


Denní záznamy stavby	Datum
POČASÍ: -6°C; JASNO; ±0°C TOLČASNO	11.11.2017
POČET PRAC.: 1x THP; 6x PSV STAVEBNÍ; 8x PSV; 3x ELEKTROIN	70
PRAC. DOBA: 7.00 - 17.00	
PRÁVNÍ SE: S001A - VÝZVUKY PRŮČELÍ BOUŽÁVÍ TRO JEDNOTLIVÉ PROFESY VÍ; ETI; EL; VED. HUBBÉ ZORUODS EL. ZORUODS.	
S001C - MONTÁŽ STŘEŠNÍ KEE ODBLOK MALT. (PROHLÁŠENÍ).	
S001D - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO STROPU V MÍSTNOSTI č. 5158.	
POČASÍ: -5°C; TOLČASNO; -2°C JASNO	11.11.2017
POČET PRAC.: 1x THP; 6x PSV; 6x PSV STAVEBNÍ	67
PRAC. DOBA: 7.00 - 17.00	
PRÁVNÍ SE: S001A - VÝZVUKY PRŮČELÍ, ZORUODS ELEKTR.	
S001C - MONTÁŽ STŘEŠNÍCH PANELOV.	
ZBÝVAJÍCÍ PRÁCE POD TÍSKOVÝM STROJEM SE BUDĚ MUSET ZPLNIT TEPRÁ JESTLIŽ KANALIZACE.	
POČASÍ: -6°C ZATÁŽENO; -5°C ZATÁŽENO	11.11.2017
POČET PRAC.: 1x THP; 6x PSV; 6x PSV STAVEBNÍ.	87
PRAC. DOBA: 7.00 - 17.00	
PRÁVNÍ SE: S001A - VÝZVUKY PRŮČELÍ.	
S001C - MONTÁŽ STŘEŠNÍCH PANELOV KINGSMAN.	
POČASÍ: -4°C ZATÁŽENO	11.11.2017
POČET PRAC.: 1x THP; 7x PSV	67
PRAC. DOBA: 7.00 - 17.00	
PRÁVNÍ SE: S001A - VÝZVUKY PRŮČELÍ.	
S001C - ODBLOK MALT V PŘÍPRAVU S001C.	
OD 22.11.2017 - 1.1.2018 SE NA STAVBĚ NEPRACUJE.	






Denní záznamy stavby	Datum
KONSTRUKCE	
• V NABÍDEK : KČMADCOOL S.R.O.	
• REALIZACE : INT CZ S.R.O. IČ. 2411648	
ZÁMČNÍK KČE	
• V NABÍDEK : ŠOLE KONSTRUKCE S.R.O.	
• REALIZACE : JOSEF TILŠ IČ. 44236735	
THERMISLOVÉ PODLAHY	
• V NABÍDEK : NEUVODEN	
• REALIZACE : SALIT SPOL. S.R.O. IČ. 29132983	
ZÁPIS TDI: BYLA PROVEDENA NA KA	
TODŮN: +1°C ZATÍŽENO	9.1.2018
POČET TELL.: 1xTHA; 12xHVV; 3xELEKTRON	UT
TOD. DOBA: 7.00 - 17.00	
PRŮVÁNÍ SE: SOOAK - NEUVE/ROZVOHY ELEKTRO.	
SOOAC - VÝKOPY A POKLÁDKA LEŽATÉ KANALIZACE	
(DEŠŤOVÉ A SPLAŠKOVÉ); ZATĚVA: INIESTOR	
POŘADÍ ZPŮSOB ZÁKLADU POD TISKÁŘSKÉ STROJE V	
K/ST. 8. 123.	
TODŮN: +4°C ZATÍŽENO; +5°C ZATÍŽENO	10.1.2018
POČET TELL.: 1xTHA; 12xHVV; 3xELEKTRON; 2xELEKTROIN	ST
TOD. DOBA: 7.00 - 17.00	
PRŮVÁNÍ SE: SOOAK - NEUVE/ROZVOHY ELEKTRO.	
SOOAC - VÝKOPY A POKLÁDKA LEŽATÉ KANALIZACE	
PÍSKOVÁNÍ, ZÁSTUPNÍ HUTNĚNÍ PO VSTUPNÍM.	
ZDĚNÍ ŠTÍTOVÉ STĚNY NA OSE 1. J.	
TODŮN: +3°C ZATÍŽENO; +4°C ZATÍŽENO	11.1.2018
POČET TELL.: 1xTHA; 12xHVV; 3xELEKTRON; 2xELEKTROIN	ET
TOD. DOBA: 7.00 - 17.00	
PRŮVÁNÍ SE: SOOAC - VÝKOPY A POKLÁDKA	
LEŽATÉ KANALIZACE (DEŠŤOVÁ A SPLAŠKOVÁ)	
ČÁSTI, PÍSKOVÁNÍ, HUTNĚNÍ PO VSTUPNÍM.	
ZDĚNÍ ŠTÍTOVÉ STĚNY NA OSE 1. J.	
ZÁPIS TDI: BYLA PROVEDENA KONTROLA PÍSKOVÁNÍ	
A POKLÁDKA PODLAHY KANALIZACE TDI VÝKOPY	
PROVEDENÍ A SOUHLASÍ S ZÁSTUPNÍM	



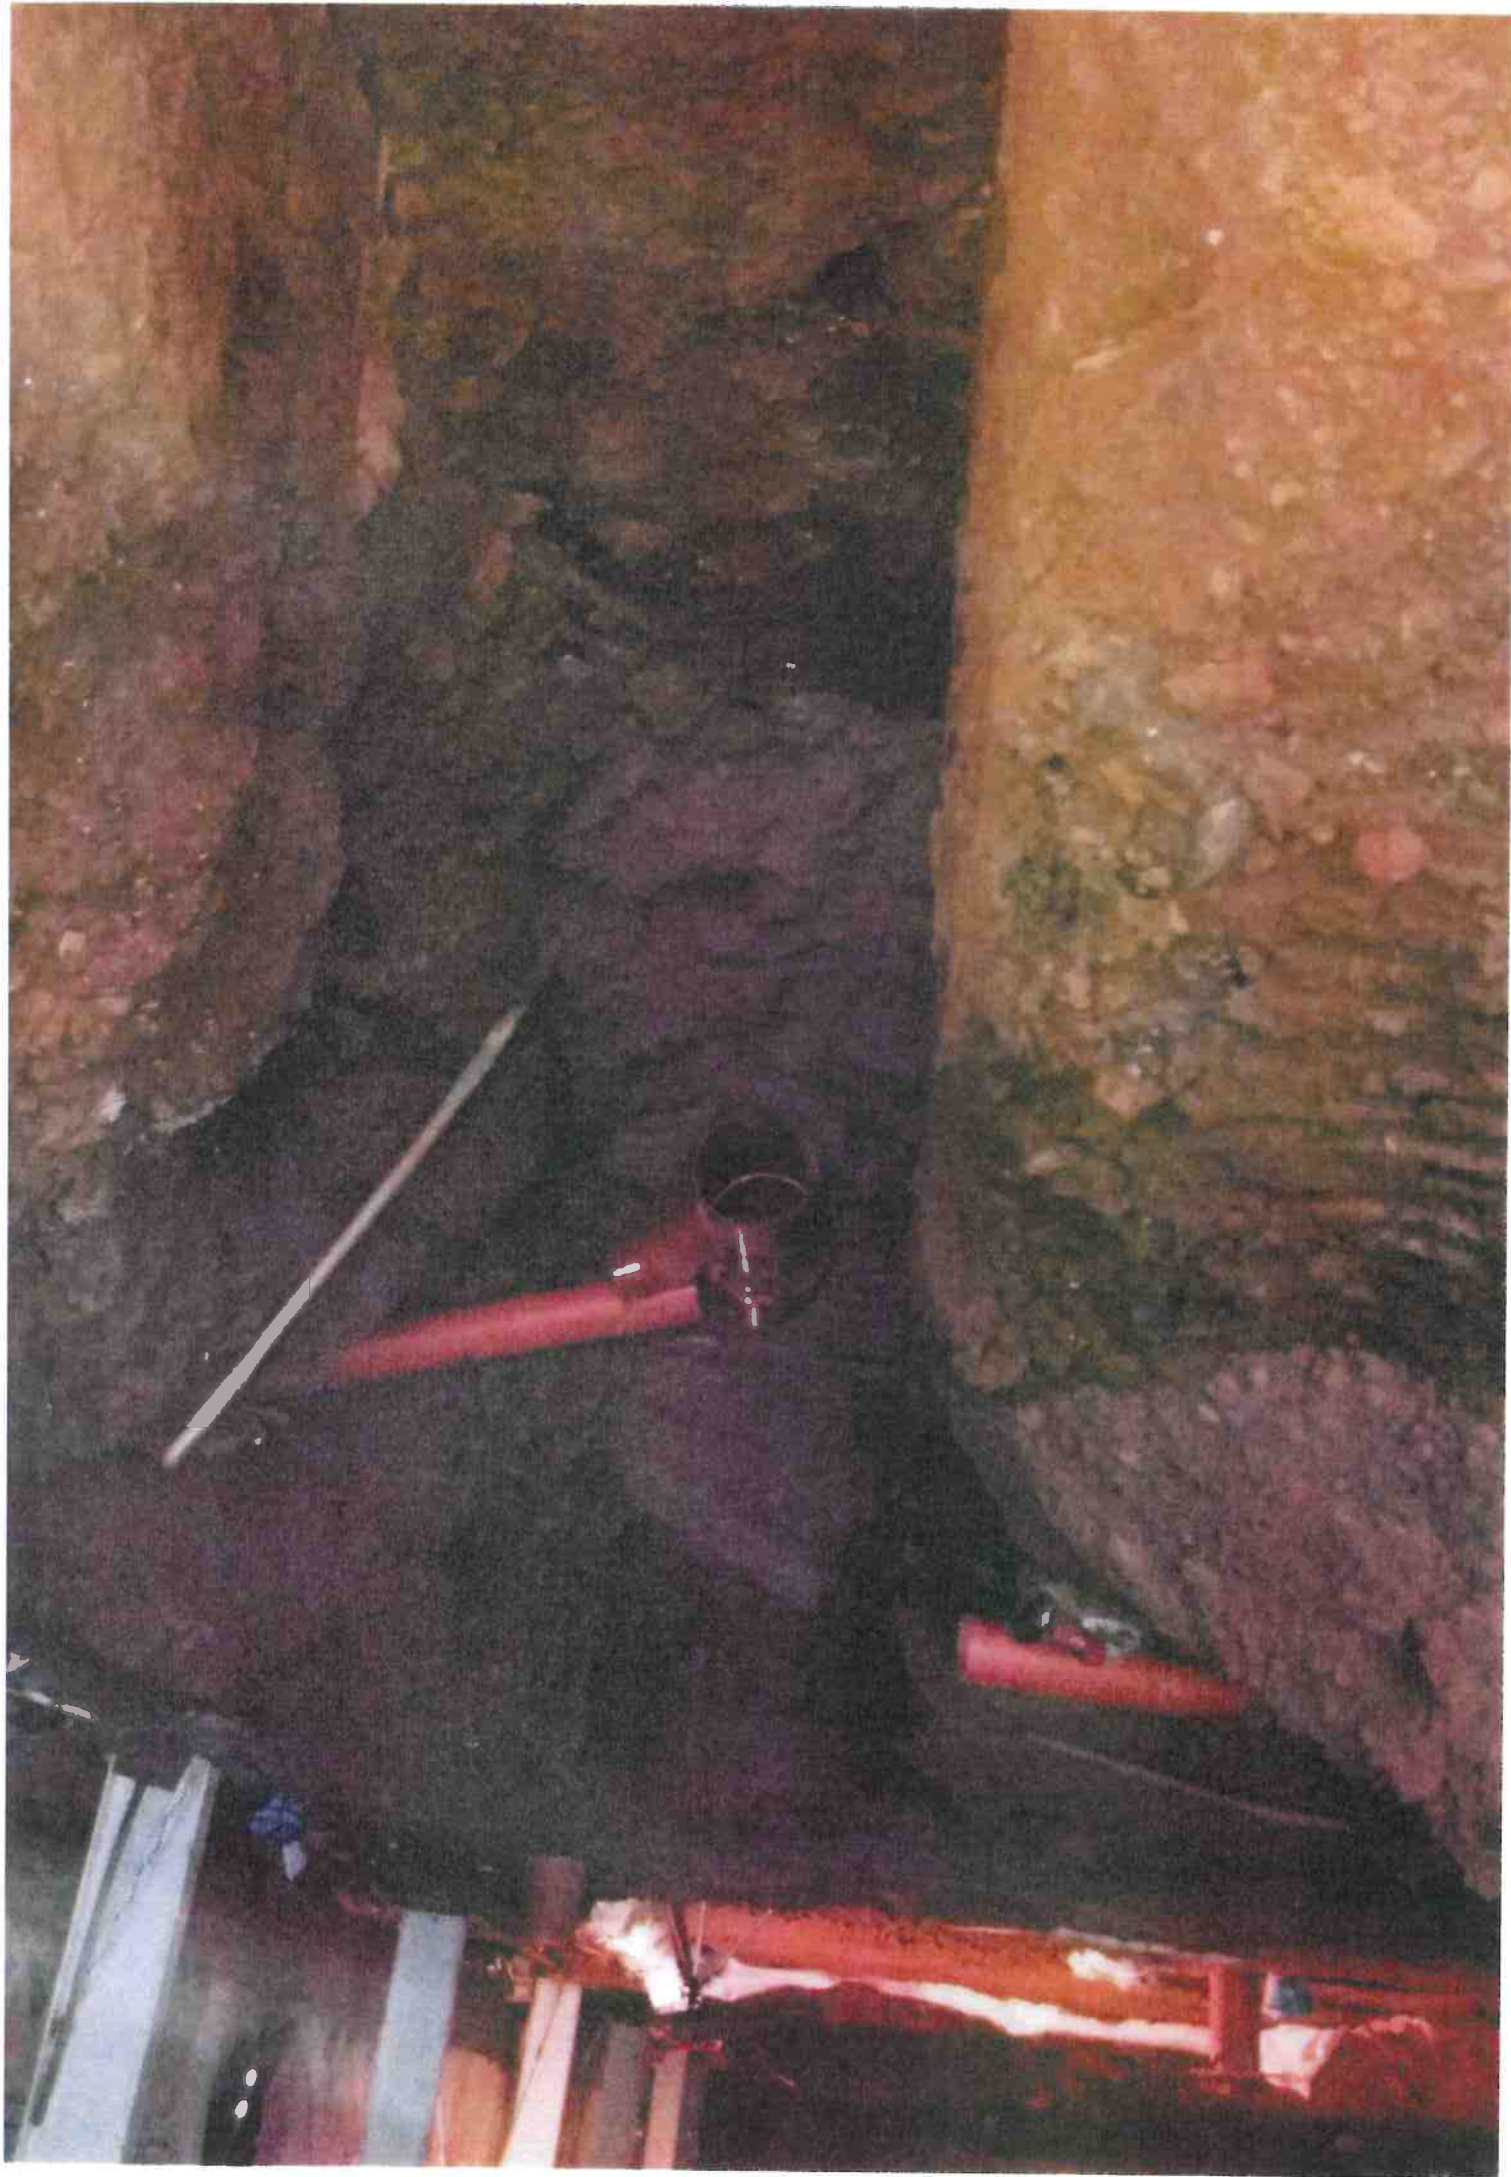






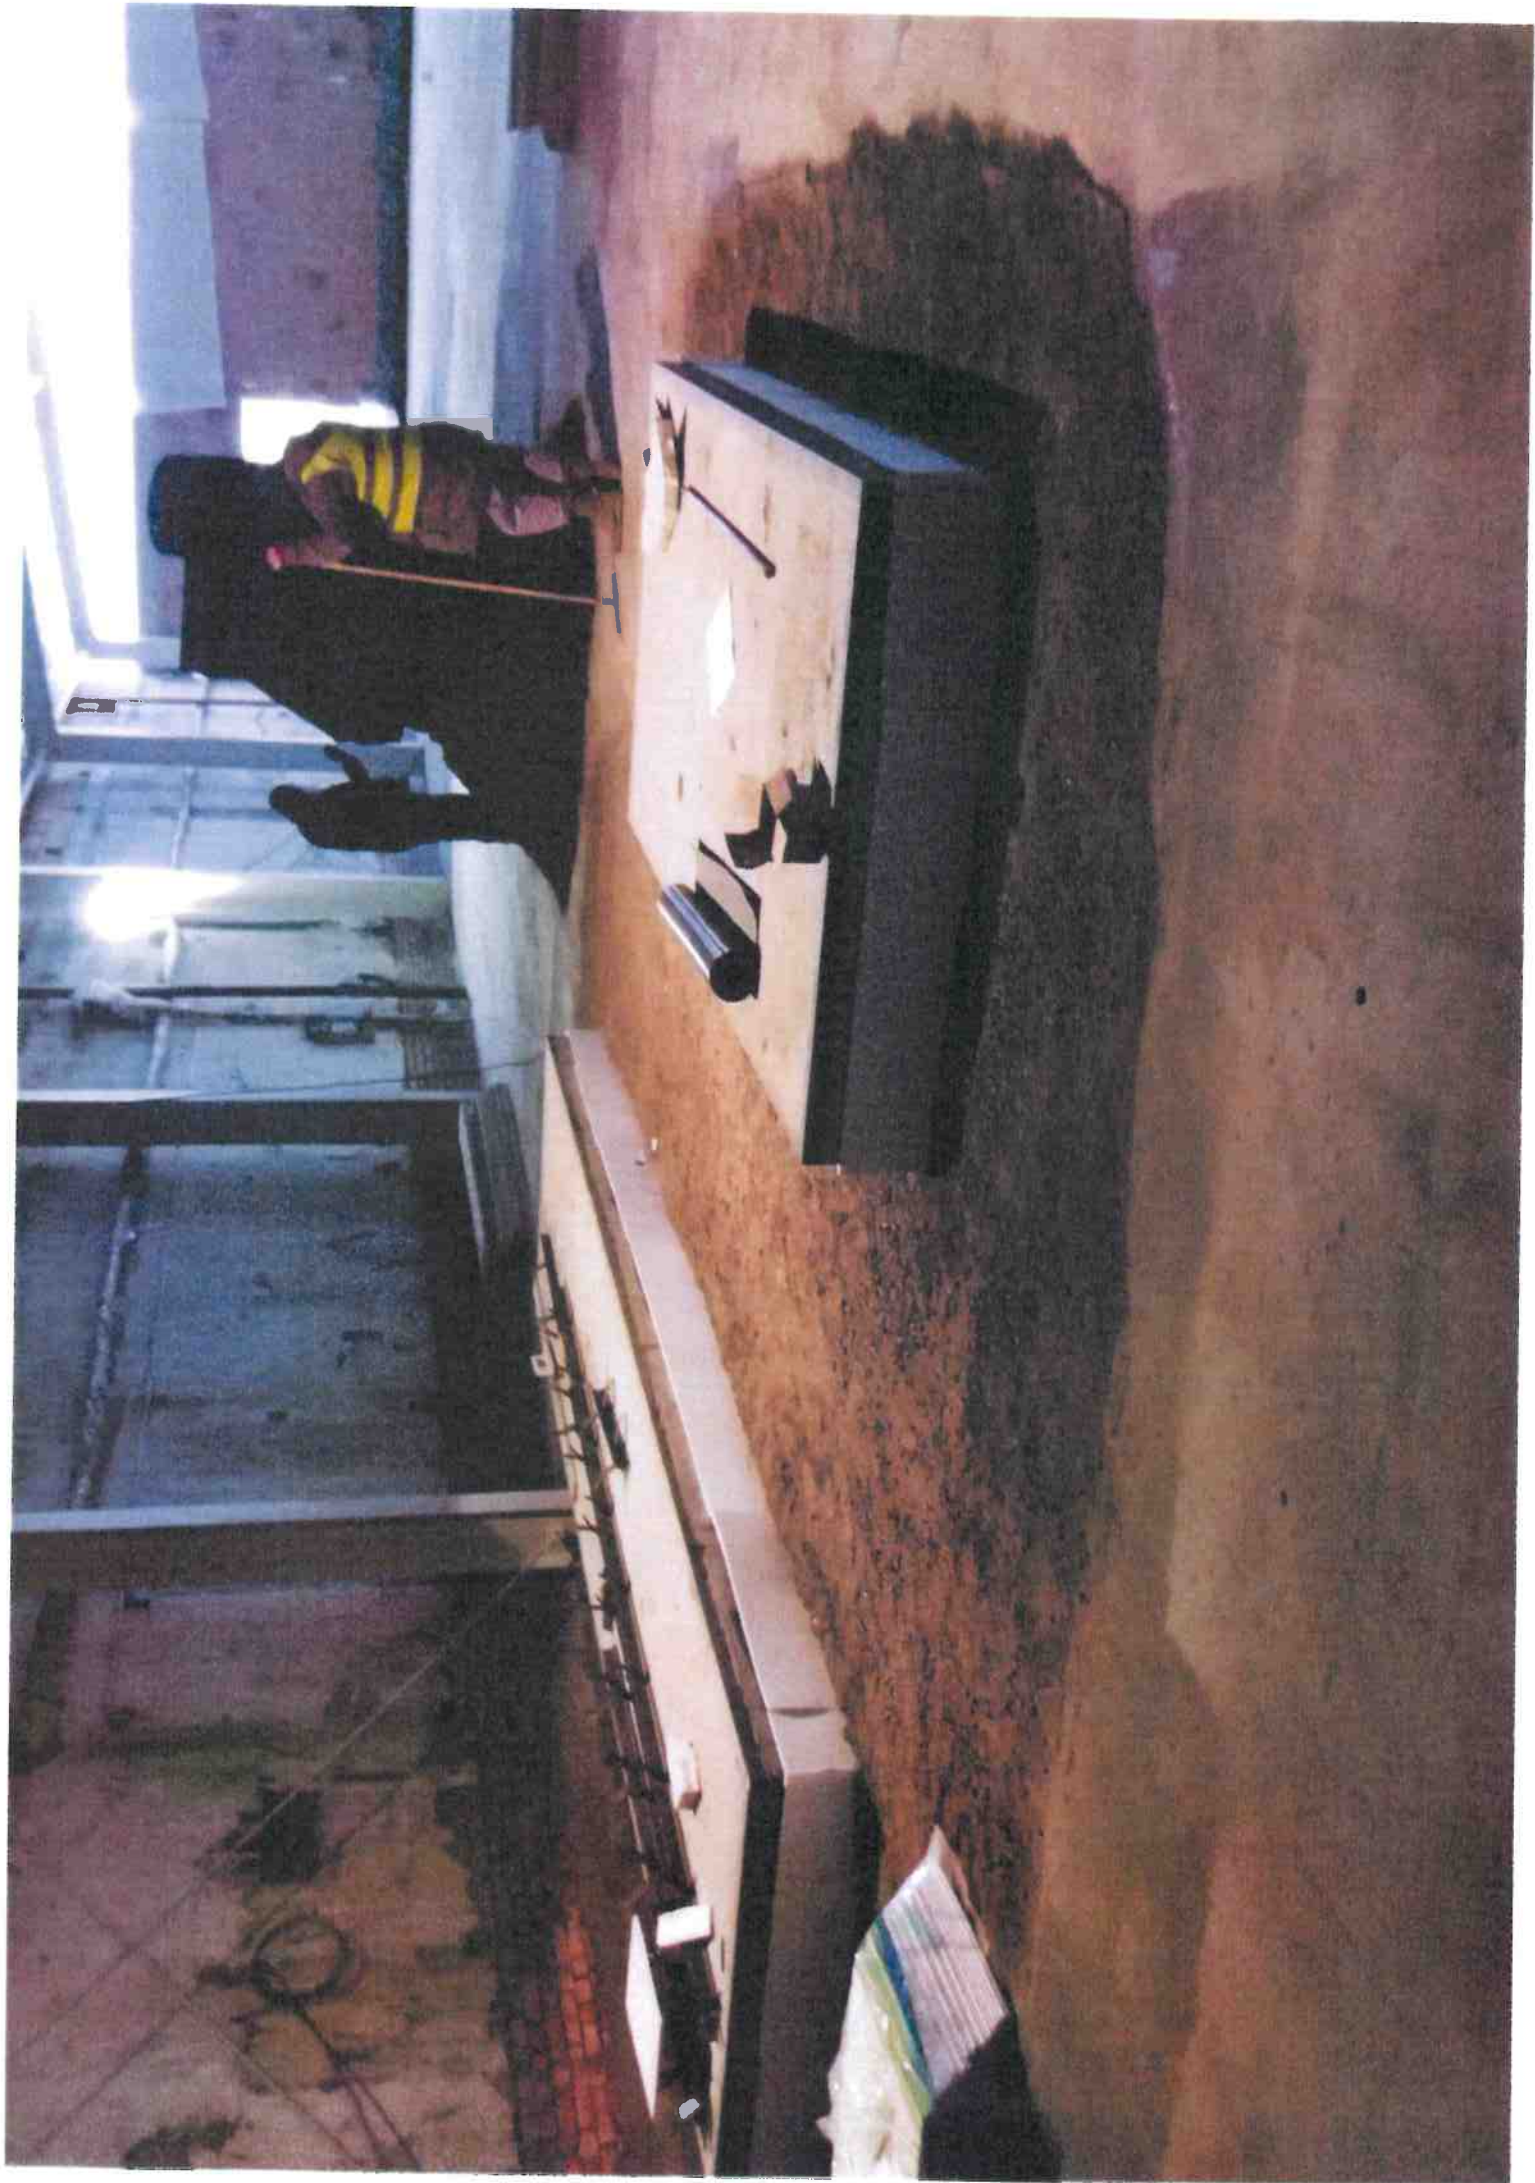

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ

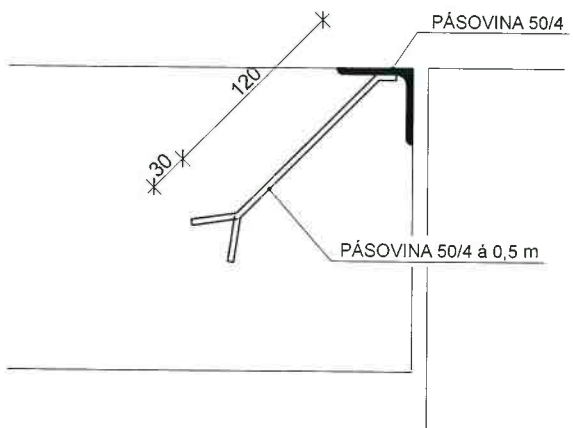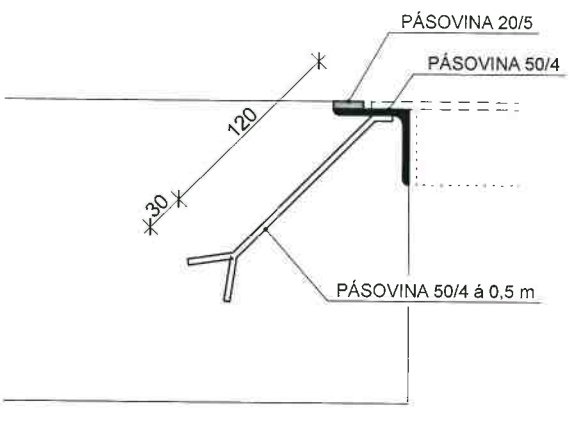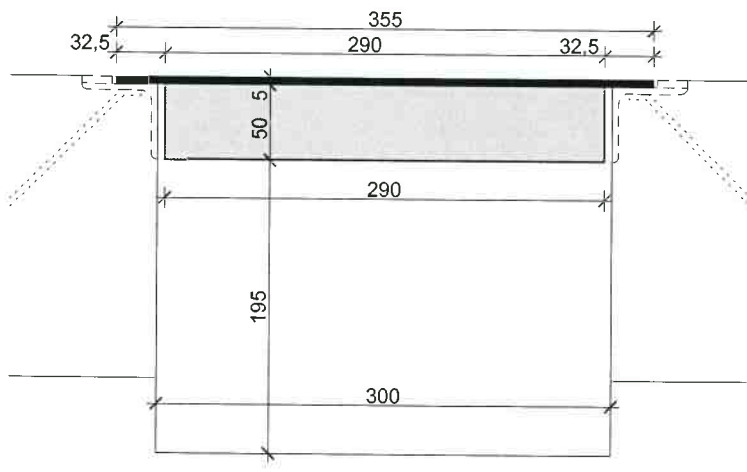
OZNAČENÍ	POPIS	KS / BM / M ²	POZNÁMKA
Z9	LEMOVÁNÍ ZÁKLADŮ STROJŮ "L" PROFIL 50/50/4 	24,5 bm 3,75 kg/bm	- PROFILY SPOJOVÁNY POD ÚHLEM 45 - JEDNOTLIVÉ PROFILY SVAŘENY SVÁRY PŘEBROUŠENY DO HLADKA - PROFIL NATŘEN ZÁKLADNÍM A DVOJNÁSOBNÝM VRCHNÍM NÁTĚREM ODSTÍN ŠEDÉ
Z10	LEMOVÁNÍ TECHNOLOGICKÉHO KANÁLU "L" PROFIL 50/50/4 S NAVAŘENOU PÁSOVINOU 20/5 	26,0 bm 4,55 kg/bm	- PROFILY SPOJOVÁNY POD ÚHLEM 45 - JEDNOTLIVÉ PROFILY SVAŘENY SVÁRY PŘEBROUŠENY DO HLADKA - PROFIL NATŘEN ZÁKLADNÍM A DVOJNÁSOBNÝM VRCHNÍM NÁTĚREM ODSTÍN ŠEDÉ
Z11	KRYCÍ PLECH TECHNOLOGICKÉHO KANÁLU KAPĚNKOVÝ PLECH tl. 5 mm S NAVAŘENÝMI ŽEBRY Z PÁSOVINY 50/5 á 200 mm 	13,5 bm 17,00 kg/bm	- PLECHY SESAZENY NA SRAZ - PLECHY ROZDĚLIT NA DÍLY O DÉLCE MAX. 1,5 m. - V KAŽDÉM PLECHU OTVOR PRO ZVEDNUTÍ - JEDNOTLIVÉ PROFILY SVAŘENY - PLECH NATŘEN ZÁKLADNÍM A DVOJNÁSOBNÝM VRCHNÍM NÁTĚREM ODSTÍN ŠEDÉ



Denní záznamy stavby	Datum
POČASÍ: 10°C ZATAŽENO, TĚŠÍ, 5°C ZATAŽENO TĚŠÍ	01.11.2017
POČET PRAC.: 1xTHP, 16xPSV	GT
PRAC. DOBA: 7. ⁰⁰ - 17. ⁰⁰	
PROVÁDÍ SE: S001A - PŘÍPRAVNÉ PRÁCE NA BETONÁŘSKÝCH BETONŮ. ÚKLID.	
S001B - MONTÁŽ ZEMNĚNÍ DLE KRESLOU ELEKTRO. - ÚKLID.	
S001C - VÝKOP ZÁKLADOVÝCH PRŮ + MONTÁŽ ARMATURY + MONTÁŽ BEDNĚNÍ. ARMATURA PRŮ BILA PŘEVZATA TDI. PRŮ NA OSE, 1". DOVOZ ZEMNÍK A V SÍTLU.	
S001D - DOVEDENÍ STĚNY NA OSE, 1". DOKLADY 71.300mm. MONTÁŽ BEDNĚNÍ LENCE A ARMATURY 40x12 TĚŠÍ Ø 6 d 250mm. ARMATURA BILA PŘEVZATA TDI.	
POČASÍ: 3°C; TĚŠÍ, 5°C TĚŠÍ	03.11.2017
POČET PRAC.: 1xTHP, 16xPSV	GT
PRAC. DOBA: 7. ⁰⁰ - 17. ⁰⁰	
PROVÁDÍ SE: S001A - BETONÁŘSKÝCH BETONŮ, PŘÍPRAVA PRO NOVÉ VODROVNÉ, ZALAC.	
S001C - MONTÁŽ BEDNĚNÍ ZÁKLADOVÝCH PRŮ. PŘÍPRAVNÉ PRÁCE NA BETONÁŘSKÝCH ZÁKLADOVÝCH PRŮ.	
S001B - ÚKLID.	
S001A+B ZEMNĚNÍ HYDROIZOLACE (VODROVNÁ) DEKASTIČENA.	
POČASÍ: 2°C ZATAŽENO, 6°C ZATAŽENO	13.11.2017
POČET PRAC.: 1xTHP, 16xPSV	GT
PRAC. DOBA: 7. ⁰⁰ - 17. ⁰⁰	
PROVÁDÍ SE: S001A - BETONÁŘSKÝCH BETONŮ.	
S001C - BETONÁŘSKÝCH PRŮ NA OSE, 1". PRŮ Ø 25/30. BEZPEČNOSTNÍ ZATÍŽENÍ STŘEDU SLOUPŮ OCELOVÉ KCE.	
S001D - BETONÁŘSKÝ LENCE NA OSE, 1" BETON Ø 25/30 SE ZEMNÍ PŘÍPRAVOU. ÚKLID STAVENIŠTĚ.	
DO ZVEŠTNÍHO ZNE NEBÁTE PŘEDANOU PRŮVĚDU DOKUMENTACI VIZ ZPRÁVA 12.11.2017.	





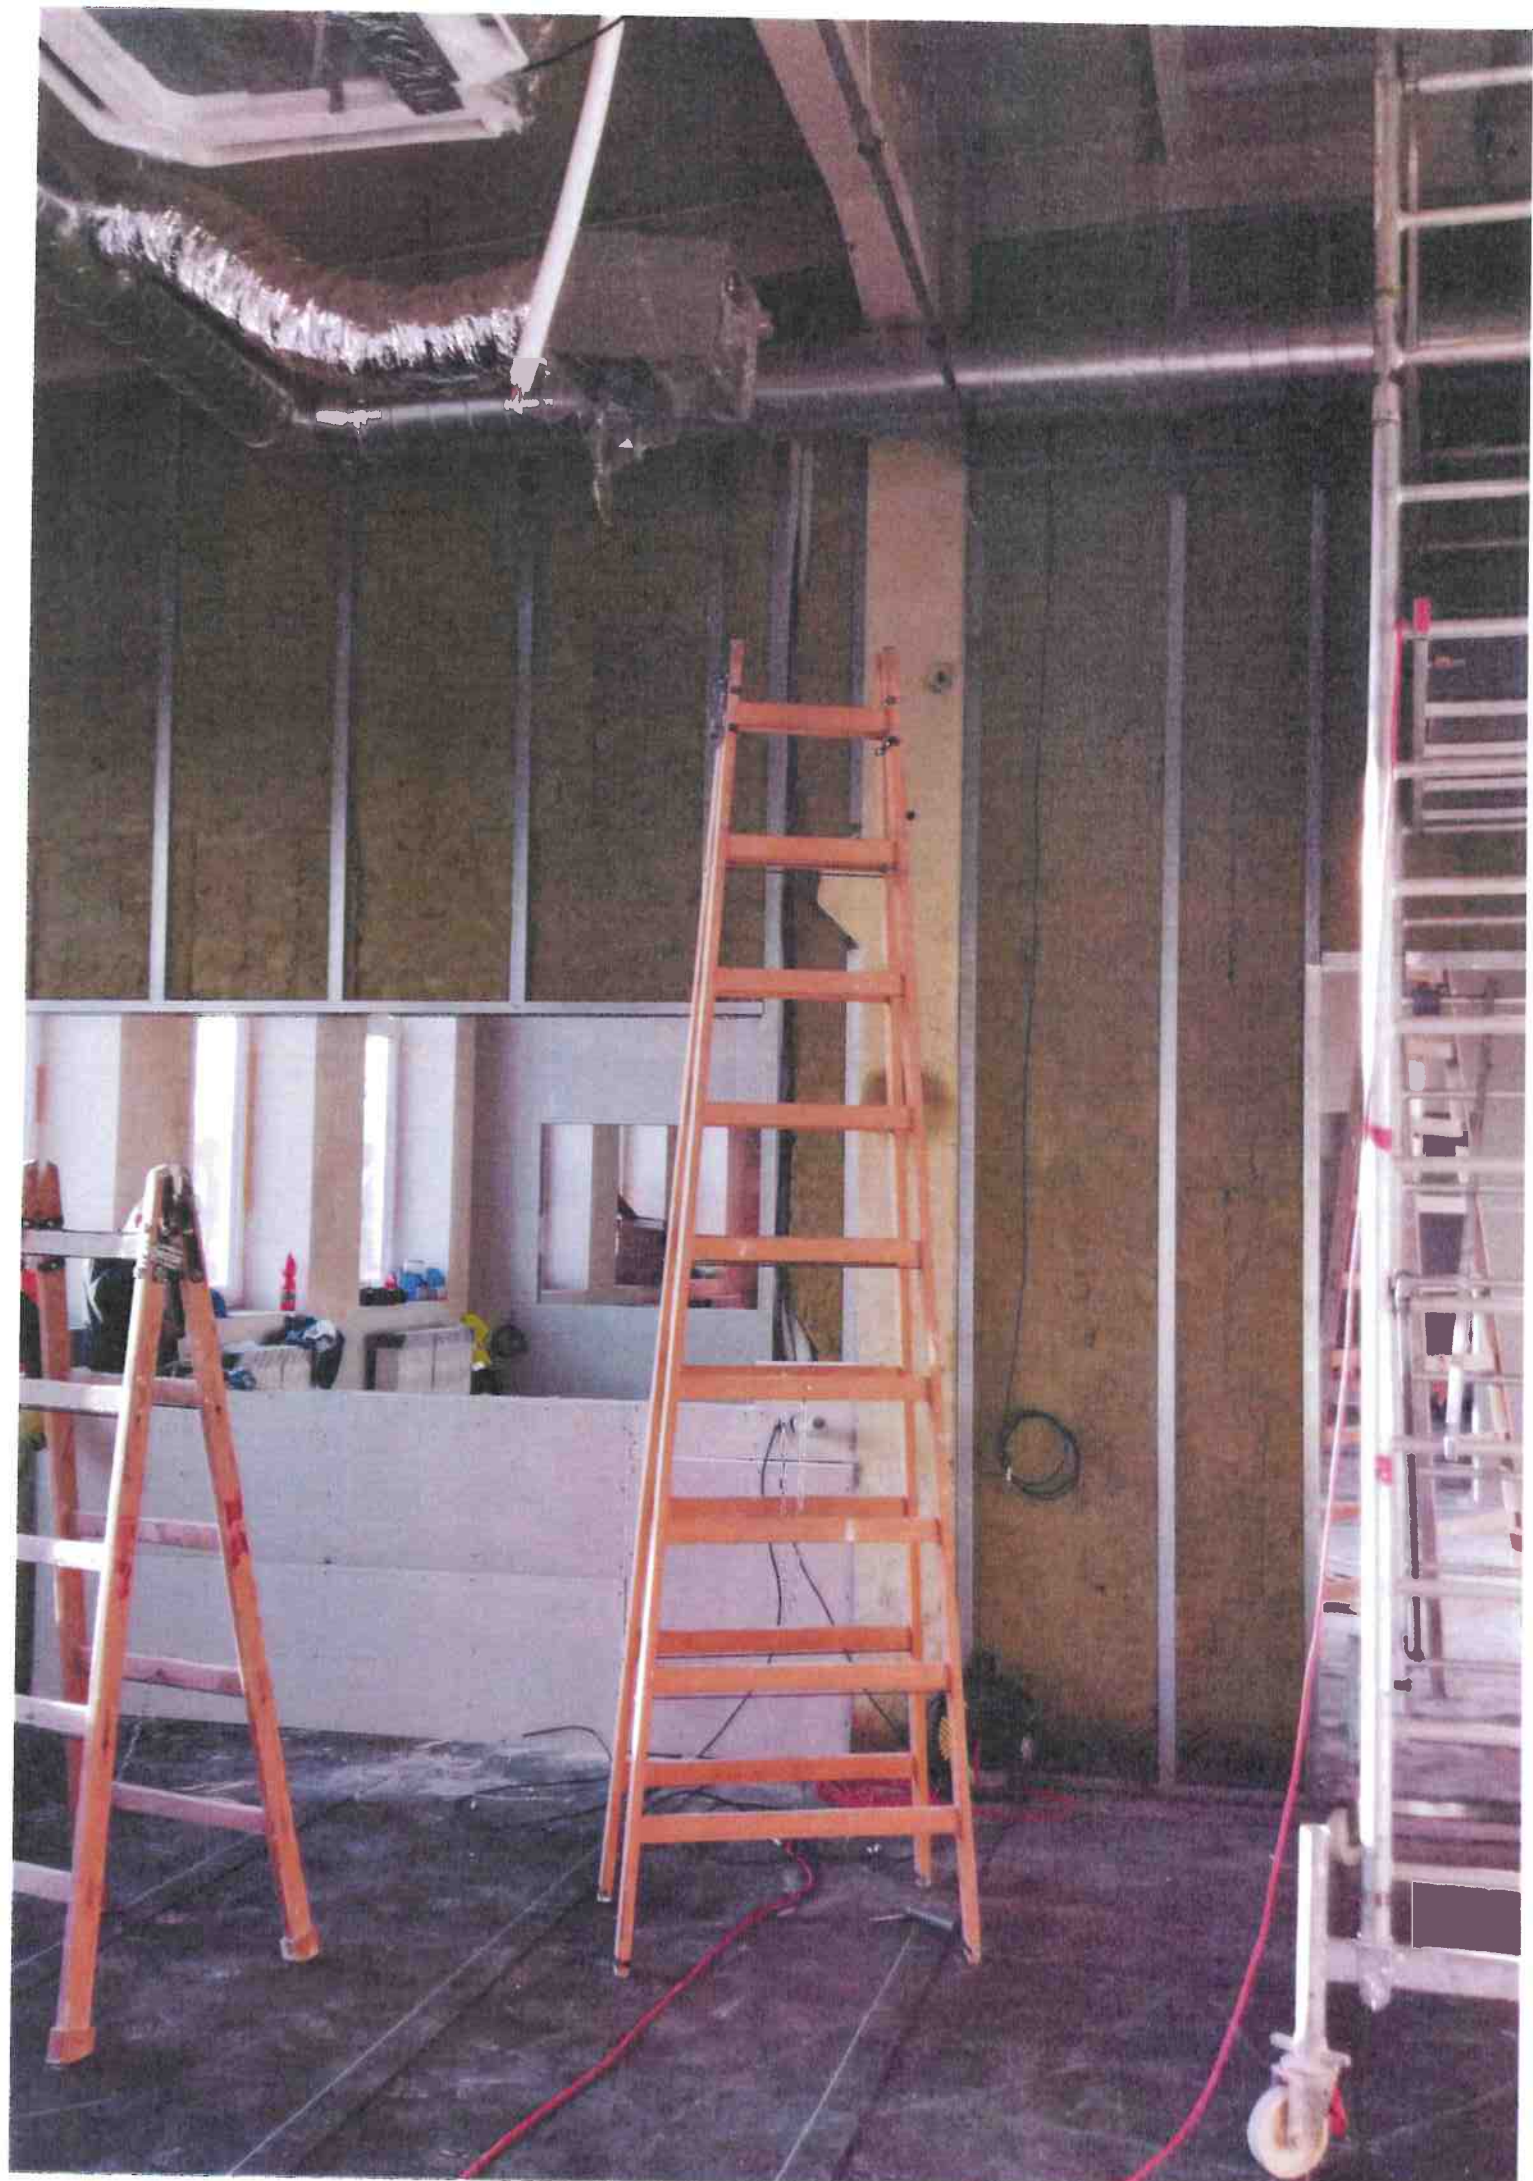




Denní záznamy stavby	Datum
POČASÍ: +6°C; +8°C POKLONNO	24.1.2018
POČET PRAC.: 1xTHP; 12xHVV; 3xECTHON	8 ST
PRAC. DOBA: 7.00 - 16.30	
PRŮBĚH SB: S001X - BETONÁŘ ČISTÝCH PODLAH (146 - 149)	
S001B - BETONÁŘ PŘECHODESKY SVĚTLKŮ BETON C25/30 XL.	
S001C - DOKONČENÍ LEŽATÉ KANALIZACE. ROVNÁNÍ KOCHY OCE'HALY. HUTNĚNÍ.	
POČASÍ: +5°C; +6°C ZATAŽENO	25.1.2018
POČET PRAC.: 1xTHP; 12xHVV; 3xECTHON; 2xSELECTA	7x ST
PRAC. DOBA: 7.00 - 16.30	
PRŮBĚH SB: S001X - BETONÁŘ ČISTÝCH PODLAH BETON C 15/20 S KAZI SVTL' Ø 150x150.	
S001B - OBĚTŘOVÁNÍ BETONU PŘECHODESKY.	
S001C - ROVNÁNÍ KOCHY. HUTNĚNÍ.	
S001D - NÁKOP ISOLANTU NA KCI NOVÉ STŘECHY. PŘÍPRAVNÉ PRÁCE, PO ODVOZENÍ SVĚTLKŮ BUDE POTŘEBA KLIKOMAT JAKOVOU OVLÁTKU NA STÁVAJÍCÍ BUDOVU INTERNETU.	
POČASÍ: +6°C; +7°C POKLONNO	16.1.2018
POČET PRAC.: 1xTHP; 12xHVV; 3xECTHON; 2xSELECTA	7x
PRAC. DOBA: 7.00 - 16.30	
PRŮBĚH SB: S001X - BETONÁŘ ČISTÝCH PODLAH BETON C20 + KAZI Ø 6 150x150mm.	
S001C - ROVNÁNÍ PODKLADU V HALĚ, HUTNĚNÍ. - ZDĚNÍ ŠTŮTOVÉ STĚNY Z BLOKŮ TL. 300mm NA TĚNU. OSA 1x2.	
S001D - PŘÍPRAVNÉ PRÁCE PRO MONTÁŽ VŘETEV NOVÉ STŘECHY.	
POČASÍ: +7°C; +8°C ZATAŽENO	19.1.2018
POČET PRAC.: 1xTHP; 12xHVV; 3xECTHON; 2xSELECTA	70
PRAC. DOBA: 7.00 - 16.30	
PRŮBĚH SB: S001X - ROZVODY VT.	
S001B - DOKONČENÍ PODPĚRNE KCB PŘECHODESKY.	
S001C - ROVNÁNÍ HALY. PŘÍPRAVA PRO PRVOK ČERKŮ 0-30 m - ZDĚNÍ Z BLOKŮ TL. 300mm NA TĚNU OSA 1x2.	







Denní záznamy stavby	Datum
Teploty: -4°C; $+1^{\circ}\text{C}$ POUŠENO Teploty vzduchu: 1xTHP; 16xHSV; 2xELCION TRC. DOBA: 7.00 - 17.00 PROVÁZENÍ SE: S001A - BETONÁŘ ČISTĚ POXATK 12MMV. S001B - VÁZROVÉ OMTKY S001C - ARMOVÁNÍ PLOCHY HALY 1x KAZI $\phi 6$ OKA 150x150 mm. S001D - MONTÁŽ ZATOPLOVÝ STRÁČEK NAD - NDBENOV.	9.2.2018 7x
Teploty: -3°C; $+2^{\circ}\text{C}$ ZATŘENO Teploty vzduchu: 1xTHP; 8xHSV TRC. DOBA: 7.00 - 17.00 PROVÁZENÍ SE: S001B - VÁZROVÉ OMTKY. MÍSTNOST 10 VYTÁPĚNÍ. S001C - ARMOVÁNÍ PLOCHY 1x KAZI $\phi 6$ OKA 150x150 mm.	10.2.2018 30
Teploty: -2°C; $+1^{\circ}\text{C}$ POUŠENO Teploty vzduchu: 1xTHP; 8xHSV TRC. DOBA: 7.00 - 17.00 PROVÁZENÍ SE: S001B - VÁZROVÉ OMTKY, MÍSTNOST 10 VYTÁPĚNÍ. S001C - ARMOVÁNÍ PLOCHY HALY (PODKRÁDMÍ 1. VSTRA POKLADY) 1x KAZI $\phi 6$ OKA 150x150 mm.	11.2.2018 NE
Teploty: -2°C; $+1^{\circ}\text{C}$ ZATŘENO Teploty vzduchu: 1xTHP; 14xHSV; 2xELCION Teploty vzduchu: 7.00 - 17.00 PROVÁZENÍ SE: S001A - BETONÁŘ POKRÁDMÍ. S001B - VÁZROVÉ OMTKY. MÍSTNOST 10 VYTÁPĚNÍ. S001C - PŘÍPRAVA PLOCHY NA BETONÁŘ. POKRÁDMÍHO BETONU E 12/15. ARMATURA V PLOŠE. ŽELE KONTROLOVÁNÍ 1x KAZI $\phi 6$ 150x150 mm. TDI POUŠENÍ 2x BETONOVAT. ARMATURA - VYKONATEL UVEDENÝ NA IZOTNY STAV PŘÍPRAVY PLOCHY, DĚLE NA VYKONÁNÍ KAZI.	12.2.2018 70

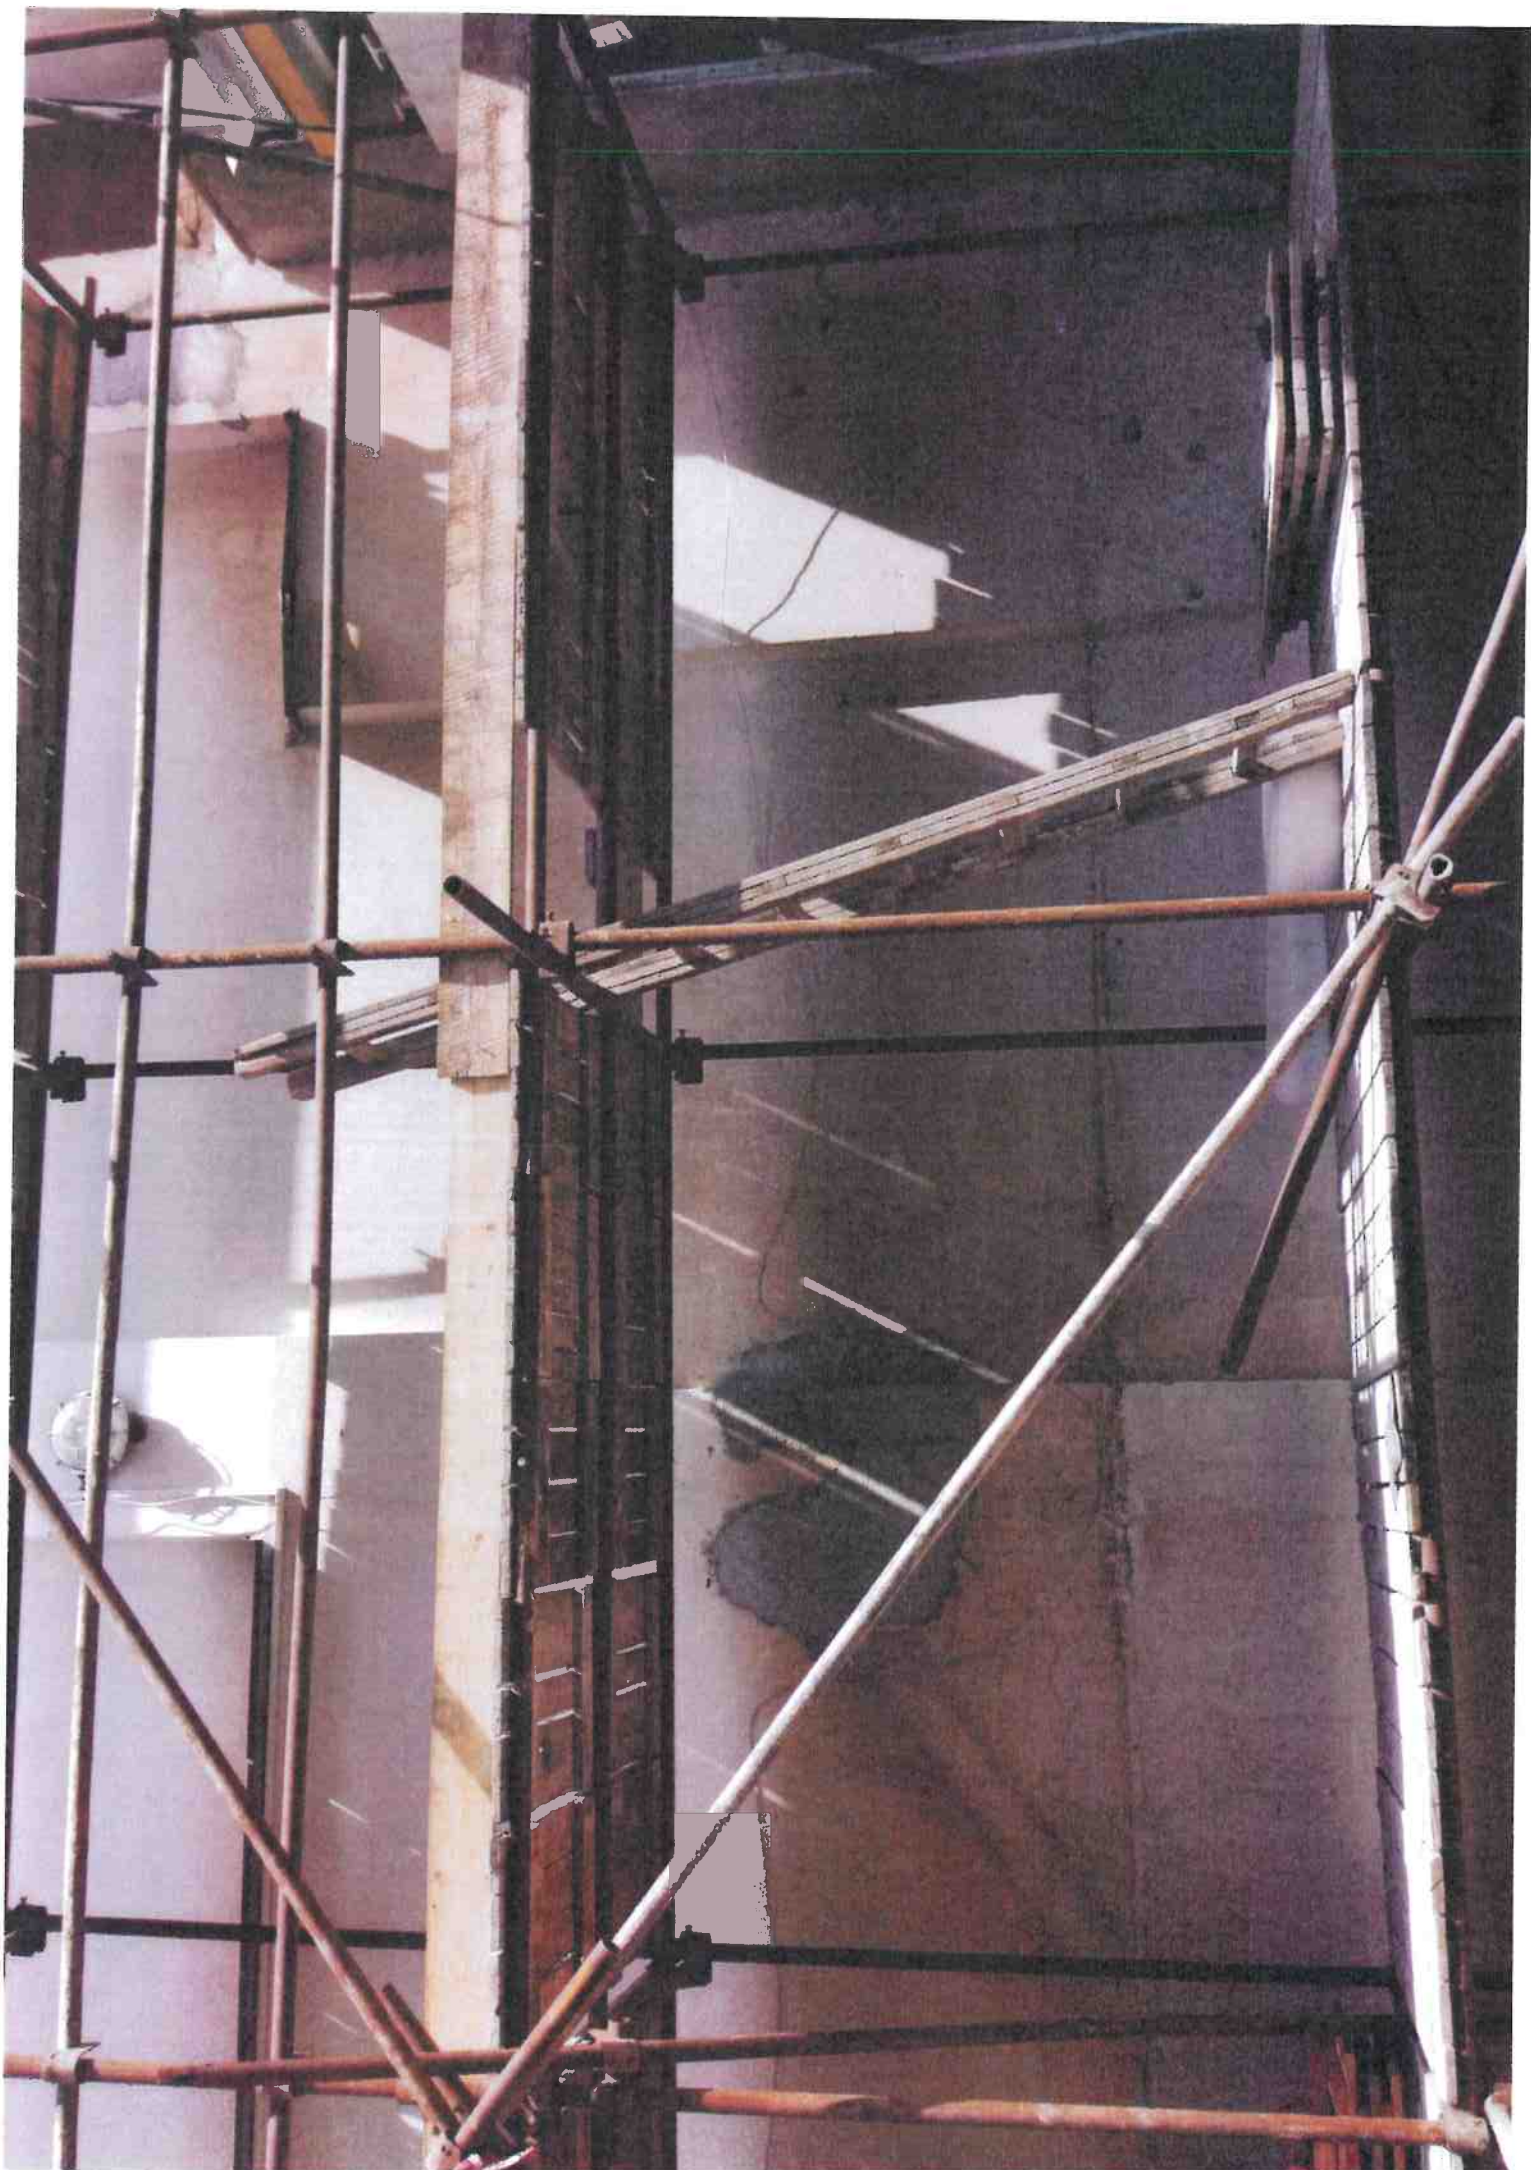





Denní záznamy stavby	Datum
POČASÍ: -2°C; +3°C JASNO	13.1.2019
POČET PRAC.: KTM; 16xHV; 3xELION	ST
PRAC. DOBA: 7.00 - 17.00	
PROVĚRA SE: S001A - BETONÁŘ PRAVNÍK C 17/20.	
S001B - VÁZROVÉ OPĚTKY. HRUBÉ ZOLVOT ETI, PUKU.	
S001C - ZOLVOT KUKU, ETI. ZOLVOT PRACOV.	
- ZOLVOTOVÁNÍ PLOCHY 1x KALI Ø 6 A 17/20mm.	
POČASÍ: -2°C; +2°C JASNO, PUKU	14.1.2019
POČET PRAC.: KTM; 16xHV; 3xELION	ST
PRAC. DOBA: 7.00 - 17.00	
PROVĚRA SE: S001B - HRUBÉ ZOLVOT KUKU A ETI.	
S001C - BETONÁŘ ZOLVOTOVÁNÍ ZOLVOTU V KALI.	
ZOLVOT C 17/20.	
ZKOUŠKA UPOTŘEBU NA ZOLVOTOVÁNÍ ZOLVOT, DRT. DRT. DRT.	
ZOLVOT, DRT. DRT. DRT. - ZOLVOTOVÁNÍ ZOLVOT. ZOLVOT	
DRT. SE NĚKTERÝ NEVYBĚH.	
PROVEDENÍ KONTROLY JINÝCH 100. ZOLVOT 1 KALI	14.2.19
100 ZOLVOT. 90% KONTROLA + ZOLVOT 100. ZOLVOT	
NA MÍSTĚ SE ZOLVOT. 90% A DRT. 100. ZOLVOT	
DRT. 100. ZOLVOT	
POČASÍ: -2,5°C; +2°C JASNO	17.2.2019
POČET PRAC.: KTM; 16xHV	ST
PRAC. DOBA: 7.00 - 17.00	
PROVĚRA SE: S001C - BETONÁŘ ZOLVOTOVÁNÍ ZOLVOTU	
V KALI.	
S001B - VÁZROVÉ OPĚTKY.	
POČASÍ: -3°C; +2°C JASNO	16.2.2019
POČET PRAC.: KTM; 16xHV; 3xELION	ST
PRAC. DOBA: 7.00 - 17.00	
PROVĚRA SE: S001A - BETONÁŘ ČISTÝCH PRAVNÍK. (KALI 10)	
S001B - VÁZROVÉ OPĚTKY. (ZOLVOT SE VYBĚH)	
S001C - PŘÍPRAVA PRÁCE NA ZOLVOTOVÁNÍ ZOLVOT	
STOL. PENETRAČNÍ ZOLVOTOVÁNÍ ZOLVOTU PRO	

Akce : „Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠPTP Velké Poříčí“

Pozice dveří : D21, D21a

Popis : 2-křídle dřevěné prosklené interiérové dveře s nadsvětlíkem, povrchová úprava z CPL lamina

Rozměr rámu : 1510x2970 mm

Rozměr dveří : 1430x1970 mm + nadsvětlík 1430x1000 mm

Požární odolnost : EW 30 DP3 C2

Zárubeň : Ocelová

Prohlášení

Pro uvedené pozice nejsme schopni vyrobit ocelovou zárubeň a deklarovat samostatně požadované vlastnosti.

Dne 5.2.2018

MJ - HANÁK s.r.o.
KOVOVÝROBA
L. 018 011 011 011
Hav
00014

Razítko a podpis výrobce
MJ-Hanák s.r.o.

Akce : „Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠPTP Velké Poříčí“

Pozice dveří : D21, D21a

Popis : 2-křídle dřevěné prosklené interiérové dveře s nadsvětlíkem, povrchová úprava z CPL lamina

Rozměr rámu : 1510x2970 mm

Rozměr dveří : 1430x1970 mm + nadsvětlík 1430x1000 mm

Požární odolnost : EW 30 DP3 C2

Zárubeň : Ocelová

Prohlášení

Pro uvedené pozice nejsme schopni vyrobit ocelovou zárubeň a deklarovat samostatně požadované vlastnosti. Toto lze do průsvitu nadsvětlíku do 700 mm.

Dne 5.2.2018

MONTKOV spol. s r.o.
Vyšehněvice 10
533 41 Lázně Bohdaneč
DIČ: CZ42936250


.....
Jindřich Holub

Tel.: +420 724 851 034

e-mail: holub@montkov.cz

MONTKOV, spol. s r.o.

Vyšehněvice 10

533 41 Lázně Bohdaneč


Denní záznamy stavby	Datum
BEDNĚNÍ ENERGOKANÁLU V HÍSTNOSTI 123'. MONTÁŽ OCELOVÉHO LEVDOMÁ. OSADOVÁNÍ ZKS HRANATÝCH SVĚTLÍKŮ MEZI OSOU G-H. ZHOTOVITEL UPOLOŽNUT NA STĚNU MEZI S001A A C, KTERÁ BY BUDE MUSET PŘEDPOLOŽIT DODAT (ZUB NA STĚNĚ PO DEMOLICI STŘECHY.)	
POČASÍ: -1°C, +2°C ZATAŽENO, PŘEHÁŇKY.	6.3.2018
POČET PRAC.: 1x THP, 1x HSK, 3x IZOLACE PŘEHÁŇKY, 6x KRSTAV	CT
PRAC. DOBA: 6:30 - 17:00	
PROVÍDÍ SE: S001A - JÁDROVÉ A SANAČNÍ OPVKY.	
OBJEKT JE VYTÁHÉN.	
S001B - SÁDROKARTONOVÉ KCE. (POČÁTKU KASLIK NA STROPE PŘES PŘEHÁŇKY).	
S001C - TAVĚNÍ IZOLACE Z ASFALTOVÝCH PÁSOV V CELÉ PLOŠE. MONTÁŽ BEDNĚNÍ PŘEHÁŇKY PŘEHÁŇKY VE DVEŘÍCH. KONTROLA SPÁJENÝCH SPÁJÍ IZOLACE.	
S001D - SÁDROKARTONOVÉ KCE V HÍSTNOSTI S 145.	hej
POČASÍ: -1°C, +6°C JASNO	7.3.2018
POČET PRAC.: 1x THP, 1x HSK, 4x KRSTAV, 2x T-SERVIS	ST
PRAC. DOBA: 6:30 - 17:30	
PROVÍDÍ SE: S001A - JÁDROVÉ A SANAČNÍ OPVKY.	
S001B - SDR KONSTRUKCE, PĚŮKY + STROPY.	
S001C - TAVĚNÍ HYDROIZOLACE Z ASFALTOVÝCH PÁSOV V CELÉ PLOŠE. STROJE KONTROLOVAT POKLÁDKA TEPELNÉ IZOLACE NA JIŽ HOTOVOU HYDROIZOLACI. MATERIÁL XPS TL. 100mm. XPS K POKLADU FIXOVÁNO PĚNOV.	hej
S001D - SDR KONSTRUKCE STROPY.	
POČASÍ: -2°C, +9°C JASNO	8.3.2018
POČET PRAC.: 1x THP, 1x HSK, 6x KRSTAV, 2x T-SERVIS	CT
PRAC. DOBA: 6:30 - 17:00	
PROVÍDÍ SE: S001A - JÁDROVÉ A SANAČNÍ OPVKY.	
S001B - SDR KONSTRUKCE STROPY A PŘÍČEK	
S001C - TAVĚNÍ IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOСТИ Z ASFALTOVÝCH PÁSOV. POKLÁDKA TEPELNÉ IZOLACE PODLAHY XPS TL. 100mm. KONTROLA ASF. PÁSOV TDI.	hej
S001D - SDR KONSTRUKCE STROPY.	



7-124204



Denní záznamy stavby	Datum
ZÁPIS TDI:	13.3.2018
1) BYLA PROVEDENA KONTROLA PŘÍKLEPU 1. ZÁKLADY SAC KCE V OBLASTI SO 01 C, TDI PLOCHY PŘEJÍMA A SOUHLASÍ S MTD ZVLASTNÍ	
2) BYLA PROVEDENA KONTROLA PŘÍKLEPU TEP. IZOLACE Z +PS 300 T. ROHM V OBLASTI SO 01C TDI PLOCHY PŘEJÍMA	
3) POŽADAV. U MTD PAROCESNÉ FÓLIE PŘÍKLEPU NAROVNÁNÍ NA OBIDVOULE STRANÁCH ALE NA ÚROVNĚ	
PŘEVEDENÁ KONTROLA ČINNOST 400. BODU V OBLASTI 6D JED. STAV KONTROLA - 1271ET. AED. PROSPORNÝ K MÍSTU 9F 20ET. STAVBY A DÁLĚ MTD. PŘÍKLEPU DENÍK 400. BOD.	13.3.18
Na 400. BOD 13.3.18	
POČASÍ: +5°C; +4°C ZATAŽENO, PŘEHÁNÍ. POČET PRAC.: 1xTHP, 16xHŠV, 2xIKSTAV, 10xSLIT PRAC. DOBA: 6:30 - 24:00 PROJEKT SE: S001A - JÁDROVÉ OMÍTKY. S001D - SDK KONSTRUKCE STROPŮ. S001C - BETONÁT DRÁTKO-BETONOVÉ PODLAHY TL. 200mm. BETON C 25/30. LEŠTĚNÍ BETONOVÉ PODLAHY.	14.3.2018 ST
POČASÍ: +2°C; +6°C POLOJASNĚ POČET PRAC.: 1xTHP, 16xHŠV, 2xIKSTAV, 8xSLIT PRAC. DOBA: 7:00 - 18:00 PROJEKT SE: S001A - JÁDROVÉ OMÍTKY. S001D - SDK KONSTRUKCE STROPŮ S001C - LEŠTĚNÍ BETONU. ZMOKOVITELNOSTI ZOBRAZENÉ NA RÝZNÝCH DETAIL ČERTEŽÍCH A ZMĚNÁCH PŘÍSTĚČKŮ V S001C. BUDE PROVÁDĚNO NA K.D. STROPŮ.	15.3.2018 ET 13.3.18 ST

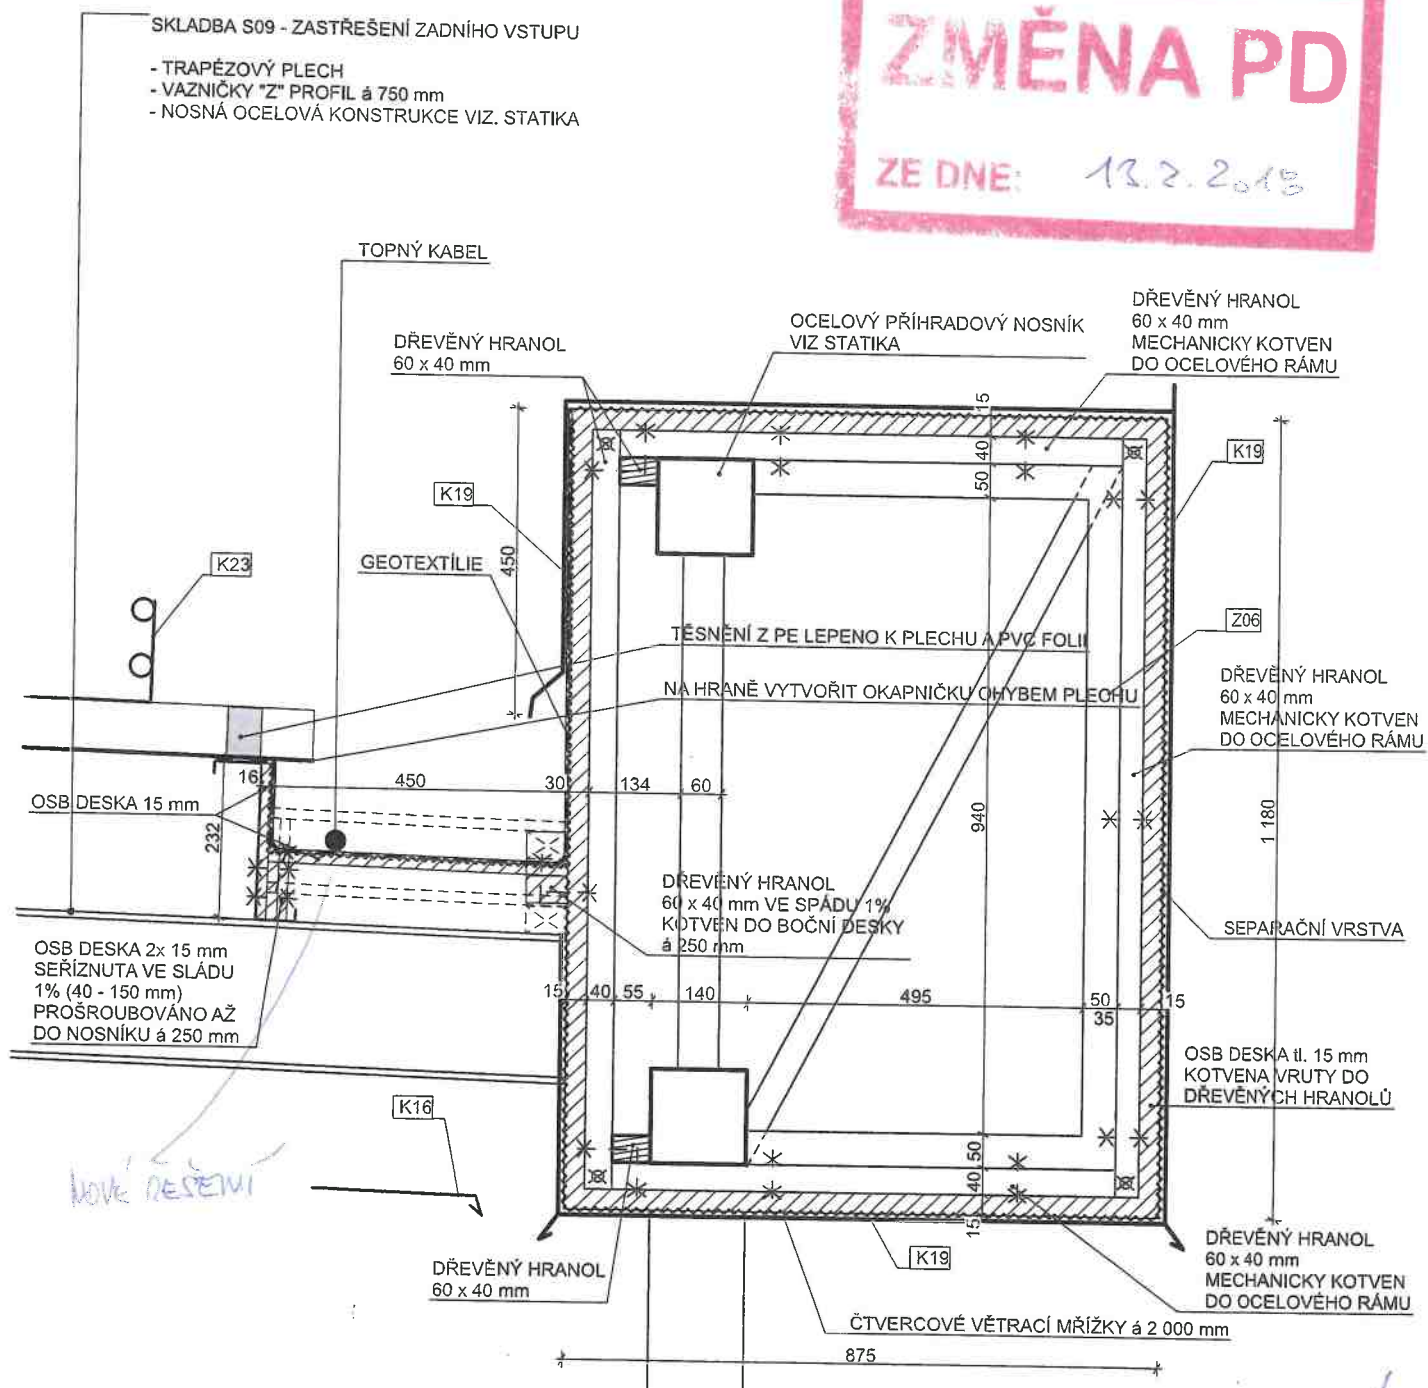


±0,000 = PODLAHA DÍLNÝ

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

AUTOR PROJEKTU :	ING. ARCH. PAVEL ČERVENÝ		ARCHITEP HK S.R.O. ARCHITEKTONICKÁ A PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ HABRMANOVA 323, HRADEC KRÁLOVÉ 500 02 IČO: 27542238 DIČ: CZ27542238 TEL.: 495 531 155, FAX: 495 531 156	
VEDOUcí PROJEKTANT :	ING. ARCH. PAVEL ČERVENÝ			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	ING. ARCH. PAVEL ČERVENÝ			
VYPRACOVAL :	JAN BOHÁČ, JIŘÍ FIŠAR			
KRAJ : KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ	M.Ú. : NÁCHOD			
INVESTOR : KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245/2, 50003, HRADEC KRÁLOVÉ			ČÍSLO ZAKÁZKY :	16022
AKCE : SŠPTP VELKÉ POŘÍČÍ CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY POLYGRAFICKÝCH OBORŮ ST. PARC. Č. PARC. Č. K.Ú. VELKÉ POŘÍČÍ			STUPEŇ PD :	DPS
			DATUM :	13.02.2018
			MĚŘÍTKO :	1:11,11
			FORMÁT :	1x44
NÁZEV :			ČÍSLO VÝKRESU: ZL.19	
DETAIL ŘÍMSA ZASTŘEŠENÍ ZADNÍHO VCHODU				

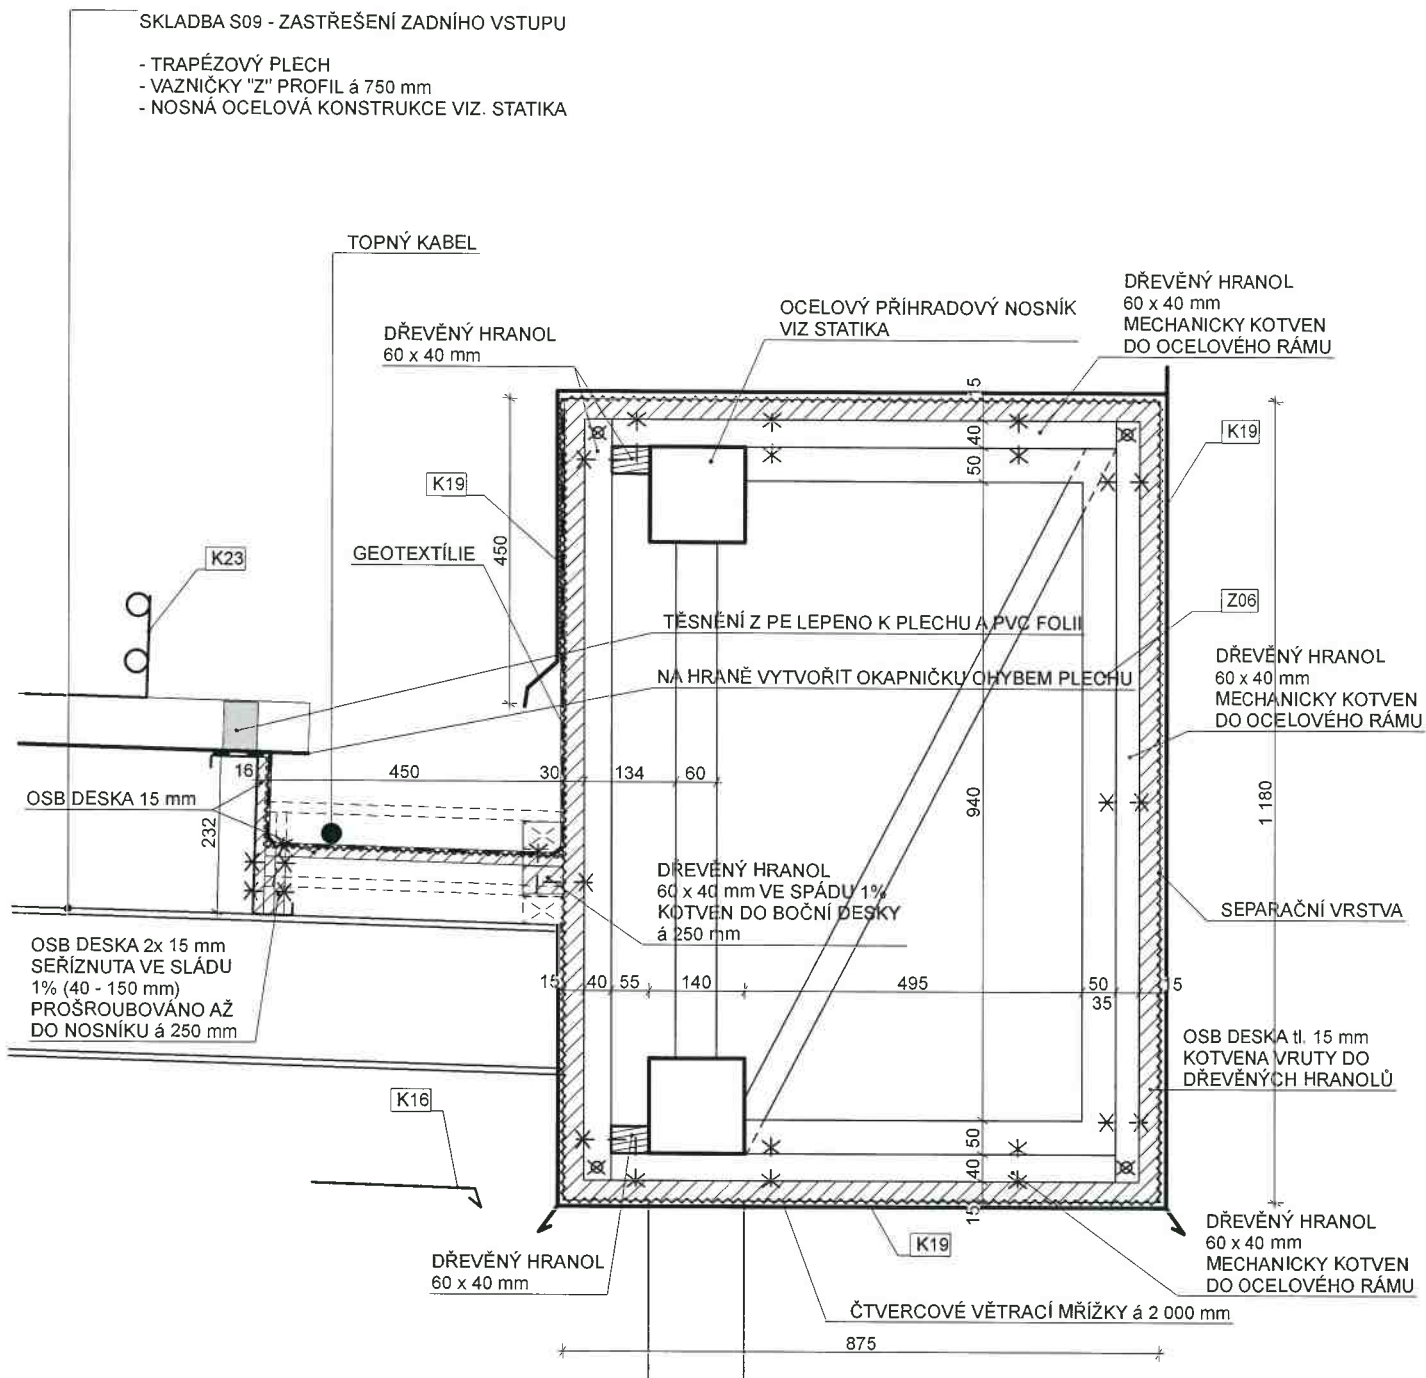


±0,000 = PODLAHA DÍLNÝ

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK


VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

AUTOR PROJEKTU :	ING. ARCH. PAVEL ČERVENÝ		ARCHITEP.HK S.R.O. ARCHITEKTONICKÁ A PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ HABRMANOVA 323, HRADEC KRÁLOVÉ 500 02 IČO: 27542238 DIČ: CZ27542238 TEL.: 495 531 155, FAX.: 495 531 156	
VEDOUČÍ PROJEKTANT :	ING. ARCH. PAVEL ČERVENÝ			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	ING. ARCH. PAVEL ČERVENÝ			
VYPRACOVAL :	JAN BOHÁČ, JIŘÍ FIŠAR			
KRAJ : KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ	M.Ú. : NÁCHOD			
INVESTOR : KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245/2, 50003, HRADEC KRÁLOVÉ			ČÍSLO ZAKÁZKY :	16022
AKCE : SŠPTP VELKÉ POŘÍČÍ CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY POLYGRAFICKÝCH OBORŮ ST. PARC. Č. PARC. Č. K.Ú. VELKÉ POŘÍČÍ			STUPEŇ PD :	DPS
			DATUM :	14.06.2018
			MĚŘÍTKO :	1:11,11
			FORMÁT :	1xA4
NÁZEV :			ČÍSLO VÝKRESU : ZL.21	
DETAIL ŘÍMSA ZASTŘEŠENÍ ZADNÍHO VCHODU				

Denní záznamy stavby	Datum
Pořadí: -10; +20 ZATŘENO	16.3.2018
Počít PRAC.: 1xTHP, 17xHSV, 3xKSTAV	PA
PRAC. DOBA: 6.30 - 15.30	
PROVÁDÍ SE: S001A - JÁDROVÉ OMÍTKY. ÚKLID.	
S001B - SANIČNÍ OMÍTKY. OBJEKTY JSOU TEPLOIZOLOVANÉ NA +5°C.	
S001C - ÚKLID PO BETONÁŘI DRÁTKO-BETONOVÉ DESKY. ZKOTOLITEL OTVOŘOVÁNÍ NA VRSOKOV VÝKOST OKOLO KUCHA OBYTOVÝCH STĚN - BUDY PŘEDLOU NA KD - SANIČNÍ OMÍTKY	
Pořadí: -10; -20 ZATŘENO	17.3.2018
Počít PRAC.: 1xTHP, 8xHSV	SO
PRAC. DOBA: 6.30 - 17.30	
PROVÁDÍ SE: S001A+B - JÁDROVÉ A SANIČNÍ OMÍTKY. OBJEKTY JSOU TEPLOIZOLOVANÉ NA TEMOTU +5°C.	
Pořadí: -70; -30 ZATŘENO	
Počít PRAC.: 1xTHP, 17xHSV, 6xKSTAV, 9xELEKTROIN, 9xELEKION	19.3.2018
PRAC. DOBA: 6.30 - 17.30	PO
PROVÁDÍ SE: S001A+B - JÁDROVÉ A SANIČNÍ OMÍTKY. OBJEKTY JSOU VYTÁPĚNY.	
S001D - ZAKLÁDÁNÍ KRÍŽOVÉ ŽALUZIE M.Č. 101.	
S001E - SDR ŽÁŘIVÝ ŽÁRKOPEČ (JEDNOTRAVNÝ)	
S001F - SDR KCE STROPU M.Č. 3158, 3159, 3143, 3145.	
Pořadí: -40; +40 ISNO	20.3.2018
Počít PRAC.: 1xTHP, 17xHSV, 10xKSTAV, 3xELEKION	ÚT
PRAC. DOBA: 6.30 - 18.00	
PROVÁDÍ SE: S001A+B - JÁDROVÉ A SANIČNÍ OMÍTKY. SDR KONSTRUKCE ŽÁŘIVÝ X STROPŮ. ŠTUKOVÉ OMÍTKY. ROZVEDENÍ EL. ŽII, ÚT.	
S001G - ZAKLÁDÁNÍ ŽALUZIE.	
S001H - SDR KONSTRUKCE STROPŮ A GES KUCHYNÍ SVĚTLÍČ REI 30 MIN.	

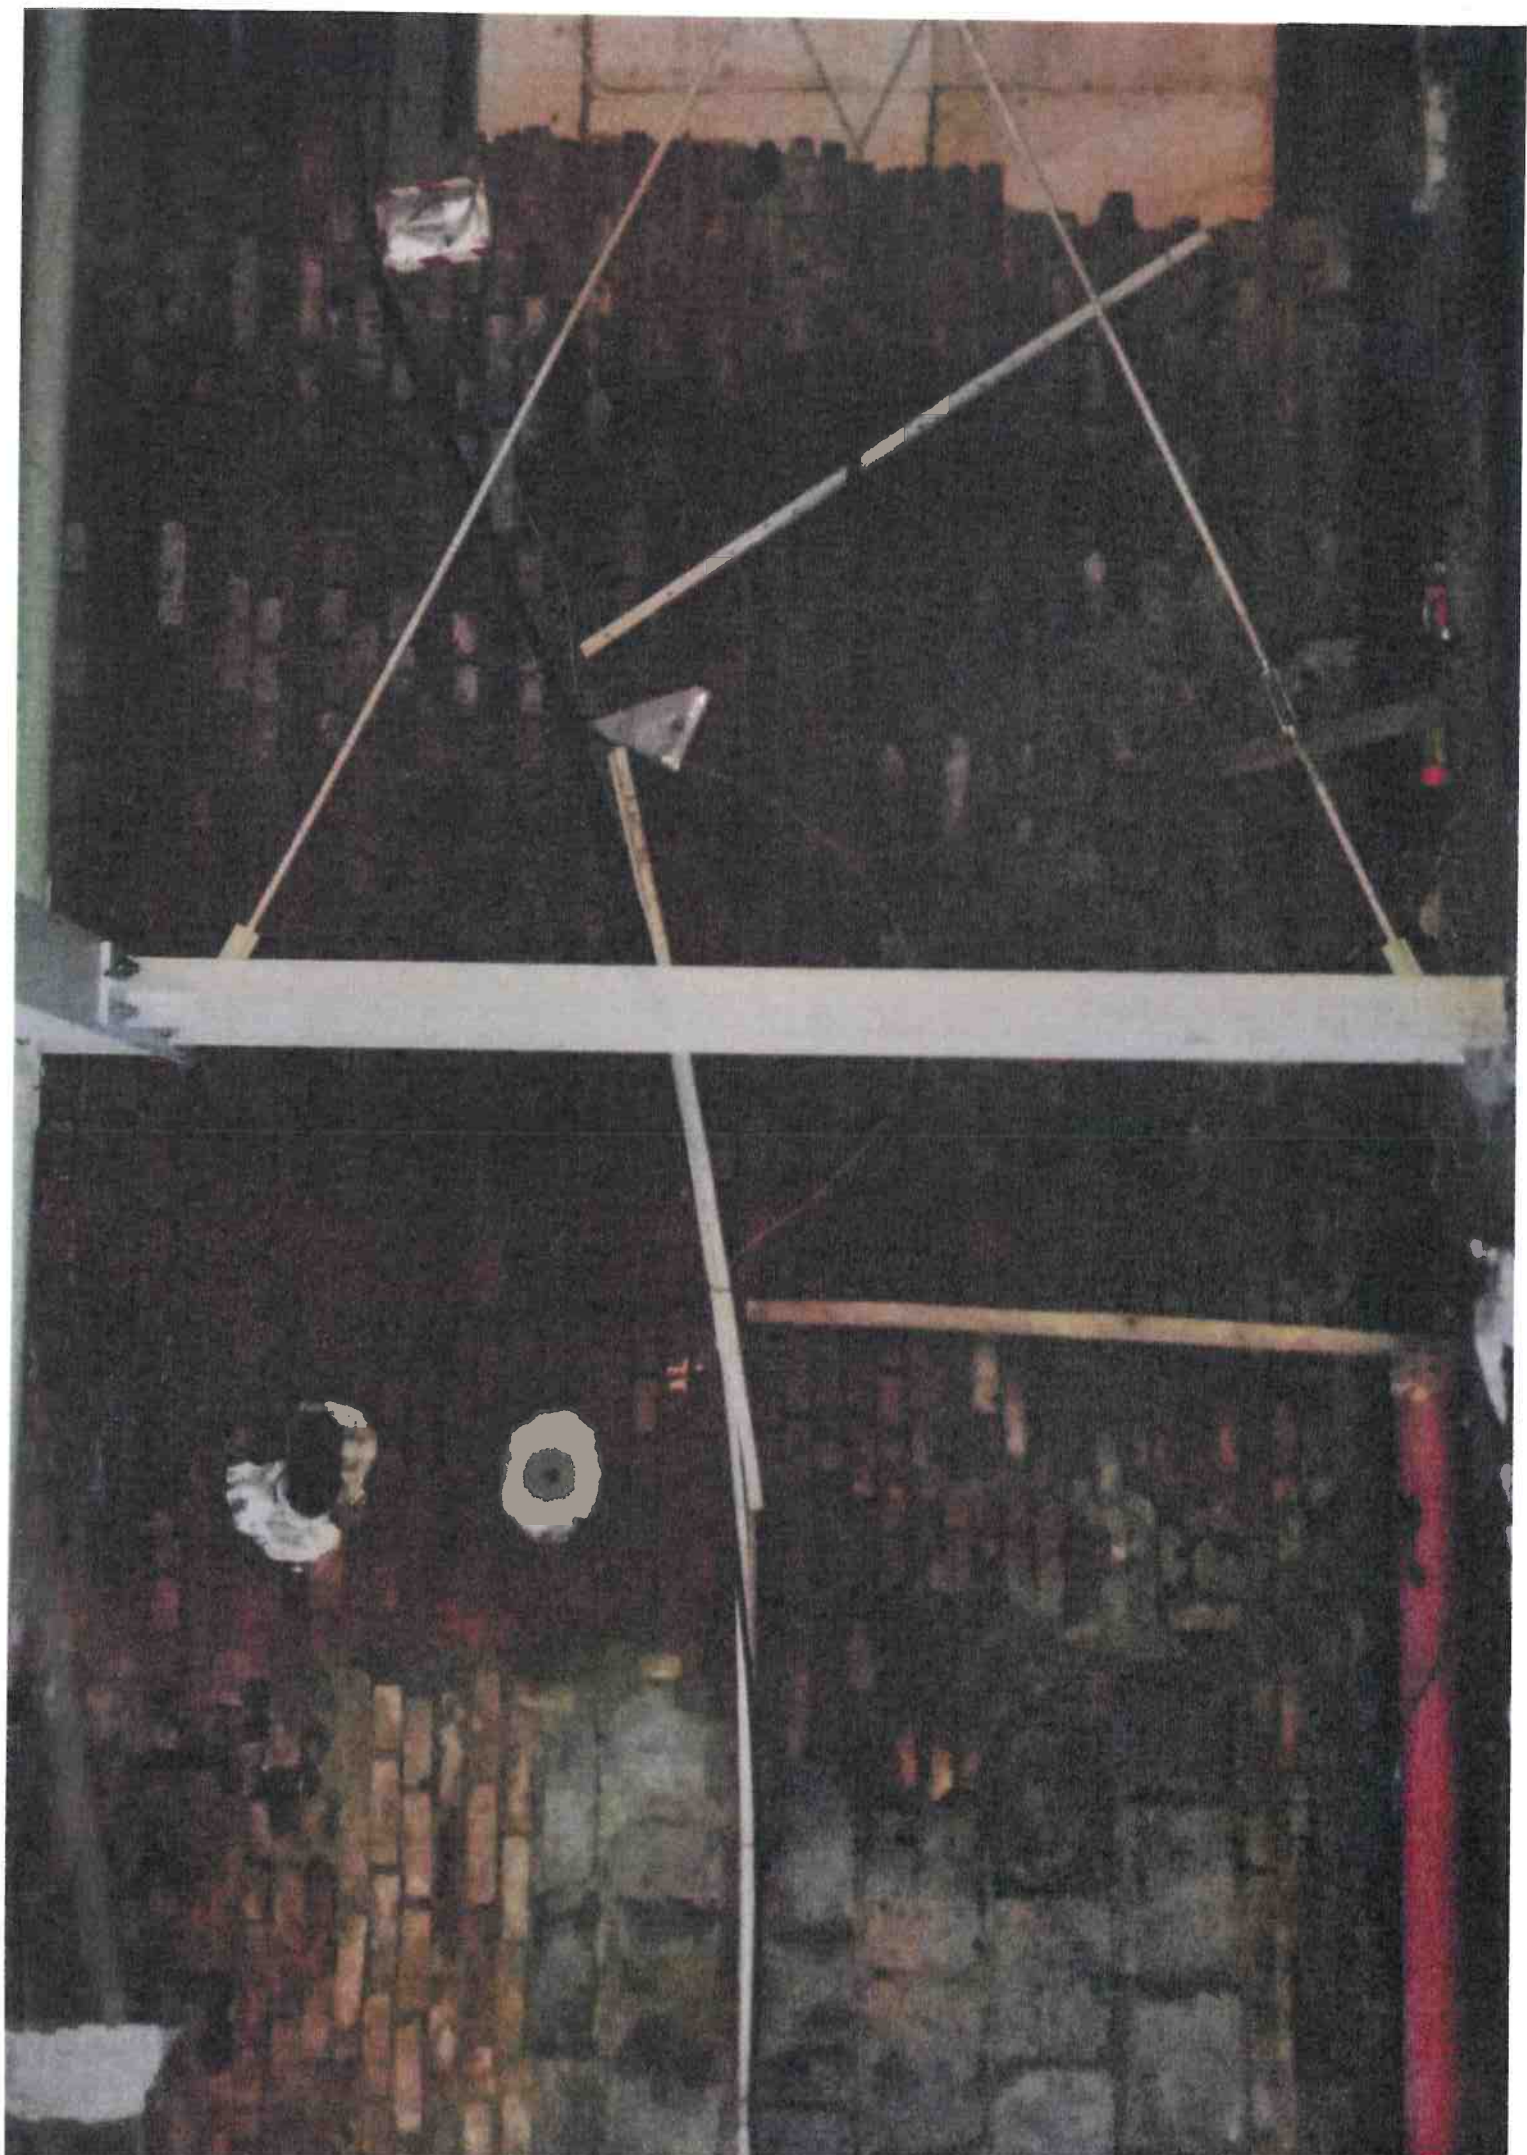



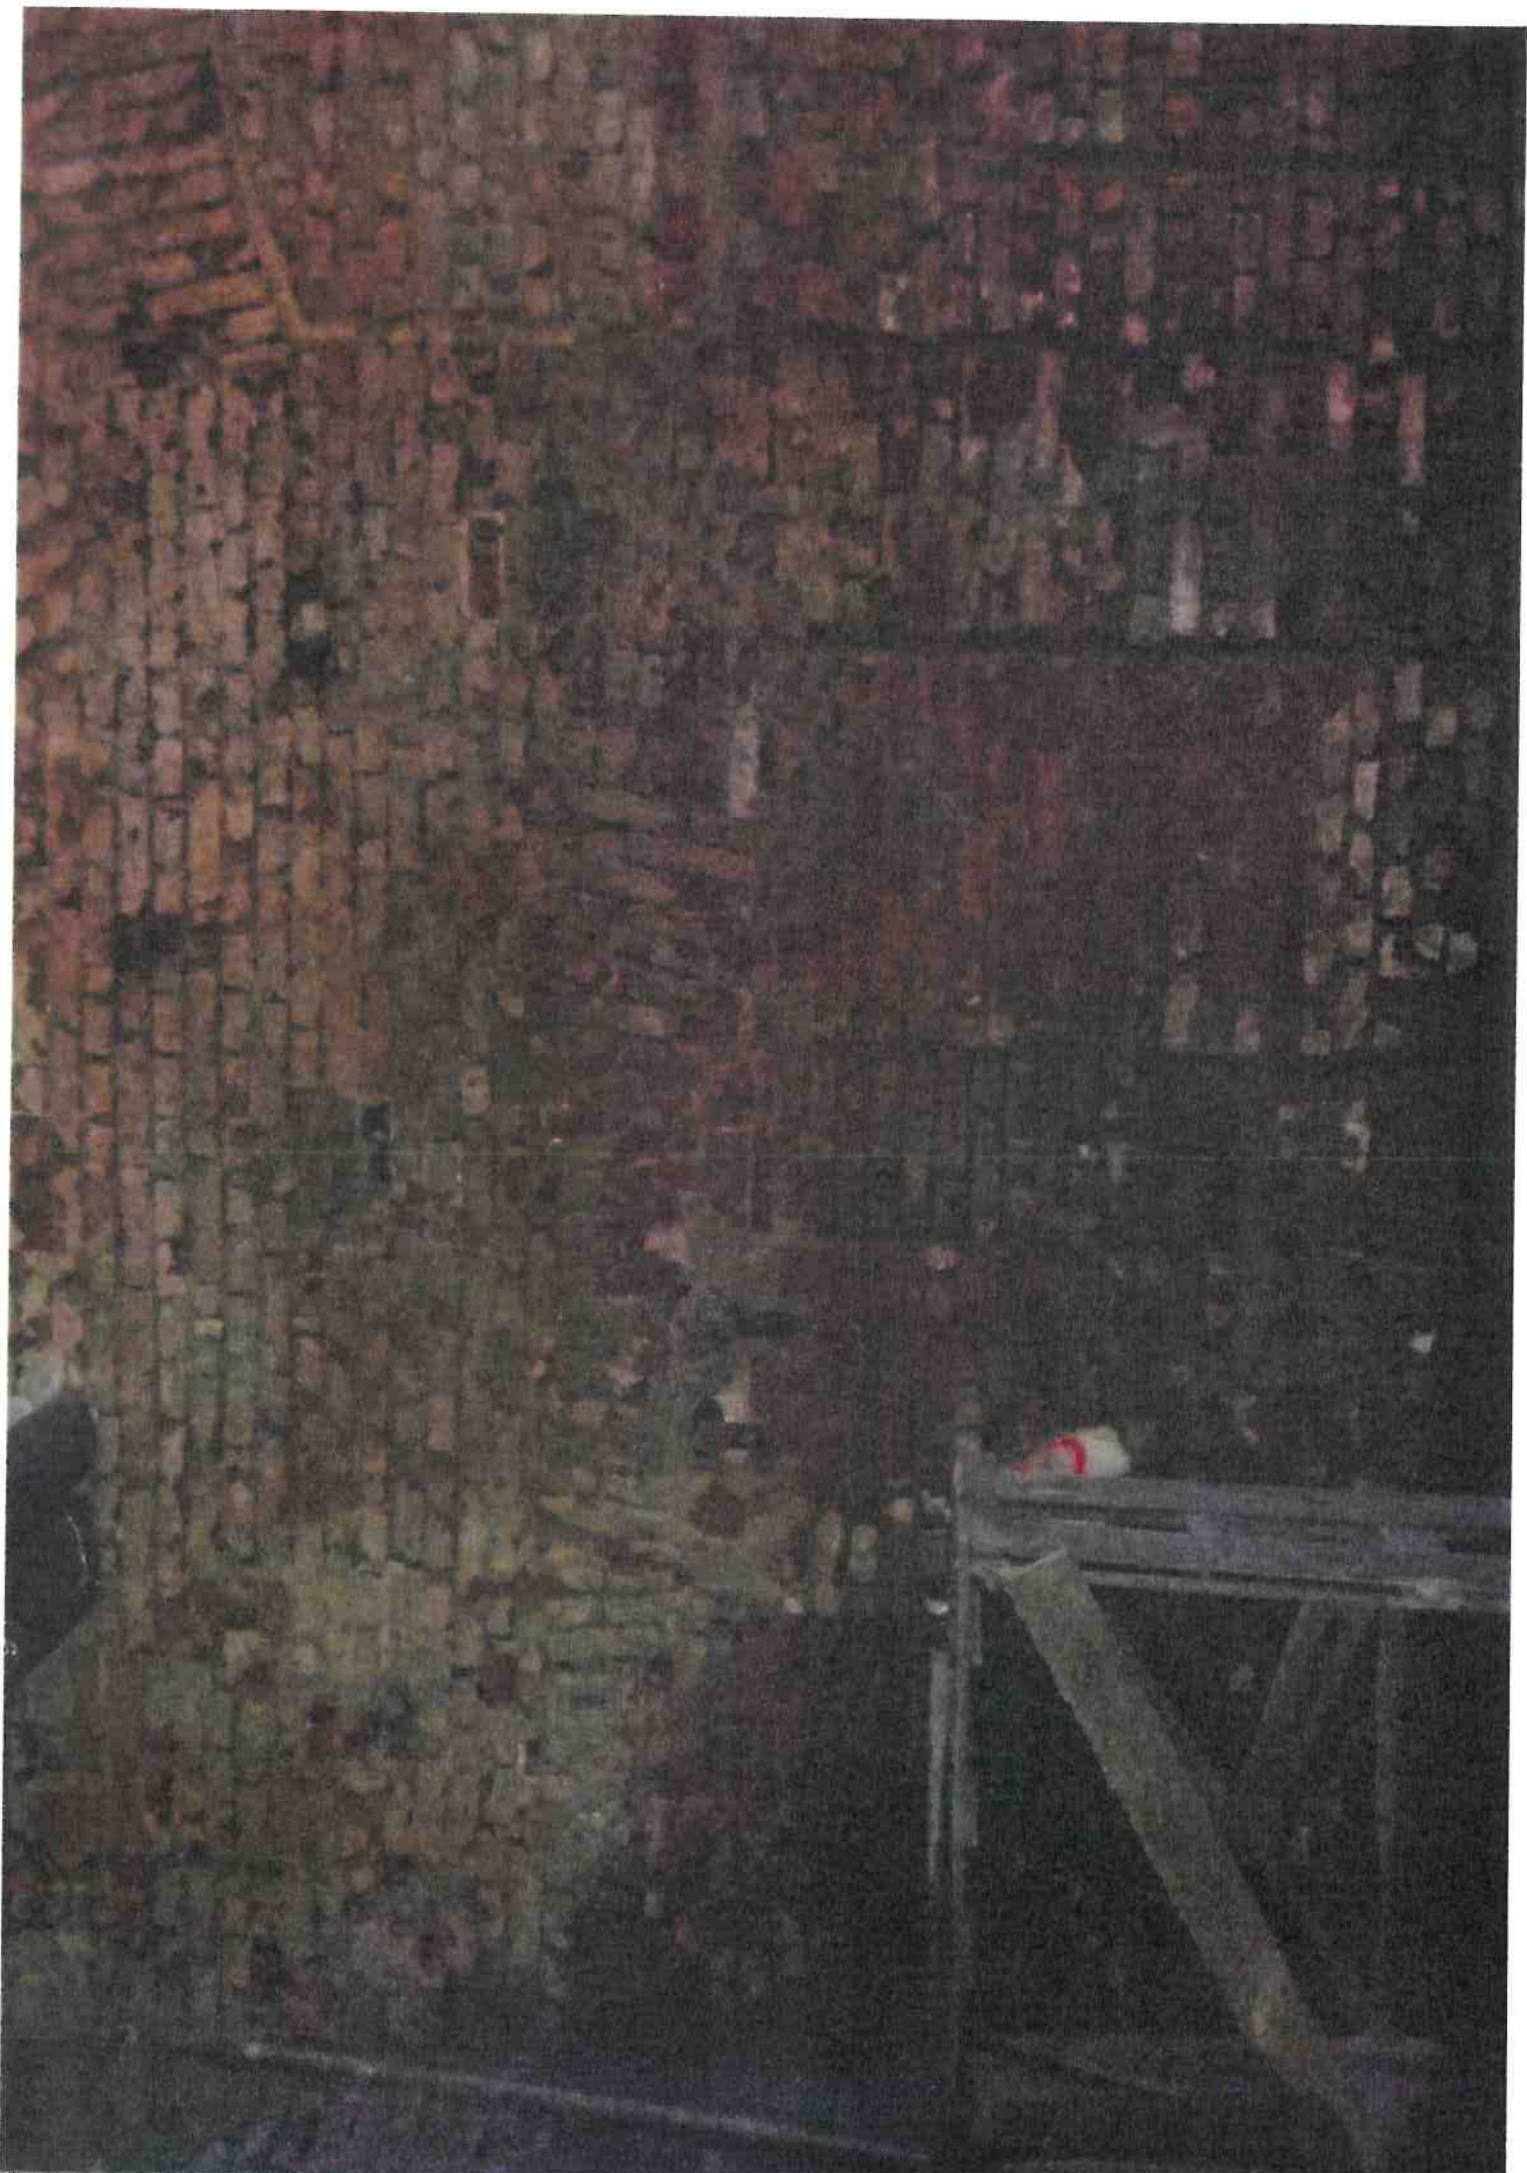



Vlhkost – zdiva

Salinita – zdiva

záznam měření

Objednatel :
PRŮMSTAV NÁCHOD S.R.O.
 p. Svoboda
 Dobrošovského 1776
 547 01

Místo stavby :
Centrum odborné přípravy
 Krausova 215
 Velké Poříčí

Sonda číslo	Místo sondy	Materiál	Výška nad podlahou (m)	Obsah vody (%)	Obsah solí (%)		
					Chloridy	Dusičnany	Sírany
1.	Zed' – interiér	Cihla plná	1	12,6	0	0,250	0,2
2.	Zed' – interiér	Cihla plná	0,3	14,6	0,5	0,250	0,1
3.	Zed' – exteriér	Cihla plná	0,3	10,2	0,5	0,125	0,2
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							

Vlhkost:

Salinita:

Hodnocení – platí pro zdivo

Velmi nízká $w < 3$
 Nízká $3 \leq w < 5$
 Zvýšená $5 \leq w < 7,5$
 Vysoká $7,5 \leq w \leq 10$
Velmi vysoká $w > 10$

Hodnocení – platí pro zdivo

	Nízký	Střední	Vysoký
Chloridy	$< 0,2$	0,2 do 0,5	$> 0,5$
Dusičnany	$< 0,1$	0,1 do 0,3	$> 0,3$
Sírany	$< 0,5$	0,5 do 1,5	$> 1,5$

Měření provedeno přístrojem:

Záznam vyhotovil:

Datum:

Elektr. přílož. vlhkoměr
 Sada pro detekci salinity

Lukáš Pechar

18.1.2018

SAINT-GOBAIN Construction Products CE
 Podpis
 Divize WEBER, sídlo: Václavské náměstí 10
 Obchodní středisko Václavské náměstí 10
 DIČ: CZ25029673


Denní záznamy stavby	Datum
POČET PRAC.: 1xTHP; 16xHVN; 10xKSTAV; 3xELDON; 2xELEKTRIN PRAC. DOBA: 6.30 - 18.00	11.3.2018
PROVÁZENÍ SE: S001A - JÁDROVÉ + SANAČNÍ OTVĚRY, ŠTUKOVÉ OTVĚRY. ZOBUDOT ÚT; EL; ZTI; OSLEBNÍ ZIDIVOTORŮ. ČELID.	
S001B - SDK KONSTRUKCE PRŮČEK 2x12,5 B/LA. - SANAČNÍ OTVĚRY. BOUŘNÍ STŘECH SVĚTLŮ.	
S001C - ZAKLÁDÁNÍ ZATYPL, ZTRACENÉ BEDNĚNÍ BEST TL. 200 mm. VELAŽNÍ ARMATURY Ø 12 mm. ČELID.	
S001D - SDK KONSTRUKCE STROPŮ A GRS KVALITNÍ SVĚTLŮ 28/30 mm.	
POČET PRAC.: 1xTHP; 16xHVN; 10xKSTAV PRAC. DOBA: 6.30 - 18.00	12.3.2018
PROVÁZENÍ SE: S001A - JÁDROVÉ + SANAČNÍ + ŠTUKOVÉ OTVĚRY.	
S001B - SDK KONSTRUKCE PRŮČEK 2x12,5 mm B/LA. ZÁKLAD JEDNOSTRANNĚ. BOUŘNÍ STŘECH SVĚTLŮ.	
S001C - ZAKLÁDÁNÍ KCE ZATYPL. ZTRACENÉ BEDNĚNÍ TL. 200 mm. VELAŽNÍ ARMATURA Ø 12 (VODLOVNĚ K BILISLE).	
S001D - SDK KONSTRUKCE STROPŮ A SVĚTLŮ 28/30 mm.	
POČET PRAC.: 1xTHP; 16xHVN; 10xKSTAV; 3xELDON; 2xSELECTA PRAC. DOBA: 6.30 - 18.00	13.3.2018
PROVÁZENÍ SE: S001A - JÁDROVÉ, SANAČNÍ, ŠTUKOVÉ OTVĚRY. - MONTÁŽ ÚT	
S001B - SDK PRŮČEK. SANAČNÍ OTVĚRY.	
S001C - SDK PRŮČEK.	
S001D - SDK STROP 28/30 mm.	
S001E - BUDE POTŘEBA PROVEDNAT KANCEL A OSVĚTLENÍ NA D STROVÍ V MÍST. E. 123, 124.	

Datum	Zúčastněné strany:
8.5.2018	POČASÍ: +12°C; +16°C JASNO
ÚT	POČET PRAC.: 1xTHP; 10xHSV; 3xSELECTA;
	PRAC. DOBA: 6.30 - 18.30
	PROVÁDÍ SE:
	S0013 - MONTÁŽ VENKOVNÍHO ZATEPLENÍ EPS TL. 140mm
	A XPS 140mm.
	S001C - SDK MONTÁŽ STROPŮ A SVĚTLÍKŮ, VÍTOVÁNÍ
	ZÁKLAD, ŠTUKOVÉ OMÍTKY, ÚKID.
	OÁVOD KÁBLŮ NA STĚŠNÍ. KCE/PROSTŘ. (A/S).
	MONTÁŽ OCELOVÉ KCE PŘÍSTĚŠKY.
9.5.2018	POČASÍ: 12°C; 16°C JASNO
ST	POČET PRAC.: 1xTHP; 10xHSV; 12xKSTAV; 4xSELECTA;
	2xELEKTROIN; 2xT-SERVIS; 2xZAPĚČAČKA
	PRAC. DOBA: 6.30 - 18.30
	PROVÁDÍ SE: S001A - ZÁKLAD STROPŮ SDK.
	S001C - ROZVODY ELEKTRO SILNOPROVOD + SLABOPROV.
	- SDK MONTÁŽ STROPŮ + SVĚTLÍKŮ + PRÍČEK
	VÍTOVÁNÍ PŘÍČEK + STROPŮ. MONTÁŽ TUKOTĚSN.
	ZÁBRAN.
	- MONTÁŽ ROZVODŮ ÚT + ZTI.
	- ŠTUKOVÉ OMÍTKY.
	S001B - JÁDELOVÉ OMÍTKY V S 158 + 3157
	S001B - MONTÁŽ ZATEPLENÍ EPS TL. 140mm +
	XPS TL. 140mm.
10.5.2018	POČASÍ: +13°C; 20°C POLOJASNO, PŘEHÁŽKY
ČT	POČET PRAC.: 1xTHP; 10xHSV; 12xKSTAV; 4xSELECTA;
	2xELEKTROIN; 2xT-SERVIS; 3xZAPĚČAČKA
	2xMATRIX
	PRAC. DOBA: 6.30 - 18.30
	PROVÁDÍ SE: S001A - ZÁKLAD SDK STROPŮ.
	S001B - MONTÁŽ ZATEPLENÍ EPS TL. 140mm +
	XPS TL. 140mm. MONTÁŽ APU LIŠT, ZOHŮ S
	PŘÍMCOV A TAPETNÍM LIŠT.




Denní záznamy stavby	Datum
<u>ZÁPIS KOO ROZP:</u> - BYLA PROVEDENA KONTROLA JADROVÁNÍ PLÁNU ROZP, ZVŮSTĚ NEADSTATKY BYLY OASIDLAŇEM V RÁHCI KA ROZP ZA ČÁSTI JÁSTURCE ZHOTOVITEL 	22.2.2019
POČASÍ: -6°C; -2°C; POLOJASNO POČET PRAC.: 1xTHP, 15xHIV, 3xELIDOL PRAC. DOBA: 7.00 - 17.00	22.2.2019 OT
PROVÁZENÍ: S001A - VNITŘNÍ OMÍTKY PROSTOR JE VYTÁPĚN. S001C - ROZVEDY A MONTÁŽ PODPĚRNE KCE PRO NOVÉ POTRUBÍ. S001A - DORUČENÍ KABELOVÉ A ZÁSUVEK NI OBJEDNÁVKU INVESTORA, OŽIVITEL STROJŮ.	
POČASÍ: -6°C; -3°C JASNO POČET PRAC.: 1xTHP, 15xHIV, 3xELIDOL, 3xSELECTA PRAC. DOBA: 7.00 - 17.00	23.2.2019 TH
PROVÁZENÍ: S001A - VNITŘNÍ OMÍTKY. PROSTOR JE VYTÁPĚN. S001C - ROZVEDY ZTI DO HALE. - SLEDOVÁNÍ STÁDOVÝCH KLÍNŮ NA NOVOU STŘECHU NAD S001C.	
POČASÍ: -14°C; ZATAŽENO POČET PRAC.: 1xTHP, 14xHIV PRAC. DOBA: 7.00 - 17.00	26.2.2019 TO
PROVÁZENÍ: S001A - JÁDROVÉ + SANÁČNÍ OMÍTKY. - OBJEKT VYTÁPĚN S001B - MONTÁŽ VED, ÚKLID. S001C - ÚKLID.	
POČASÍ: -14°C; -10°C JASNO POČET PRAC.: 1xTHP, 14xHIV, 3xINT PRAC. DOBA: 6.30 - 17.30	27.2.2019 OT
PROVÁZENÍ: S001A - JÁDROVÉ A SANÁČNÍ OMÍTKY. - OBJEKT VYTÁPĚN S001B - MONTÁŽ VED, ÚKLID S001C - ÚKLID.	
S001B - SLEDOVÁNÍ ÚPRAV NA VED POTRUBÍ KUPČI ROZVEDY SE STÁVÁJÍCÍMI ROZVEDY TETRA	




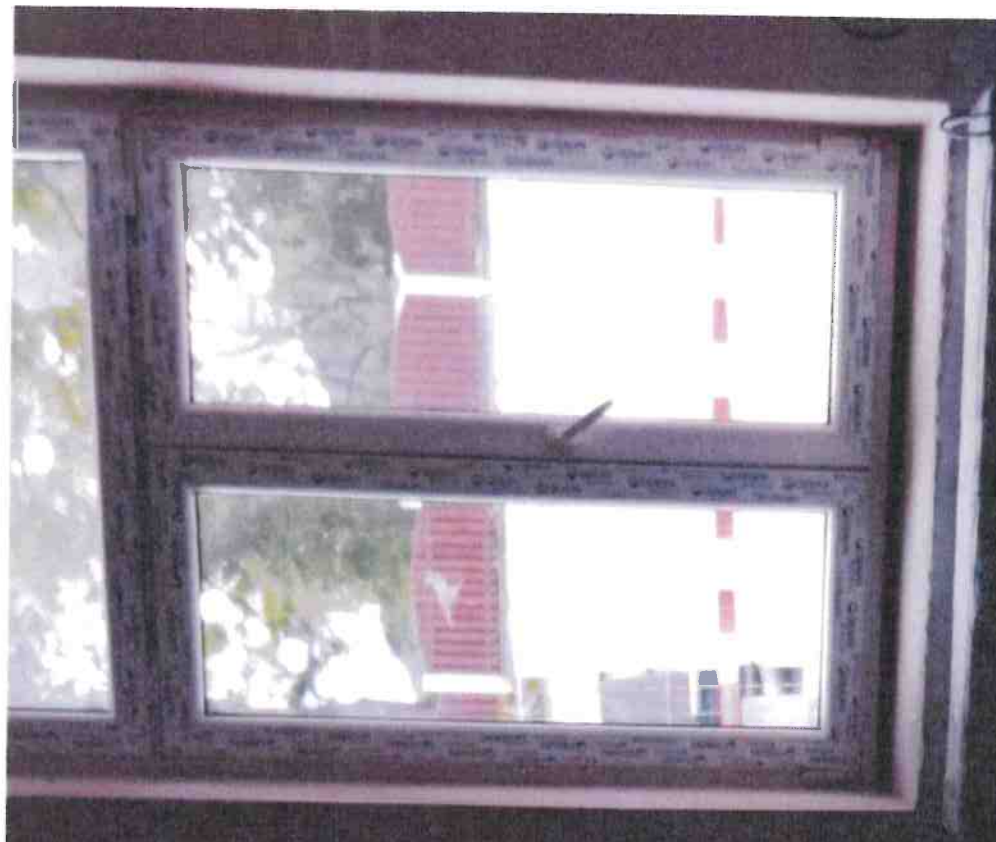



Denní záznamy stavby	Datum
POČASÍ: +4°C; +7°C JASNO	24.3.2018
POČET PRAC.: 1xTHP; 10xHSV; 4xPSV STAVEBNÍ	SO
PRAC. DOBA: 6.30 - 18.00	
PROVÁDÍ SE: S001A - ŠTUKOVÉ OMÍTKY.	
S001B - ŠTUKOVÉ OMÍTKY.	
S001C - VŘEZÁVÁNÍ HEANATČNÍ SVĚTLKŮ DO KCE STŘECH.	
POČASÍ: +2°C; +6°C JASNO	25.3.2018
POČET PRAC.: 1xTHP; 4xHSV	NE
PRAC. DOBA: 7.00 - 16.00	
PROVÁDÍ SE: S001C - VŘEZÁVÁNÍ HEANATČNÍ SVĚTLKŮ DO KCE STŘECH A D MÍST.	
K.: 122; 123; 124.	
POČASÍ: +3°C; +6°C POLOJMNO	26.3.2018
POČET PRAC.: 1xTHP; 10xHSV; 10xKSTAV; 2xELDON; 1xELBKTRON	PO
PRAC. DOBA: 6.30 - 18.00	
PROVÁDÍ SE: S001A - ŠTUKOVÉ OMÍTKY.	
S001B - SDR KONSTRUKCE TŘÍČEK	
S001C - SDR KONSTRUKCE TŘÍČEK	
- ELEKTRO ZOBLODI.	
- MONTÁŽ ZADÍK H.Č. 121.	
S001D - SDR KONSTRUKCE STROŽ.	
S001A - POSUN SVĚTLKŮ HEZÍ OBJEKTU K - C NĚKOLIK	
LAD DO KONTAKTU.	
POČASÍ: +4°C; +8°C JASNO	27.3.2018
POČET PRAC.: 1xTHP; 16xHSV; 2xELBKTRON; 2xELDON	ST
10xKSTAV	
PRAC. DOBA: 6.30 - 18.00	
PROVÁDÍ SE: S001A - ŠTUKOVÉ OMÍTKY.	
S001B - ZOBLODI ELEKTRO	
- SDR KONSTRUKCE TŘÍČEK + JEDNOSTRANNÝ	
ZÁKLOP 2x 12,3 WHITE.	
S001C - SDR KONSTRUKCE TŘÍČEK SDRÍKÁNÍ	
ZÁKLOP.	
- ZOBLODI ELEKTRO.	
S001D - SDR KONSTRUKCE STROŽ.	

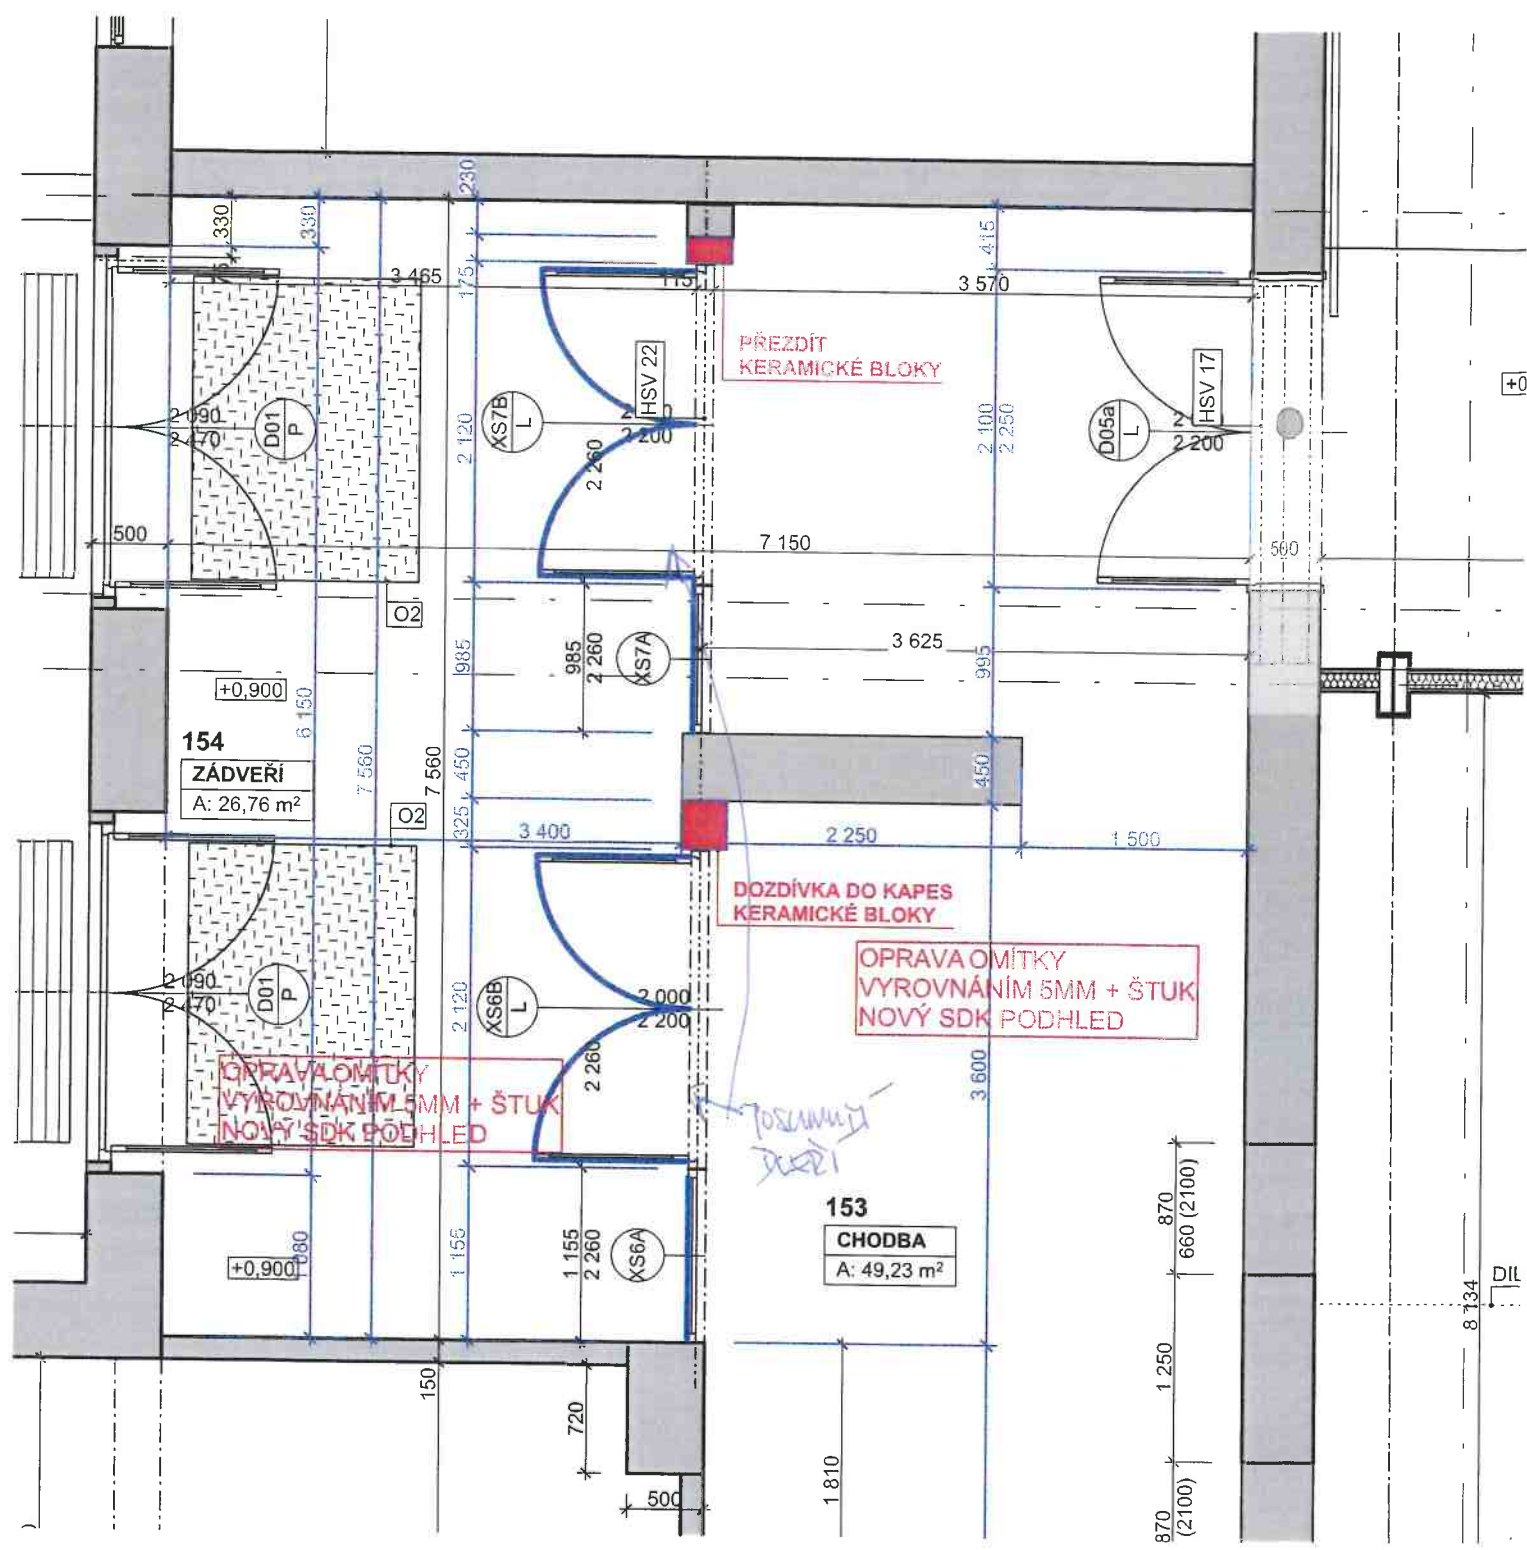


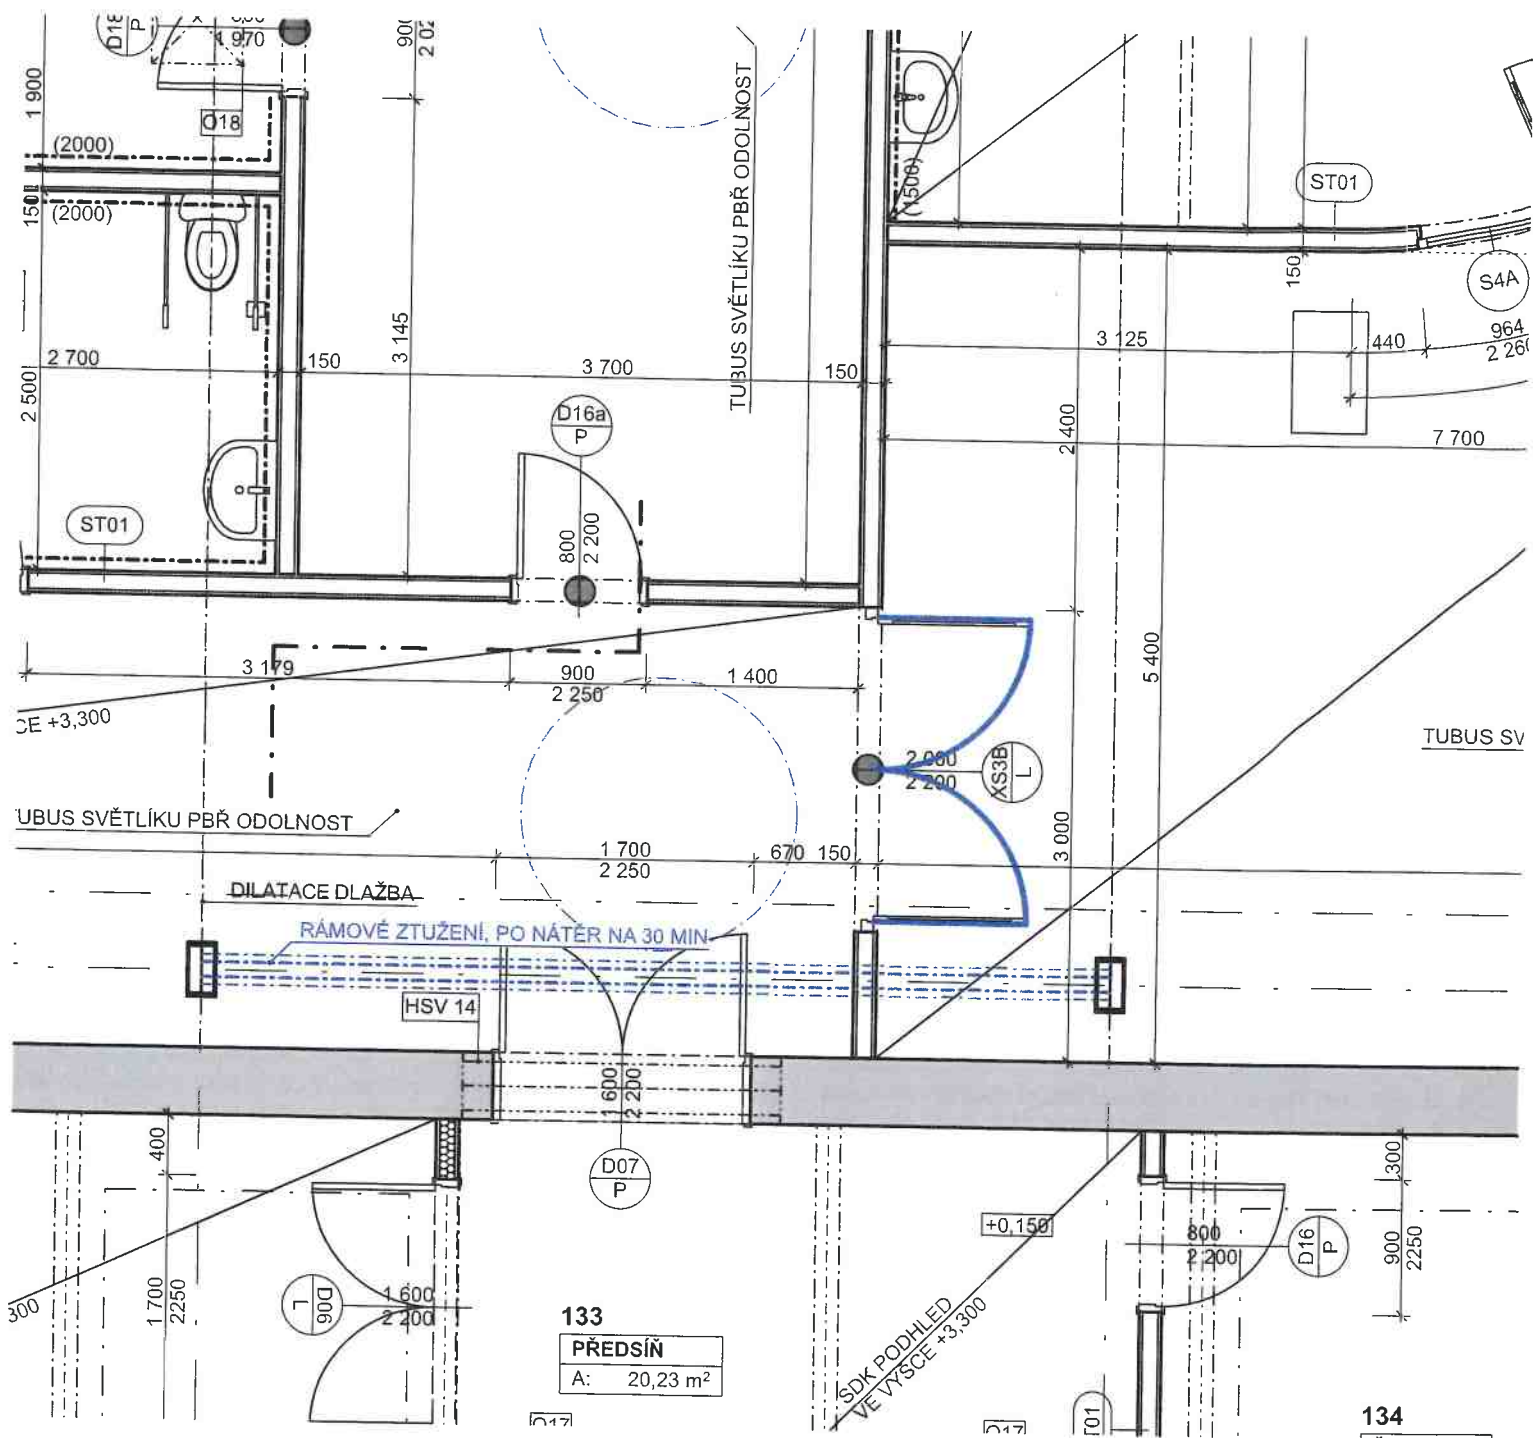

Datum	Zúčastněné strany:
15. 5. 2018	PROVEDENÍ KONTRASTNÍHO ČERVENÉHO LAKU, ZČ POUŽITÍ LAKU. STAV KONTRASTNÍ PŘÍSTĚLE LED. PROVEDENÍ NA MÍSTĚ SE ZČ. STAV A DÁLE MŮ. (MŮ. STAV) LAKU. ZČ ZČ LAKU. ZČ MŮ. STAV
15. 7. 2018	ČT POČASÍ: +17°C, +19°C POLOJASNO POČET PRAC.: 11THP, 16XHV, 10XIK STAV, 5X ELEKTROIN 2X T-SERVIS, 2X SELECTA PRAC. DOBA: 8.30 - 14.30 PROVÁDĚNÍ SE: S001A - MALBA S001B - MALBA S001C - SDK KLE STROPŮ, PŘÍČEK, SVĚTLÍKŮ ROZVODY ZTI, ČT, ELEKTRO, SLABOPROUD ŠTUKOVÉ OMÍTKY.
16. 5. 2018	ST POČASÍ: 17°C, 20°C JASNO POČET PRAC.: 11THP, 16XHV, 10XIK STAV, 2X ELEKTROIN 2X T-SERVIS, 2X SELECTA PRAC. DOBA: 8.30 - 14.30 PROVÁDĚNÍ SE: S001A - MALBA (PŘIDALOVÁNÍ) S001B - MALBA, ÚKLID. MONTÁŽ EL. ŽLABŮ. S001C - SDK KLE, VÁTOVÁNÍ PRÁČEK A STROPŮ ROZVODY, ČT, ELEKTRO, ZTI, SLABOPROUD. ŠTUKOVÉ OMÍTKY. ÚKLID S001B - FASÁDA: KOTVENÍ, STĚROVÁNÍ ŠPALET, ZA PŘÍČEK, PŘÍČEK, STĚROVÁNÍ FASÁDY. S001C - BETONÁŘ SCHODIŠTĚ E 25/30 X 22. S001A+B - ZHOTOVITEL UPOZORNĚNÍ, ŽE U NOVÝCH PŘÍSTĚLÍ OKEN NEJSOU ČALUZIE, NEBYLO POČÍTOVÁNÍ - BUDEN ŘEŠIT NA KD.

Denní záznamy stavby	Datum
<u>ZÁPIS KDO ROZP:</u>	22.2.2018
- BYLA PROVEDENA KONTROLA JADROVÁNÍ PLÁNU ROZP, ZVÝŠENÍ NEGOTIATION BYLY OASIDNĚM V RÁMCI KA ROZP ZA ČÁSTI JÁSTUKE ZHOVITELIA	
POČASÍ: -6°C; -2°C; POLOHUSNO	11.1.2018
POČET PRAC.: 1xTHP; 15xHV; 3xELDON	ST
PRAC. DOBA: 7.00 - 17.00	
PROVÁZ SE: S001A - VNITŘNÍ OMTK. PROSTOR JE VYTÁPĚN.	
S001C - ROZVEDY A MONTÁŽ FODPĚRNÉ KCF PRO NOVÉ POTRUBÍ.	
S001A - DORUČENÍ KABELŮ A ZÁSUVEK NI OBJEDNÁVKU INVESTORA, OČIVATELE STROJŮ.	
POČASÍ: -6°C; -3°C VÍTR	13.1.2018
POČET PRAC.: 1xTHP; 15xHV; 3xELDON, 3xSELECTA	TA
PRAC. DOBA: 7.00 - 17.00	
PROVÁZ SE: S001A - VNITŘNÍ OMTK. PROSTOR JE VYTÁPĚN.	
S001C - ROZVEDY ZPÍ DO HALE.	
- SOKLÁVNÍ STÁDOVÉH KČNÍ NA NOVOU STÁDOVU KAD S001C.	
POČASÍ: -14°C; ZATAŽENO	26.1.2018
POČET PRAC.: 1xTHP; 14xHV	TO
PRAC. DOBA: 7.00 - 17.00	
PROVÁZ SE: S001A - JÁDROVÉ + SANÁČNÍ OMTK.	
- OBJEKT VYTÁPĚN	
S001B - MONTÁŽ VED, UKUD.	
S001C - UKUD.	
POČASÍ: -14°C; -10°C VÍTR	27.1.2018
POČET PRAC.: 1xTHP; 14xHV; 3xINT	CI
PRAC. DOBA: 6.30 - 17.00	
PROVÁZ SE: S001A - JÁDROVÉ + SANÁČNÍ OMTK.	
- OBJEKT VYTÁPĚN	
S001B - MONTÁŽ VED, UKUD.	
S001C - UKUD.	
S001B - ZMĚNA - ÚPRAVY NA VED POTRUBÍ ČVČU	
KOLIZI SE STÁVAJÍCÍMI ROZVEDY TAPKA	



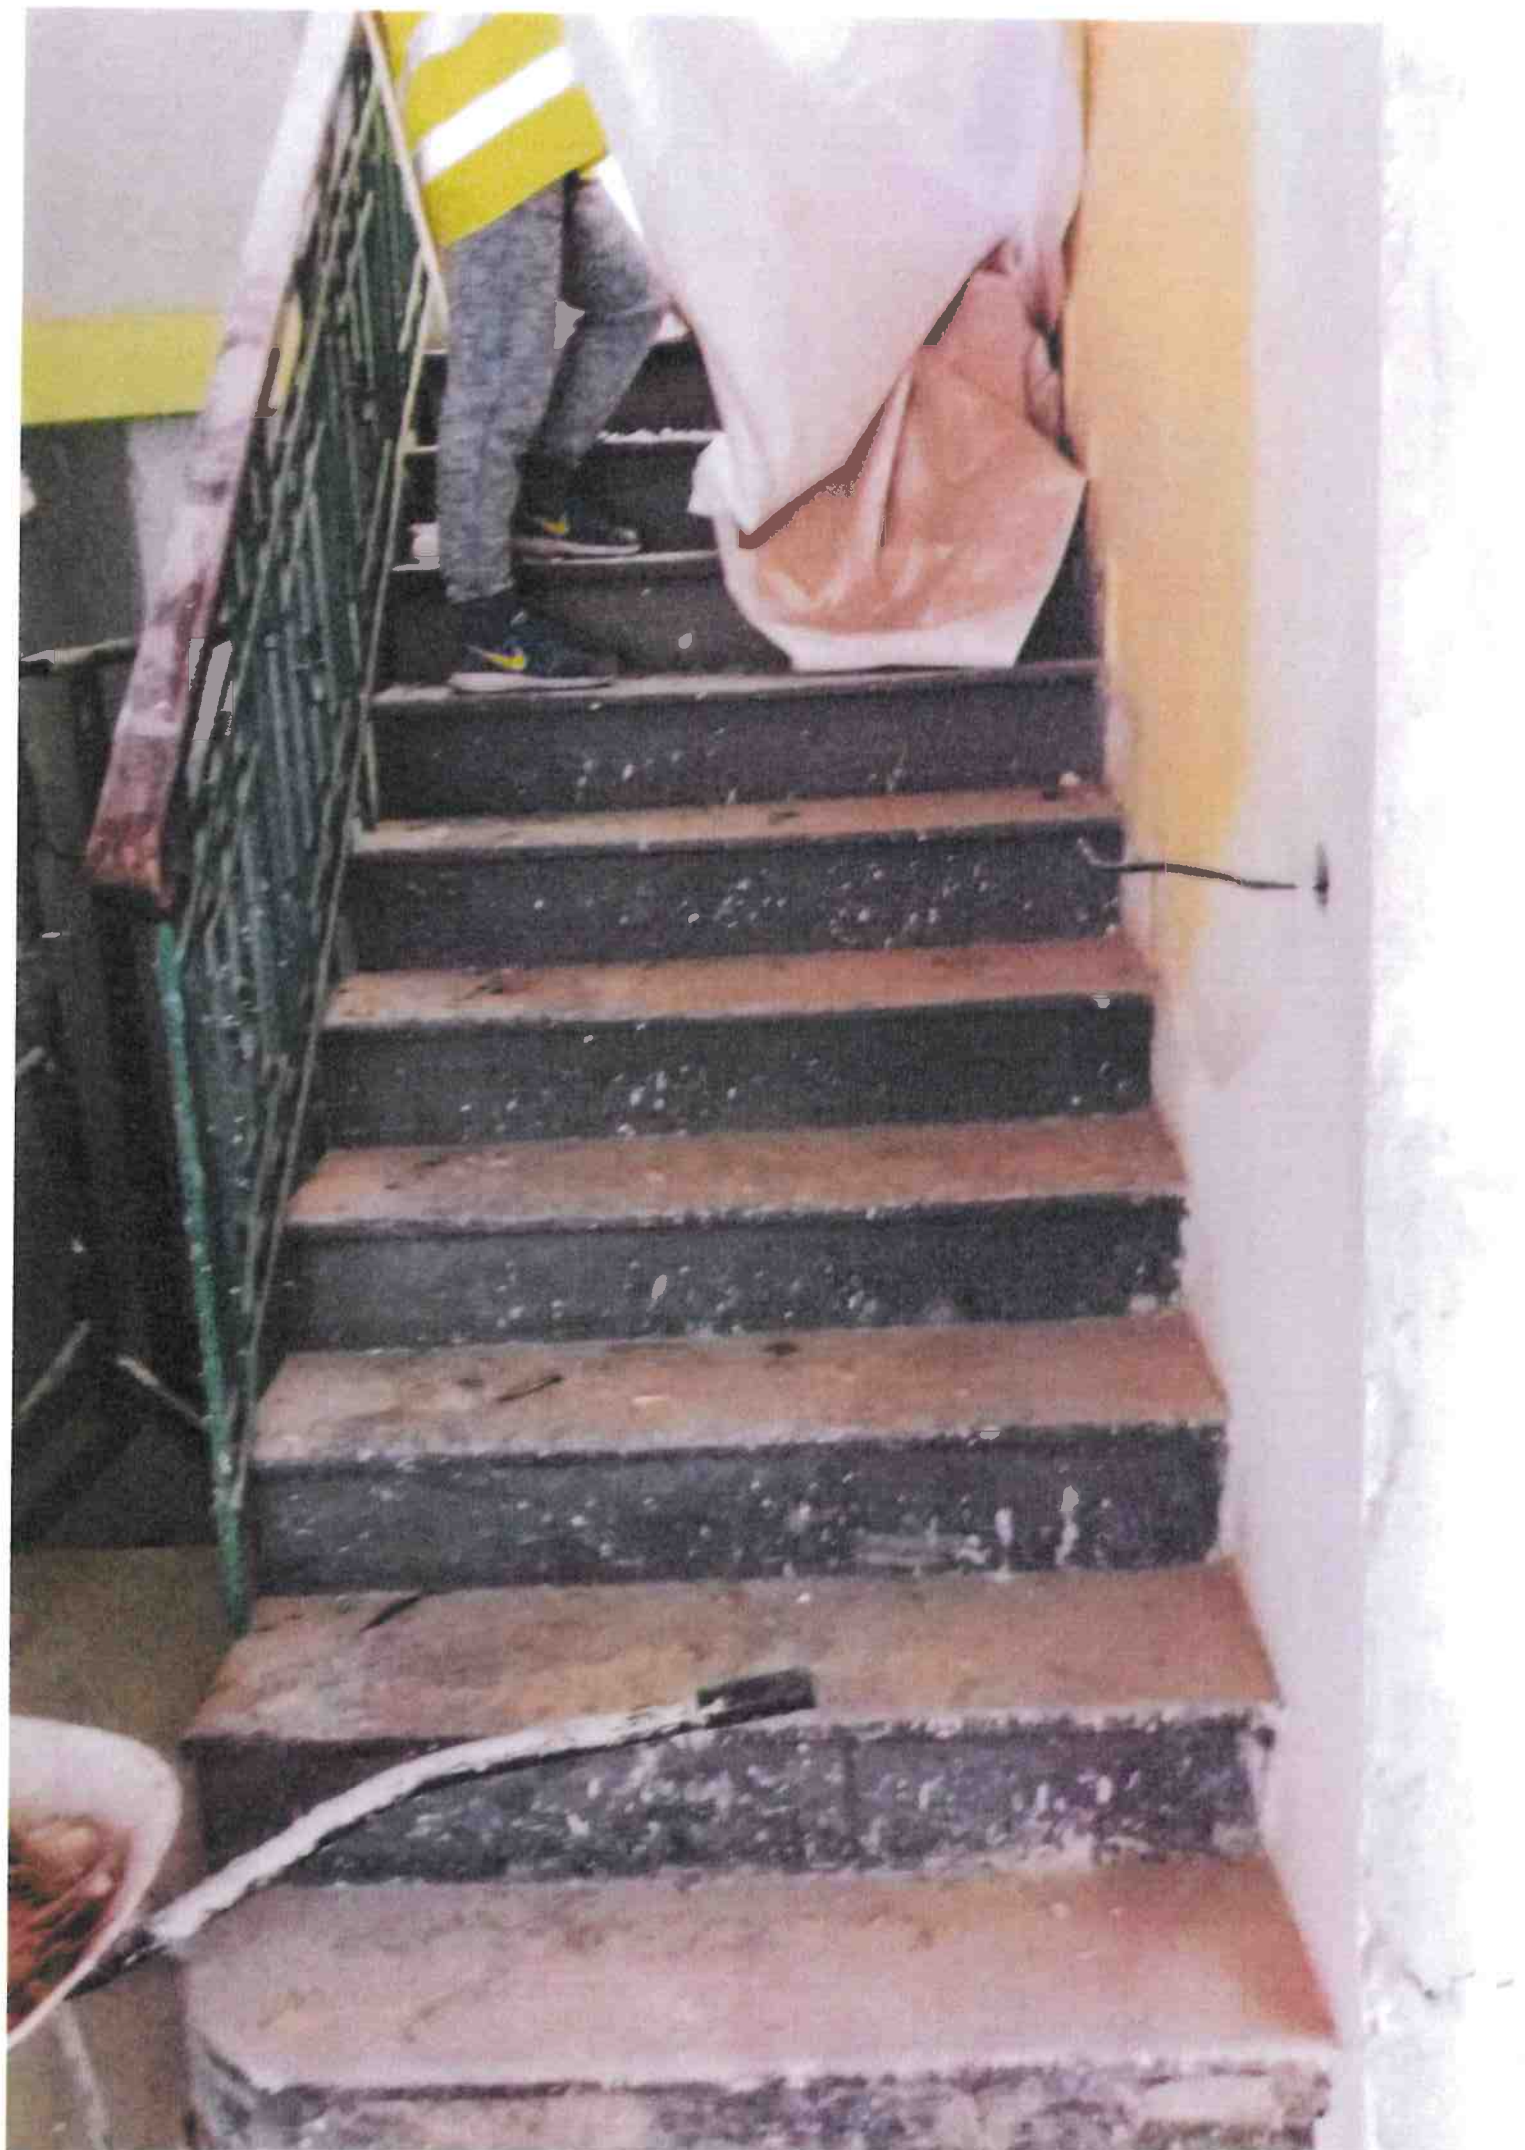

Datum	Zúčastněné strany:
17.5.2018	POČASÍ: 13°C; 20°C ZOL01K5NO
ET	POČET PRAC.: 1xTHP; 16xHSV; 10xIK STAV; 5xELDON; 2xELEKTROIN 4xT-SERVIS
	PRAC. DOBA: 6.30 - 16.30
	PROVÁDÍ SE: S001A - DOKONČENÍ SDK STROPŮ.
	S001B - MALBA (PODHALOVÁNÍ). MONTÁŽ SILNOPROVD.
	Sup - ZATEPLENÍ FASÁDY EPS TL. 40mm + XPS TL. 140mm. MONTÁŽ VENKOVNÍCH PARATETŮ
	S001C - SDK KONSTRUKCE STROPŮ A ZÁVĚSŮ
	- ROZVEDY ELEKTRO, SLABOPROVD, SILNOPROVD
	- ZATEPLENÍ FASÁDY EPS TL. 40mm + XPS 140mm.
	- ŠTUKOVÉ OMÍTKY.
	S001A - ZKOTOVITEL UPOZORNĚNÍ NA ŠPATNÝ A NEHODNÝ STAV FASÁDY + KLEBY PRVKŮ. (PŘEDNÍ FASÁDA A HL. ISTOP)
18.5.2018	POČASÍ: 10°C; 19°C JASNO
FA	POČET PRAC.: 1xTHP; 16xHSV; 10xIK STAV; 4xELDON 2xELEKTROIN; 4xT-SERVIS
	PRAC. DOBA: 6.30 - 16.00
	PROVÁDÍ SE: S001B - ZATEPLENÍ FASÁDY EPS TL. 40mm XPS 140mm. MONTÁŽ EL. ŽLABŮ, VÝMALBA.
	S001C - ŠTUKOVÉ OMÍTKY FASÁDY (POHLED SEVERNÍ)
	- SDK KONSTRUKCE STROPŮ A PRŮBĚH, VITOVÁNÍ ZÁKLAD PRŮBĚH A STROPŮ.
	- ŠTUKOVÉ OMÍTKY. VÝMALBA MÍST. 8. M3
	- ČIKUD STAVENÍSTĚ.
19.5.2018	POČASÍ: 12°C; 19°C ZOL01K5NO
SO	POČET PRAC.: 1xTHP; 16xHSV
	PRAC. DOBA: 6.30 - 16.30
	PROVÁDÍ SE: S001B+C - ŠTUKOVÉ OMÍTKY FASÁDY POHLED SEVERNÍ + VÝCHODNÍ
19.5.2018	ZÁKRESY: VIZ PŘÍLOHA ZE DNE 18.5.2018, KTERÁ TUDY NEJEDNÁ O ŠPATNÝ STAV STROJŮ



Matrix, a.s.

Lipovka 143
Rychnov nad Kněžnou
516 01

tel.: 494 320 302
fax: 494 531 633
e-mail:

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s.
č.ú.: 35-7105210217/0100

IČ: 25947672 DIČ: CZ25947672

výroba oken a dveří

plastová | dřevěná | hliníková



MATRIX

**Nabídka: N180529**

Objednatel:	PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o.	SŠPT POŘÍČÍ Adresa stavby:
IČ:	25275062	
DIČ:	CZ25275062	
Zástupce:		
tel.:	491 433 286, 491 433 286	
fax:		
e-mail:		
Adresa:	DOBROŠOVSKÁ 1776 NÁCHOD 547 01	Dokončení výroby:
		Termín realizace:
		Výrobní rozměry dodal:
Zpracováno dne:	16.4.2018	Zpracoval: Kuřová Jana

Vážený zákazníku,

dovolujeme si Vám předložit cenovou nabídku plastových výrobků a služeb. Tyto výrobky pro Vás vyrábíme z vysoce kvalitních materiálů německého výrobce GEALAN, které jako kompletní výrobek představují špičku v nabídce otvorových výplní.

Profilový systém: GEALAN 8000IQ

- 6-ti komorový systém o stavební hloubce 74mm.
- Izolační hodnota celého okna U_w od 1,0 W/m²K.
- 2 těsnicí roviny pro optimální tepelnou izolaci.
- Vynikající statika díky ocelovým výztužím o tloušťce 1,5-2,0mm.

Barvy

- Dřevěné dekory s dokonalou imitací přírodních materiálů.
- Vybrané barvy dle vzorníku RAL.

Kování: Roto NT

- Dvě rohová vedení s bezpečnostními hříbovými uzávěry zajišťují účinnou ochranu okna proti vloupání.
- Za použití nano částic vzniká jedinečná antikorozi povrchová úprava a zajišťuje vynikající kluzné vlastnosti.

Zasklení:


- Doporučené izolační dvojsklo s hodnotami U_g od 1,0 W/m²K.

Pozice : 2/: Trojdílné okno s poutcem + příslušenství

Rozměry rámu: 1220,0 x 2150,0 mm

Stavební otvor: 1240,0 x 2200,0 mm

Gealan S 8000

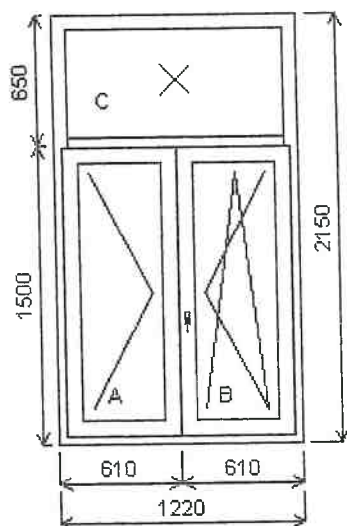

Základní cena:	Trojdílné okno s poutcem	10 075,00 Kč
Barva (ext/int):	3167004 Dub bahenní (Mooreiche)/bílá	
Sklo:	F4-16N-PT4+A Float-Planitherm Futur+A	
	TGI rámeček u=1.1	
Rám:	66mm	
Sloupek:	82mm 5K	
Stulp AB:	64mm	
Křídlo:	78mm	
	FIX	
Zazdívací lišta:	30 mm	
Klika:	Ok.klika Pluton II standard bílá	
	žádná	
Doplňky:	Žaluzie CELOSTÍNÍČÍ 25mm /	537,00 Kč
	0,18 b:1/9010 ovl:L pole A	
	Žaluzie CELOSTÍNÍČÍ 25mm /	537,00 Kč
	0,18 b:1/9010 ovl:P pole B	
	Žaluzie CELOSTÍNÍČÍ 25mm /	549,00 Kč
	0,18 b:1/9010 ovl:P pole C	

Množství: 8


Cena za ks: 11 698,00 Kč

Celkem:

93 584,00 Kč

Datum	Zúčastněné strany:
21.5.2018	POČET: 12°C, 19°C JASNO
70	POČET PRAC.: 1xTHP, 16xH3V, 10xIKSTAV, 3xELDON
	2xELEKTROIN, 2xT-SERVIS
	PRAC. DOBA: 6.30-14.30
	PROVÁDÍ SE: S001A - PODHALOVÁNÍ
	S001B - PODHALOVÁNÍ, MONTÁŽ EL. ŽLABŮ
	- MONTÁŽ LATEXENÍ FASÁDY EPS TK
	140mm + XPS TL 140mm. STĚROVÁ
	OMÍTKA.
	S001C - PORUODI ŽTI, SILNOPROUD, SLABOPROUD
	A ÚT. SDK STROPŮ VÁTOVÁNÍ
	A ZÁKLAD PRŮŘEK A STROPŮ.
	PODHALOVÁNÍ JIŽ HOTOVÝCH SDK STĚN A
	STROPŮ. SMYBA LEŽENÍ. STĚROVÁ OMÍTKA
	FASÁDY (SEVER).
22.5.2018	POČET: 14°C, 22°C JASNO
ÚT	POČET PRAC.: 1xTHP, 16xH3V, 10xIKSTAV, 5xELDON
	2xELEKTROIN, 2xT-SERVIS
	PRAC. DOBA: 6.30-14.30
	PROVÁDÍ SE: S001A - PODHALOVÁNÍ STĚN A
	STROPŮ. S001B - PODHALOVÁNÍ STĚN A
	STROPŮ. MONTÁŽ ELEKTROŽLABŮ A PORUODI
	SLABOPROUDU. STĚROVÁ OMÍTKA FASÁDY.
	S001C - SDK PODHLADY VÁTOVÁNÍ ZÁKLAD
	STROPŮ A PRŮŘEK. PODHALOVÁNÍ JIŽ
	HOTOVÝCH STROPŮ A STĚN. PORUODI
	SILNOPROUDU, SLABOPROUDU, ÚT, ŽTI.
	STĚROVÁ OMÍTKA FASÁDY (SEVER).
	S001D - ZKOTOLITEC UPOZORNĚNÍ NA ČPÁTNÍ
	TECHNICKÝ STAV STÁVAJÍCÍ UMĚNĚNÍ NÁDOBÍ
	(KANALIZACE, OBRÁDĚNÍ ATO.) BUDE ŘEŠENO NA
	KD.



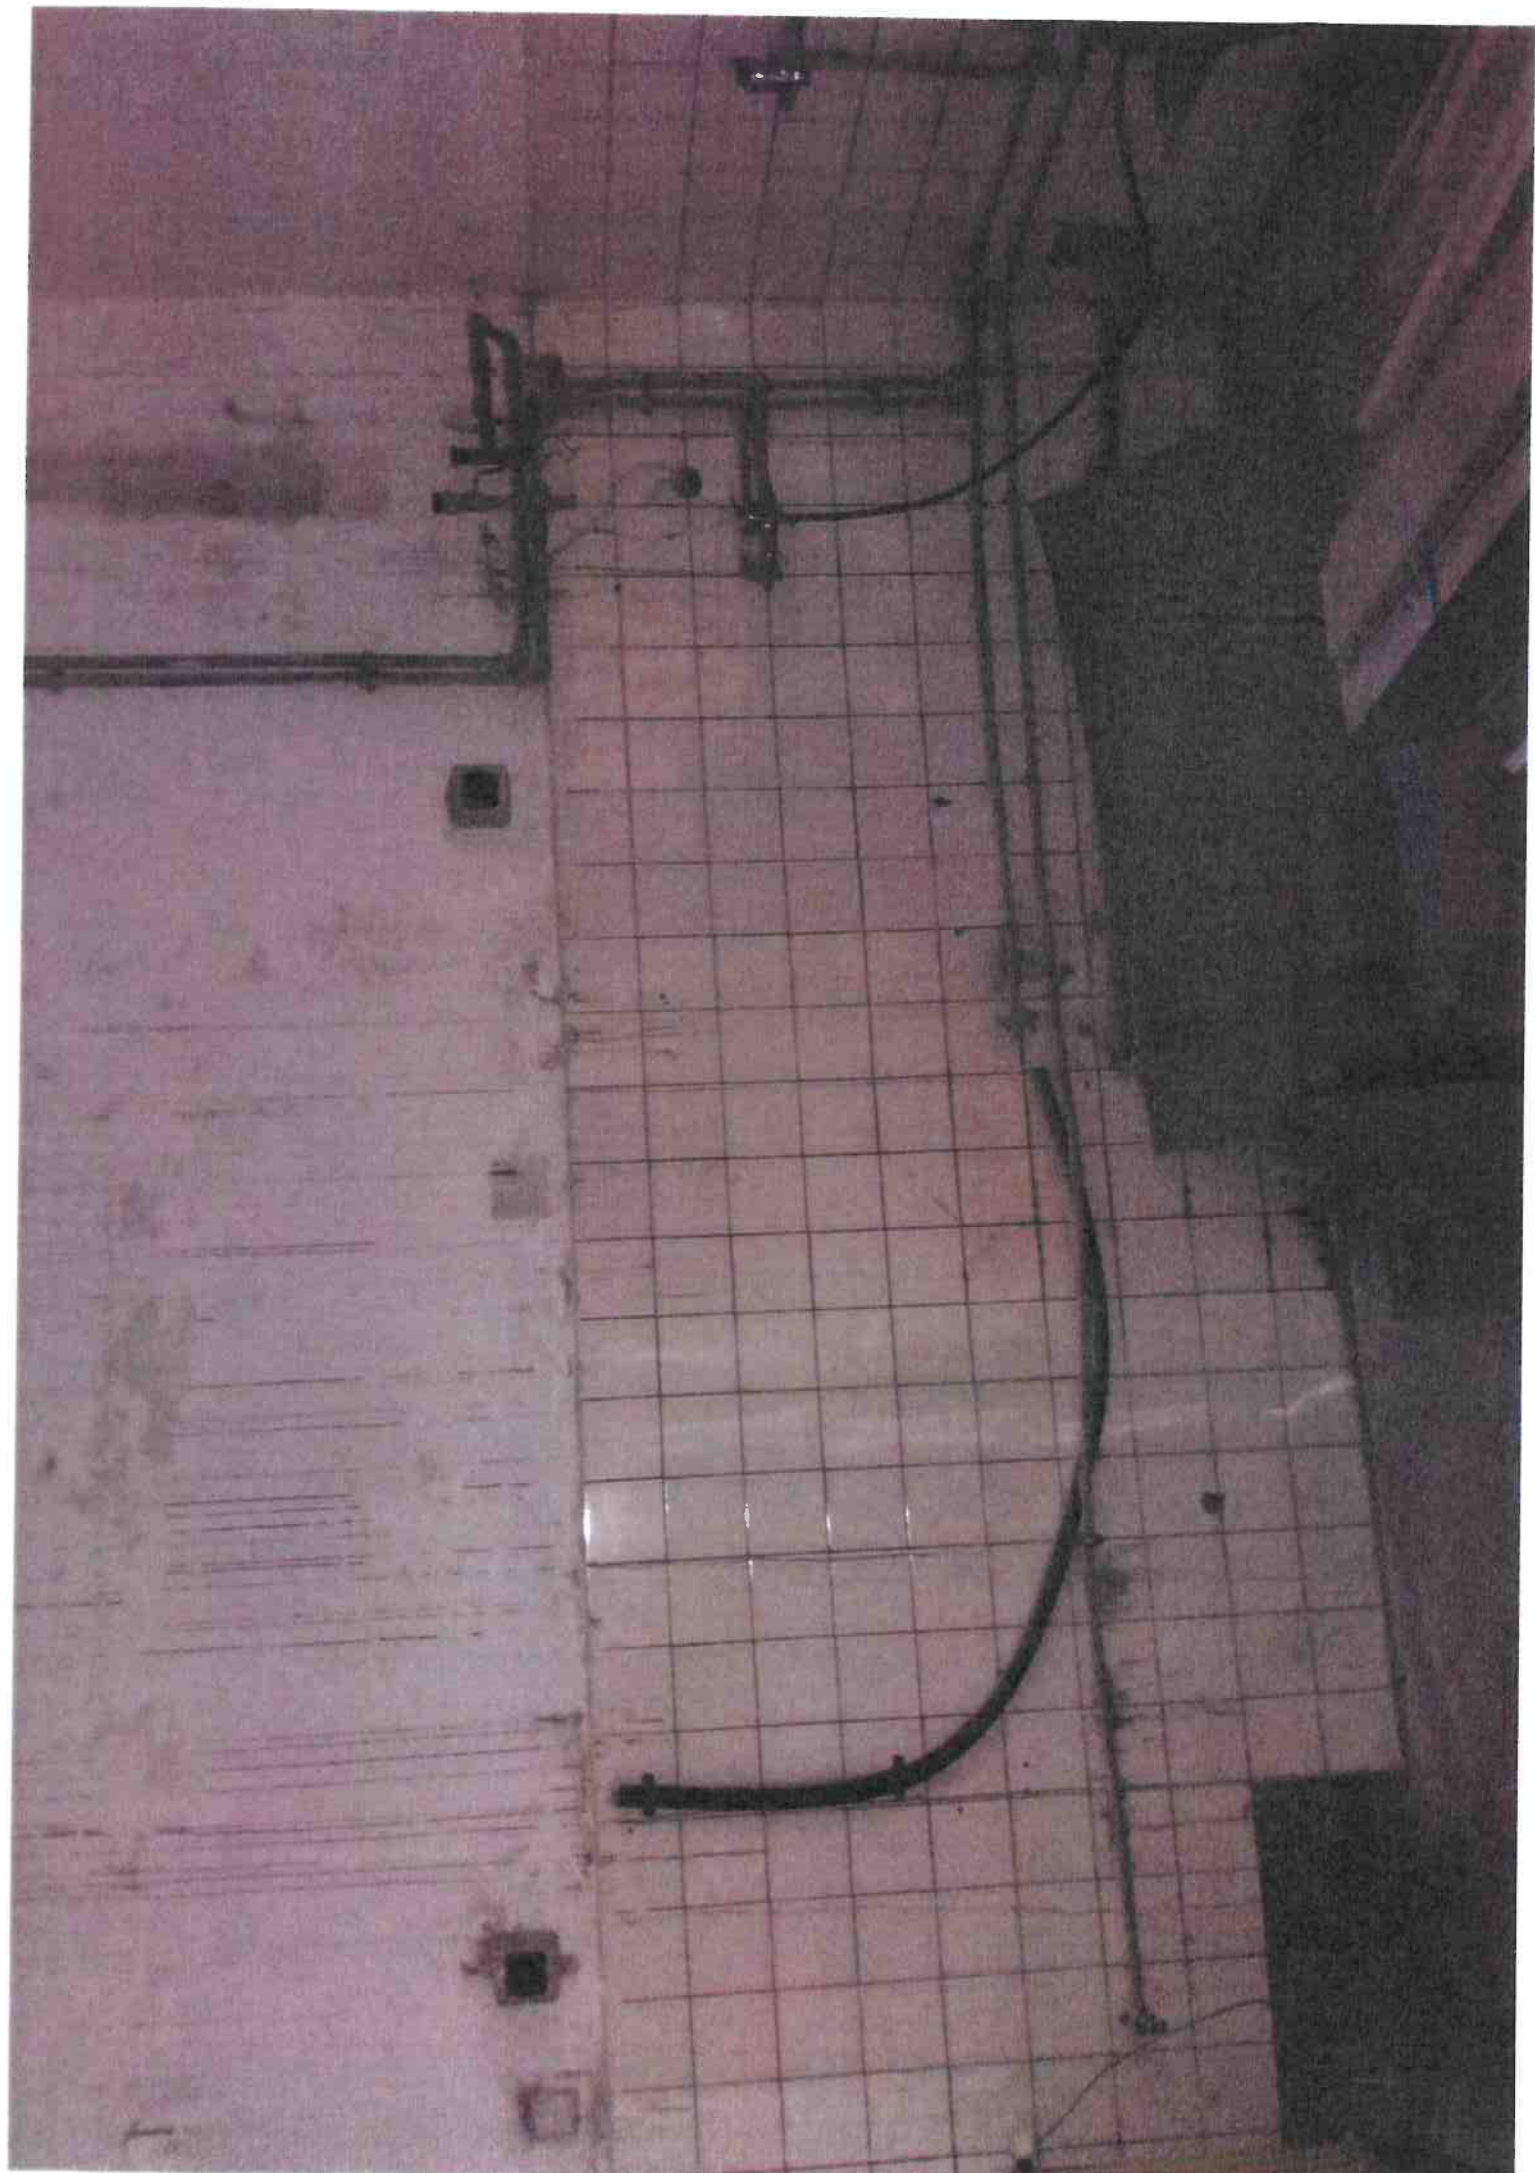

RADIK

technický ceník

RADIK KLASIK - Z

(POZINKOVANÉ DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO)



TEPELNÝ VÝKON Q [W] PRO TEPLONOSNOU LÁTKU VODA PODLE EN 442 A CENA

20 °C		Typ 22 Hloubka B = 130 mm							Typ 33 Hloubka B = 155 mm						
Hmotn. L (kg)	t (t) S (mm)	Hmotn. H (kg)													
		200	300	400	500	600	700	800	200	300	400	500	600	700	800
400	75/65		386	486	581	672	759	925		552	695	832	962	1089	1331
	55/45		196	246	294	340	382	462		284	356	422	485	547	664
	Kč		6 459	7 221	7 857	8 600	9 845	11 713		8 178	9 310	10 334	11 359	13 135	15 800
500	75/65		483	608	726	840	949	1157		690	869	1040	1203	1362	1664
	55/45		245	308	367	424	478	578		355	444	527	606	683	830
	Kč		7 123	8 041	8 807	9 685	11 154	13 358		9 075	10 439	11 660	12 923	15 013	18 147
600	75/65		580	730	871	1007	1138	1388		827	1043	1247	1444	1634	1997
	55/45		294	370	441	509	573	694		426	533	633	727	820	996
	Kč		7 789	8 863	9 757	10 769	12 463	15 004		9 971	11 566	12 987	14 486	16 888	20 492
700	75/65		676	851	1016	1175	1328	1619		965	1217	1455	1684	1906	2330
	55/45		343	431	514	594	669	809		497	622	738	848	957	1161
	Kč		8 454	9 683	10 705	11 856	13 774	16 646		10 867	12 692	14 312	16 047	18 764	22 840
800	75/65	519	773	973	1162	1343	1518	1850	747	1103	1390	1663	1925	2178	2662
	55/45	273	392	493	588	679	764	925	391	569	711	844	969	1093	1327
	Kč	8 270	9 117	10 501	11 654	12 940	15 081	18 292	10 669	11 764	13 821	15 640	17 611	20 640	25 185
900	75/65	584	869	1094	1307	1511	1707	2082	841	1241	1564	1871	2165	2451	2995
	55/45	308	441	554	661	764	860	1041	440	640	800	949	1090	1230	1493
	Kč	8 874	9 783	11 322	12 604	14 026	16 391	19 940	11 482	12 661	14 948	16 966	19 173	22 517	27 531
1000	75/65	649	966	1216	1452	1679	1897	2313	934	1379	1738	2079	2406	2723	3328
	55/45	342	490	616	735	849	955	1156	489	711	889	1055	1211	1366	1659
	Kč	9 476	10 448	12 141	13 554	15 112	17 699	21 583	12 294	13 555	16 076	18 292	20 735	24 393	29 877
1100	75/65	714	1063	1338	1597	1847	2087	2544	1027	1517	1912	2287	2647	2995	3661
	55/45	376	539	678	808	934	1051	1272	538	782	978	1160	1332	1503	1825
	Kč	10 078	11 112	12 962	14 502	16 196	19 009	23 227	13 107	14 451	17 205	19 619	22 298	26 269	32 223
1200	75/65	779	1159	1459	1742	2015	2276	2776	1121	1655	2086	2495	2887	3268	3994
	55/45	410	588	739	882	1019	1146	1387	587	853	1067	1266	1454	1640	1991
	Kč	10 680	11 779	13 780	15 453	17 280	20 317	24 874	13 919	15 349	18 333	20 946	23 861	28 144	34 568
1400	75/65	909	1352	1702	2033	2351	2656	3238	1308	1931	2433	2911	3368	3812	4659
	55/45	478	686	862	1029	1188	1338	1619	685	995	1244	1477	1696	1913	2323
	Kč	11 886	13 107	15 419	17 351	19 451	22 936	28 164	15 546	17 139	20 589	23 598	26 985	31 897	39 261
1600	75/65	1038	1546	1946	2323	2686	3035	3701	1494	2206	2781	3326	3850	4357	5325
	55/45	547	784	985	1176	1358	1529	1850	782	1137	1422	1688	1938	2186	2655
	Kč	13 093	14 435	17 060	19 249	21 622	25 553	31 452	17 171	18 931	22 844	26 252	30 111	35 647	43 953
1800	75/65	1168	1739	2189	2614	3022	3415	4163	1681	2482	3128	3742	4331	4901	5990
	55/45	615	882	1109	1323	1528	1720	2081	880	1279	1600	1899	2180	2460	2987
	Kč	14 298	15 766	18 699	21 149	23 794	28 173	34 745	18 797	20 724	25 101	28 904	33 238	39 400	48 645
2000	75/65	1298	1932	2432	2904	3358	3794	4626	1868	2758	3476	4158	4812	5446	6656
	55/45	683	980	1232	1470	1698	1911	2312	978	1421	1778	2110	2423	2733	3318
	Kč	15 503	17 094	20 338	23 047	25 962	30 791	38 034	20 422	22 514	27 355	31 558	36 362	43 153	53 339

Ceny jsou včetně uchycení.

Technické změny vyhrazeny.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

MATRIX

a. s.

MATRIX a.s. divize Windows

Ulice: Lipovka 143

PSČ, město: 516 01, Rychnov nad Kněžnou

Telefon: +420 494 661 825

Fax: +420 494 531 633

E-mail: windows@matrix-as.cz

**Nabídka č.:
N180529.Průmstav Náchod**

SŠPT Poříčí

Obsahuje: konstrukce, sklo, montáž, lakování

ADRESÁT:

Ulice:


PSČ, město:

Telefon:

Fax:

E-mail:

POPIS KONSTRUKCÍ:Hliníkové konstrukce v systémech: **ALUPROF S.A. (MB-45)**Počet pozicí: **1.** Počet konstrukcí: **2**Celková plocha: **3,7 m².**Celkový obvod: **11,4 m.**

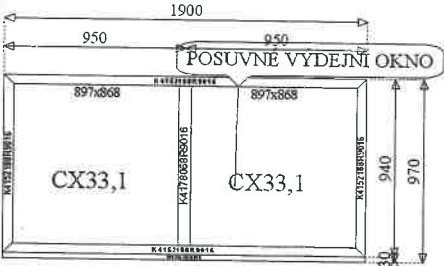P.č.	Nákres ~Pohled zvenku~, rozměry, popis	Počet kusů	Jedn.cena bez DPH ~CZK~	Celkem bez DPH ~CZK~	Poznámky
1	 POSUVNÉ VÝDEJNÍ OKNO Poz. 1 MB-45 Okna i dveřní vitríny ~B=1 900, H=970~	x 2	17 239 <u>Z toho:</u> Konstrukce: 15 765 Montáž: 1 474	34 478 31 529 2 949	RAL 8R9016 - standardní SKLO=CX33,1 POSUVNÉ VÝDEJNÍ OKNO
Nabídka se slevou: 20%			Celkem bez DPH: 34 478 DPH: 7 240 Celkem s DPH: 41 718 CZK		
Termín platnosti nabídky: 16.5.2018 ~20 týden v roce~ Platební podmínky: Termín realizace:					
Zhotovil: Ladislava Králová					


Poznámky:

AKCE SŠPTP Velké Poříčí – nerezové parapety k výdejním okénkům vč. konzol

Dobrý den.

Posílám cenu za nerezové parapety k výdejním okénkům – 4 kusy, š. 400mm, dl. 2000mm

-mat.	10 200,-	
-výroba.....	5 200,-	
-montáž.....	2 400,-	
-doprava.....	670,-	= 18 470,-


.....
Josef Tylš

Datum	Zúčastněné strany:
21.5.2018	POČASÍ: +11°C, 25°C jasno
DO	POČET PRAC.: 1xTHP, 16xHVV, 12xKSTAV, 2xELEKTROA
	3xELEKTRON, 2xT-SERVIS
	PRAC. DOBA: 6.30 - 14.30
	PROVÁDÍ SE: SODIC - SDR KCE PRŮČEK A STROPŮ.
	MONTÁŽ PRŮČEK A STROPŮ. ZOLUODI ČT,
	ZTI, ELEKTRO. A PŘÍSLUŠENSTVÍ. NĚKTERÉ PRÁCE
	MONTÁŽNÍ ZAŘÍZENÍ DVEŘÍ V KOTELNĚ.
	STŘEŠOVÉ OHŘÍVAČ.
	SODIC - MALBA
	KOMUNIKACE: KOPROVÁNÍ KROKIT - 400mm DE
	PLATNĚ PD. HUTNĚNÍ, NÁVOR ŠTĚRKŮ 0-32mm
	HUTNĚNÍ DO VESTVÁCH (CELKOVÁ VESTVA TL. 200mm)
	MONTÁŽ ZEMNÍHO PÁSKU PROTISVODŮ, NÁVOR
	ŠTĚRKŮ 0-63mm: HUTNĚNÍ DO VESTVÁCH.
	STROJINA - ZAPOVÍTEL UPOZORŮJE NA ŠPATNÝ STAV
	DÍLNY (KROKIT, ZEDNĚNÍ) BUDE PROVEDENO NI KD.
24.5.2018	
ÚT	POČASÍ: 11°C; 20°C jasno
	POČET PRAC.: 1xTHP, 16xHVV, 10xKSTAV, 2xELEKTROA
	5xELEKTRON, 1xT-SERVIS
	PRAC. DOBA: 6.30 - 14.30
	PROVÁDÍ SE: SODIC - SDR KONSTRUKCE PRŮČEK A
	STROPŮ. ZOLUODI ČT, ZTI, ELEKTRO
	KOMUNIKACE: NÁVOR ŠTĚRKŮ 0-63mm - 0x32mm
	HUTNĚNÍ DO VESTVÁCH.
	SODIC - STAVBA LEŠENÍ NA PRŮČNÍ ČÁSTI PRÁDIT.
30.5.2018	POČASÍ: 11°C; 14°C jasno
ST	POČET PRAC.: 1xTHP, 16xHVV, 10xKSTAV, 2xELEKTROA, 4xELEKTRON
	PRAC. DOBA: 6.30 - 14.30
	PROVÁDÍ SE: SODIC: SDR KCE STROPŮ A PRŮČEK
	MONTÁŽNÍ. KONTROLA OKOTŘEBNĚNÍ ISOLACE V PRŮČKÁCH
	KONTROLA ČI ZARADĚNÍ. MONTÁŽNÍ STROPŮ A PRŮČEK.
	ZOLUODI ČT + ZTI + ELEKTRO. KOTVENÍ DO PRŮČEK





Datum	Zúčastněné strany:
	KOMUNIKACE: NÁVOD STĚRKY 063 mm ZOHMÍTAL A 0-92 ZOHMÍTAL, KUTNĚNÍ 70 Vrstva. PŘÍPLIVA NA ZKOUŠKY ÚNOSNOSTI. 2001A - STUŽBA LESŇAN PRO OPRAVU FASÁDY.
31.5.2018	ZÁPIS ZSI: 1. MĚŘENÍ JNE BYLA PROVEDENA KONTROLA STAVBY, VLIVEM VÝROBNÍCH VEROJNÝCH TYPŮ DI UPOZORUJE NA DOKONČENÍ TP JENOTLIVÝCH MATERIÁLŮ 2. MĚŘENÍ JNE BYLY PĚLIVY TYTO KONSTRUKCE: - STĚŠNÍ KONSTRUKCE 2001 B, 2001 C, 2001 D 3. SDE KONSTRUKCE - RASO, VARNÁNÍ - POJOLEN ZÁKLAD 4. KONSTRUKCE UT, ZTI - 2001 C - DOKONČENÍ KOTVENÍ POTRUBÍ M.C. 129 5. VERNĚNÍ OŘÍTKY - KONTROLA VSTUPA 2001 B, 2001 A 6. HEDSICKA PRO ZPĚVNĚNÍ TROCHOV
31.3.2018 ET	POČET: 16°C, 20°C VASNO POČET TRAC.: 1xTH, 16xPB, 15x1RSTAV, 3xELEKTROIN, 4xELMON, 3xINT, 2xKERAMO TRAC. DOBA: 6.30 - 18.30 PROVÁDÍ SE: KOMUNIKACE - ZKOUŠKY TROCHOV => => STATIKA => VIZ PROTOKOL QUALIFORM: 1. MĚŘENÍ EDF, ZOHMÍTAL. MĚŘENÍ: EDF, 19, 21 MP 2001C - SDE KEE STROŽ A TŘÍČK, KOTOVÁNÍ ZÁKLAD. TENKOVRSTVÍ OŘÍTKA FASÁDY. 2001A - TĚŽKÉ TRÁPE PRO DOKONČENÍ. - ZPĚVNĚNÍ TRÁPE NA FASÁDĚ. KONTROLA TRACOVÁNÍ POKY 3 PERLINOV, OŘÍDNÍ, KUTNĚNÍ.

**QUALIFORM, a.s.**

Mlaty 672/8, 642 00 Brno-Bosonohy

Zkušební laboratoř č. 1008 akreditovaná ČIA

podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Pracoviště č. 06: Prosecká 412/74, 190 00 Praha

**QUALIFORM****Z P R Á V A č. : 3024 / 06 / KZ 1 / 2018****o kontrole zhutnění zemin a sypanin statickou zatěžovací zkouškou****Identifikační údaje :**

Objednatel zkoušky :

Průmstav Náchod s.r.o.

Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod

Stavba :

SŠPTP-Velké Poříčí-Centrum odborné přípravy polygrafických oborů

Objekt :

Komunikace

Konstrukční vrstva :

Zemní pláň

Materiál :

Původní

Staničení:

Mezi osou 1-2, 4m od osy I

Klimatické podmínky :

Oblačno, 22°C

Průměr zatěžovací desky : 300 mm

Poznámky: Výše uvedené údaje sdělil objednatel zkoušky. Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky a nenahrazují jiné dokumenty, které jsou orgány státního dozoru podle specifických předpisů žádány. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí zpráva reprodukovat jinak než celá.


Charakteristika zkoušky :

Zkouška byla provedena dle :

ČSN 72 1006 - Kontrola zhutnění zemin a sypanin, Příloha A**Výsledek zkoušky :**

Napětí p MPa	Zatlačení y mm
0,00	0,00
0,07	2,52
0,14	6,16
0,21	8,80
0,29	11,08
0,36	12,78
0,43	14,00
0,50	15,56
0,25	15,26
0,12	14,38
0,00	10,76
0,07	12,02
0,14	12,96
0,21	13,66
0,29	14,40
0,36	14,96
0,43	15,56

První zatěžovací cyklus $E_{def,1}$	7,0	MPa
Druhý zatěžovací cyklus $E_{def,2}$	20,9	MPa
$E_{def,2} / E_{def,1}$	2,98	

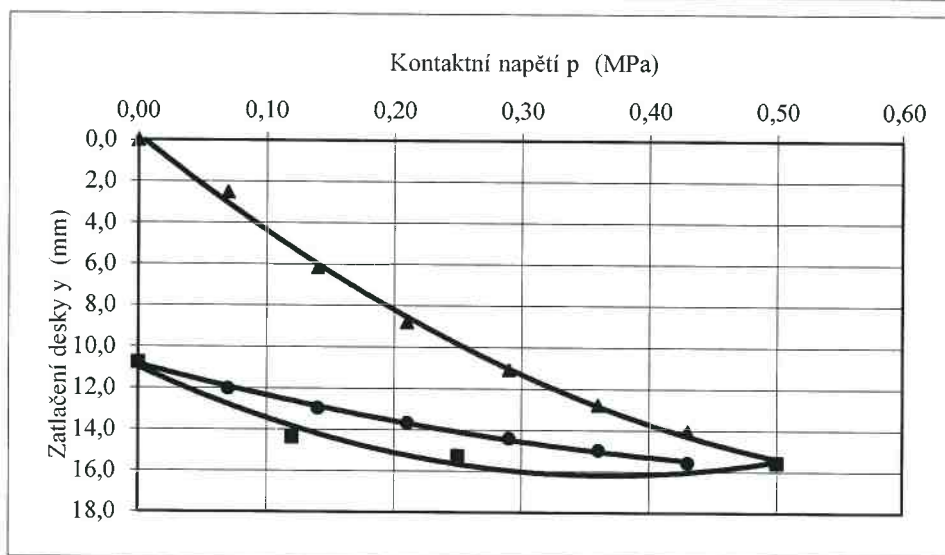

1. větev: $y = -42,191 p^2 + 53,13 p - 0,729$ 2. větev: $y = -12,445 p^2 + 16,099 p + 10,855$

Poznámka :

Vhkost :

Datum a čas zkoušky :

31.5.2018, 10:05

Zkoušku provedl :

Ing. Helena Zetková

V Praze dne :

1.6.2018

Ing. Helena Zetková
technik zkušební

**QUALIFORM, a.s.**

Mlaty 672/8, 642 00 Brno-Bosonohy

Zkušební laboratoř č. 1008 akreditovaná ČIA

podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Pracoviště č. 03: Průmyslová 283, 503 02 Předměřice n. L.

**QUALIFORM®****Z P R Á V A č. : 3024 / 06 / KZ 2 / 2018****o kontrole zhutnění zemin a sypanin statickou zatěžovací zkouškou****Identifikační údaje :**

Objednatel zkoušky :

Průmstav Náchod s.r.o.

Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod

Stavba :

SŠPTP-Velké Poříčí-Centrum odborné příprava polygrafických oborů

Objekt :

Komunikace

Konstrukční vrstva :

Zemní pláň

Materiál :

Původní

Staničení :

Mezi osou 2-2*, 3m od osy J

Klimatické podmínky :

Zataženo, 22°C

Průměr zatěžovací desky : 300 mm

Poznámky: Výše uvedené údaje sdělil objednatel zkoušky. Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky a nenahrazují jiné dokumenty, které jsou orgány státního dozoru podle specifických předpisů žádány. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí zpráva reprodukovat jinak než celá.

Charakteristika zkoušky :


Zkouška byla provedena dle :

ČSN 72 1006 - Kontrola zhutnění zemin a sypanin, Příloha A

Výsledek zkoušky :

Napětí p MPa	Zatlačení y mm
0,00	0,00
0,05	1,74
0,10	3,88
0,20	7,64
0,30	10,06
0,10	9,04
0,05	8,10
0,00	6,10
0,05	6,60
0,10	7,92
0,20	9,28
0,10	8,88
0,05	8,14
0,00	6,42

První zatěžovací cyklus $E_{def,1}$	7,2	MPa
Druhý zatěžovací cyklus $E_{def,2}$	19,8	MPa
$E_{def,2} / E_{def,1}$	2,76	

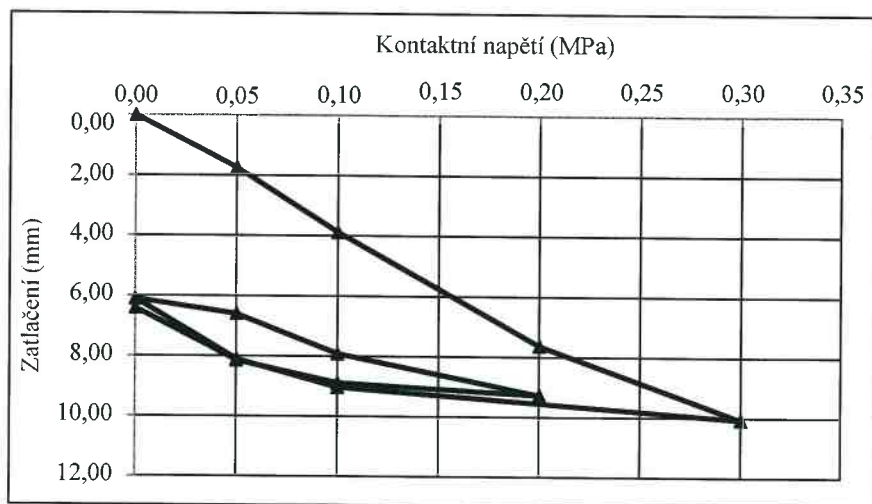

Poznámka :

Vlhkost : -

Datum a čas zkoušky :

31.5.2018, 10:05

Zkoušku provedl :

Ing. Helena Zetková

V Hradci Králové dne :

1.6.2018

Ing. Helena Zetková
technik zkušební
