

SMLOUVA O DODÁVCE SANITÁRNÍCH KONTEJNERŮ

SMLUVNÍ STRANY

Název Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice, příspěvková organizace
Sídlo Riegerova 1403, Hořice, 508 01
IČ 601 169 27
zastoupená Mgr. Hanou Richtermocovou
email richtermocova@gozhorice.cz
dále jen jako „objednatel“

a

Obchodní firma S-Vision s.r.o.
Sídlo Staňkov 16, 507 82, Pecka
IČ 044 74 694
zastoupená Mgr. Štěpánem Vele, jednatelem
email
bankovní spojení účet č. 3958514329/0800 vedený u České spořitelny, a.s.
dále jen jako „dodavatel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku smlouvu o dodávce sanitárních kontejnerů v následujícím znění:

Čl. I.

Předmět smlouvy

I.1 Předmětem této smlouvy je dodávka sanitárních kontejnerů pro potřeby školního statku objednatele, a to dle specifikace uvedené v čl. II. této smlouvy (dále jen jako „sanitární kontejnery“).

I.2 Dodavatel se touto smlouvou zavazuje dodat specifikované sanitární kontejnery v požadovaném množství a umístit je na příslušný pozemek, a to včetně instalace, zapojení inženýrských sítí a uvedení do provozu. Předmět smlouvy je pak objednatel povinen převzít a zaplatit za něj dodavateli sjednanou odměnu dle čl. III. této smlouvy.

Čl. II

Sanitární kontejnery

II.1 Dodavatel se tímto zavazuje dodat pro objednatele **2 kusy sanitárních kontejnerů**, jeden určený pro muže a jeden pro ženy (dále také jen jako Kontejner M a kontejner Ž), a instalovat je a zprovoznit pro účely školního statku v Hořicích na pozemku uvedeném v čl. II.3 této smlouvy. Specifikace kontejneru M a Ž je uvedena v **příloze č. 1** této smlouvy.

II.2 Součástí dodávky kontejnerů je taktéž zhotovení elektrické, vodovodní a kanalizační přípojky (dále jen jako „**inženýrské sítě**“) a jejich napojení na dodávané kontejnery.

II.3 Dodávané kontejnery budou umístěny dle přiloženého nákresu (**příloha č. 2** této smlouvy) na pozemku parc.č. 2350/3 a zhotovení inženýrských sítí pak bude provedeno dle trasy uvedené v příloze č. 2 této smlouvy, a to na již zmíněném pozemku parc.č. 2350/3 a přilehlé st. parcele č. 1599/3, vše zapsané na na LV č. 938 pro obec Hořice, k.ú. Hořice v Podkrkonoší, zapsaného u KÚ pro Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště Jičín.

II.4 Za účelem zhotovení příslušných inženýrských sítí dle této smlouvy uděluje objednatel dodavateli oprávnění ke vstupu na pozemek a zavazuje se v případě potřeby vydat mu plnou moc k jednání s dotčenými správními orgány. Pokud by bylo k dovozu či manipulaci nezbytné pro plnění této smlouvy potřeba sjednat další povolení ke vstupu na sousední pozemky, je objednatel povinen taková povolení na svůj náklad zajistit.

Čl. III

Cena plnění

III.1 Smluvní strany touto smlouvou sjednali, že celková cena dodávky a instalace sanitárních kontejnerů dle této smlouvy je stanovena následovně:

Cena dodávky a montáže sanitárních kontejnerů je uvedena v položkovém rozpočtu Kontejnery, který je přílohou č. 3 této smlouvy.

Cena zhotovení inženýrských sítí je uvedena v položkovém rozpočtu Inženýrské sítě, který je přílohou č. 4 této smlouvy.

III.2 Cena plnění dodavatele dle této smlouvy je splatná na základě faktury po předání příslušné dodávky. Splatnost faktury je 15 dní.

III.3 V případě prodlení objednatele s úhradou ceny plnění dle shora uvedeného je objednatel povinen uhradit dodavateli taktéž zákonný úrok z prodlení za příslušnou dobu prodlení.

Čl. IV

Provádění dodávky a instalace

IV.1 Dodavatel provede dodávku a instalaci kontejnerů osobně či za součinnosti třetích osob. V případě, že využije služeb třetích osob odpovídá za jejich činnosti tak, jako by je vykonával sám.

IV.2 Objednatel prohlašuje, že k plnění smlouvy není třeba stavebního povolení, a zavazuje se v případě, že ke zhotovení inženýrských sítí je potřeba vydání patřičných povolení či souhlasů veřejnoprávních orgánů či třetích osob, takové v dostatečném předstihu opatřit.

IV.3 Strany smlouvy sjednali termín plnění dodávek a služeb dle této smlouvy tak, že kontejnery budou objednateli předány nejpozději do 30.12.2016 . Smluvní strany sjednali penále za prodlení s plněním dle této smlouvy ve výši 1% z cen díla. Termín plnění bude splněn i v případě, bude-li objednatel vyzván k převzetí předmětu smlouvy alespoň 5 dní předem, a převzetí se neuskuteční z důvodu překážek na straně objednatele.

IV. 4 Vzhledem k brzkému termínu plnění není dodavatel v prodlení s plněním díla v případě, objeví-li se časová překážka spočívající v nedostatku nezbytných oprávnění či povolení nezbytných k plnění předmětu smlouvy, za něž odpovídá objednatel.

IV.5 Dodavatel je povinen předat kontejnery objednateli. O předpokládaném termínu předání stavby dodavatel povinen informovat objednatele 5 dní předem. Takové oznámení je možné učinit i elektronicky na email uvedený v záhlaví této smlouvy. V případě, že navržený termín předání nebude vyhovující, upraví dodavatel termín předání dle požadavků objednatele, ne však v rozmezí delším než 14 dní od původního předpokládaného termínu.

IV.6 Objednatel nabývá vlastnictví k dodávané věci okamžikem protokolárního předání dle čl. IV.5 této smlouvy. V případě souhlasu objednatele je možné i postupné předání dodávky.

Čl.V.

Další ujednání

V.1 Dodavatel poskytuje objednateli na dodávané plnění záruku 24 měsíců. Reklamované vady (zjevné, skryté, odstranitelné, neodstranitelné a nebránící užívání) je dodavatel povinen odstranit do 15 dnů od doručení reklamace. Vady bránící užívání a vady neodstranitelné jsou podstatným porušením smlouvy a dodavatel takovou dodávku musí nahradit dodávkou novou.

V.2 Reklamací jakýchkoliv vad je nutné učinit písemně prostřednictvím datové schránky dodavatele.

Čl. VI.

Závěrečná ustanovení

VI.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

VI.2 Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.

VI.3 V případě, že by se některé z ujednání v této smlouvě ukázalo neplatným, neplatnost takového ujednání nemá vliv na ostatní ujednání v této smlouvě obsažená.


VI.4 Ostatní práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými souvisejícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

V Tičetě dne 20. 11. 2016


.....
ŠTĚPÁN VELE

 - **Vision s.r.o.**
Šaňkov 16, 507 82 Pecka
IČO: 044 74 694

V Hořicích dne 22. 11. 2016


.....

GYMNÁZIUM, STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA,
STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ A
VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, HOŘICE ¹⁰
Riegrova 1403 508 01 HOŘICE

Technický popis - nabídka dodání 2 ks sanitárních kontejnerů

Popis produktů:

Sanitární kontejner ženy

Velikost:	6058 x 2438 x 2820 mm (SV 2500 mm)
Konstrukce - ocelový rám:	svařovaná konstrukce z ocelových profilů s antikoročním základním nátěrem, 1x základní nátěr, 2x nalakovaný; PUR dvoukomponentní lakování, barva rámu stejná jako barva vnějších stěn; stohování kontejneru na 2 další patra, bez tunelů na vysokozdvizný vozík
Konstrukce – střecha:	střecha odvětrávaná, nelakovaná, krytinu tvoří pozinkovaný trapézový plech 0,75 mm, na spojích přinýtovány dva překryvné plechové profily, na čelních stěnách jsou pak tyto plechy přišroubovány. Trapézový plech je položený na ocelových nosnících, které jsou svařeny rámovou konstrukcí. Čtyři dešťové svody, Ø 63 mm, zabudované v kontejnerovém rámu; zatížení střechy: 1,5Kn/m ² , tepelná izolace ze skelné vaty A1 – 80 mm, $\lambda = 0,039 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$
Konstrukce – strop:	parozábrana: PE fólie 0,2 mm; vnitřní obložení: oboustranně laminovaná dřevotřísková E1 10 mm, bílá
Konstrukce – stěny:	venkovní opláštění: pozinkovaný trapézový plech 0,55 mm, standardní barvy: RAL 7035 světle šedá; tepelná izolace ze skelné vaty A1 – 60 mm, $\lambda = 0,039 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ Vnitřní konstrukce: PE - fólie 0,2 mm, vnitřní obložení: oboustranně polaminovaná dřevotřísková deska E1 10 mm, bílá; příčka: tloušťka 80 mm, z obou stran laminovaná dřevotřísková E1 10 mm, izolovaná 60 mm skelnou vatou, pro výšku místnosti 2500 mm 2,5 bm
Podlahy:	spodní krytina: pozinkovaný ocelový plech tl. 0,55 mm; tepelná izolace ze skelné vaty A1 – 80 mm, $\lambda = 0,039 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$; parozábrana: PE – fólie 0,2 mm; cementotřísková 15 m ² podlahová krytina PVC 1,5 mm, šedá, mramorovaná, vytažená do vany 15 m ² zatížení podlahy 2,5 kN/m ²
Okna:	okno 600/450 mm, sklopné, ornamentní prosklení, $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ 4 ks
Dveře:	venkovní dveře ZK – pozinkované dveřní křídlo s výplní, ocelová zárubeň, plastové kování, PZ-zámek se 3 klíči, vnitřní barva RAL 9010, venkovní barva jako u kontejneru; ocelové dveře: světlý průchozí rozměr 811/1968 mm 1 ks Vnitřní dveře – pozinkované dveřní křídlo s výplní, ocelová zárubeň, plastové kování, PZ-zámek se 3 klíči, vnitřní barva RAL 9010, venkovní barva jako u kontejneru; ocelové dveře: světlý průchozí rozměr 811/1968 mm 1 ks
Sanitární vybavení:	vodovodní potrubí, přívod vody – plastové trubky (Alupex), odpad – plastové – HT trubky; potrubí vedení po stěně Připojení vody přes stěnu, uzavírací ventil ¾“, redukční ventil s manometrem ¾“ 1 ks Odvětrávání odpadů, odvětrávací hlavice umístěna uvnitř sanitární místnosti 1 ks

	kompletní WC kabinka s dělicími stěnami, dveře s WC – zámek, porcelánový záchod s hlubokým splachováním, plastové sedátko s poklopem, plastový držák na toaletní papír, háček; 2 ks	
	porcelánové umyvadlo cca 400x350 mm, se směšovací baterií pro teplou a studenou vodu, plastový sifon, zrcadlo 400x300 mm, skleněná odkládací polička, háček	3 ks
	Plastová sprchovací kabina 800x800 mm se závěsem, sprchová baterie, držák na mýdlo	2 ks
	Plastová vpust' v podlaze se sifonem, přípoj na odpadní potrubí ze strany stavby	1 ks
	elektrický bojler 200 l, typ EWH Trend, 1/N/PE – 220V, zn. AEG, kompletní montáž na pevný přípoj	1 ks
Elektroinstalace dle DIN	Elektrický rozvaděč HAGER s proudovým chráničem a jističi	1 ks
	elektrodokumentace	1 ks
	CEE 32 A	1 ks
	vypínač nebo přepínač 10 A 250 V	2 ks
	zásuvka 10/16 A, 250 V	3 ks
	zářivka do vlhkých prostor (IP 54), barva šedá, vanka z akrylátového skla s elektronickým předřadníkem	2 ks
Topení	elektrické stěnové topení 2 kW s termostatem, plynulá regulace teploty, automatická ochrana proti mrazu, chráněné proti stříkající vodě, určené pro vlhké místnosti, vč zásuvky 16 A, 250 V samostatně jištěné	1 ks
	elektrické stěnové topení 1 kW s termostatem, plynulá regulace teploty, automatická ochrana proti mrazu, kompletně namontované s přípojnou zásuvkou	1 ks
Ventilátory	ventilátor pro odvětrávání skrze stěnu, průměr 100 mm, výkon 90 m ³ /h, kompletně s montáží, spínání prostřednictvím vypínače světla nebo odděleným spínačem	1 ks
Ostatní	větrací mřížky ve stěnách pro provětrávání sendvičové konstrukce stěn kontejneru	

Sanitární kontejner muži

Velikost:	6058 x 2438 x 2820 mm (SV 2500 mm)
Konstrukce - ocelový rám:	svařovaná konstrukce z ocelových profilů s antikoročním základním nátěrem, 1x základní nátěr, 2x nalakovaný; PUR dvoukomponentní lakování, barva rámu stejná jako barva vnějších stěn; stohování kontejneru na 2 další patra, bez tunelů na vysokozdvižný vozík
Konstrukce – střecha:	střecha odvětrávaná, nelakovaná, krytinu tvoří pozinkovaný trapézový plech 0,75 mm, na spojích přínýtovány dva překryvné plechové profily, na čelních stěnách jsou pak tyto plechy přišroubovány. Trapézový plech je položený na ocelových nosnících, které jsou svařeny rámovou konstrukcí. Čtyři dešťové svody, Ø 63 mm, zabudované v kontejnerovém rámu; zatížení střechy: 1,5Kn/m ² , tepelná izolace ze skelné vaty A1 – 80 mm, $\lambda = 0,039 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

Konstrukce – strop:	parozábrana: PE fólie 0,2 mm;	
	vnitřní obložení: oboustranně laminovaná dřevotřísková E1 10 mm, bílá	
Konstrukce – stěny:	venkovní opláštění: pozinkovaný trapézový plech 0,55 mm, standardní barvy: RAL 7035 světle šedá; tepelná izolace ze skelné vaty A1 – 60 mm, $\lambda = 0,039 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	
	Vnitřní konstrukce: PE - fólie 0,2 mm, vnitřní obložení: oboustranně polaminovaná dřevotřísková deska E1 10 mm, bílá; příčka: tloušťka 80 mm, z obou stran laminovaná dřevotřísková E1 10 mm, izolovaná 60 mm skelnou vatou, pro výšku místnosti 2500 mm	2,5 bm
Podlahy:	spodní krytina: pozinkovaný ocelový plech tl. 0,55 mm; tepelná izolace ze skelné vaty A1 – 80 mm, $\lambda = 0,039 \text{ W/(m}^2\text{K)}$; parozábrana: PE – fólie 0,2 mm; cementotřísková 22 mm	15 m ²
	podlahová krytina PVC 1,5 mm, šedá, mramorovaná, vytažená do vany	15 m ²
	zatížení podlahy 2,5 kN/m ²	
Okna:	okno 600/450 mm, sklopné, ornamentní prosklení, $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$	4 ks
Dveře:	venkovní dveře ZK – pozinkované dveřní křídlo s výplní, ocelová zárubeň, plastové kování, PZ-zámek se 3 klíči, vnitřní barva RAL 9010, venkovní barva jako u kontejneru; ocelové dveře: světlý průchozí rozměr 811/1968 mm	1 ks
	Vnitřní dveře – pozinkované dveřní křídlo s výplní, ocelová zárubeň, plastové kování, PZ-zámek se 3 klíči, vnitřní barva RAL 9010, venkovní barva jako u kontejneru; ocelové dveře: světlý průchozí rozměr 811/1968 mm	1 ks
Sanitární vybavení:	vodovodní potrubí, přívod vody – plastové trubky (Alupex), odpad – plastové – HT trubky; potrubí vedení po stěně	
	připojení vody přes stěnu, uzavírací ventil ¾“, redukční ventil s manometrem ¾“	1 ks
	odvětrávání odpadů, odvětrávací hlavice umístěna uvnitř sanitární místnosti	1 ks
	kompletní WC kabinka s dělicími stěnami, dveře s WC – zámkem, porcelánový záchod s hlubokým splachováním, plastové sedátko s poklopem, plastový držák na toaletní papír, háček	2 ks
	porcelánové umyvadlo cca 400x350 mm, se směšovací baterií pro teplou a studenou vodu, plastový sifon, zrcadlo 400x300 mm, skleněná odkládací polička, háček	3 ks
	porcelánový pisoár s tlakovým splachováním, bez poklopu	2 ks
	mezistěna k pisoáru, bílá	1 ks
	plastová sprchovací kabina 800x800 mm se závěsem, sprchová baterie, držák na mýdlo	2 ks
	plastová vpust' v podlaze se sifonem, přípoj na odpadní potrubí ze strany stavby	2 ks
	elektrický bojler 200 l, typ EWH Trend, 1/N/PE – 220V, zn. AEG,	
	kompletní montáž na pevný přípoj	1 ks
Elektroinstalace dle DIN	elektrický rozvaděč HAGER s proudovým chráničem a jističi	1 ks
	elektrodokumentace	1 ks
	CEE 32 A	1 ks
	vypínač nebo přepínač 10 A 250 V	2 ks
	zásuvka 10/16 A, 250 V	3 ks


	zářivka do vlhkých prostor (IP 54), barva šedá, vanka z akrylátového skla s elektronickým předřadníkem	2 ks
Topení	elektrické stěnové topení 2 kW s termostatem, plynulá regulace teploty, automatická ochrana proti mrazu, chráněné proti stříkající vodě, určené pro vlhké místnosti, vč. zásuvky 16 A, 250 V samostatně jištěné	1 ks
	elektrické stěnové topení 1 kW s termostatem, plynulá regulace teploty, automatická ochrana proti mrazu, kompletně namontované s přípojnou zásuvkou	1 ks
Ventilátory	ventilátor pro odvětrávání skrze stěnu, průměr 100 mm, výkon 90 m ³ /h, kompletně s montáží, spínání prostřednictvím vypínače světla nebo odděleným spínačem	1 ks
Ostatní	větrací mřížky ve stěnách pro provětrávání sendvičové konstrukce stěn kontejneru	

Stavební připravenost ze strany zákazníka:

- Stavební povolení nebo jiné příslušné povolení/dokumenty, jsou-li na daném místě určení třeba

Kontejnery budou pokládány na betonové panely.

Sanitární kontejner - ženy

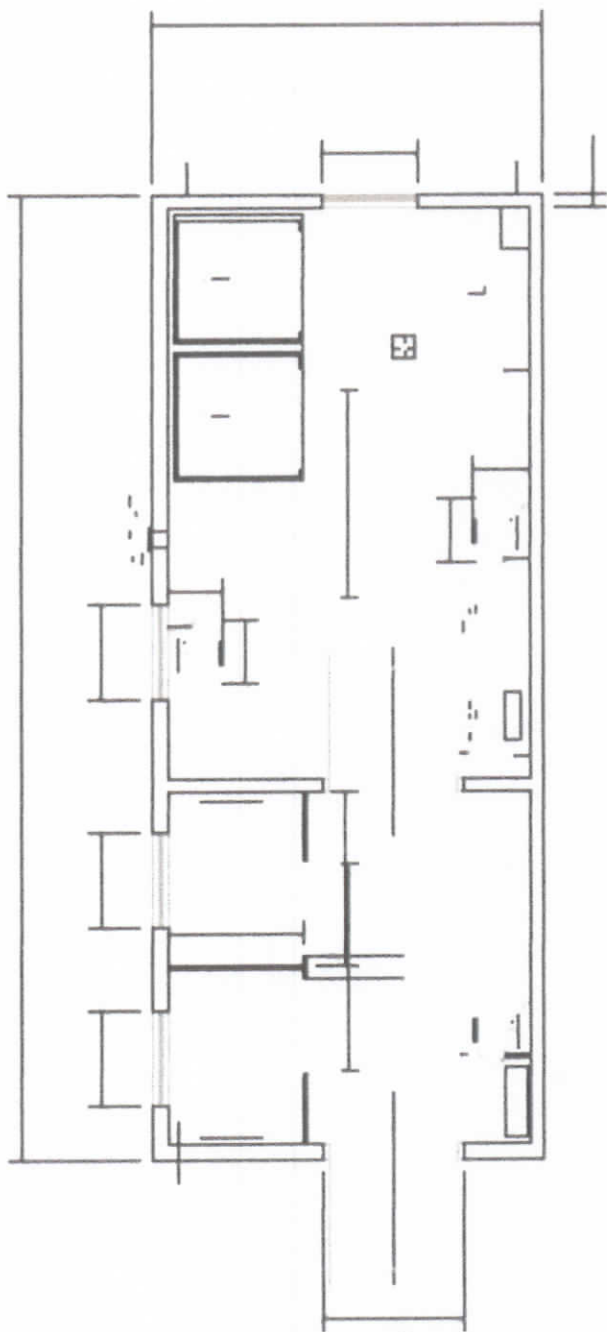

Sanitární kontejner - muži





ŠKOLNÍ STÁTEK HOŘICE

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Sanitární buňky - Školní statek Hořice

Objekt: Sanitární buňky Školní statek Hořice - dodávka a osazení buněk

příloha č. 4 zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu

Objednatel: Školní statek Hořice

Zhotovitel: Provýběrové řízení

Místo:

Zpracoval: Štěpán Vele

Datum: 20. 11. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena v Kč bez DPH	Celková cena v Kč bez DPH
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------------	---------------------------

PSV Práce a dodávky PSV

740 Elektromontáže - zkoušky a revize

1	R	74001	Dodávka, osazení, napojení na přípojky vody, kanalizace, elektro včetně revize elektro, tlakové zkoušky kanalizace vodovodu.	soubor	2,000	319 500,00	639 000,00
---	---	-------	--	--------	-------	------------	------------

Celkem v Kč bez DPH

639 000,00

Sazba DPH

21,00%

DPH

134 190,00

Celkem v Kč s DPH

773 190,00

Veškeré ceny jsou uvedeny v českých korunách

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Sanitární buňky - Školní statek Hořice

Objekt: Sanitární buňky, Školní statek Hořice - napojení na sítě

příloha č. 3 zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu

Objednatel: Školní statek Hořice

Zhotovitel: Provýběrové řízení

Místo:

Zpracoval: Štěpán Vele

Datum: 20.11. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena v Kč zadání bez DPH	Celková cena v Kč zadání bez DPH
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------------------	----------------------------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

23 557,36

1	221	113107135	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu vyztuženého sítěmi tl 100 mm 6*0,6	m2	3,600	524,00	1 886,40
2	221	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm 6*0,6	m2	3,600	153,00	550,80
3	001	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m 14*3*0,2	m3	8,400	32,50	273,00
4	001	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 14*3*0,35	m3	14,700	132,00	1 940,40
5	001	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 (6+3)*0,6*1	m3	5,400	596,00	3 218,40
6	001	139711101	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině tř. 1 až 4 9*0,3*1	m3	2,700	1 890,00	5 103,00
7	001	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 (5,4+2,7)-2,16-3,78 "pro buňky" 8,4+14,7 Součet	m3	25,260	54,50	1 376,67
8	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky 2,16+8,4+14,7	m3	25,260	17,20	434,47
9	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 2,160*1,6+25,26	t	28,716	200,00	5 743,20
10	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním (6+3)*0,6*0,7	m3	3,780	89,60	338,69
11	001	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhuťněním 9*0,6*0,7	m3	3,780	291,00	1 099,98
12	001	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu (6+9+3)*0,6*0,2	m3	2,160	358,00	773,28
13	583	583373030	Štěrkopísek frakce 0-8 2,160*1,6	t	3,456	237,00	819,07

5 Komunikace pozemní

65 825,97

14	221	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm	m2	42,000	58,90	2 473,80
15	221	564671111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 250 mm	m2	3,600	201,00	723,60
16	221	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	3,600	97,50	351,00
17	221	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 14*3	m2	42,000	126,00	5 292,00

18	221	576156311	Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	3,600	231,00	831,60
19	221	577144131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	6,000	303,00	1 818,00
6*1					6,000		
20	221	584121111	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm	m2	42,000	158,00	6 636,00
14*3					42,000		
21	593	593811340	panel silniční IDZ 2/490 tl.15 cm	m2	42,000	1 016,67	42 699,97
22	R	5939	práce spojené s napojením sítí na buňky	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							19 989,44
23	221	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	12,000	56,80	681,60
6*2					12,000		
24	221	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	10,200	72,20	736,44
6+0,6*7					10,200		
25	221	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	19,200	232,00	4 454,40
"podklad asfaltové krytiny" 6+0,6*7					10,200		
"betonová podlaha v dílně" 9					9,000		
Součet					19,200		
26	013	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,810	2 460,00	1 992,60
9*0,6*0,15					0,810		
27	013	971024591	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 1 m2 na MV nebo MVC tl přes 900 mm	m3	0,048	2 280,00	109,44
0,2*0,2*0,6*2					0,048		
28	221	998226011	Přesun hmot s krytem montovaným z dílců z ŽB	t	51,346	234,00	12 014,96
PSV Práce a dodávky PSV							
721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							19 940,97
29	721	721173402	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 125 systém KG	m	10,000	278,00	2 780,00
30	721	721173403	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 150 systém KG	m	25,000	376,00	9 400,00
31	721	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	10,000	16,80	168,00
32	721	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	25,000	21,70	542,50
33	R	7213001	Úprava šachty pro napojení kanalizace	soub.	1,000	3 430,00	3 430,00
34	R	7213002	Osazení vč dodání šachtového dna Wavin DN 400	soub.	1,000	1 460,00	1 460,00
35	R	7213003	Osazení vč dodání šachtové roury Wavin DN 400	soub.	1,000	751,00	751,00
36	R	7213004	Osazení vč. dodání šachtového poklopu	soub.	1,000	1 080,00	1 080,00
37	721	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	196,115	1,68	329,47
722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							24 342,08
38	721	722173242	Potrubí vodovodní plastové vícevrstvé vč. fitinek 20x2,3 mm	m	8,000	213,00	1 704,00
39	721	722173244	Potrubí vodovodní plastové vícevrstvé vč. fitinek 32x3,0 mm	m	45,000	388,00	17 460,00
40	721	722181252	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubiciemi z PE tl do 25 mm DN do 42 mm	m	15,000	106,00	1 590,00
41	721	722262223	podružný vodoměr Q=2,5 m3 s 2 uzavíracími křehouty a zpětným ventilem	soubor	1,000	1 800,00	1 800,00
42	721	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	53,000	29,10	1 542,30
8+45					53,000		
43	721	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	240,963	1,02	245,78
740 Elektromontáže							10 000,00
44	R	01	Elektroinstalace	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
Celkem PSV a HSV							163 655,83
Náklady na umístění stavby							19 000,00
Celkem v Kč bez DPH							182 655,83
Sazba DPH							21%
DPH							38 357,73
Celkem v Kč s DPH							221 013,56

Veškeré ceny jsou uvedeny v českých korunách
