

ZAKÁZKA :

**VÝSTAVBA KONSOLIDOVANÝCH LABORATOŘÍ A TRANSFÚZNÍHO ODD. V OBLASTNÍ  
NEMOCNICI TRUTNOV a.s.**

ZMĚNOVÝ LIST č.

21

ze dne :

14.07.2020

*Tento ZL je vystaven ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel*

**VĚCNÝ POPIS ZMĚNY - PŘEDMĚT DÍLA :**

Změna se týká vícepráci nad rámec smluvního rozpočtu (Úprava objektu OLMI):

- doplnění chybějícího plynoměru v HUP,
  - dodatečně požadované úpravy AL venkovních výplní otvorů,
- , vše bude provedeno v rozsahu dle přílohy č.1, která je nedílnou součástí tohoto změnového listu.

VLIV NA TERMÍNY HMG :

NE

VLIV NA DOKONČENÍ STAVBY

NE

**CENOVÉ VYHODNOCENÍ :**

ODPOČET ( - ) :


-452,43

PŘÍPOČET ( + ) :


33 480,50

CENOVÝ ROZDÍL - VÝŠE ZMĚNOVÉHO LISTU

**33 028,07****ZHOTOVITEL: Společnost BAK - SYNER**

Osoba :	Podpis :	Datum podpisu :
Michal Vojáček		3.8.2020
Václav Zítko		3.8.2020
Lucie Eisová / Václav Sedláček		13.8.2020
Ladislav Köhler / Michal Holub		3.8.2020
Karel Laš		13.8.2020

**OBJEDNATEL: Královéhradecký kraj**

Osoba :	Podpis :	Datum podpisu :
Lukáš Oma - TDI		2.8.2020
Viktor Šlapal - HIP		10.8.2020
Libor Žilka - KKU		10.8.2020
Jiří Strnad - KKU		10.8.2020

Přílohy :

č.1 - položkový rozpočet

Příloha č. 1 k změnóvému listu stavby č. 21

Stavba: ZŠ a MŠ  
 Objednatel: Město Jihlava  
 Stavebník: Město Jihlava

D1\_01\_4f - Odběrná plynová zařízení

Trutnov  
 Královéhradecký kraj  
 Společnost BAK-SYNER zastoupen BAK stavební společnost, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK] "-"	Cena celkem [CZK] "-"	Cenová soustava
23	K	723260601	Demontáž plynoměru G 2 nebo G 4 nebo G 10 max. průtok do 16 m3/hod.	kus	-1,000	452,43	-452,43	1 878,60	CS URS 2019 01

1) Doplnění chybějícího plynoměru v HUP

23	K	723260601	Demontáž plynoměru G 2 nebo G 4 nebo G 10 max. průtok do 16 m3/hod.	kus	-1,000	452,43	-452,43	1 878,60	CS URS 2019 01
----	---	-----------	---	-----	--------	--------	---------	----------	----------------

Stavba: ZŠ a MŠ  
 Objednatel: Město Jihlava  
 Stavebník: Město Jihlava

D1\_01\_1 - Stavební

Trutnov  
 Královéhradecký kraj  
 Společnost BAK-SYNER zastoupen BAK stavební společnost, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK] "-"	Cena celkem [CZK] "-"	Cenová soustava
X1			Demontáž, montáž okna A_10, bourání ostění a nadpraží	kpl	1,000	11 004,40	0,00	31 601,90	CN dodavatele + koordinace
X2			Výměna poškozených tenzometrů zastiť pasivního křídla A_07_A_08	kpl	1,000	5 643,00			CN dodavatele + koordinace
X3			Úprava venkovních mříží	kpl	1,000	11 850,30			CN dodavatele + koordinace
X4			Za výplně propíjecí zanku na dveřích A_07_A_08 (funkce rohů) dle požadavku personálu	kpl	1,000	3 104,200			CN dodavatele + koordinace

2) Dodatečně požadované úpravy AL venkovních výplní otvorů

Náklady soupisu celkem

-452,43  
 33 028,07

Položky nepodbarvené jsou položky vracené náklady, které jsou již součástí záměrného položkového rozpočtu k SoD. Pro ocenění byla použita metodika dle bodu 6.3 smlouvy o dílo (smluvní jednotkové ceny).  
 Položky podbarvené modrou barvou jsou položky vracené, které jsou nové a nejsou součástí záměrného položkového rozpočtu k SoD. Pro ocenění byla použita metodika dle bodu 6.5 smlouvy o dílo (URS + koeficient 1,01).  
 Položky podbarvené zelenou barvou jsou položky vracené, které jsou nové a nejsou součástí záměrného položkového rozpočtu k SoD. Pro ocenění byla použita metodika dle bodu 6.5 smlouvy o dílo (cena v místě a čase obvyklá, zjištěná cenovým průzkumem, nepřidání ze tří cenových nabídek + koordinace projektového zhotovitele).

**Alufront, s.r.o.**  
Nové Město nad Metují

Tel.: XXXXXXXXXX  
zakázka číslo: 19 08 60  
29.6.2020

**Laboratoře a Transfúzní odd. - oblastní nemocnice Trutnov - vnější výplně**

Pozice	šířka	výška	ks	plocha	cena celkem
Demontáž, montáž okna A_10, bourání ostění a nadpraží	3550	650	2	4,62	10 004 Kč
výměna poškozených centrálních zástrčí pasivního křídla - A_07 + A_08			2		5 130 Kč
úprava nerezových madel			4		10 773 Kč
2x výměna protiplechů zámku na dveřích A_07 + A_08 (funkce rolny) - požadavek personálu			2		2 822 Kč

**CELKEM**

**28 728 Kč**

**Poznámky:**

Cena nezahrnuje DPH

Cena za provedené práce je včetně použitých materiálů a ostatních nákladů

ZAKÁZKA :

**VÝSTAVBA KONSOLIDOVANÝCH LABORATOŘÍ A TRANSFÚZNÍHO ODD. V OBLASTNÍ  
NEMOCNICI TRUTNOV a.s.**

ZMĚNOVÝ LIST č.

22

ze dne :

1.6.2020

Tento ZL je vystaven ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel

**VĚCNÝ POPIS ZMĚNY - PŘEDMĚT DÍLA :**

Změna se týká: Vícepráce nad rámec smluvního rozpočtu - Změna pracovních linek dle požadavku uživatele a schvalovacího listu vzorku č.80, vše bude provedeno v rozsahu dle příloh č.1 a č.2, které jsou nedílnou součástí tohoto změnového listu.

VLIV NA TERMÍNY HMG :

ANO

VLIV NA DOKONČENÍ STAVBY

NE

**CENOVÉ VYHODNOCENÍ :**

ODPOČET ( - ) :

-21 691,00

PŘÍPOČET ( + ) :

110 625,20

CENOVÝ ROZDÍL - VÝŠE ZMĚNOVÉHO LISTU

88 934,20

**ZHOTOVITEL: Společnost BAK - SYNER**

Osoba :	Podpis :	Datum podpisu :
Michal Vojáček		1. 6. 2020
Václav Zítko		3. 6. 2020
Lucie Eisová / Václav Sedláček		13. 6. 2020
Ladislav Köhler / Michal Holub		9. 6. 2020
Karel Laš		10. 6. 2020

**OBJEDNATEL: Královéhradecký kraj**

Osoba :	Podpis :	Datum podpisu :
Lukáš Oma - TDI		3. 6. 2020
Viktor Šlapal - HIP		10. 6. 2020
Libor Žilka - KKV		10. 6. 2020
Jiří Strnad - KKV		10. 6. 2020

Přílohy :

č.1 - položkový rozpočet

č.2 - schvalovací list vzorku č.80



Příloha č. 1 k změnóvémú listu sláby č. 22

Trutnov

27.01.2020

Královéhradecký kraj

Atelier Penta v.o.s., Mříškova  
12, Jhlava  
Ing. Avuk

Společnost BAK-SYNER zastoupen BAK stavební společnost, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství celkem dle SoD	Množství celkem dle skutečnosti	Rozdíl mezi skutečností a SoD	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] "-"	Cena celkem [CZK] "-"	Cenová soustava
3	K	260015	linka pracovní č.3	ks	-1,000	-1,000	-1,000	8 829,00	-8 823		
4	K	260018	linka laboratorní č.4	ks	1,000	1,000	1,000	35 784,10		35 784	
5	K	260020	stůl laboratorní č.5	ks	1,000	1,000	1,000	34 602,20		34 602	
6	K	260046	stůl laboratorní č.6	ks	2,000	2,000	2,000	5 300,00		10 600	
11	K	420003	linka pracovní č.11	ks	1,000	1,000	1,000	3 856,00		3 856	
12	K	420004	linka pracovní č.12	ks	-1,000	-1,000	-1,000	598,00	-598		
13	K	420005	linka pracovní č.13	ks	1,000	1,000	1,000	0,00		0	
14	K	42JD34	linka pracovní č.14	ks	1,000	1,000	1,000	20 790,00		20 790	
15	K	42UH01	linka pracovní č.15	ks	-1,000	-1,000	-1,000	12 265,00	-12 265		
16	K	460065	linka pracovní č.16	ks	1,000	1,000	1,000	4 992,90		4 993	
<b>Náklady soupíšu celkem</b>									<b>-21 691,00</b>	<b>110 625,20</b>	
									<b>88 934,20</b>		

Položky nepodbarvené jsou položky víceprací, které jsou již součástí zasmulvněného položkového rozpočtu k SoD. Pro ocenění byla použita metodika dle bodu 6.5 smlouvy o dílo (smluvní jednotkové ceny).  
Položky podbarvené modrou barvou jsou položky víceprací, které jsou nové a nejsou součástí zasmulvněného položkového rozpočtu k SoD. Pro ocenění byla použita metodika dle bodu 6.5 smlouvy o dílo (URS + koeficient 1,01).  
Položky podbarvené zelenou barvou jsou položky víceprací, které jsou nové a nejsou součástí zasmulvněného položkového rozpočtu k SoD. Pro ocenění byla použita metodika dle bodu 6.5 smlouvy o dílo (cena v místě a čase obvyklá).

## Schvalovací list vzorku (vzorkovací protokol)

Akce: Výstavba konsolidovaných laboratoří a Transfúzního oddělení v Oblastní nemocnici Trutnov a. s. III.

Část: 1. EATAPA OLMÍ

Název: **LÉKAŘSKÉ TECHNOLOGIE - PRACOVNÍ STOLY**

SLV č.: **80**

**Žádáme, dle čl. 8.1.9 smlouvy o dílo, o schválení níže uvedeného materiálu / výrobku / provedení:**

Název materiálu /  
výrobku / provedení: **LÉKAŘSKÉ TECHNOLOGIE - PRACOVNÍ STOLY**

Popis materiálu / výrobku  
/ provedení: dle příloh výrobní dokumentace, barevnost dle barevného řešení - lamino Kronospan

*Další technické parametry a barvy dle přiložených dokladů a fotografií*

Dodavatel / výrobce: **MERCI**  
Dodávka / profese: lékařské technologie  
Místo a rozsah použití: Dle PD OLMÍ

**Přílohy:** ☒ Dokument ☐ Foto ☐ Vzorek ☐ Jiný

Cenový dopad (je-li nějaký): ano dle ZL

Časový dopad (je-li nějaký): ano

Dopad do standardu (je-li nějaký):

**Požadované datum odsouhlasení vzorku:**

### Prohlášení zhotovitele:

Použité výrobky a materiály splňují minimální standard požadované kvality a parametry specifikovaných smluvní dokumentací a splňují veškeré požadavky vyplývající z právních předpisů a technických norem.

Předložil: Michal Vojáček / Václav Zítka  
Společnost BAK – SYNER

Dne:

Podpis:

### Uživatel:

Schválil: Petr Kozák  
ONT

Dne:

Podpis:

### Technický dozor stavebníka:

Ověřil: Lukáš Oma  
ERV

Dne:

Podpis:

### Autorský dozor:

Schválil: Viktor Šlapal  
PENTA

Dne:

Podpis:

### Zástupce investora:

Schválil: Libor Žilka  
Královéhradecký kraj

Dne:

Podpis:

### Zástupce investora:

Schválil: Jiří Strnad  
Královéhradecký kraj

Dne:

Podpis:

### Distribuce:

☐

Investor

☐

TDS

☐

Autorský dozor

☐

Uživatel

☐

Zhotovitel

Název standardu

Linka pracovní

Číslo standardu

3  
260015  
OL 328

Rozměry: šířka x hloubka x výška

1300 x 700 x 900 mm

Popis:

Skříňka výlevková	640 x 570 / 870 mm	2 ks
Deska pracovní	1300 x 700 / 35 mm	1 ks
Výlevka	470 x 470 / 265 mm	2 ks
Baterie		2 ks

Skříňka (pod pracovní desku laboratorního stolu) bude vyrobena z laminovaných dřevotřískových desek (DTD L). Korpus vyroben z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), olepených ABS hranou min. tloušťky 0,5 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná dřevotřísková deska.

Přední plochy (dvěře, čela) vyrobeny z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), po obvodě olepeny hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm.


Dvěře zavěšeny na 2 kusech niklových samo dovíracích závěsech s integrovaným tlumením, odnímatelných bez šroubování, seřízení dveří na korpusu musí být bez demontáže nosných šroubů v boku korpusu s ohledem na pevnost a dlouhou životnost (stavitelné montážní podložky, ramínka závěsu, atd.). Úhel otevření dveří min. 110°. Pravoúhlost a počet dveří viz. vyobrazení. Úchytka skříňky kovová s povrchovou úpravou (broušený nerez matný), západné provedení obdélníkového tvaru bez ostrých hran, znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání. Dvěře a čela vybaveny integrovanými tlumiči dorazů.

Zámek nábytkový se závorou pro výměnnou cylindrickou vložku osazenou zeřetězu pro vnitřní montáž na dveře či zásuvku. Zámek musí umožňovat pravolevé provedení montáže. Povrchová úprava niklovaná. Zámkovou vložku musí jít vyjmout, pokud je zámek v odjistěné (nezamčené) poloze, pomocí demontážního klíče. Zámky musí poskytovat maximální flexibilitu. Jednoduchá výměna zamykacích vložek musí umožňovat použití zamykacích plánů pro uspořádání (organizaci) uzamykaných celků s hlavními klíči. Součástí zámku musí být minimálně 2 klíče a protíplech. Výškové stavitelné plastové nožky skříňek musí být překryty soklem materiálového provedení plast s kovovým vzhledem a těsnící silikonovou lištou pro snadné ukližení (sokl slouží k zakrytování spodních prostor skříňek). Rozměry soklu odpovídají výšce nožek nábytku.

Skříňka výlevková s přípravou pro montáž kameninové výlevky a přívodu médií, skříňka bude bez zad a částí dna pro přívod a odvod médií, přední horní čelo pro zakrytí výlevky. Prostor skříňky pod výlevkou bez police využitelný jako odkládací.

Povrch pracovní desky tvořen z jednolitě kvalitní vypalované keramické desky s vysokou chemickou i tepelnou odolností. Glazura bude mít velmi dobrou odolnost proti oděru a nárazu a snadnou čistitelnost. Deska má jednolitý zaoblený okraj ze třech stran a zadní zvýšený okraj.

Kameninová výlevka (vnitřní 380x380/250) podlepená bude z vnitřní strany pokryta šedou glazurou s odolností vůči kyselinám, zásadám, abrazi (kromě kyseliny fluorovodíkové a silným alkáliím při vysokých teplotách). Součástí výlevky bude srovnávací chemicky odolného plastu a zátky.

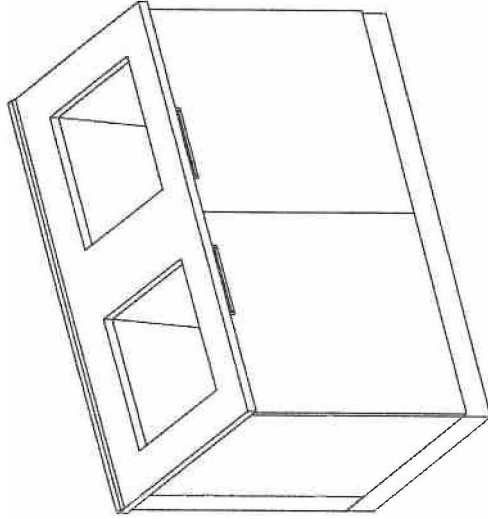

Vyobrazení:



Název standardu

Číslo standardu

5  
260020  
OL 330

## Linka pracovní

Rozměry: šířka x hloubka x výška

4820 x 620 x 900 mm

Popis:

Konstrukce	1200 x 545 / 870 mm	2 ks
Skříňka otevřená	900 x 550 / 870 mm	1 ks
Skříňka výlepková	750 x 570 / 870 mm	1 ks
Skříňka instalační	750 x 570 / 870 mm	1 ks
Doměr		2 ks
Deska pracovní	4820 x 620 / 35 mm	1 ks
Výlečka	595 x 445 / 265 mm	1 ks
Umyvadlo	550 x 380 / 175 mm	1 ks
Skříňka nástěnná otevřená	1000 x 370 / 300 mm	1 ks
Skříňka nástěnná otevřená	900 x 350 / 600 mm	1 ks
Skříňka nástěnná dveřová	750 x 370 / 600 mm	2 ks

Konstrukce montovaná (pod pracovní desku laboratorního stolu) vyrobená z ocelového profilu 30x30 mm. Pevnost a stabilita konstrukce zajištěna svařenými bočnicemi a horními, spodními spojovacími výšy. Povrchová úprava provedena elektrostaticky naneseným epoxidovým vypalovacím emálem.

Konstrukce opatřena výškově stavitelnými nožkami pro vyrovnání nerovnosti podlahy.

Nosnost konstrukce 150 kg.


Skříňka (pod pracovní desku laboratorního stolu) bude vyrobená z laminovaných dřevotřískových desek (DTD L). Korpus vyroben z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), oplepených ABS hranou min. tloušťky 0,5 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná dřevotřísková deska.

Přední plochy (dveře, čela) vyrobeny z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), po obvodu oplepeny hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm.

Dveře zavěšeny na 2 kusech niklových samo dovíracích závěsech s integrovaným tlumením, odnímatelných bez šroubování, seřízení dveří na korpusu musí být bez demontáže nosných šroubů v boku korpusu s ohledem na pevnost a dlouhou životnost (stavitelné montážní podložky, ramínka závěsu, atd.). Úhel otevření dveří min. 110°. Pravoúhlost a počet dveří viz. vyobrazení. Úchytka skříňky kovová s povrchovou úpravou (broušený nerez matný), zápusťné provedení obdélníkového tvaru bez ostrých hran, zneumožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání. Dveře a čela vybaveny integrovanými tlumiči dorazů.

Zámek nábytkový se závorou pro výměnnou cylindrickou vložku osazenou západou pro vnitřní montáž na dveře či zásuvku. Zámek musí umožňovat pravolevé provedení montáže. Povrchová úprava niklovaná. Zámkovou vložku musí jít vyjmout, pokud je zámek v odjištěné (nezamčené) poloze, pomocí demontážního klíče. Zámky musí poskytovat maximální flexibilitu. Jednoduchá výměna zamykacích vložek musí umožňovat použití zamykacích plánů pro uspořádání (organizaci) uzamykaných celků s hlavním klíčem. Součástí zámku musí být minimálně 2 klíče a protiplech. Výškové stavitelné plastové nožky musí být překryty soklem materiálového provedení plast s kovovým vzhledem a těsnící silikonovou lištou pro snadné uklizení (sokl slouží k zakrytí spodních prostor skříňky). Rozměry soklu odpovídají výšce nožek nábytku.

Skříňka otevřená uvnitř vybavena 2 stavitelnými policemi z DTD L tloušťky 18 mm osazená.

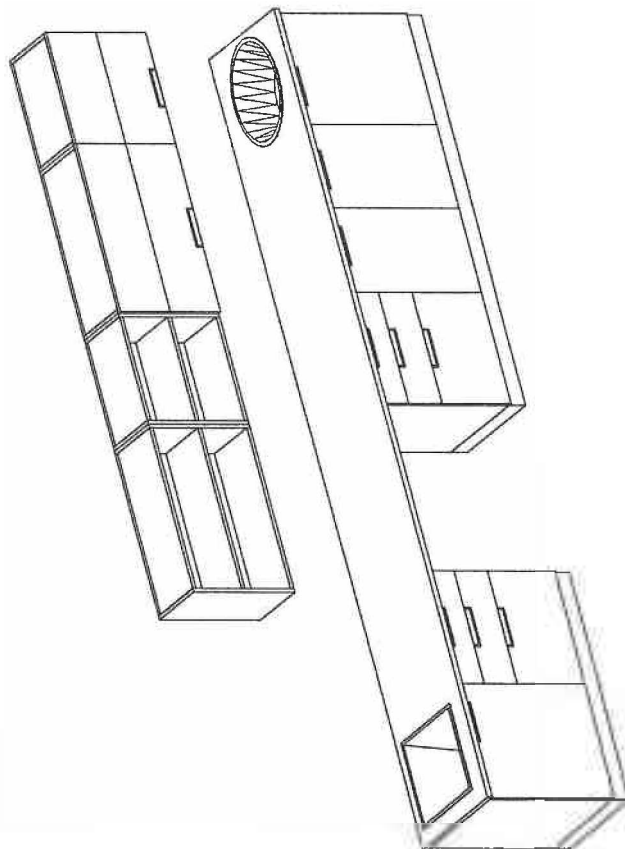

Wyobrazenie

Název standardu

Číslo standardu

Linka pracovní

6A  
260046  
OL 120

Rozměry: šířka x hloubka x výška

1460 x 800 x 900 mm

Popis:

Skříňka zásuvková	600 x 570 / 870 mm	1 ks
Skříňka vylevková	850 x 570 / 870 mm	1 ks
Doměr		2 ks
Deska pracovní	1460 x 800 / 35 mm	1 ks
Výlevka	445 x 445 / 265 mm	1 ks
Skříňka nástěnná dveřová	600 x 350 / 370 mm	1 ks
Skříňka nástěnná dveřová	850 x 350 / 370 mm	1 ks

Skříňka (pod pracovní desku laboratorního stolu) bude vyrobena z laminovaných dřevotřískových desek (DTD L). Korpus vyroben z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), olepených ABS hranou min. tloušťky 0,5 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná dřevoláknitá deska.

Přední plochy (dveře, čela) vyrobeny z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), po obvodě olepeny hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm.

Dveře zavěšeny na 2 kusech niklových samo dovíracích závěsech s integrovaným tlumením, odnímatelných bez šroubování, seřízení dveří na korpusu musí být bez demontáže nosných šroubů v boku korpusu s ohledem na pevnost a dlouhou životnost (stavitelné montážní podložky, ramínka závěsu, atd.). Úhel otevření dveří min. 110°. Pravolevost a počet dveří viz. vyobrazení. Konstrukce zásuvky tvořena s ohledem na vysokou pevnost a stranovou tuhost z kovových dvouplášťových boků zásuvky povrchově upravených šedým lakem, které nese skrytá výsuvná lišta s plným výsuvem zásuvky z korpusu skříňky a bude vybavena samo dovíracím a tlumením dorazu s min. nosností 30 kg. Čelo zásuvky vybaveno dostatečnou stranovou i výškovou rektifikací. Dno a záda zásuvky vyrobena z DTD L 16 mm šedé barvy.

Úchytky skříňky kovová s povrchovou úpravou (broušený nerez matný), zápuskné provedení obdélníkového tvaru bez ostrých hran, znemožňující zachytávání odvě a zajišťující intuitivní otevírání. Dveře a čela vybaveny integrovanými tlumiči dorazů.

Zámek nábytkový se závorou pro výměnou cylindrickou vložku osazenou zepředu pro vnitřní montáž na dveře či zásuvku. Zámek musí umožňovat pravolevé provedení montáže. Povrchová úprava niklovaná. Zámkovou vložku musí jít vyjmout, pokud je zámek v odjištěné (nezamčené) poloze, pomocí demontážního klíče. Zámky musí poskytovat maximální flexibilitu. Jednoduchá výměna zamykacích vložek musí umožňovat použití zamykacích plánů pro uspořádání (organizaci) uzamýkaných celků s hlavním klíčem. Součástí zámků musí být minimálně 2 klíče a protíplech. Výškově stavitelné plastové nožky skříňek musí být překryty soklem materiálového provedení plast s kovovým vzhledem a těsnící silikonovou lištou pro snadné uklízení (sokl slouží k zakrytování spodních prostor skříňek). Rozměry soklu odpovídají výšce nožek nábytku.

Skříňka zásuvková se třemi zásuvkami (2x mělká, 1x hluboká).

Skříňka vylevková s přípravou pro montáž kameninové výlevky a přívodu médií, skříňka bude bez zad a části dna pro přívod a odvod médií, přední horní čelo pro zakrytí výlevky. Prostor skříňky pod výlevkou bez police využitelný jako odkládací.

Doměr z laminované dřevotřískové desky (DTD L) tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), olepených ABS hranou min. tloušťky 0,5 mm.

Doměr slouží k zakrytování otvorů vzniklých kolem skříňek při instalaci u zdí, ve výklencích či vzájemně proti sobě. Rozměry doměru odpovídají mezere vzniklé po finální instalaci nábytku.

Povrch pracovní desky z vysokotlakého laminátu tl. 18 mm s horním i spodním rádiusem 3 mm. Teplotní odolnost do 180°C, chemická a mechanická odolnost.

Kameninová výlevka (vnitřní 380x380/250) bude z vnitřní strany pokryta šedou glazurou s odolností vůči kyselinám, zásadám, abrazí (kromě kyseliny fluorovodíkové a silným alkalickým při vysokých teplotách). Součástí výlevky bude sifon z chemicky odolného plastu a zátky.

Zábrana na zadní stranu pracovní desky stolu - přesah 5 cm nad desku z vysokotlakého laminátu tl. 4 mm.

Skříňka nástěnná vyrobena z laminovaných dřevotřískových desek (DTD L). Korpus bude vyroben z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), olepených ABS hranou min. tloušťky 0,5 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná dřevoláknitá deska.

Dveře zavěšeny na výklonných závěsech s integrovaným tlumením.


Úchytky skříňky kovová s povrchovou úpravou (chrom), tvarem zaoblená bez ostrých hran, znemožňující zachytávání odvě a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 160 mm.

Dveře vybaveny integrovanými tlumiči dorazů a zámekem.

Skříňka dveřová s prosklenými výklopnými dveřmi v hliníkovém rámu, uvnitř 1 stavitelná police z DTD L tloušťky 18 mm osazená podpěrkami bránících vysunutí.

Na bocích závěsy pro uchycení na zeď (min. nosnost 50kg/kus).

Vyobrazení:

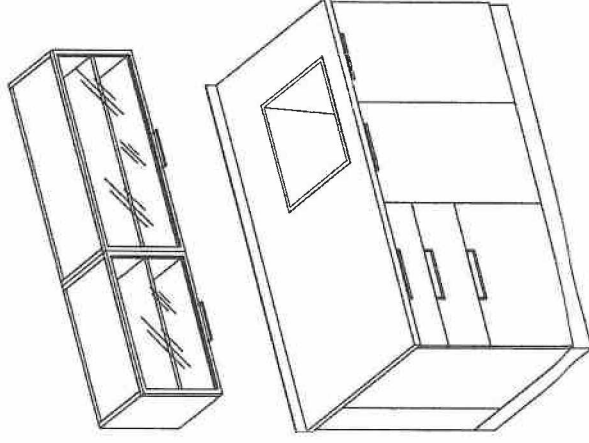



Název standardu

Číslo standardu

## Linka pracovní

11A  
420003  
OL 107

Rozměry: šířka x hloubka x výška

2010 x 600 x 900 mm

Popis:

Skříňka zásuvková	800 x 570 / 870 mm	1 ks
Skříňka výlevková	600 x 570 / 870 mm	1 ks
Skříňka instalační	600 x 570 / 870 mm	1 ks
Deska pracovní	2010 x 600 / 35 mm	1 ks
Výlevka	445 x 445 / 265 mm	1 ks
Umyvadlo	550 x 380 / 175 mm	1 ks
Skříňka nástěnná dveřová	800 x 350 / 600 mm	1 ks
Skříňka nástěnná dveřová	600 x 350 / 600 mm	2 ks

Skříňka (pod pracovní desku laboratorního stolu) bude vyrobena z laminovaných dřevotřískových desek (DTD L). Korpus vyroben z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), oplepených ABS hranou min. tloušťky 0,5 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná dřevotřísková deska.

Přední plochy (dveře, čela) vyrobeny z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), po obvodě oplepeny hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm.

Dveře zavěšeny na 2 kusech niklových samo dovíracích závěsích s integrovaným tlumením, odhmatelných bez šroubování, seřízení dveří na korpusu musí být bez demontáže nosných šroubů v boku korpusu s ohledem na pevnost a dlouhou životnost (stavitelné montážní podložky, ramínka závěsu, atd.). Uhel otevíření dveří min. 110°. Pravolevost a počet dveří viz. vyobrazení. Uchytka skříňky kovová s povrchovou úpravou (broušený nerez matný), zápusťné provedení obdélníkového tvaru bez ostrých hran, znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání. Dveře a čela vybaveny integrovanými tlumiči dorazů.


Zámek nábytkový se závorou pro výměnnou cylindrickou vložku osazenou zepředu pro vnitřní montáž na dveře či zásuvku. Zámek musí umožňovat pravolevé provedení montáže. Povrchová úprava niklovaná. Zámkovou vložku musí jít vyjmout, pokud je zámek v odjištěné (nezamčené) poloze, pomocí demontážního klíče. Zámky musí poskytovat maximální flexibilitu. Jednoduchá výměna zamykacích vložek musí umožňovat použití zamykacích plánů pro uspořádání (organizaci) uzamykaných celků s hlavními klíči. Součástí zámku musí být minimálně 2 klíče a protipech. Výškově stavitelné plastové nožky skříňek musí být překryty soklem materiálového provedení plast s kovovým vzhledem a těsnící silikonovou lištou pro snadné uklizení (sokl slouží k zakrytí spodních prostor skříňek). Rozměry soklu odpovídají výšce nožek nábytku.

Skříňka zásuvková se třemi zásuvkami (2x mělká, 1x hluboká).

Skříňka výlevková s přípravou pro montáž kameninové výlevky a přívodu médií, skříňka bude bez zad a části dna pro přívod a odvod médií, přední horní čelo pro zakrytí výlevky. Prostor skříňky pod výlevkou bez police využitelný jako odkládací.

Skříňka instalační s přípravou pro montáž dřezu nebo umyvadla a přívodu médií, skříňka bude bez zad (pouze horní vlys) a části dna pro přívod a odvod médií, přední horní čelo pro zakrytí dřezu nebo umyvadla. Prostor skříňky pod dřezem nebo umyvadlem bez police využitelný jako odkládací.

Výrobek pracovní desky z syntetického laminátu tl. 18 mm a horním i spodním rádiusem 3 mm. Teplotní odolnost do 180°C, chemická a mechanická odolnost.

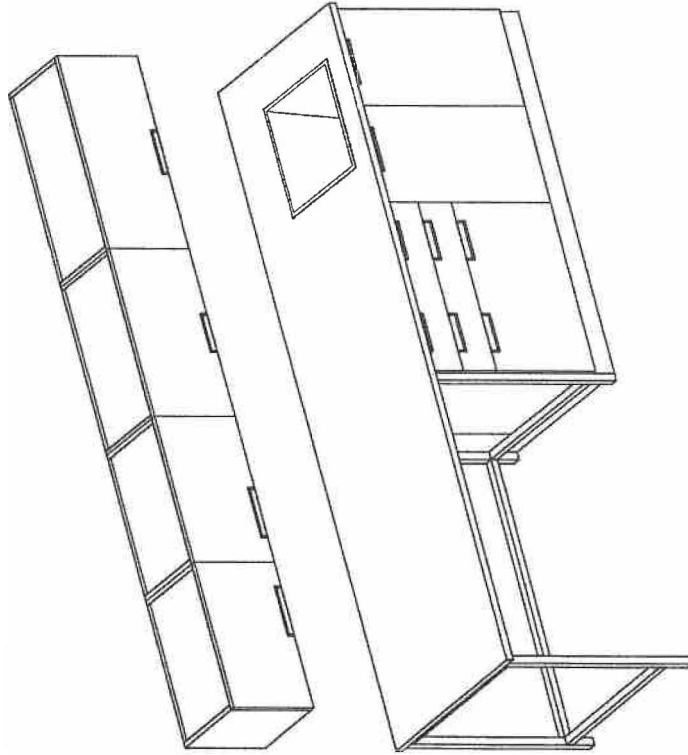

Výrobek pracovní



Keramické oválné umyvadlo z vnitřní strany pokryto bílou glazurou s přepadovým otvorem, z jednoho kusu pro zabudování do pracovní desky. Součástí umyvadla bude sifon z plastu a zátky.

Nerezový dřez lisovaný z potravinářského nerez AISI 304 s odkládací plochou, pro zabudování na pracovní desku. Součástí dřezu musí být odpadní sifon se zápachovou uzávěrou a zátkou.

Skříňka nástěnná vyrobená z laminovaných dřevotřískových desek (DTD L). Korpus bude vyroben z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), oplepených ABS hranou min. tloušťky 0,5 mm. Žádá skříňku jednostranně lakovanou dřevotřískátá deska.


Přední plochy (dvěře) vyrobeny z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), po obvodě oplepeny hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm.

Dveře zavěšeny na výklopných závěsech s integrovaným tlumením.

Učnicka skříňka kovová s povrchovou úpravou (broušený nerez matný), zápusťné provedení obdélníkovitého tvaru bez ostrých hran, znemožňující zachycování oděvů a zajišťující intuitivní otevírání. Dveře vbařeny integrovanými tlumiči dorazů a zámkem.

Skříňka dveřová s plnými výklopnými dveřmi, uvnitř 1 stavitelná police z DTD L tloušťky 18 mm osazena podběrkami bránících vysunutí.

Na bocích závěšy pro uchycení na zeď" (min. nosnost 50kg/kus).

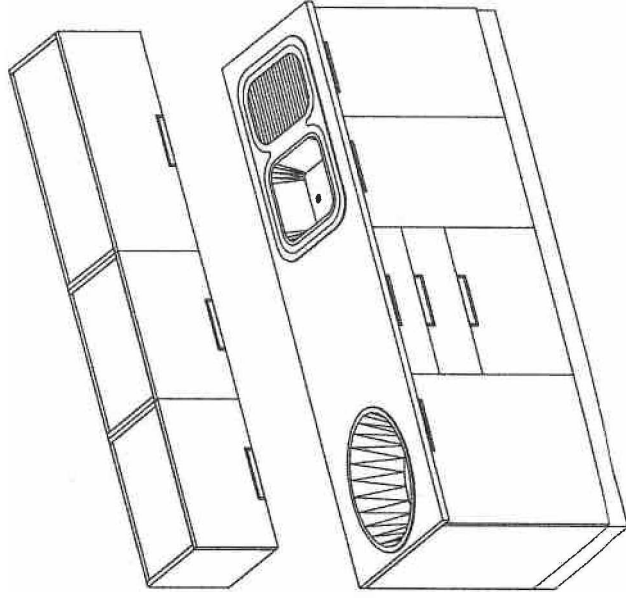

Název standardu

Číslo standardu

# Linka pracovní

13  
420005  
OL 116

Rozměry: šířka x hloubka x výška

3020 x 600 x 900 mm

Podis:

Skrínka instalační	800 x 570 / 870 mm	1 ks
Skrínka vylevková	800 x 570 / 870 mm	1 ks
Skrínka zasuvková	600 x 570 / 870 mm	1 ks
Skrínka dveřová	800 x 570 / 870 mm	1 ks
Deska pracovní	3020 x 600 / 35 mm	1 ks
Umyvadlo	550 x 380 / 175 mm	1 ks
Vylevka	445 x 445 / 265 mm	1 ks
Skrínka nástěnná dveřová	800 x 350 / 370 mm	3 ks
Skrínka nástěnná otevřená	600 x 330 / 370 mm	1 ks

Název standardu

Číslo standardu

Linka pracovní

14  
42JD34  
OL 309

Rozměry: šířka x hloubka x výška

1810 x 600 x 900 mm

Popis:

Skříňka dveřová	600 x 570 / 870 mm	1 ks
Skříňka zásuvková	600 x 570 / 870 mm	1 ks
Skříňka instalační	600 x 570 / 870 mm	1 ks
Deska pracovní	1810 x 600 / 38 mm	1 ks
Lišta		1 ks
Dřez	480 x 415 / 180 mm	1 ks
Skříňka nástěnná kombinovaná	600 x 350 / 600 mm	1 ks
Skříňka nástěnná dveřová	600 x 350 / 600 mm	2 ks

Skříňka (pod pracovní desku laboratorního stolu) bude vyrobena z laminovaných dřevotřískových desek (DTD L). Korpus vyroben z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), olepených ABS hranou min. tloušťky 0,5 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná dřevoláknitá deska.

Přední plochy (dveře, čela) vyrobeny z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), po obvodě olepeny hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm.

Dveře zavěšeny na 2 kusech niklových samo dovíracích závěsech s integrovaným tlumením, odhmatelných bez šroubování, seřízení dveří na korpusu musí být bez demontáže nosných šroubů v boku korpusu s ohledem na pevnost a dlouhou životnost (stavitelné montážní podložky, ramínka závěsu, atd.). Úhel otevření dveří min. 110°. Pravevolest a počet dveří viz. vyobrazení. Úchytka skříňky kovová s povrchovou úpravou (broušený nerez matný), zápusné provedení obdélíkového tvaru bez ostrých hran, znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání. Dveře a čela vybaveny integrovanými tlumiči dorazů.

Zámek nábytkový se závorou pro výměnnou cylindrickou vložku osazenou zepředu pro vnitřní montáž na dveře či zásuvku. Zámek musí umožňovat pravolevé provedení montáže. Povrchová úprava niklovaná. Zámkovou vložku musí jít vyjmout, pokud je zámek v odjištěné (nezamčené) poloze, pomocí demontážního klíče. Zámky musí poskytovat maximální flexibilitu. Jednoduchá výměna zamykacích vložek musí umožňovat použití zamykacích plánů pro uspořádání (organizaci) uzamykaných celků s hlavním klíčem. Součástí zámku musí být minimálně 2 klíče a protiplech. Výškové stavitelné plastové nožky skříňek musí být překryty soklem materiálového provedení plast s kovovým vzhledem a těsnící silikonovou lištou pro snadné uklizení (sokl slouží k zakrytování spodních prostor skříňek). Rozměry soklu odpovídají výšce nožek nábytku.

Skříňka dveřová s falešným čelem pro zabudování varné desky, uvnitř vybavena 1 stavitelnou police z DTD L tloušťky 18 mm osazená podpěrkami bránících vysunutí.

Skříňka zásuvková se třemi zásuvkami (2x mělká, 1x hluboká).

Skříňka instalační s přípravou pro montáž dřezu nebo umyvadla a přívodu medií, skříňka bude bez zad (pouze horní výs) a části dna pro přívod a odvod medií, přední horní čelo pro zakryví dřezu nebo umyvadla. Prostor skříňky pod dřezem nebo umyvadlem bez police využitelný jako odkládací.

Pracovní deska tvořena jádrem z dřevotřískové desky potažené fólií z vysokotlakovým laminátem (HPL fólií), přední horní i spodní hrana plynuče jako lepen - postřik mrg. Deska odolná teplotě do 150°C, krátkodobě 250°C.

Lišta kuchyňská pro přichycení mezi pracovní desku a zeď.

Nerezový dřez lisovaný z potravinářského nerez AISI 304, pro zabudování na pracovní desku. Součástí dřezu musí být odpadní sifon se zápachovou uzávěrou a zátkou.

Skříňka nástěnná vyrobena z laminovaných dřevotřískových desek (DTD L). Korpus bude vyroben z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), olepených ABS hranou min. tloušťky 0,5 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná dřevoláknitá deska.

Přední plochy (dveře) vyrobeny z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), po obvodě olepeny hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm.

Dveře zavěšeny na výklopných závěsech s integrovaným tlumením.

Úchytka skříňky kovová s povrchovou úpravou (broušený nerez matný), zápusné provedení obdélíkového tvaru bez ostrých hran, znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání. Dveře vybaveny integrovanými tlumiči dorazů a zámek.

Skříňka kombinovaná s horními plnými výklopnými dveřmi, uvnitř 1 stavitelná police z DTD L tloušťky 18 mm osazená podpěrkami bránících vysunutí a spodní otevřenou nikou bez zad.

Skříňka dveřová se skládáním plnými výklopnými dveřmi, uvnitř 1 stavitelná police z DTD L tloušťky 18 mm osazená podpěrkami bránících vysunutí.

Na bocích závěsy pro uchycení na zeď (min. nosnost 50kg/kus).

Spotřebiče:

Deska varná vestavná

- Otočné ovládací knoflíky
- Hlavní barva: Černá Instalace Independent Instalace
- Vestavěný spotřebič
- Typ výrobku elektrická varná deska
- Materiál ovládacího panelu: Sklo
- Střední zóna vpředu - výkon/průměr 1200W/145mm
- Střední zóna vzadu - výkon/průměr 1700W/180mm
- Max. příkon 2900 W
- Typ ohřevu desky: Sklokeramická sálavá
- Frekvence 50 Hz
- Napájecí napětí 230 V
- Šířka 290 mm, hloubka 520 mm, vestavná výška 41 mm
- Šířka výřezu (mm) 270 Hloubka výřezu (mm) 490 Radius výřezu (mm) 0
- Čistá hmotnost 3,8 kg, hmotnost včetně obalu 4,2 kg

Trouba mikrovlnná:

- Barva: Nerez ocel
- Barva vnitřku trouby: Tmavě modrá
- Systém tepelné úpravy: Mikrovlny/Gril
- Vnitřní objem 18.7 l
- Příkon 1300 W
- Mikrovlnný výkon 800 W
- Počet výkonových stupňů pro mikrovlnný ohřev: 5
- Počet výkonových stupňů grilu: 1
- Materiál vnitřku trouby: Lakovaná ocel
- Osvětlení vnitřku trouby 20 W
- Barva ovladačů: Feritová
- Výkon grilu 1000 W
- Šířka 461 mm, hloubka 367 mm, výška 280 mm
- Čistá hmotnost (kg) 13.1




Skříňka nástěnná výrobená z laminovaných dřevotřískových desek (DTD L). Korpus bude vyroben z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), olepených ABS hranou min. tloušťky 0,5 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná dřevotřísková deska. Přední plochy (dveře) vyrobeny z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), po obvodě olepeny hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm.

Dveře zavěšeny na výklopných závěsech s integrovaným tlumením. Úchytka skříňky kovová s povrchovou úpravou (broušený nerez matný), zápusné provedení obdélníkového tvaru bez ostrých hran, znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání. Dveře vybaveny integrovanými tlumiči dorazů a zámkem.

Skříňka dveřová se skládá z plnými výklopnými dveřmi, uvnitř 1 stavitelná police z DTD L tloušťky 18 mm osazena podpěrkami bránících vysunutí.

Na bocích závěsy pro uchycení na zeď (min. nosnost 50kg/kus).

Vyobrazení:



Název standardu

Linka pracovní

Číslo standardu

16  
460085  
OL 104

Rozměry: šířka x hloubka x výška

1010 x 600 x 900 mm

Popis:

Skříňka instalační	600 x 570 / 870 mm	1 ks
Skříňka instalační	400 x 570 / 870 mm	1 ks
Deska pracovní	1010 x 600 / 35 mm	1 ks
Umyvadlo	550 x 380 / 175 mm	1 ks
Dřez	350 x 415 / 180 mm	1 ks
Skříňka nástěnná dveřová	1000 x 350 / 600 mm	1 ks

Skříňka (pod pracovní desku laboratorního stolu) bude vyrobená z laminovaných dřevotřískových desek (DTD L). Korpus vyroben z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), olepených ABS hranou min. tloušťky 0,5 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná dřevotřísková deska.

Přední plochy (dveře, čela) vyrobeny z DTD L tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), po obvodě olepeny hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm.

Dveře zavěšeny na 2 kusech niklových samo dovíracích závěsech s integrovaným tlumením, odnímatelných bez šroubování, seřízení dveří na korpusu musí být bez demontáže nosných šroubů v boku korpusu s ohledem na pevnost a dlouhou životnost (stavitelné montážní podložky, ramínka závěsů, atd.). Úhel otevírání dveří min. 110°. Pravevost a počet dveří viz. vyobrazení. Úchytka skříňky kovová s povrchovou úpravou (broušený nerez matný), zápusné provedení obdélníkového tvaru bez ostrých hran, znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání. Dveře a čela vybaveny integrovanými tlumiči dorazů.

Zámek nábytkový se závorou pro výměnnou cylindrickou vložku osazenou zeředu pro vnitřní montáž na dveře či zásuvku. Zámek musí umožňovat pravolevé provedení montáže. Povrchová úprava niklování. Zámek musí jít vyjmout, pokud je zámek v odlišné (nezamčené) poloze, pomocí demontážního klíče. Zámky musí poskytovat maximální flexibilitu. Jednoduchá výměna zamykacích vložek musí umožňovat použití zamykacích plánů pro uspořádání (organizaci) uzamykaných celků s hlavním klíčem. Součástí zámku musí být minimálně 2 klíče a protíplech. Výškově stavitelné plastové nožky skříňky musí být překryty soklem materiálového provedení plast s kovovým vzhledem a těsnící silikonovou lištou pro snadné uklizení (sokl slouží k zakrytí spodního prostoru skříňky). Rozměry soklu odpovídají výšce nožek nábytku.

Skříňka instalační s přípravou pro montáž dřezu nebo umyvadla a přívodu médií, skříňka bude bez zad (pouze horní výs) a části dna pro přívod a odvod médií, přední horní čelo pro zakrytí dřezu nebo umyvadla. Prostor skříňky pod dřezem nebo umyvadlem bez police využitelný jako odkládací.

Povrch pracovní desky z vysokotlakého laminátu tl. 18 mm s horním i spodním rádiusem 3 mm. Teplotní odolnost do 180°C, chemická a mechanická odolnost.

Keramické oválné umyvadlo z vnitřní strany pokryto bílou glazurou s přepadovým otvorem, z jednoho kusu pro zabudování do pracovní desky. Součástí umyvadla bude sifon z plastu a zátky.

Nerezový dřez lisovaný z pobravinářského nerez AISI 304, pro zabudování na pracovní desku. Součástí dřezu musí být odpadní sifon se západovou uzávěrou a zátkou.

Seznam změn:

- 3 260015 – zkrácení stolu
- 4 260018 – doplnění nástěnných skříněk, záměna výklopů za standardní panty
- 5 260020 – doplnění nástěnných skříněk
- 6a 260046 – záměna nástěnných skříněk s plnými dveřmi za prosklené, výklopy
- 6b 260042 – výklopy
- 11a 420003 – výklopy
- 12a 420004 – odstraněna 1 úchytka
- 13 420005 – beze změny
- 14 42JD34 – výklopy
- 15 42UH01 – výklopy
- 16 460085 – záměna nástěnných skříněk, výklopy

# **DODAVATELSKÉ CENOVÉ NABÍDKY**

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfúzní oddělení - OLMI

Objekt:

D2\_51 - Lékařská technologie - pevně spojené ze staveb

KSO:

Místo: Trutnov

Zadávatel:

Uchazeč:

MERCI, S.R.O.

Projektant:

Atelier Penta v.o.s. - Mrštíkova 12, Jihlava

Zpracovatel:

Myslíková Hana

Poznámka:

CC-CZ

Datum: 05.06.2020

JČ

DIČ

JČ

DIČ

JČ

DIČ

JČ

DIČ

Cena bez DPH

575 442,00

DPH základní  
snížené

#ODKAZ!

#ODKAZ!

Základ daně

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

120 842,62

0,00

Cena s DPH

v CZK

696 284,82



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfúzní oddělení - OI MI  
Objekt: D2\_51 - Lékařská technologie - pevně spojené ze stavbou  
Místo: Trutnov  
Zadávatel:  
Uchazeč: MERCI, S.R.O.

Datum:  
Projektant: Atelier Petla v.o.s.,  
Mrtkova 12, Jihlava  
Zpracovatel: Musilová Hana

Kód dílu - Popis: celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 575 442,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba

Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfúzní oddělení - OLMI

Objekt:

D2\_51 - Lékařská technologie - pevné spojené ze stavbou

Místo:

Trutnov

Datum:

Zadavatel:

Projektant: Ate'er Praha v.o.s.  
Mlýnská 12 Jihlava

Uchazeč:

MERCÍ, S.R.O.

Zpracovatel:

Musilová Hana

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>575 442,00</b>	
3	K	260015	linka pracovní vč. dřez kamenina, 2x baterie, pracovní deska kamenina, dolní skříňky, prostor pro myčku	ks	1,000	54 579,00	54 579,00	
	VV		2000/700/900 mm					
	VV		Příloha č. 1					
	VV		pracovní deska kamenina se zvýšeným zadním okrajem					
	VV		2x dřez kamenin					
	VV		2x skříňka dřezová dvířková					
	VV		prostor pro podstavcovou myčku laboratorního skla					
	VV		1		1,000			
4	K	260016	linka laboratorní vč. keramického dřezu a umyvadla, dolní skříňky	ks	1,000	78 776,00	78 776,00	
	VV		4200 mm					
	VV		Příloha č. 1					
	VV		pracovní deska kompak, hladký povrch					
	VV		dřez, umyvadlo - keramické					
	VV		2x skříňka 2-dveřová (pro dřez a umyvadlo)					
	VV		2x skříňka pevná 3-zásuvková					
	VV		2x skříňka policová 2-dveřová					
	VV		1		1,000			
5	K	260020	stl. laboratorní vč. dřezu, umyvadla, 2x baterie, dolní skříňky, police pro PC, askánu	ks	1,000	80 595,00	80 595,00	
	VV		4800/800/800 mm					
	VV		Příloha č. 1					
	VV		pracovní deska kompak, hladký povrch					
	VV		1x dřez kamenina					
	VV		1x umyvadlo kamenina					
	VV		2x baterie (dodávka STAVBA)					
	VV		2x dolní skříňka 2-dveřová pro dřez a umyvadlo					
	VV		1x skříňka policová otevřená (pro PC a askánu)					
	VV		1		1,000			
6	K	260046	stl. laboratorní - dřez, umyvadlo, pracovní deska - kamenina, 2x baterie, dolní skříňky	ks	2,000	73 148,00	146 296,00	
	VV		2100/700/900 mm					
	VV		Příloha č. 1					
	VV		pracovní deska kamenina se zadním zvýšeným okrajem					
	VV		dřez kamenina					
	VV		umyvadlo kamenina					
	VV		2x baterie (dodávka STAVBA)					
	VV		skříňka dvířková pro dřez					
	VV		skříňka dvířková pro umyvadlo					
	VV		skříňka 3-zásuvková					
	VV		2		2,000			
7	K	378000	hodiny spínací a součtové pro germicidní zařízení, programovatelné	ks	1,000	1 664,00		
	VV		spínací a součtové hodiny					
	VV		evidence odsávacích hodin germicidního zářivce					
	VV		provedení na stěnu					
	VV		programovatelné					
	VV		krytí IP 65					
	VV		1		1,000			
8	K	378010	zářiv. germicidní (televizní přímé záření, stropní provedení)	ks	2,000	6 958,00		
	VV		germicidní zářiv. s přímým účinkem					
	VV		stropní provedení					
	VV		ú					
	VV		výkon 55 W					
	VV		krytí IP 65					
	VV		2		2,000			
11	K	420003	linka pracovní vč. umyvadla a dřezu, dolní + horní skříňky	ks	1,000	64 248,00	64 248,00	
	VV		4800 mm					
	VV		Příloha č. 1					
	VV		pracovní deska kompak, hladký povrch					
	VV		umyvadlo keramické					
	VV		dřez keramický					
	VV		skříňka dolní pro umyvadlo 2-dvířková (š. 800 mm)					
	VV		skříňka dolní pro dřez 2-dvířková (š. 800 mm)					
	VV		2x skříňka dolní zásuvková (3x zásuvka) š. cca 800 mm					
	VV		1x skříňka dolní policová otevřená					
	VV		2x dolní skříňka policová 2-dveřová (š. cca 800 mm)					
	VV		skříňky nástěnné policové dvířkové					
	VV		2x skříňka nástěnná policová otevřená (š. cca 800 mm)					
	VV		1		1,000			
12	K	420004	linka pracovní rohová vč. umyvadla a dřezu, dolní + horní skříňky	ks	1,000	20 565,00	20 565,00	
	VV		1000 + 1200 mm					
	VV		Příloha č. 1					
	VV		pracovní deska kompak, hladký povrch					
	VV		umyvadlo keramické					
	VV		dřez keramický					
	VV		skříňka pro dřez dvířková					
	VV		skříňka pro umyvadlo dvířková					
	VV		2x nástěnná skříňka (1 police) otevřená					
	VV		1		1,000			
13	K	420005	linka pracovní vč. umyvadla a dřezu, dolní + horní skříňky	ks	1,000	42 143,00	42 143,00	
	VV		3000 mm					
	VV		Příloha č. 1					
	VV		pracovní deska kompak, hladký povrch					
	VV		umyvadlo keramické					
	VV		dřez keramický					
	VV		skříňka pro dřez 2-dveřová (š. cca 800 mm)					
	VV		skříňka pro umyvadlo 2-dveřová (š. cca 800 mm)					
	VV		1x skříňka 3-zásuvková (š. cca 800 mm)					
	VV		1x skříňka policová 2-dveřová (š. cca 800 mm)					
	VV		3x nástěnná skříňka policová 2-dveřová (š. cca 800 mm)					
	VV		1x nástěnná skříňka policová otevřená (š. cca 800 mm)					
	VV		1		1,000			
14	K	42JD34	linka pracovní 1-dřez, skříňky dolní+horní	ks	1,000	47 250,00	47 250,00	
	VV		1800 mm					
	VV		1		1,000			
15	K	42UH01	linka pracovní vč. umyvadla - dolní skříňka, nástěnná police	ks	1,000	14 210,00	14 210,00	
	VV		600 mm					
	VV		Příloha č. 2					
	VV		42JD34 + 42UH01 pracovní deska v celku 2400 mm (1800 + 600 mm)					
	VV		pracovní deska postforming tl. min. 35 mm vč. zadní lišty					
	VV		1x dolní skříňka pro dřez dvířková š. 600 mm					
	VV		1x dolní skříňka pro umyvadlo dvířková š. 600 mm					
	VV		1x dolní skříňka zásuvková š. cca 800 mm					
	VV		2x dolní skříňka policová 1-dveřová š. 300 mm					
	VV		nástěnná police nad umyvadlem					
	VV		nástěnné skříňky policové dvířkové					
	VV		1x nástěnná skříňka otevřená (š. 800 mm)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena smlouvy [CZK]	Cenová soustava
	vv				1,000			
16	K	460005	linka pracovní vč. umyvadla a dřezu, 2x baterie, nástěnná polička	ks	1,000	26 780,00	26 780,00	
	vv		1000 mm					
	vv		Příloha č. 1					
	vv		pracovní deska kompaktní hladký povrch					
	vv		umyvadlo keramické					
	vv		dřez keramický					
	vv		skříňka pro dřez a umyvadlo 2-dveřková					
	vv		1x nástěnná polička					
	vv		(2x baterie - dodávka stavby)					
	vv		1		1,000			

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

### Stavba

Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfúzní oddělení - OLM

### Objekt

DZ\_51 - Lékařská technologie - pevně spojené ze stavbou

### KSO

Místo: Trutnov

### Zadavatel

### Uchazeč

HELAGO-CZ, s.r.o.

### Projektant

Atelier Penia v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

### Zpracovatel

Petra Žemličková

### Poznámka

### CC-CZ

Datum: 05.06.2020

### Č

### DIČ

### IČ

### DIČ

### IČ

### DIČ

### IČ

### DIČ

Cena bez DPH

590 413,00

DPH základní

snížené

Základ daně

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

123 986,73

0,00

Cena s DPH



CZK

714 399,73

# SOUPIS PRACÍ

Stavba

Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfúzní oddělení - OLMI

Objekt

D2\_51 - Lékařská technologie - pevně spojené ze stavbou

Místní

Trutnov

Datum

Zadavatel

Projektant

Aleš Petr a.s.,  
Měšická 12, Jihlava

Uchazeč

HELAGO-CZ, s.r.o.

Zpracovatel

Petra Žemličková

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>590 413,00</b>	
3	K	260015	linka pracovní - 2x dřez kamenina, 2x baterie, pracovní deska kamenina, dolní skříňky, prostor pro myčku 2000/700/900 mm Příloha č. 1 pracovní deska kamenina se zvýšeným zadním okrajem 2x dřez kamenina 2x skříňka dřezová dvířková prostor pro podstavnou myčku laboratorního skla 1	ks	1,000	55 320,00	55 320,00	
4	K	260018	linka laboratorní vč. keramického dřezu a umyvadla, dolní skříňky 4200 mm Příloha č. 1 pracovní deska kompaktní, hladký povrch dřez, umyvadlo - keramické 2x skříňka 2-dvířková (pro dřez a umyvadlo) 2x skříňka pevná 3-zásuvková 2x skříňka policevá 2-dvířková 1	ks	1,000	90 342,00	90 342,00	
5	K	260020	stůl laboratorní vč. dřezu, umyvadla, 2x baterie, dolní skříňky, police pro PC, buklévní 4800/800/800 mm Příloha č. 1 pracovní deska kompaktní hladký povrch 1x dřez kamenina 1x umyvadlo kamenina 2x baterie (dodává STAVBA) 2x dolní skříňka 2-dvířková pro dřez a umyvadlo 1x skříňka policevá otevřená (pro PC a buklévní) 1	ks	1,000	81 976,00	81 976,00	
6	K	260046	stůl laboratorní - dřez, umyvadlo, prac. deska - kamenina, 2x baterie, dolní skříňky 2100/700/900 mm Příloha č. 1 pracovní deska kamenina se zadním zvýšením okrajem dřez kamenina umyvadlo kamenina 2x baterie (dodává STAVBA) skříňka dvířková pro dřez skříňka dvířková pro umyvadlo skříňka 3-zásuvková 2	ks	2,000	75 030,00	150 060,00	
9	K	378000	hodiny spíneči a součtové tvrdé, programovatelné spíneči a součtové tvrdé ovidence odsávacích hodin germicidního zářivce provedení na stěnu programovatelné krytí IP 65 1	ks	1,000	1 550,00		
10	K	378010	zářiv germicidní (otevřená přímé záření, stropní provedení) germicidní zářiv s přímým účinkem stropní provedení o výkon 55 W krytí IP 65 2	ks	2,000	7 237,00		
11	K	420003	linka pracovní vč. umyvadla a dřezu, dolní + horní skříňky 4850 mm Příloha č. 1 pracovní deska kompaktní hladký povrch umyvadlo keramické dřez keramický skříňka dolní pro umyvadlo 2-dvířková (š. 800 mm) skříňka dolní pro dřez 2-dvířková (š. 800 mm) 2x skříňka dolní zásuvková (3x zásuvka) š. cca 500 mm 1x skříňka dolní policevá otevřená 2x dolní skříňka policevá 2-dvířková (š. cca 800 mm) skříňky nástěnné policevá dvířkové 2x skříňka nástěnná policevá otevřená (š. cca 800 mm) 1	ks	1,000	66 026,00	66 026,00	
12	K	420004	linka pracovní rohová vč. umyvadla a dřezu, dolní + horní skříňky 1000 + 1200 mm Příloha č. 1 pracovní deska kompaktní hladký povrch umyvadlo keramické dřez keramický skříňka pro dřez dvířková skříňka pro umyvadlo dvířková 2x nástěnná skříňka (1 police) otevřená 1	ks	1,000	22 213,00	22 213,00	
13	K	420006	linka pracovní vč. umyvadla, dřezu, dolní + horní skříňky 3000 mm Příloha č. 1 pracovní deska kompaktní hladký povrch umyvadlo keramické dřez keramický skříňka pro dřez 2-dvířková (š. cca 800 mm) skříňka pro umyvadlo 2-dvířková (š. cca 600 mm) 1x skříňka 3-zásuvková (š. cca 600 mm) 1x skříňka policevá 2-dvířková (š. cca 800 mm) 3x nástěnná skříňka policevá 2-dvířková (š. cca 800 mm) 1x nástěnná skříňka policevá otevřená (š. cca 500 mm) 1	ks	1,000	42 985,00	42 985,00	
14	K	42JD34	linka pracovní (dřez, skříňky dolní + horní) 1600 mm 1	ks	1,000	49 210,00	49 210,00	
15	K	42UH01	linka pracovní vč. umyvadla - dolní skříňka, nástěnná police 600 mm Příloha č. 2 42JD34 + 42UH01 pracovní deska v celku 2400 mm (1600 + 800 mm) pracovní deska postforming tl. min. 35 mm vč. zadní lišty 1x dolní skříňka pro dřez dvířková š. 600 mm 1x dolní skříňka pro umyvadlo dvířková š. 600 mm 1x dolní skříňka zásuvková š. cca 600 mm	ks	1,000	14 965,00	14 965,00	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obšasní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OLMI

Objekt:

D2\_51 - Lékařská technologie - pevně spojené ze stavbou

KSO:

Místo: Trutnov

Zadavatel:

Kvalitativně děkujeme

Uchazeč:

Toka a.s.

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Městská 17, Jihlava

Zpracovatel:

Michaela Havlačková

Poznámka:

CC CZ

Datum: 04.06.2020

IC

DC

IC

DC

IC

DC

IC

DC

Cena bez DPH

595 064,00

DPH základní

snížená

Základ daně

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

124 963,44

0 00

Cena s DPH

v CZK

720 027,44



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OLMI  
Objekt: D2\_51 - Lékařská technologie - pevné spojené ze stavbou  
Místo: Trutnov  
Zadavatel:  
Uchazeč: Toka a.s.

Datum:  
Projektant: Atelier Pella v.o.s.,  
Městská 12, Jihlava  
Zpracovatel: Michala Hrdličková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 595 064,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfúzní oddělení - OLMF  
 Objekt: D2\_51 - Lékařská technologie - pevně spojené ze staveb  
 Místo: Trutnov  
 Zadavatel: Královéhradecký kraj  
 Uchazeč: Toka a.s.

Datum:  
 Projektant: Aleš Pátek v.o.s.,  
 Měšáková 12, Jihlava  
 Zpracovatel: Michaela Havlíková

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>595 064,00</b>	
3	K	280015	linka pracovní - 2x dřez kameninový, 2x baterie, pracovní deska kameninová, dolní skříňky, prostor pro myčku	ks	1,000	55 620,00	55 620,00	
	VV		2000/700/900 mm					
	VV		Příloha č. 1					
	VV		pracovní deska kameninová se zvýšeným zadním okrajem					
	VV		2x dřez kameninový					
	VV		2x skříňka dřezová dvířková					
	VV		prostor pro podstavnu myčku laboratorního skla					
	VV		1		1,000			
4	K	280018	linka laboratorní vč. keramického dřezu a umyvadla, dolní skříňky	ks	1,000	79 345,00	79 345,00	
	VV		4200 mm					
	VV		Příloha č. 1					
	VV		pracovní deska kompaktní hladký povrch					
	VV		dřez, umyvadlo - keramické					
	VV		2x skříňka 2-dveřová (pro dřez a umyvadlo)					
	VV		2x skříňka pevná 3-zásuvková					
	VV		2x skříňka policová 2-dveřová					
	VV		1		1,000			
5	K	280020	linka laboratorní vč. dřezu umyvadla, 2x baterie, dolní skříňky, police pro PC a tiskárnu	ks	1,000	82 200,00	82 200,00	
	VV		4800/800/800 mm					
	VV		Příloha č. 1					
	VV		pracovní deska kompaktní hladký povrch					
	VV		1x dřez kameninový					
	VV		1x umyvadlo kameninové					
	VV		2x baterie (dodávka STAVBA)					
	VV		2x dolní skříňka 2-dveřová pro dřez a umyvadlo					
	VV		1x skříňka policová otevřená (pro PC a tiskárnu)					
	VV		1		1,000			
6	K	280046	linka laboratorní - dřez, umyvadlo, pracovní deska - kameninová, 2x baterie, dolní skříňky	ks	2,000	74 532,00	149 064,00	
	VV		2100/700/900 mm					
	VV		Příloha č. 1					
	VV		pracovní deska kameninová se zadním zvýšeným okrajem					
	VV		dřez kameninový					
	VV		umyvadlo kameninové					
	VV		2x baterie (dodávka STAVBA)					
	VV		skříňka dvířková pro dřez					
	VV		skříňka dvířková pro umyvadlo					
	VV		skříňka 3-zásuvková					
	VV		2		2,000			
11	K	420003	linka pracovní vč. umyvadla a dřezu, dolní + horní skříňky	ks	1,000	66 784,00	66 784,00	
	VV		4950 mm					
	VV		Příloha č. 1					
	VV		pracovní deska kompaktní hladký povrch					
	VV		umyvadlo keramické					
	VV		dřez keramický					
	VV		skříňka dolní pro umyvadlo 2-dvířková (š. 800 mm)					
	VV		skříňka dolní pro dřez 2-dvířková (š. 800 mm)					
	VV		2x skříňka dolní zásuvková (3x zásuvka) š. cca 500 mm					
	VV		1x skříňka dolní policová otevřená					
	VV		2x dolní skříňka policová 2-dvířková (š. cca 800 mm)					
	VV		skříňky nástěnné policové dvířkové					
	VV		2x skříňka nástěnná policová otevřená (š. cca 800 mm)					
	VV		1		1,000			
12	K	420004	linka pracovní rohová vč. umyvadla a dřezu, dolní + horní skříňky	ks	1,000	22 120,00	22 120,00	
	VV		1000 + 1200 mm					
	VV		Příloha č. 1					
	VV		pracovní deska kompaktní hladký povrch					
	VV		umyvadlo keramické					
	VV		dřez keramický					
	VV		skříňka pro dřez dvířková					
	VV		skříňka pro umyvadlo dvířková					
	VV		2x nástěnná skříňka (1 police) otevřená					
	VV		1		1,000			
13	K	420005	linka pracovní vč. umyvadla, dřezu, dolní + horní skříňky	ks	1,000	44 156,00	44 156,00	
	VV		3000 mm					
	VV		Příloha č. 1					
	VV		pracovní deska kompaktní hladký povrch					
	VV		umyvadlo keramické					
	VV		dřez keramický					
	VV		skříňka pro dřez 2-dveřová (š. cca 800 mm)					
	VV		skříňka pro umyvadlo 2-dvířková (š. cca 800 mm)					
	VV		1x skříňka 3-zásuvková (š. cca 600 mm)					
	VV		1x skříňka policová 2-dveřová (š. cca 800 mm)					
	VV		3x nástěnná skříňka policová 2-dveřová (š. cca 800 mm)					
	VV		1x nástěnná skříňka policová otevřená (š. cca 600 mm)					
	VV		1		1,000			
14	K	420034	linka pracovní 1-dřez, skříňky dolní + horní	ks	1,000	49 600,00	49 600,00	
	VV		1800 mm					
	VV		1		1,000			
15	K	420035	linka pracovní vč. umyvadla - dolní skříňka, nástěnná police	ks	1,000	17 632,00	17 632,00	
	VV		600 mm					
	VV		Příloha č. 2					
	VV		420034 + 420035 pracovní deska v celku 2400 mm (1800 + 600 mm)					
	VV		pracovní deska pošetřování tl. min. 35 mm vč. zadní lišty					
	VV		1x dolní skříňka pro dřez dvířková š. 600 mm					
	VV		1x dolní skříňka pro umyvadlo dvířková š. 600 mm					
	VV		1x dolní skříňka zásuvková š. cca 600 mm					
	VV		2x dolní skříňka policová 1-dveřová š. 300 mm					
	VV		nástěnná police nad umyvadlem					
	VV		nástěnné skříňky policové dvířkové					
	VV		1x nástěnná skříňka otevřená (š. 600 mm)					
	VV		1		1,000			
16	K	460085	linka pracovní vč. umyvadla a dřezu, 2x baterie, nástěnná police	ks	1,000	28 543,00	28 543,00	
	VV		1000 mm					
	VV		Příloha č. 1					
	VV		pracovní deska kompaktní hladký povrch					
	VV		umyvadlo keramické					
	VV		dřez keramický					
	VV		skříňka pro dřez a umyvadlo 2-dveřová					
	VV		1x nástěnná police					
	VV		(2x baterie - dodávka stavby)					
	VV		1		1,000			

1,000

ZAKÁZKA :

**VÝSTAVBA KONSOLIDOVANÝCH LABORATOŘÍ A TRANSFÚZNÍHO ODD. V OBLASTNÍ  
NEMOCNICI TRUTNOV a.s.**

ZMĚNOVÝ LIST č.

**23**

ze dne :

**7.4.2020**

*Tento ZL je vystaven ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel*

**VĚCNÝ POPIS ZMĚNY - PŘEDMĚT DÍLA :**

Změna se týká: Změna materiálu potěru na pískocementový potěr strojně hlazený v 3.NP OLM1, včetně polypropylenových vláken, vše bude provedeno v rozsahu dle přílohy č.1 (položkový rozpočet), která je nedílnou součástí tohoto změnového listu.

VLIV NA TERMÍNY HMG :

NE

VLIV NA DOKONČENÍ STAVBY

NE

**CENOVÉ VYHODNOCENÍ :**

ODPOČET ( - ) :






**-291 543,97**

PŘÍPOČET ( + ) :





**213 655,62**

CENOVÝ ROZDÍL - VÝŠE ZMĚNOVÉHO LISTU

**-77 888,35****ZHOTOVITEL: Společnost BAK - SYNER**

Osoba :	Podpis :	Datum podpisu :
Michal Vojáček		7.4.2020
Václav Zítka		7.4.2020
Lucie Eisová / Václav Sedláček		13.8.2020
Ladislav Köhler / Michal Holub		14.8.2020
Karel Laš		13.8.2020

**OBJEDNATEL: Královéhradecký kraj**

Osoba :	Podpis :	Datum podpisu :
Lukáš Oma - TDI		8.8.2020
Viktor Šlapal - HIP		10.8.2020
Libor Žilka - KRU		10.8.2020
Jiří Strnad - KRU		10.8.2020

Přílohy :

č.1 - položkový rozpočet OLM1

# Příloha č. 1 k změnovému listu stavby č. 23

Stavba: Obilnární napojovací Trutnov a.s. Kon. ořizovací lebedčové a transfúzní oddělení - OL141  
 Objekt: D1\_01 - Úprava objektu OL141  
 Skupina: D1\_01\_1 - Stavební

Realizace: Trutnov  
 Zadavatel: Královéhradecký kraj  
 Upravitel: Společnost BAK-SYNER zastoupen BAK stavební společnost a.s.  
 Datum: 07.04.2020  
 Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mířkova 12, Jihlava  
 Zpracovatel: Ing. Babič

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství celkem dle SOO	Množství celkem dle skutečnosti	Rozdíl mezi skutečností a SOO	Jednotka [CZK]	Cena celkem [CZK] --	Cena celkem [CZK] ++	Cenová soustava
118	K	63245-R1	Podkladní samonivelizační potěr na bázi cementu, plniva a vláken organického původu, tl. 55 mm, D+M, Podrobný popis viz PD	m2	8,450	0,000	-8,450	493,96	-4 173,92		
	VV		"3 NP		4,750						
	VV		"m.č.OL315" 4,65+0,8*0,125		3,700						
	VV		"m.č.OL338" 3,7								
119	K	63245-R2	Podkladní samonivelizační potěr na bázi cementu, plniva a vláken organického původu, tl. 57 mm, D+M, Podrobný popis viz PD	m2	25,783	0,000	-25,783	571,92	-13 108,77		
	VV		"Podlaha D1								
	VV		"3 NP		11,130						
	VV		"m.č.OL302" 11,0+1,3*0,1		2,300						
	VV		"m.č.OL318" 2,2+0,8*0,125		4,913						
	VV		"m.č.OL321" 4,65+0,7*0,125*3		4,600						
	VV		"m.č.OL322" 4,5+0,8*0,125		1,420						
	VV		"m.č.OL323" 1,35+0,7*0,1								
	VV		"m.č.OL324" 1,35+0,7*0,1								
120	K	63245-R3	Podkladní samonivelizační potěr na bázi cementu, plniva a vláken organického původu, tl. 52 mm, D+M, Podrobný popis viz PD	m2	100,503	0,000	-100,503	550,83	-55 982,90		
	VV		"Podlaha K1								
	VV		"3 NP		12,790						
	VV		"m.č.OL308" 12,7+0,9*0,1		16,895						
	VV		"m.č.OL310" 16,8+1,95*0,1		16,895						
	VV		"m.č.OL311" 16,7+1,95*0,1		16,595						
	VV		"m.č.OL312" 16,4+1,95*0,1		15,595						
	VV		"m.č.OL338" 15,4+1,95*0,1		21,633						
	VV		"m.č.OL337" 21,35+1,95*0,1+0,7*0,125								
121	K	63245-R4	Podkladní samonivelizační potěr na bázi cementu, plniva a vláken organického původu, tl. 65 mm, D+M, Podrobný popis viz PD	m2	373,794	0,000	-373,794	583,77	-219 208,36		
	VV		"Podlaha P1								
	VV		"3 NP		7,000						
	VV		"m.č.OL301" 7,0		9,550						
	VV		"m.č.OL304" 9,55		9,400						
	VV		"m.č.OL305" 9,4		12,200						
	VV		"m.č.OL309" 17,35+1,95*0,1		17,445						
	VV		"m.č.OL307" 12,1+0,8*0,125+0,9*0,1		20,450						
	VV		"m.č.OL314" 20,35+0,8*0,125		2,350						
	VV		"m.č.OL316" 2,1+0,8*0,125		2,200						
	VV		"m.č.OL319" 4,2+0,8*0,125		4,300						
	VV		"m.č.OL320" 7,9+0,8*0,125		8,000						
	VV		"m.č.OL325" 10,3+0,8*0,125		10,400						

[illegible]

123	K	632451491	Připravení a přelátání ze přelátání povrchu	m2	0,000	508 530	37,50	19 068,88 [Kč]
			3 NP					
124	K	632459775	Připravení a povrchu o šku 50 mm ze směsí do 5 m2	m2	0,000	508 530	18,20	581,54 [Kč]
			3 NP					
125	K	63219211	Připravení a mazování ze směsí PP makrovlákna pro ochranné vytváření 0,9 kg/m2	m2	0,000	31 953	270,00	8 615,10 [Kč]
			3 NP					
						25 427		
<b>Náklady soupisu celkem</b>						<b>-291 543,97</b>	<b>213 655,62</b>	
						<b>-77 888,35</b>		

Poznámka:

Položky nepodbarvené jsou položky víceprací, které jsou již součástí zasklávacího rozpočtu k SoD. Pro ocenění byla použita metodika dle bodu 6.5 smlouvy o dílo (smluvní jednotkové ceny).  
Položky podbarvené modrou barvou jsou položky víceprací, které jsou nové a nejsou součástí zasklávacího rozpočtu k SoD. Pro ocenění byla použita metodika dle bodu 6.5 smlouvy o dílo (URS + koeficient 1,01).  
Položky podbarvené zelenou barvou jsou položky víceprací, které jsou nové a nejsou součástí zasklávacího rozpočtu k SoD. Pro ocenění byla použita metodika dle bodu 6.5 smlouvy o dílo (cena v místě a čase obvyklá, zjištěná cenovým průzkumem - nejníže ze tří cenových nabídek svěřitel + koeficientní přirážka generálního zhotovitele).



ZAKÁZKA :

# VÝSTAVBA KONSOLIDOVANÝCH LABORATOŘÍ A TRANSFÚZNÍHO ODD. V OBLASTNÍ NEMOCNICI TRUTNOV a.s.

ZMĚNOVÝ LIST č.

24

ze dne :

13.7.2020

Tento ZL je vystaven ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel

## VĚCNÝ POPIS ZMĚNY - PŘEDMĚT DÍLA :

Změna se týká: Vícepráce nad rámec smluvního rozpočtu - Přemístění rozvaděče výtahu V3 z 3.NP do 1.NP místnosti č.126, vše bude provedeno v rozsahu dle příloh č.1, které jsou nedílnou součástí tohoto změnového listu.

VLIV NA TERMÍNY HMG :

NE

VLIV NA DOKONČENÍ STAVBY

NE

## CENOVÉ VYHODNOCENÍ :

ODPOČET ( - ) :

0,00

PŘÍPOČET ( + ) :

30 826,00

CENOVÝ ROZDÍL - VÝŠE ZMĚNOVÉHO LISTU

30 826,00

## ZHOTOVITEL: Společnost BAK - SYNER

Osoba :	Podpis :	Datum podpisu :
Michal Voják		13.7.2020
Václav Zítka		13.7.2020
Lucie Eisová / Václav Sedláček		13.7.2020
Ladislav Köhler / Michal Holub		13.7.2020
Karel Laš		13.7.2020

## OBJEDNATEL: Královéhradecký kraj

Osoba :	Podpis :	Datum podpisu :
Lukáš Oma - TDI		13.7.2020
Viktor Šlapal - HIP		13.7.2020
Libor Žilka - KKV		13.7.2020
Jiří Strnad - KKV		13.7.2020

Přílohy :

č.1 - položkový rozpočet

Příloha č. 1 k změnóvému listu stavby č.24

Stavba: Obnova nemocnice Trutnov a.s. - kón. obřívová laborátore - kónstruční odřívová - 02.01.2020

Objekt: D1\_01 - Úprava obřívku 02.01.2020

Sortiment: D1\_01\_1 - Stavební

Místo: Trutnov

Závěreční: Královéhradecký kraj  
Účel: Společnost BAK-SYNER zastoupen BAK stavební společnost, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství celkem dle SoD	Množství celkem dle skutečnosti	Rozdíl mezi skutečností a SoD	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
X1			Přemístění rozvaděče výřím V3 z 3 NP do 1 NP místnost č.128	ks	1,000	1,000	0,000	27 326,00	27 326,00	27 326,00	Nová soustava
X2			Zednická zpráva	ks	1,000	1,000	0,000	3 500,00	3 500,00	3 500,00	Nová soustava
Náklady soupisu celkem									0,00	30 826,00	
									30 826,00		

Poznámky

Položky nepodbarvené jsou položky vícepráci, které jsou již součástí zasměvněného položkového rozpočtu k SoD. Pro ocenění byla použita metodika dle bodu 6.5 smlouvy o dílo (smluvní jednotkové ceny).

Položky podbarvené modrou barvou jsou položky vícepráci, které jsou nové a nejsou součástí zasměvněného položkového rozpočtu k SoD. Pro ocenění byla použita metodika dle bodu 6.5 smlouvy o dílo (URS + koeficient 1,01).

Položky podbarvené zelenou barvou jsou položky vícepráci, které jsou nové a nejsou součástí zasměvněného položkového rozpočtu k SoD. Pro ocenění byla použita metodika dle bodu 6.5 smlouvy o dílo (cena v místě a čase obvyklá, zjištěná cenovým průzkumem - nejnížší ze 01 cenových nabídek + kónordinační přírůžka generálního zhotovitele).

ZAKÁZKA :

**VÝSTAVBA KONSOLIDOVANÝCH LABORATOŘÍ A TRANSFÚZNÍHO ODD. V OBLASTNÍ  
NEMOCNICI TRUTNOV a.s.**

ZMĚNOVÝ LIST č.

25

ze dne :

13.7.2020

*Tento ZL je vystaven ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel*

**VĚCNÝ POPIS ZMĚNY - PŘEDMĚT DÍLA :**

Změna se týká: Vícepráce nad rámec smluvního rozpočtu - Hydroizolace podlahy strojovny VZT místnost číslo 339, vše bude provedeno v rozsahu dle příloh č.1, které jsou nedílnou součástí tohoto změnového listu.

VLIV NA TERMÍNY HMG :

ANO

VLIV NA DOKONČENÍ STAVBY

NE

**CENOVÉ VYHODNOCENÍ :**

ODPOČET ( - ) :

-27 979,04

PŘÍPOČET ( + ) :

121 142,44

CENOVÝ ROZDÍL - VÝŠE ZMĚNOVÉHO LISTU

93 163,40

**ZHOTOVITEL: Společnost BAK - SYNER**

Osoba :	Podpis :	Datum podpisu :
Michal Vojáček		13.7.2020
Václav Zítka		13.7.2020
Lucie Eisová / Václav Sedláček		13.8.2020
Ladislav Köhler / Michal Holub		13.8.2020
Karel Laš		10.8.2020

**OBJEDNATEL: Královéhradecký kraj**

Osoba :	Podpis :	Datum podpisu :
Lukáš Oma - TDI		20.8.2020
Viktor Šlapal - HIP		10.8.2020
Libor Žilka - KRU		10.8.2020
Jiří Strnad - KRU		10.8.2020

Přílohy :

č.1 - položkový rozpočet

Příloha č. 1 k změnóvémú listu stavby č.25

Stavba: OMŠŠan romazov Tuhov z.s., Knapč. dované laboratóre a kúřovním oddělením - OLK  
Objekt: D1\_01 - Úprava okapního OLK  
Soubor: D1\_01\_1 - Stavební

Místo: Trutnov  
Zakazatel: Královéhradecký kraj  
Uchazeč: Společnost BAK-SYNER zastoupen BAK stavební společnost, a.s.  
Datum: 27.01.2020  
Projektant: Atelier Penta v.o.s., Městská 12, Jiřetice  
Zpracovatel: Ing. Avuk

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství celkem dle SdO	Množství celkem dle skutečnosti	Rozdíl mezi skutečností a SdO	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
SdO	K	777610-R2	Náklady epizodické podlahy betonových protisklizných vc. samostatně - dvoustranný nátěr na bázi epoxidové pryskyřice, s uzavíráním protiskliznými nálepy	m2	49,783	0,000	-49,783	362,02	-27 979,04		
Podrobný popis viz PD											
"Vodorovné plochy											
"Podlaha B1											
"m.6,OL339" 49,1+2,1*0,325											
49,783											
X1			Montáž hydroizolace podlahy střešiny VZT OL339	hod		144,000		385,00		55 440,00	OL339
X2			Membrana hydroiz. Aquaflex roof premium RAL 7038	kg		110,000		310,72		34 179,20	OL339
X3			Náter Mapacreat 1 600W A+B	kg		12,000		536,27		6 435,24	OL339
X4			Páskat Mapabond S4 š.12cm	m		50,000		123,46		6 174,00	OL339
X5			Maltu podlahová Topcanti Pronto	kg		375,000		11,50		4 312,50	OL339
X6			Lepidlo Adesilex P9 C2TE	kg		75,000		14,80		1 110,00	OL339
X7			Mapetex 50 (100Z5)	m		25,000		43,10		1 077,50	OL339
X8			Ornithon L1000 s nerez dráhou tl.2mm	m		12,000		434,50		5 214,00	OL339
X9			Doprava	km		900,000		8,00		7 200,00	OL339
Máklady soupisu celkem									-27 979,04	121 142,44	
									93 163,40		

Poznámka:

Položky nepodbarvené jsou položky víceprací, které jsou již součástí zasklávaného položkového rozpočtu k SdO. Pro ocenění byla použita metodika dle bodu 6.5 smlouvy o dílo (smluvní jednotkové ceny).  
Položky podbarvené modrou barvou jsou položky víceprací, které jsou nové a nejsou součástí zasklávaného položkového rozpočtu k SdO. Pro ocenění byla použita metodika dle bodu 6.5 smlouvy o dílo (URS - koeficient 1,01).  
Položky podbarvené zelenou barvou jsou položky víceprací, které jsou nové a nejsou součástí zasklávaného položkového rozpočtu k SdO. Pro ocenění byla použita metodika dle bodu 6.5 smlouvy o dílo (cena v místě a čase obvyklá, zjištěná cenovým - nejedná se o)

ZAKÁZKA :

**VÝSTAVBA KONSOLIDOVANÝCH LABORATOŘÍ A TRANSFÚZNÍHO ODD. V OBLASTNÍ  
NEMOCNICI TRUTNOV a.s.**

ZMĚNOVÝ LIST č.

26

ze dne :

3.8.2020

Tento ZL je vystaven ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel

**VĚCNÝ POPIS ZMĚNY - PŘEDMĚT DÍLA :**

Změna se týká: Vícepráce nad rámec smluvního rozpočtu - Dilatační lišty, nerezové parapety, vše bude provedeno v rozsahu dle příloh č.1, které jsou nedílnou součástí tohoto změnového listu.

VLIV NA TERMÍNY HMG :

NE

VLIV NA DOKONČENÍ STAVBY

NE

**CENOVÉ VYHODNOCENÍ :**

ODPOČET ( - ) :

0,00

PŘÍPOČET ( + ) :

88 525,00

CENOVÝ ROZDÍL - VÝŠE ZMĚNOVÉHO LISTU

88 525,00

**ZHOTOVITEL: Společnost BAK - SYNER**

Osoba :	Podpis :	Datum podpisu :
Michal Voják		3.8.2020
Václav Zítka		3.8.2020
Lucie Eisová / Václav Sedláček		12.8.2020
Ladislav Köhler / Michal Holub		5.9.2020
Karel Laš		

**OBJEDNATEL: Královéhradecký kraj**

Osoba :	Podpis :	Datum podpisu :
Lukáš Oma - TDI		3.8.2020
Viktor Šlapal - HIP		10.8.2020
Libor Žilka - KKU		10.8.2020
Jiří Strnad - KKU		10.8.2020

Přílohy :

č.1 - položkový rozpočet



# Příloha č. 1 k změnovému listu stavby č.26

Stavba: Omladina neovazovaná Trutnov a.s., Konečná úprava Litavče a následným oddělením Omlad

Objekt: D1\_01 - Úprava objektu Omlad

Stavba: D1\_01\_1 - Stavební

Město: Trutnov

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Ukazatel: Společnost BAK-SYNER zastoupen BAK stavební společnost, a.s.

Datum: 05.08.2020

Projektant:

Zpracovatel:

Atelier Perla v.o.s., Místková  
12, Jihlava  
Ing. Avuk

PČ	Typ	Kod	Pops	MJ	Množství celkem dle SoD	Množství celkem dle skutečnosti	Rozdíl mezi skutečností a SoD	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
X1			Ocelový podlahový dlažební profil Solider, D+M	m	40,000	40,000	40,000	988,00		39 520,00	
X2			D+M Nerez plastový praporek a výřez V3	ks	3,000	3,000	3,000	18 335,00		49 005,00	
Náklady soupisu celkem									0,00	88 525,00	
									88 525,00		

## Dodávky

Položky nepodbarvené jsou položky víceprací, které jsou již součástí zasmělněného položkového rozpočtu k SoD. Pro ocenění byla použita metodika dle bodu 6.5 smlouvy o dílo (smluvní jednotkové ceny).

Položky podbarvené modrou barvou jsou položky víceprací, které jsou nové a nejsou součástí zasmělněného položkového rozpočtu k SoD. Pro ocenění byla použita metodika dle bodu 6.5 smlouvy o dílo (URS + koeficient 1,01).

Položky podbarvené zelenou barvou jsou položky víceprací, které jsou nové a nejsou součástí zasmělněného položkového rozpočtu k SoD. Pro ocenění byla použita metodika dle bodu 6.5 smlouvy o dílo (cena v místě a čase obvyklá, zjištěná cenovým průzkumem - nejnižší ze tří cenových nabídek + koordinační přírůstek generálního zhotovitele).

ZAKÁZKA :

**VÝSTAVBA KONSOLIDOVANÝCH LABORATOŘÍ A TRANSFÚZNÍHO ODD. V OBLASTNÍ  
NEMOCNICI TRUTNOV a.s.**

ZMĚNOVÝ LIST č.

27

ze dne :

28.7.2020

Tento ZL je vystaven ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel

**VĚCNÝ POPIS ZMĚNY - PŘEDMĚT DÍLA :**

Změna se týká vícepráce nad rámec smluvního rozpočtu (Úprava objektu OLMI): dodatečně požadovaná úprava ukončení prvků TZB ( VZT výústky) v podhledu Performace, vše bude provedeno v rozsahu dle přílohy č.1, která je nedílnou součástí tohoto změnového listu.

VLIV NA TERMÍNY HMG :

NE

VLIV NA DOKONČENÍ STAVBY

NE

**CENOVÉ VYHODNOCENÍ :**

ODPOČET ( - ) :

0,00

PŘÍPOČET ( + ) :

16 483,20

CENOVÝ ROZDÍL - VÝŠE ZMĚNOVÉHO LISTU

16 483,20

**ZHOTOVITEL: Společnost BAK - SYNER**

Osoba :	Podpis :	Datum podpisu :
Michal Voják		3.8.2020
Václav Zítka		3.8.2020
Lucie Eisová / Václav Sedláček		13.8.2020
Ladislav Köhler / Michal Holub		5.9.2020
Karel Laš		17.8.2020

**OBJEDNATEL: Královéhradecký kraj**

Osoba :	Podpis :	Datum podpisu :
Lukáš Oma - TDI		3.8.2020
Viktor Šlapal - HIP		10.8.2020
Libor Žilka - KKV		10.8.2020
Jiří Strnad - KKV		10.8.2020

Přílohy :

č.1 - položkový rozpočet

Стефан  
Căpășanu rememorează Trăirea a sa în perioada de tranziție ordinelor - CUM

D01.01 - Úprava chřeky OLMI

D1 01 1 - Stavební

Trutnov

Královéhradecký kraj

Společnost BAK-SYNER zastoupen BAK stavební společnost

znám

Položky podbarvené modrou barvou jsou položky vicepráci, které jsou nové a nejsou součástí zasmulvněného položkového rozpočtu k SoD. Pro ocenění byla použita metodika dle bodu 6.5. emfouvy o dlo (ÜRS + koeficient 1,01).

Pro ocenění byla použita metodika dle bodu 6.5 smlouvy o dílo (cena v místě a čase obvyklá, zjišťována cenovým průzkumem). Položky podběrných zelenin jsou položky víceprací, které jsou nové a nejsou součástí zasklápnutého rozpočtu k SoD. Pro ocenění byla použita metodika dle bodu 6.5 smlouvy o dílo (cena v místě a čase obvyklá, zjišťována cenovým průzkumem). Položky podběrných zelenin jsou položky víceprací, které jsou nové a nejsou součástí zasklápnutého rozpočtu k SoD. Pro ocenění byla použita metodika dle bodu 6.5 smlouvy o dílo (cena v místě a čase obvyklá, zjišťována cenovým průzkumem).



ZAKÁZKA :

**VÝSTAVBA KONSOLIDOVANÝCH LABORATOŘÍ A TRANSFÚZNÍHO ODD. V OBLASTNÍ  
NEMOCNICI TRUTNOV a.s.**

ZMĚNOVÝ LIST č.

29

ze dne :

30.07.2020

*Tento ZL je vystaven ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel*

**VĚCNÝ POPIS ZMĚNY - PŘEDMĚT DÍLA :**

Změna se týká vícepráce nad rámec smluvního rozpočtu (Zateplení objektu OLM1): při provádění rekonstrukce úpravy nového vstupního přístřešku bylo zjištěno, že stávající konstrukce podhledu je zdegradována tudíž bylo rozhodnuto ze strany objednatele o její likvidaci a provedení nové konstrukce z desek cembrit, vše bude provedeno v rozsahu dle přílohy č.1, která je nedílnou součástí tohoto změnového listu.

VLIV NA TERMÍNY HMG :

ANO

VLIV NA DOKONČENÍ STAVBY

ANO

**CENOVÉ VYHODNOCENÍ :**

ODPOČET ( - ) :

0,00







PŘÍPOČET ( + ) :

154 829,41





CENOVÝ ROZDÍL - VÝŠE ZMĚNOVÉHO LISTU

154 829,41

**ZHOTOVITEL: Společnost BAK - SYNER**

Osoba :	Podpis :	Datum podpisu :
Michal Vojáček		3.8.2020
Václav Zítka		3.8.2020
Lucie Eisová / Václav Sedláček		13.8.2020
Ladislav Köhler / Michal Holub		
Karel Laš	13.8.2020	

**OBJEDNATEL: Královéhradecký kraj**

Osoba :	Podpis :	Datum podpisu :
Lukáš Oma - TDI		3.8.2020
Viktor Šlapal - HIP		10.8.2020
Libor Žilka - KKU		10.8.2020
Jiří Strnad - KKU		10.8.2020

Přílohy :

č.1 - položkový rozpočet

57061

Chen, Y.-C. and Wang, T.-H. 1990. The effect of the concentration of the polymer solution on the morphology of the polymer film. *J. Polym. Sci. Part A: Polym. Chem.* 28: 1111-1120.

57062

Chen, Y.-C. and Wang, T.-H. 1990. The effect of the concentration of the polymer solution on the morphology of the polymer film. *J. Polym. Sci. Part A: Polym. Chem.* 28: 1111-1120.

57063

Chen, Y.-C. and Wang, T.-H. 1990. The effect of the concentration of the polymer solution on the morphology of the polymer film. *J. Polym. Sci. Part A: Polym. Chem.* 28: 1111-1120.

## Trutnov

Královéhradecký kraj  
Společnost BAK-SYNER zastoupen BAK stavební společnost, a.s.

30.07.2020

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova  
12, Jihlava  
Ing. Avuk

**Abstract**

**Položky nepodbarvené jsou položky vicepráctičnépráci, které jsou již součástí zasmíruvněného položkového rozpočtu k SoD Pro ocenění byla použita metoda dle bodu 6.5 smlouvy o dílo (smluvní jednolokové ceny)**

Položky podbarvené modrou barvou jsou položky vícepráci, které jsou nové a nejsou součástí zasmíluveného rozpočtu k SoD. Pro ocenění byla použita metodika dle bodu 6.5 směrnicy a dila (ÚRS + koeficient 1,01).

Položky podčiarknuté zelenou barvou jsou položky vstupní, které jsou nové a nejsou součástí zaskladňovacího rozpočtu k SoD. Pro ocenění byla použita metodika dle bodu 6.5 smlouvy o dílo (cena v místě a čase obvyklá, zjištěná cenovým průzkumem ze tří cenových nabídek + koordinování přírůstků generálního zhotovitele)

# ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

**VYSTAVBA KONSOLIDOVANÝCH LABORATORIÍ A TRANSFUZNÍHO ODD. V OBLASTNÍ NEMOCNICI  
TRUTNOV a.s.**

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	182 931 709,01 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 675 177,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 458 391,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 914 300,62 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 341 666,44 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 3	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 1 589 477,62 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 800 057,44 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	2 389 535,06 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) (Změna ZsS) ≤ (limit nadlimitní VZ)	2 389 535 Kč ≤ 137 366 000 Kč		
b) (Změna ZsS / Smluvní cena) ≤ 15 %	1,31 % ≤ 15,00 %		

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	182 931 709,01 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH		
(Změna ZsS / Smluvní cena) ≤ 50 %		Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
		0,00 % ≤ 50,00 %	

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	182 931 709,01 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 3 178 495,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 967 763,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 763 898,55 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 376 975,01 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		

Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 3 942 393,55 Kč bez DPH	
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 1 344 738,01 Kč bez DPH	
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	5 287 131,56 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
c) (Změna ZsS / Smluvní cena) ≤ 50 %	2,89 % ≤ 50,00 %	

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODS. 5 A 6		
Smluvní cena	182 931 709,01 Kč bez DPH	
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
(5) Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 3 942 393,55 Kč bez DPH	
(6) Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 1 344 738,01 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	2 597 655,54 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	1,42 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K Odstavci 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
<b>POSOUZENÍ:</b>	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
<b>POSOUZENÍ:</b>	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	2
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 1 678 199,17 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 718 641,45 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	959 557,72 Kč bez DPH



**SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ**

Původní smluvní cena (vstupní)	182 931 709,01 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	185 359 227,01 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	186 318 784,73 Kč bez DPH
<b>Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)</b>	<b>186 318 784,73 Kč bez DPH</b>

Výpočet provedl/a: ing.Libor Žilka

**Pozn.: Jedná se o kontrolní výpočet. Případný rozdíl v haléřích je v zaokrouhlování.**



## Harmonogram prací Nemocnice Trutnov 1.NP OLM

<b>Stavební práce 1.NP OLM</b>		
Demontáž interierového vybavení, zařizovacích předmětů, výplní otvorů vnitřních	21.8.20	22.8.20
Demontáž stávajících podhledů a obkladů, podlahových krytin 1.NP.	22.8.20	27.8.20
Demontáž přístupných rozvodů 1.NP	27.8.20	2.9.20
Bourání zdiva výplňového 1.NP.	27.8.20	2.9.20
Zdivo vnitřní výplňové +1	31.8.20	5.9.20
Hrubé rozvody VZT +1	31.8.20	12.9.20
Hrubé rozvody kanalizace, vodovod, plyn +1	31.8.20	12.9.20
Hrubé rozvody ÚT +1	1.9.20	12.9.20
Hrubé rozvody elektro - silnoproud +1	31.8.20	15.9.20
Hrubé rozvody elektro - slaboproud, UPS, EPS +1	1.9.20	15.9.20
Hrubé rozvody medicínální plyny	1.9.20	15.9.20
Omítky záhozových 1.NP	6.8.20	30.8.20
Podhledy rastr	7.9.20	20.9.20
Svítlidla	20.9.20	26.9.20
Obklady a dlažby	3.9.20	21.9.20
Podlahy vyrovnávací stěrky 1.NP	15.9.20	20.9.20
Podlahové krytiny	25.9.20	30.9.20
Vnitřní výplně	27.9.20	28.9.20
Kompletace	28.9.20	2.10.20
Zkoušky, atesty, revize	2.10.20	4.10.20
<b>Dokončení díla</b>	<b>5.10.20</b>	<b>5.10.20</b>
