

Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem:

zastoupený:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Mgr. Martinem Červíčkem, hejtnanem kraje

708 89 546

CZ70889546

[REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

„Společnost BAK – GEOSAN“

se sídlem:

zastoupená:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek

Ing. Radkem Mrázkem, MBA, místopředsdou představenstva
vedoucího společníka BAK stavební společnost, a.s., na základě plné
moci

[REDACTED]
[REDACTED]

Vedoucí společník

BAK stavební společnost, a.s.

se sídlem:

zastoupená:

IČO:

DIČ:

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14336

bankovní spojení:

číslo účtu:

Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek

Ing. Radkem Mrázkem, MBA, místopředsdou představenstva

284 02 758

CZ28402758

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Společník

GEOSAN GROUP a.s.

se sídlem:

zastoupená:

IČO:

DIČ:

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12459

bankovní spojení:

číslo účtu:

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Ivanem Havlem, výkonným ředitelem a Ing. Kamilem Vykydalem,
výrobním ředitelem, na základě plné moci

281 69 522

CZ28169522

[REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „**zhotovitel**“ nebo „**dodavatel**“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „**smluvní strany**“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č.5 (dále jen „**dodatek**“) ke Smlouvě o dílo ze dne 4.2.2019 ve znění dodatku č.1 ze dne 6.4.2020, dodatku č.2 ze dne 25.6.2020, dodatku č.3 ze dne 23.11.2020 a dodatku č.4 ze dne 23.2.2021, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky nazvané: „**SMARTmuzeum: modernizace depozitářů, technického a technologického zázemí Muzea východních Čech v Hradci Králové – stavební práce**“ (dále jen „**dílo**“ nebo „**veřejná zakázka**“). Veřejná zakázka byla oznámena ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2018-031339 (dále jen „**veřejná zakázka**“).

I. Účel dodatku

1. Tento dodatek je dále uzavírán dle ust. čl. 6 odst. 6.5 a odst. 6.6 a čl. 16 odst. 2 původní smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „**zákon**“), v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací – víceprací, méněprací a nutných změn:

Jedná se o změny dle ust. § 222 odst. 4 zákona, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky – práce podle změnového listu č.73 - 98

2. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou oběma smluvními stranami potvrzené změnové listy č.73 až 98. Přehled veškerých oběma smluvními stranami potvrzených změnových listů, obsahující stručný popis změny a vliv na cenu díla, je nedílnou součástí a přílohou č. 1 tohoto dodatku. Tabulka změn závazků ze smlouvy o dílo je nedílnou součástí a přílohou č. 2 tohoto dodatku.
3. Změny podle odst. 1 tohoto článku činí:

vícepráce: **1 970 875,16 Kč bez DPH**

méněpráce: **- 477 904,55 Kč bez DPH**

4. Celková smluvní cena se tedy **navyšuje o 1 492 970,61 Kč bez DPH.**

II. Vymezení rozsahu změn

1. V čl. 4 Předmět plnění odst. 4.1 se odstavec 4 a 5 smlouvy se nahrazuje textem následujícího znění:

Stávající účelová komunikace v místě budoucí přístavby bude zrušena a nahrazena nově přeloženou účelovou komunikací, která bude vybudována okolo nové přístavby. Stávající napojení na ulici Opletalovu zůstane zachováno. Předprostor Gayerových kasáren a přístavby bude tvořit zpevněná plocha. Řešení vlastního parteru v areálu není předmětem tohoto projektu.

Charakteristickým prvkem objektu Gayerových kasáren je klasicistní členitá fasáda horizontálně členěná římsami, bosovanými nárožími a orámováním oken s trojúhelníkovými frontony. Cílem

rekonstrukce je obnova těchto prvků a přiblížení se původnímu stavu objektu. Dispoziční ani technické řešení nebude mít dopad na řešení střešních rovin. Stávající keramická drážková střešní krytina, bude nahrazena novou keramickou drážkovou střešní krytinou ve stejném provedení. Do roviny střešní krytiny jsou osazeny na severní straně kovové žaluzie pro VZD zařízení, která jsou nově osazena do půdního prostoru. Komíny budou zachovány. Na střechu nebudou vyvedena žádná technologická zařízení. Při rekonstrukci budou zachovány proporce špaletových oken.

2. Smluvní strany si sjednaly, že v důsledku změn díla, blíže specifikovaných v oběma smluvními stranami v potvrzených změnových listech č. 73 až 98 se ust. čl. 6 odst. 6.2 smlouvy o dílo, ve znění dodatků, mění a nově zní takto:

Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu

(příloha č.3) činí:

Cena celkem: 224 311 010,46 Kč bez DPH

(slovy: dvěštdvacetčtyřimilionytřístajedenácttisícdeset korun českých čtyřicetšest haléřů)

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, ve znění dodatků, nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají tak nadále platná i účinná.

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek se vyhotovuje v šesti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřině společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. Dodatek č.5 ke smlouvě o dílo byl schválen Radou Královéhradeckého kraje dne 26. 04. 2021 usnesením. 22.13.17021.2021.

Přílohy tohoto dodatku:

Příloha č. 1: Změnový list č. 73 až 98

Příloha č. 2: Změny závazků ze smlouvy o dílo

Za objednatele:
V Hradci Králové dne

Za zhotovitele:
V Praze dne

.....
Královéhradecký kraj
Mgr. Martin Červíček
hejtman

„Společnost BAK – GEOSAN“
Ing. Radek Mrázek
místopředseda představenstva
vedoucího společníka BAK stavební
společnost, a.s., na základě plné moci

Ivan Havel
výkonný ředitel, na základě plné moci
GEOSAN GROUP a.s.

.....
Ing. Kamil Vykydal,
výrobní ředitel, na základě plné moci
GEOSAN GROUP a.s.

Projekt: SMART Muzeum HK

SEZNAM VYDANÝCH PROTOKOLU OZNÁMENÍ ZMĚNY

Dne: 20.04.2021


	<i>Celkem</i>	<i>Přípočty</i>	<i>Odpočty</i>
dod č. 1	841 631,80 Kč	1 343 231,80 Kč	-501 600,00 Kč
dod č. 2	10 734 386,99 Kč	24 295 505,52 Kč	-13 561 118,53 Kč
dod č. 3	10 685 863,55 Kč	15 466 361,44 Kč	-4 780 497,89 Kč
dod č. 4	4 257 919,51 Kč	8 193 409,24 Kč	-3 935 489,73 Kč
dod č. 5	1 492 970,61 Kč	1 970 875,16 Kč	-477 904,55 Kč

Cena díla dle SoD: 196 298 238

Celkem dodatky: 28 012 772,46 Kč

SoD + DoD: 224 311 010,46 Kč

ČÍSLO OZ	PŘEDMĚT ZMĚNY	Odpočet v rámci ZL	Přípočet v rámci ZL	NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY BAK	NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (vydáno dne)	ODSOUHLASENÁ CENA	CENA K JEDNÁNÍ	Cena díla po odsouhlasení ZL	DODATEK SoD č.
	CELKEM			29 505 743 Kč		22 261 882 Kč	5 750 890 Kč		
73	Oprava pískovce do vstupu staré budovy	0,00 Kč	46 045,74 Kč	46 045,74 Kč	08.02.2021		46 046 Kč	222 864 085,59	dod č.5
74	Dveře DF05	0,00 Kč	15 165,00 Kč	15 165,00 Kč	08.02.2021		15 165 Kč	222 879 250,59	dod č.5
75	Upgrade MaR, SLN, jistič	-16 550,00 Kč	205 006,90 Kč	188 456,90 Kč	15.03.2021		188 457 Kč	223 067 707,49	dod č.5
76	VCP SLN, centrální ovid. Ventilátoru, ZTI	-647,46 Kč	254 063,63 Kč	253 416,17 Kč	15.03.2021		253 416 Kč	223 321 123,66	dod č.5
77	Projekční místnost	0,00 Kč	36 206,96 Kč	36 206,96 Kč	15.03.2021		36 207 Kč	223 357 330,62	dod č.5
78	Ordexal 1 PP bez povrchové úpravy	0,00 Kč	97 120,01 Kč	97 120,01 Kč	15.03.2021		97 120 Kč	223 454 450,63	dod č.5
79	Ocelová konstrukce protipožární rolety	0,00 Kč	42 470,00 Kč	42 470,00 Kč	15.03.2021		42 470 Kč	223 496 920,63	dod č.5
80	Šoupě parapetů u rolet	0,00 Kč	9 963,00 Kč	9 963,00 Kč	15.03.2021		9 963 Kč	223 506 883,63	dod č.5
81	Nápis muzeum	0,00 Kč	50 532,48 Kč	50 532,48 Kč	15.03.2021		50 532 Kč	223 557 416,11	dod č.5
82	Repase starého schodiště	0,00 Kč	187 048,59 Kč	187 048,59 Kč	15.03.2021		187 049 Kč	223 744 464,70	dod č.5
83	doplnění odnímat. Zábradlí Z1.12	0,00 Kč	21 147,05 Kč	21 147,05 Kč	15.03.2021		21 147 Kč	223 765 611,75	dod č.5
84	Nátěr bastionu, stěrka stěn	0,00 Kč	22 786,04 Kč	22 786,04 Kč	15.03.2021		22 786 Kč	223 788 397,79	dod č.5
85	DZ pro invalidu a vybavení WC	-492,84 Kč	29 329,82 Kč	28 836,98 Kč	15.03.2021		28 837 Kč	223 817 234,77	dod č.5
86	Sloupek před motorem plošiny	0,00 Kč	8 100,00 Kč	8 100,00 Kč	15.03.2021		8 100 Kč	223 825 334,77	dod č.5
87	Odkapové "květináče" VZT	0,00 Kč	16 541,19 Kč	16 541,19 Kč	15.03.2021		16 541 Kč	223 841 875,96	dod č.5
88	Úprava ostění dveří	0,00 Kč	132 650,99 Kč	132 650,99 Kč	15.03.2021		132 651 Kč	223 974 526,95	dod č.5
89	Odpočet žlabů ZTI, mříží, nopová folie	-337 887,02 Kč	71 484,01 Kč	-266 403,01 Kč	18.03.2021		-266 403 Kč	223 708 123,94	dod č.5
90	Úprava místnosti WC invalida	0,00 Kč	18 932,63 Kč	18 932,63 Kč	18.03.2021		18 933 Kč	223 727 056,57	dod č.5
91	Kuchyňská linka	0,00 Kč	5 180,99 Kč	5 180,99 Kč	18.03.2021		5 181 Kč	223 732 237,56	dod č.5
92	SDK konstrukce	0,00 Kč	159 864,28 Kč	159 864,28 Kč	18.03.2021		159 864 Kč	223 892 101,84	dod č.5
93	Poklop 1.PP	0,00 Kč	48 138,48 Kč	48 138,48 Kč	18.03.2021		48 138 Kč	223 940 240,32	dod č.5
94	Doplnění fasády	0,00 Kč	121 708,48 Kč	121 708,48 Kč	18.03.2021		121 708 Kč	224 061 948,80	dod č.5
95	SDK, revizní dvířka	-11 797,23 Kč	91 329,42 Kč	79 532,19 Kč	18.03.2021		79 532 Kč	224 141 480,99	dod č.5
96	Příčka za sloupky	-61 050,00 Kč	119 970,00 Kč	58 920,00 Kč	18.03.2021		58 920 Kč	224 200 400,99	dod č.5
97	Mřížky	-49 480,00 Kč	55 213,47 Kč	5 733,47 Kč	16.04.2021		5 733 Kč	224 206 134,46	dod č.5
98	Doplnění dveří do prosklené příčky	0,00 Kč	104 876,00 Kč	104 876,00 Kč	16.04.2021		104 876 Kč	224 311 010,46	dod č.5
		-477 904,55 Kč	1 970 875,16 Kč	1 492 970,61 Kč					
		celkem odpočty - dodatek č. 5	celkem přípočty - dodatek č. 5	celkem odpočty + přípočty - dod. Č. 5					



Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Zhotovitel:	Společnost BAK-GEOSAN, Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek
Projekt:	SMARTmuzeum: modernizace depozitářů, technického a technologického zázemí Muzea východních Čech v Hradci Králové
Místo:	Hradec Králové
Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0011170
Smlouva o dílo ze dne 04.02.2019	

ZMĚNOVÝ LIST		ZL	73
		revize:	
	Společnost	Zastoupena (Jméno, Příjmení)	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	Mgr. Martin Červíček	
Zhotovitel:	Společnost BAK-GEOSAN, Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek	Ing. Radek Mrázek, MBA Ivan Havel Ing. Kamil Vykydal	
Vydáno dne:			
PŘEDMĚTEM ZMĚNOVÉHO LISTU - ZADÁVACÍHO LISTU			
<i>Na základě požadavku OPP MMHK je nutné provést kamenickou opravu pískovcového ostění hlavních vstupních dveří stávající budovy Gayerových kasáren. Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které investor jednající s náležitou péčí nemohl předvidat. Změna nemění celkovou povahu zakázky.</i>			
• Rozpočet, viz. v příloha č. 1 • Stanovisko Magistrátu města Hradec Králové, odboru památkové péče k opravě fasády objektu č.p. 334 - bod 4.1, viz. v příloha č. 2 • Email od OPP MMHK (BcA. Karolína Blažejová)			
DOPAD NA CENU (bez DPH):		DOPAD NA ČAS realizace v souvislosti s tímto ZL:	
Celkem odpočty:	0,00 Kč	Termín pro vyprojektování změny:	
Celkové odpočty a připočty:	46 045,74 Kč	Termín pro provedení změny:	
Celkem připočty:	46 045,74 Kč	Dopad na dílčí termíny:	NE
Cena díla po poslední změně:	222 864 085,59 Kč	Dopad na termín dokončení:	NE
Podpisem zástupců obou smluvních stran se tento „ZL“ nepovažuje za písemný dodatek k výše uvedené smlouvě o dílo. Tento ZL bude nutné řešit dodatkem Smlouvy o dílo			

Zástupce Objednatele: Ing. Václav Nýč	Datum: 08.02.2021
Zástupce Objednatele: Ing. Roman Kosář	Datum: 08.02.2021
Technický dozor investora: Ing. Luboš Kasper	Datum: 08.02.2021
Generální projektant: Ing. Martin Uličný	Datum: 08.02.2021
Zástupce Zhotovitele: Karel Laš	Datum: 08.02.2021
Za Zhotovitele vvracoval: Ing. Petr Hanzlík	Datum: 08.02.2021
Za Zhotovitele kontroloval: Ing. Michal Holub	Datum: 08.02.2021
Za Zhotovitele kontroloval: Ing. Michal Šťastný	Datum: 08.02.2021
Za Zhotovitele kontroloval: Lukáš Laštovička, DiS.	Datum: 08.02.2021

ZADANÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu Gayerových kasáren vč. přístavby, Opletalova 334/2, Hradec Králové
 Objekt: D.1.1. ASR - NOVÝ STAV
 Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
 Zhotovitel: Společnost BAK-GEOSAN, Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek
 Místo: Hradec Králové

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
------	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

SOUPIS PRACÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							46 045,74	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 467,87	
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 467,87	
10	K	628641111	Kamenické opracování omítnutých nebo neomítnutých lícních ploch zdí a valů bez provedení vlastní omítky a bez vypracování pásků podél hran pemřováním ploch	m2	3,210	401,94	1 290,23	CS ÚRS 2019 01*0,99
	WV		"URS 2019 I" * 0,99"					
	WV		(0,33+0,33+0,33+0,08)*1,5*2		3,210			
11	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	3,210	55,34	177,64	CS ÚRS 2019 01*0,99
	WV		"URS 2019 I" * 0,99"					
	WV		(0,33+0,33+0,33+0,08)*1,5*2		3,210			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				37 368,81	
	D	782	Dokončovací práce - obklady z kamene				1 739,68	
7	K	782991116	Obklady z kamene - ostatní práce spárování epoxidem	m	7,160	164,34	1 176,67	CS ÚRS 2019 01*0,99
	WV		(0,33+0,33+0,33+0,8)*2*2		7,160			
1	K	782991422	Obklady z kamene - ostatní práce impregnační nátěr včetně základního čištění dvouvrstvy	m2	3,210	153,45	492,57	CS ÚRS 2019 01*0,99
	WV		"URS 2019 I" * 0,99"					
	WV		(0,33+0,33+0,33+0,08)*1,5*2		3,210			
2	K	998782203	Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m	%	16,820	4,19	70,44	CS ÚRS 2019 01*0,99
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				35 629,13	
3	K	783806807	Odstanění nátěrů z omítek odstraňovačem nátěrů s obroušením	m2	19,260	109,89	2 116,48	CS ÚRS 2019 01*0,99
	WV		"ODSTRANĚNÍ NATĚRŮ Z POVRCHU PÍSKOVCE ODSTRANOVACEM NATĚRŮ - MUSÍ BYT PROVEDENO 6X"					
	WV		3,21*6		19,260			
4	M	58562260	odstraňovač syntetický nátěrů a omítek	litr	55,860	599,94	33 512,65	CS ÚRS 2019 01*0,99
	WV		"ODSTRANĚNÍ NATĚRŮ Z POVRCHU PÍSKOVCE ODSTRANOVACEM NATĚRŮ - MUSÍ BYT PROVEDENO 6X"					
	WV		13,3*6*0,7 "LITRY/ 1M2/ 1 KROK"		55,860			
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				7 209,06	
5	K	HZS2312	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV úpravy povrchů a podlahy malíř, natěrač, lakýrník specialista	hod	16,050	350,46	5 624,88	CS ÚRS 2019 01 * 0,99
	WV		"OPRAVA KAMENNÝCH PRVKŮ SCHODIŠTĚ PO ODSTRANĚNÍ NATĚRŮ - OPRAVA PROFILACE, LOKÁLNÍ RETUŠE, DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍCÍCH ČÁSTÍ"					
	WV		"1M2=5,0 HODINY" 3,21*5		16,050			
8	M	23521000	hmota lepicí a opravná bezrozpouštědlová na bázi epoxidových pryskyfic	kg	4,815	218,79	1 053,47	CS ÚRS 2019 01 * 0,99
	WV		"SPOTREBA 1,5 KG/M2" 3,21*1,5		4,815			
9	M	23561125	tvrdidlo dvousložkových epoxidových pryskyfic a tmelů	kg	3,210	165,33	530,71	CS ÚRS 2019 01 * 0,99
	WV		"SPOTREBA 1,0 KG/M2" 3,21*1,0		3,210			



Stanovisko OPP k f...
1.4 MB

From: Blažejová Karolína BcA. <Karolina.Blazejova@mmhk.cz>

Sent: Friday, February 5, 2021 3:13 PM

To: Luboš Kasper <kasper@luboskasper.cz>

Cc: Falta Jan Ing. arch. <Jan.Falta@mmhk.cz>

Subject: Stanovisko odboru památkové péče k opravě fasády Gayerovy kasárna

Vážený Ing. Kaspere,

v příloze Vám **posílám** slíbené stanovisko odboru památkové péče MMHK k provedené opravě fasády č.p. 334 (Smart muzeum). S pozdravem
Blažejová

BcA. Karolína Blažejová
památkář
odbor památkové péče

Tel: +420 495 707 693


Karolina.Blazejova@mmhk.cz



HRADEC KRÁLOVÉ

**Stanovisko Magistrátu města Hradec Králové, odboru památkové péče k opravě
fasády objektu č.p. 334**

- Toto stanovisko je provedeno na základě vizuální kontroly fasády provedené Magistrátem města Hradec Králové, odborem památkové péče (dále jen „OPP“) dne 05.02.2021. Stanovisko se netýká objektu přístavby, pouze původního objektu č.p. 334.
- 1. Všechny doplňované profilované prvky (římsy, šambrány, frontony, stezky, konzoly) fasády jsou provedeny ve správné modelaci, tj. modelace doplňovaných ploch navazuje na profilaci ploch ponechaných.
- 2. Doplňované plochy mají shodnou strukturu s omítkami původními.
- 3. Barevnost fasády odpovídá předloženému a OPP odsouhlasenému vzorku barevnosti.
- 4. Z hlediska památkové péče je nezbytné provést tyto práce:
 - 4.1. Kamenická oprava celé plochy pískovcového ostění u původního hlavního vstupu do objektu, vstupní dveře označeny v projektové dokumentaci DFR 01. Kamenné ostění zasahuje do prostoru přístavby a prostoru schodiště. (Jedná se zejm. o očištění, odstranění druhotných nevhodných vysprávek, tmelení, kamenická povrchová plastická úprava, případně barevná retuš). Postup je třeba před zahájením prací konzultovat s OPP.(viz. foto č 1)

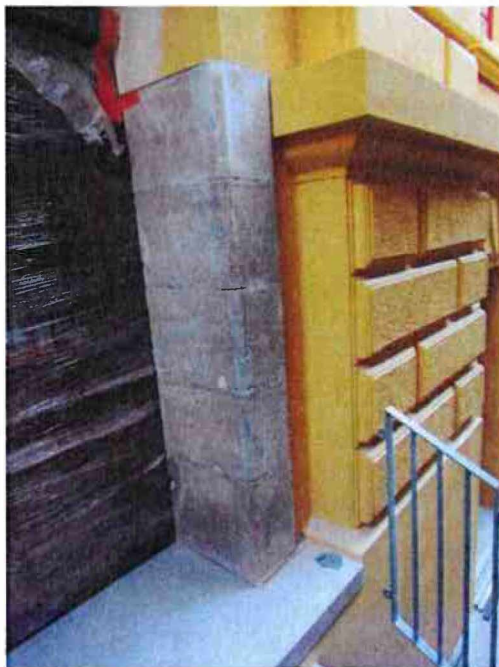

Fotografie č. 1

- 4.2. Doplnění konzol (6 ks) pod korunní římsou v jižní (dvorní) části východního křídla.
- 4.3. Úprava ukončení fasády k okapovému chodníku směrem k ulici Šimkova (severní strana).

Při provádění kontroly fasády bylo zjištěno, že na mnoha místech, která se vyskytují v úrovních všech podlaží a jsou situována v části dvorní, při ulici Šimkova a Opletalova jsou patrné plochy, které vykazují pravděpodobně působení vlhkosti, zasolení apod. zděné konstrukce. Projevují se jako ztmavlé plochy a „šupinatění“ fasádního nátěru, včetně jeho nesoudržnosti s podkladní vrstvou. Pro funkčnost, životnost a estetické vyznění fasády je nutné identifikovat příčinu těchto projevů a navrhnout účinné opatření k jejich odstranění. (Některé plochy viz. foto č. 2 a 3)



Fotografie č. 2



Fotografie č. 3

Dne 05.02.2021

Zpracovala: BcA. Karolína Blažejová

- 4.2. Doplnění konzol (6 ks) pod korunní římsou v jižní (dvorní) části východního křídla.
- 4.3. Úprava ukončení fasády k okapovému chodníku směrem k ulici Šimkova (severní strana).

Při provádění kontroly fasády bylo zjištěno, že na mnoha místech, která se vyskytují v úrovních všech podlaží a jsou situována v části dvorní, při ulici Šimkova a Opletalova jsou patrné plochy, které vykazují pravděpodobně působení vlhkosti, zasolení apod. zděné konstrukce. Projevují se jako ztmavlé plochy a „šupinatění“ fasádního nátěru, včetně jeho nesoudržnosti s podkladní vrstvou. Pro funkčnost, životnost a estetické vyznění fasády je nutné identifikovat příčinu těchto projevů a navrhnout účinné opatření k jejich odstranění. (Některé plochy viz. foto č. 2 a 3)



Fotografie č. 2



Fotografie č. 3

Dne 05.02.2021

Zpracovala: BcA. Karolína Blažejová



Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Zhotovitel:	Společnost BAK-GEOSAN, Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek
Projekt:	SMARTmuzeum: modernizace depozitářů, technického a technologického zázemí Muzea východních Čech v Hradci Králové
Místo:	Hradec Králové
Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/001/17/0
Smlouva o dílo ze dne 04.02.2019	

ZMĚNOVÝ LIST		ZL	74
		revize:	
Objednatel:	Společnost Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	Zastoupena (Jméno, Příjmení)	Mgr. Martin Cervíček
Zhotovitel:	Společnost BAK-GEOSAN, Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek	Ing. Radek Mrázek, MBA Ing. Kamil Vykydal	
Vydáno dne:			
PŘEDMĚTEM ZMĚNOVÉHO LISTU - ZADÁVACÍHO LISTU			
Na základě úpravy docházkového systému je nutné upravit dveře DF05. Změna nemá celkovou povahu zakázky.			
* Rozpočet, viz. v příloha č. 1 * Cenová nabídka, viz. příloha č. 2			
DOPAD NA CENU (bez DPH):		DOPAD NA ČAS realizace v souvislosti s tímto ZL:	
Celkem odpočty:	0,00 Kč	Termín pro vyprojektování změny:	
Celkové odpočty a připočty:	15 165,00 Kč	Termín pro provedení změny:	
Celkem připočty:	15 165,00 Kč	Dopad na dílčí termíny:	NE
Cena díla po poslední změně:	222 879 250,59 Kč	Dopad na termín dokončení:	NE
Podpisem zástupců obou smluvních stran se tento „ZL“ nepovažuje za písemný dodatek k výše uvedené smlouvě o dílo. Tento ZL bude nutné řešit dodatkem Smlouvy o dílo			

Zástupce Objednatel:
Ing. Václav Nýč
Datum:
08.02.2021

Zástupce Objednatel:
Ing. Roman Kosař
Datum:
08.02.2021

Technický dozor investora:
Ing. Luboš Kasper
Datum:
08.02.2021

Generální projektant:
Ing. Martin Uličný
Datum:
08.02.2021

Zástupce Zhotovitele:
Karel Laš
Datum:
08.02.2021

Za Zhotovitele vypracoval:
Ing. Karel Borkovec
Datum:
08.02.2021

Za Zhotovitele kontroloval:
Ing. Michal Holub
Datum:
08.02.2021

Za Zhotovitele kontroloval:
Ing. Michal Štastný
Datum:
08.02.2021

Za Zhotovitele kontroloval:
Lukáš Laštovička, DiS
Datum:
08.02.2021

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu Gayerových kasáren vč. přístavby, Opletalova 334/2, Hradec Králové
Objekt: D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		PSV	Práce a dodávky PSV				15 165,00	
		766	Konstrukce truhlářské				15 165,00	
		Zl. 74_1	Úprava dveří DFPOS	kpl	1,00	15 000,00	15 000,00	cena v místě a čase obvyklá
			* 1.PP.*		1,00			
			* odvoz dveří zpět na dílnu, zhotovení celých dveří, frézování, vrtání a příprava dveřního křídla pro elektronický zámek, nový kompletní nástřík dveří, doprava a montáž *					
164	766	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1,10	150,00	165,00	dle SOD
			<u>Celkem</u>				15 165,00	
		CELKEM	D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ				15 165,00	



Nabídkový list č. 0004
Název projektu: vícepráce muzeum SMART
Datum vystavení: 27.01.2021
Vypracoval: Kučera
Telefon: 739 159 081
Email: kučera@drevovyrobatopa.cz

Dodavatel

DREVOVÝROBA TOPA s.r.o.
Tomáš Kučera
Okružní 5
Vernerice
40725
IČ 28698282
DIČ CZ28698282
www.drevovyrobatopa.cz

Odběratel

BAK stavební společnost a.s.
~~Zátopická~~ 571/1
Prosek, 190 00 Praha 9
kontakty: Osoba: Martin Medek
mobil: +420 603 567 425
mail: medek@bak.cz

Vážený zákazníku, zasíláme Vám cenovou nabídku na vícepráce spojené s úpravou křídla dveří DF 05 pro možné osazení elektromechanického zámku – jedná se o přípravu (zadlab) pro vložení elektromechanického zámku, který není součástí naší dodávky. Vícepráce spočívá v následujících operacích: provedení truhlářských prací- zadlabu a dodatečné vykabelování v konstrukci dveří, aby vzhled dveří stále odpovídal požadavku OPP MMHK.

	Množství [ks]	Cena celkem
Doprava	1 ks	4 000 Kč
Kompletní úprava dveří	1 ks	11 000 Kč
Cena bez DPH		15 000 Kč
DPH		3 150 Kč
Cena celkem s DPH (21 %)		18 150 Kč





Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Zhotovitel:	Společnost BAK-GEOSAN, Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek
Projekt:	SMARTmuzeum: modernizace depozitářů, technického a technologického zázemí Muzea východních Čech v Hradci Králové
Místo:	Hradec Králové
Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.13/0.0/0.0/16_036/0011170
Smlouva o dílo ze dne 04.02.2019	

ZMĚNOVÝ LIST		ZL	75
		revize:	
	Společnost	Zastoupena (Jméno, Příjmení)	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	Mgr. Martin Cervíček	
Zhotovitel:	Společnost BAK-GEOSAN, Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek	Ing. Radek Mrázek, MBA Ivan Havel Ing. Kamil Vykydal	
Vydáno dne:			

PŘEDMĚTEM ZMĚNOVÉHO LISTU - ZADÁVACÍHO LISTU

V průběhu realizace zakázky došlo ke zjištění nutnosti možnosti ovládnutí zařízení vzduchotechniky a klimatizace MaR i z místnosti recepce v 1.NP původní budovy. Dále bude nutné provést úpravu v rozvaděči. Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které investor jednající s náležitou péčí nemohl předvidat. Změna nemění celkovou povahu zakázky.

- * Rozpočet, viz. v příloha č. 1
- * Cenové nabídky, viz. v příloha č. 2

DOPAD NA CENU (bez DPH):		DOPAD NA ČAS realizace v souvislosti s tímto ZL:	
Celkem odpočty:	-16 550,00 Kč	Termín pro vyprojektování změny:	----
Celkové odpočty a připočty:	188 456,90 Kč	Termín pro provedení změny:	----
Celkem připočty:	205 006,90 Kč	Dopad na dílčí termíny:	NE
Cena díla po poslední změně:	223 067 707,49 Kč	Dopad na termín dokončení:	NE

Podpisem zástupců obou smluvních stran se tento „ZL“ nepovažuje za písemný dodatek k výše uvedené smlouvě o dílo. Tento ZL bude nutně řešit dodatkem Smlouvy o dílo

<u>Zástupce Objednatel:</u> Ing. Václav Nýč	Datum: 15.03.2021
<u>Zástupce Objednatel:</u> Ing. Roman Kosář	Datum: 15.03.2021
<u>Technický dozor investora:</u> Ing. Luboš Kasper	Datum: 15.03.2021
<u>Generální projektant:</u> Ing. Martin Uličný	Datum: 15.03.2021
<u>Zástupce Zhotovitele:</u> Karel Laš	Datum: 15.03.2021
<u>Za Zhotovitele vpracoval:</u> Ing. Petr Hanzlík	Datum: 15.03.2021
<u>Za Zhotovitele kontroloval:</u> Ing. Michal Holub	Datum: 15.03.2021
<u>Za Zhotovitele kontroloval:</u> Ing. Michal Štátný	Datum: 15.03.2021
<u>Za Zhotovitele kontroloval:</u> Lukáš Laštovička, DiS.	Datum: 15.03.2021

ZADANÍ S VYKAZEM VYMER

Stavba: Stavební úpravy objektu Gayerových kasáren vč. přístavby, Opletalova 334/2, Hradec Králové
 Objekt: D.1.4.8. ELEKTRICKE KOMUNIKACE
 Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
 Zhotovitel: Společnost BAK-GEOSAN, Žitnická 871/1, 160 00 Praha 9 - Prosek
 Místo: Hradec Králové

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
		PSV	Práce a dodávky PSV				44 728,03	
			Dopojení koncových zařízení (VZT, Klimatizace)				21 487,03	
1		710100002	Likvidace vodičů na svorkovnici s oteplením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu 20y ks		210,00	28,51	5 987,52	Dle SoD ZL 70
			"Včetně uložení a zapojení"		210,00			
			"dopojení koncových zařízení"					
2	741	741110002	Montáž trubky plastové tuhá D přes 23 do 35 mm uložená pevně	m	98,000	32,97	3 230,77	Dle SoD ZL 42
			"CU ÚRS 2019 1 "0 99"		98,000			
			"dopojení koncových zařízení"					
3	M	34571095	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 36,6/40 mm, délka 3m	m	98,000	26,63	2 609,84	Dle SoD ZL 42
			"CU ÚRS 2019 1 "0 99"		98,000			
			"dopojení koncových zařízení"					
4	M	35432545	příchytka kabelová 29-40mm	kus	98,000	23,36	2 269,67	Dle SoD ZL 42
			"CU ÚRS 2019 1 "0 99"		98,000			
			"dopojení koncových zařízení"					
5	741	741910611	Montáž trubky plastové tuhá D přes 23 do 35 mm uložená pevně	m	98,000	12,57	1 232,15	Dle SoD ZL 57
			"CU ÚRS 2019 1 "0 99"		98,000			
			"dopojení koncových zařízení"					
6	741	741110001	Montáž trubky plastové tuhá D přes 16 do 23 mm uložená pevně	m	5,000	29,80	149,00	Dle SoD ZL 42
			"CU ÚRS 2019 1 "0 99"		5,000			
			"dopojení koncových zařízení"					
7	M	34571092	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, délka 3 m	m	5,000	10,30	51,48	Dle SoD ZL 42
			"CU ÚRS 2019 1 "0 99"		5,000			
			"dopojení koncových zařízení"					
8	741	741999306 SPC	D+M Kabel CYKY 5x2,5 - Specifikace dle PD	m	106,00	56,10	5 946,60	Dle SoD (D147 SILNOPROUD)
			"Včetně uložení a zapojení"					
			"dopojení koncových zařízení"		106,00			
		741	Elektromontážní práce - Ostatní				23 231,00	
9	741	741999802 SPC	D+M Pomocný materiál - Specifikace dle PD	sada	1,00	2 331,00	2 331,00	cena v čase a místě obvyklá
			"Spojovací a přípoňovací materiál, hmoždinky, vrtuty, šrouby"		1,00			
10	741	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	50,00	418,00	20 900,00	Dle SoD
			"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 741."		50,00			
			"Zeonická výpomoc, doplňkové práce, kompletace apod."					

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMER

Stavba: Stavební úpravy objektu Gayerových kasáren vč. přístavby, Opletalova 334/2, Hradec Králové

Objekt: D.1.1. ASR - NOVÝ STAV

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Společnost BAK-GEOSAN, Žitnická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek

Místo: Hradec Králové

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
		PSV	Práce a dodávky PSV				32 825,54	
			Úprava rozvaděče				7 121,01	
		ZL 75 01	Měřicí trať	kus	3,00	2 373,67	7 121,01	Cena v místě a čase obvyklá
			"Cena v místě a čase obvyklá"		3,00			
			Doplnění rozvaděče RB10 - požadavek MaR				25 704,53	
		ZL 75 02	RB úprava	kus	1,00	21 295,03	21 295,03	Cena v místě a čase obvyklá
			"Cena v místě a čase obvyklá"		1,00			
								Dle SdD ZL70
742	742330001		Montáž rozvaděče nástěnného	kus	1,00	3 385,80	3 385,80	
			"CJ URS 2021 1 * 0,99"					
			"Doplnění rozvaděče RB10 - požadavek MaR"					
			"CJ URS 2021 1 * 0,99"					
742	742330801		Demontáž rozvaděče	kus	1,00	1 019,70	1 019,70	URS 2019 I * 0,99
			"Doplnění rozvaděče RB10 - požadavek MaR"					
					1,00			

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu Gayerových kasáren vč. přístavby, Opletalova 334/2, Hradec Králové

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Společnost BAK-GEOSAN, Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek

Místo: Hradec Králové

127 453,32

-16 550,00

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
		HSV	Práce a dodávky HSV				110 903,32	
			Rozvaděč + řídící systémy				35 537,45	
		ZL 75_03	Úprava rozvaděče RA1	ks	1,00	4 563,00	4 563,00	cena v místě a čase obvyklá
			"Cena v místě a čase obvyklá"		1,000			
		35622003	připojovací sada, blokové svorky pro Al/Cu kabel 2x150mm ²	sada	1,00	3 247,20	3 247,20	URS 2019 I * 0,99
			"Cena v místě a čase obvyklá"		1,000			
		ZL 75_04	Kombinovaný I/O modul s řídící deskou, s displejem, 2x RS232, 2x RS485, Ethernet, 8xAI, 8xDI, 4xAO, 8xDC	ks	-1,00	16 550,00	-16 550,00	Dle SoD ZL 70
			"Cena v místě a čase obvyklá"		-1,000			
		ZL 75_05	Kombinovaný I/O modul s řídící deskou, s displejem, 2x RS232, 2x RS485, Ethernet, 8xAI, 8xDI, 4xAO, 8xDC + GSM	ks	1,00	29 717,77	29 717,77	cena v místě a čase obvyklá
			"Cena v místě a čase obvyklá"		1,000			
		ZL 75_06	Rozšiřující I/O modul, 1x RS485, 8xAI, 8xDC	ks	2,00	7 279,74	14 559,48	Dle SoD ZL 70 př. 23
			"Cena v místě a čase obvyklá"		2,000			
			Kabelové trasy				2 576,34	
		34121015	kabel sdělovací jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 100V (SYKY) 4x2x0,5mm ²	m	88,00	6,00	515,95	URS 2019 I * 0,99
			"CU URS 2021 I * 0,99"		88,000			
		741124707	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 10 až 16x1,5 mm ² uloženy volně (např. JYTY)	m	86,00	23,96	2 060,39	URS 2019 I * 0,99
			"CU URS 2021 I * 0,99"		86,000			
			Výkony				72 789,54	
		ZL 75_07	Realizační projektová dokumentace	kpl	1,00	4 167,54	4 167,54	cena v místě a čase obvyklá
			"Cena v místě a čase obvyklá"		1,000			
		ZL 75_08	Webserver	kpl	1,00	28 957,50	28 957,50	cena v místě a čase obvyklá
			"Cena v místě a čase obvyklá"		1,000			
		ZL 75_09	Úprava SW podstanice	kpl	1,00	19 913,40	19 913,40	cena v místě a čase obvyklá
			"Cena v místě a čase obvyklá"		1,000			
		ZL 75_10	Revize	kpl	1,00	702,00	702,00	cena v místě a čase obvyklá
			"Cena v místě a čase obvyklá"		1,000			
		ZL 75_11	Zaškolení obsluhy	kpl	1,00	1 719,90	1 719,90	cena v místě a čase obvyklá
			"Cena v místě a čase obvyklá"		1,000			
998	998764204		Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 36 m	%	1,68	1 690,00	2 839,20	Dle SoD
HZS	HZS2151		Hodinová zúčtovací sazba klempíř	hod	28,00	517,50	14 490,00	Dle SoD
			"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 764 "		28,00			
			"Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení, zprávy, zprávy, zprávy, apod."					



elektroinstalace a hromosvody

11.02.2021
Zakázka číslo: 041018
Mobil: 730158221

STAVBA: Stavební úpravy objektu Gayerových kasáren, Opletalova 334/2, Hradec Králové
INVESTOR: Královéhradecký kraj

REKAPITULACE	materiál	montáž	celkem
Vícepráce 14	28 047,15	2 703,90	30 751,05
Mezisoučet	28 047,15	2 703,90	30 751,05
Podružný materiál			
PPV			
Doprava			
Ostatní			
HZS			
Mezisoučet			0,00
CENA bez DPH			30 751
Daňový základ	15,0%	0	0
Daňový základ	21,0%	30 751	6 458
Daň celkem			6 458
CENA s DPH			37 209

Vypracoval: Martin Tomeš



NAZEV	MJ	JC mat.	JC mont.	materiál	montáž	JC celkem	Celkem
Vícepráce 14				28 047 Kč	2 704 Kč		30 751,05
Změna hodnoty hlavního jističe							
Měřicí trafo	ks 3,00	2347,37	26,30	7042,11	78,90	2373,67	7 121,01
Doplnění rozvaděče RB10 - požadavek MaR							
RB10 - úprava	ks 1,00	18674,03	2625,00	18674,03	2625,00	21299,03	21 299,03
D+M Pomocný materiál - Specifikace dle PD	ks 1,00	2331,00	0,00	2331,00	0,00	2331,00	2 331,00



Vaše značka

naše značka

vyřizuje
Jaroslav Šitina

Hradec Králové
5.2.2021

Věc: Cenová nabídka č. C2020-013-M-b dodávka a montáž systému měření a regulace

Akce: „SMARTMUZEUM Hradec Králové“

Vážený pane,

tímto Vám předkládáme stručný popis na dodávku a montáž rozšíření MaR pro výše uvedenou zakázku, která je rozšíření původní ceny za dodávku a montáž systému MaR.

Jedná se o doplnění Webserveru – vzdáleného přístupu přes webový prohlížeč. Dále bude doplněn GSM modul, ze kterého budou odesílány alarmy zařízení monitorovaných pomocí MaR a doplnění monitoringu stavů jističů topných kabelů žaluzií, odpadů a odpadních vaniček v půdních prostorech, ventilátorů a kondenzačních jednotek na jednotlivých půdách – 4NP východ, 4NP západ, 5NP. U topných kabelů bude hlídán i proudový chránič. Investor si zajistí Sim kartu s tarifem a Ethernetovou zásuvku u rozvaděče MaR. V případě poruchy MaR nebo spadlého jističe nebo proudového chrániče upozorním sms hláškou na poruchu. Dále bude možné ovládat zařízení MaR pomocí internetového prohlížeče-Webserveru

Jedná se tedy o:

- 9 topných kabelů žaluzií
- Topné kabely odpadů a vaniček pod kondenzační jednotkou
- 13 ventilátorů
- 9 kondenzačních jednotek

Na tyto okruhy bude muset být připraven elektro rozvaděč RB10 ve 4NP a doplněn pomocnými kontakty jednotlivých zařízení. Dále by pomocné kontakty měly být u proudového chrániče topných kabelů. Rozšiřující moduly systému budou umístěny v rozvaděči Elektro RB10.

Měření a regulace

Měření a regulace v ceně

87.750,59,- Kč

DPH dle platných předpisů



Přílohy: Položkový rozpočet

Cenová nabídka obsahuje:

- *Dodávku a montáž systému GSM do rozvaděče MaR pro zasílání sms hlášek*
- *Dodávku a montáž vazby na elektro rozvaděč RB10 pro monitorování polohy jističů*
- *WEBSERVER - vzdálený přístup přes webový prohlížeč*
- *Úpravu rozvaděče MaR*
- *Kabeláž*
- *Úpravu SW podstanic*
- *Zprovoznění, oživení a zaškolení obsluh*
- *Dopravu*
- *Revize*
- *Úpravu Realizační PD a PD skutečného stavu*

Cenová nabídka neobsahuje:

Požadavky na navazující profese dle Technické zprávy a dále:

- *Sim kartu*
- *PC vč. vizualizace – nebylo požadováno*
- *Úpravu a vybavení elektro rozvaděče*
- *Požární ucpávky*

Platební podmínky

- *splatnost faktur 30 dní*
- *fakturace měsíční*
- *zařízení staveniště 0%*

Záruky

Záruky na montážní a SW práce poskytuje firma INT CZ s.r.o. na dobu 60 měsíců ode dne předání a převzetí dokončeného díla. Záruky na zařízení odpovídají zárukám, které běžně poskytují výrobci těchto zařízení, nejméně však na dobu 24 měsíců ode dne předání a převzetí dokončeného díla.

Záruční lhůta se nevztahuje na případy zanedbání povinné údržby a servisu zařízení, na zásahy třetích osob, v jehož důsledku došlo k poškození zařízení a dále na materiály běžné spotřeby jako jsou náplně, baterie (včetně baterií UPS), filtry apod.



Servis

K zajištění spolehlivého chodu zařízení nabízí firma INT CZ s.r.o., též dlouhodobý záruční i pozáruční pravidelný servis, v jehož rámci jsou preventivní prohlídky a údržba zařízení, výměna náhradních dílů, atd.

Platnost nabídky je 1 měsíc.

Doufáme, že naše nabídka splňuje Vaše představy a požadavky a budeme se těšit na budoucí spolupráci.

S pozdravem

Za společnost **INT CZ s.r.o.**

Jaroslav Šitina

rozpočtář TZB

e-mail : sitina@intcz.cz

tel : 775 591 433

INT CZ s.r.o. | Jilmová 2026 | 500 08 Hradec Králové | IČ: 288 13 618 | DIČ: CZ28813618 | Telefon: +420 256 545 177
Provozovna | Křovová 962 | 500 03 Hradec Králové | www.intcz.cz
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. | číslo účtu: 250654517/0300, Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 28798.



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Pozice	Kód URS	Název dílu	Dodavatel	Jednotky	Množství	Jednotková cena dodávky	Celková cena dodávky	Jednotková cena montáže	Celková cena montáže
1		Rozvaděče + řídicí systémy							
1.1		Uprava Rozvaděče RA1	0	ks	1,0	0 Kč	0 Kč	0 Kč	4 563 Kč
1.3		Kombinovaný I/O modul s řídicí deskou, s displejem, 2x RS232, 2x RS485, Ethernet, 8xAI, 8xDI, 4xAO, 8xDO	0	ks	-1,0	16 550 Kč	-16 550 Kč	0 Kč	0 Kč
1.4		Kombinovaný I/O modul s řídicí deskou, s displejem, 2x RS232, 2x RS485, Ethernet, 8xAI, 8xDI, 4xAO, 8xDO + GSM	0	ks	1,0	29 718 Kč	29 718 Kč	0 Kč	0 Kč
1.5		Rozšiřující I/O modul, 1x RS485, 8xAI, 8xDO	0	ks	2,0	7 280 Kč	14 559 Kč	0 Kč	0 Kč
1		Celkem zařízení - Rozvaděče + řídicí systémy					27 727 Kč		4 563 Kč
2		Výkony							
2.1		Realizační projektová dokumentace	0	kpl	1,0	0 Kč	0 Kč	4 168 Kč	4 168 Kč
2.2		Webserver	0	kpl	1,0	0 Kč	0 Kč	28 958 Kč	28 958 Kč
2.3		Uprava SW podstanice	0	kpl	1,0	0 Kč	0 Kč	19 913 Kč	19 913 Kč
2.4		Revize	0	kpl	1,0	0 Kč	0 Kč	702 Kč	702 Kč
2.5		Zaškolení obsluhy	0	kpl	1,0	0 Kč	0 Kč	1 720 Kč	1 720 Kč
2.6			0	ks	0,0	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
2.7			0	ks	0,0	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
2		Celkem zařízení - Výkony							55 460 Kč
		Celkem dodávka a montáž					27 727 Kč		60 023 Kč
		Celková cena zakázky					87 751 Kč		



Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Zhotovitel:	Společnost BAK-GEOSAN, Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek
Projekt:	SMARTmuzeum: modernizace depozitářů, technického a technologického zázemí Muzea východních Čech v Hradci Králové
Místo:	Hradec Králové
Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/001/17/0
Smlouva o dílo ze dne 04.02.2019	

ZMĚNOVÝ LIST		ZL	76
		revize:	
	Společnost	Zastoupena (Jméno Příjmení)	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	Mgr. Martin Cervíček	
Zhotovitel:	Společnost BAK-GEOSAN, Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek	Ing. Radek Mrázek, MBA Ivan Havel Ing. Kamil Vykydal	
Vydáno dne:			
PŘEDMĚTEM ZMĚNOVÉHO LISTU - ZADÁVACÍHO LISTU			
<i>V průběhu realizace bylo zjištěno, že ve 4.NP chybí zásuvky pro průtokové ohřivače, přívodní kabel do šachty Š3 dešťové kanalizace k retenční nádrži vč. ukončení zásuvkou s ochranou proti vlhkosti IP, přívodní kabel k ovládání plošiny ZTP a ke střížné plošině v 1.PP u opěrné stěny, přívodní kabel z RH do výměňkové stanice v 1.PP, doplnění rozvaděče RPO a RP, rozšíření kabeláže pro možné ovládání po sektorech sklopných oken sloupko příčkové prosklené fasády přístavby, centrální ovládání ventilátoru v sociálních místnostech původní budovy, rozšíření kanalizačního potrubí pro odvod kondenzátu v 5.NP, 4.NP - včetně tepelné izolace potrubí v půdách.</i> Změna nemění celkovou povahu zakázky.			
• Rozpočet, viz. v příloha č. 1 • Cenové nabídky viz. v příloha č. 2 • Půdorys 4 NP - zásuvky viz. v příloha č. 3 • Trasa kabelu a umístění zásuvky v šachtě Š3 viz. v příloha č. 4 • Trasa kabelu pro ovládání plošiny ZTP a střížné plošiny viz. v příloha č. 5 • Doplnění úprav v rozvaděči RP viz. v příloha č. 6 • Doplnění přívodních kabelů pro okna v prosklené fasádě viz. v příloha č. 7 • Pohybová čidla - sociální prostory viz. v příloha č. 8			
DOPAD NA CENU (bez DPH):		DOPAD NA ČAS realizace v souvislosti s tímto ZL:	
Celkem odpočty:	-647,46 Kč	Termin pro vyprojektování změny:	----
Celkové odpočty a připočty:	253 416,17 Kč	Termin pro provedení změny:	----
Celkem připočty:	254 063,63 Kč	Dopad na dílčí termíny:	NE
Cena díla po poslední změně:	223 321 123,66 Kč	Dopad na termín dokončení:	NE

Podpisem zástupců obou smluvních stran se tento „ZL“ nepovažuje za písemný dodatek k výše uvedené smlouvě, ale pouze za její součást a mění ji pouze tehdy, pokud je v něm uvedeno jinak. Smlouva o dílo zůstává platná a účinná.

Zástupce Objednatel: Ing. Václav Nýč	Datum: 15.03.2021
Zástupce Objednatel: Ing. Roman Kosař	Datum: 15.03.2021
Technický dozor investora: Ing. Luboš Kasper	Datum: 15.03.2021
Generální projektant: Ing. Martin Uličný	Datum: 15.03.2021
Zástupce Zhotovitele: Karel Laš	Datum: 15.03.2021
Za Zhotovitele vypracoval: Ing. Petr Hanzlík	Datum: 15.03.2021
Za Zhotovitele kontroloval: Ing. Michal Holub	Datum: 15.03.2021
Za Zhotovitele kontroloval: Ing. Michal Štastrný	Datum: 15.03.2021
Za Zhotovitele kontroloval: Lukáš Lašovička, DiS.	Datum: 15.03.2021

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMÉR

Stavba: Stavební úpravy objektu Gayerových kasáren vč. přístavby, Opletalova 334/2, Hradec Králové
 Objekt: D.1.4.8. ELEKTRICKÉ KOMUNIKACE
 Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
 Zhotovitel: Společnost BAK-GEOSAN, Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek
 Místo: Hradec Králové

127 280,87
 -647,46

P.C.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
		PSV	Práce a dodávky PSV				126 633,41	
			Zás. pro průtokový ohřivač 4 NP				4 990,26	
9	741	741999305 SPC	D+M Kabel CYKY 3x2,5 - Specifikace dle PD "Včetně uložení a zapojení" "Zás. pro průtokový ohřivač"	m	52,00	39,80	2 059,20	Dle SoD (D1 4.7 SILNOPROUD)
10	741	741999202 SPC	D+M Zásuvka 230 V/16 A - Specifikace dle PD "Zás. pro průtokový ohřivač"	kus	2,00	164,70	329,40	Dle SoD (D1 4.7 SILNOPROUD)
11		ZL 76 01	Jistič s proudovým chráncem B16-003/AC "Cena v místě a čase obvyklá"	kus	2,00	1 100,55	2 201,10	Cena v místě a čase obvyklá
12	741	741321003	Montáž proudových chránců dvoupólových nn do 25 A ve skříně "CU URS 2019 1 * 0,99" "Zás. pro průtokový ohřivač"	kus	2,00	170,28	340,56	URS 2019 I * 0,99
			Přívod do šachty S3 u isletní nádrže		2,00		10 378,27	
13	741	741999306 SPC	D+M Kabel CYKY 5x2,5 - Specifikace dle PD "Včetně uložení a zapojení" "Přívod do jímky"	m	82,00	56,10	4 600,20	Dle SoD (D1 4.7 SILNOPROUD)
14		34571350	trubka elektroinstalční ohebná dvouplošná kotugovaná (chránič) Ø 32/40mm, HDPE+LDPE "CU URS 2019 1 * 0,99" "Přívod do jímky"	m	56,00	22,97	1 263,24	Dle SoD ZL 48
15	K	741110002	Montáž trubky plastové tuhé Ø ales 23 do 35 mm ułożená pevně "CU URS 2019 1 * 0,99" "Přívod do jímky"	m	55,00	32,87	1 813,19	Dle SoD ZL 42
16		ZL 76 01	Jistič s proudovým chráncem B16-003/AC "Cena v místě a čase obvyklá"	kus	2,00	1 100,55	2 201,10	Cena v místě a čase obvyklá
17	741	741321003	Montáž proudových chránců dvoupólových nn do 25 A ve skříně "CU URS 2019 1 * 0,99" "Zás. pro průtokový ohřivač"	kus	2,00	170,28	340,56	URS 2019 I * 0,99
18		34571524	krabice přístrojová obočná s víčkem z PH, 132x132mm, hloubka 72mm "Zás. pro průtokový ohřivač"	ks	1,00	100,98	100,98	URS 2019 I * 0,99
19	741	741112063	Montáž krabice přístrojové zapuštěná plastová čtyřhranná "Zás. pro průtokový ohřivač"	ks	1,00	35,05	35,05	Dle SoD ZL 70
20		35441875	svorka klizová pro vodič Ø 6-10mm "Zás. pro průtokový ohřivač"	ks	1,00	23,96	23,96	Dle SoD ZL 70
21		34111100	Přívod pro plošinu 1 PP kabel instalační jádro Cu olně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2 "Včetně uložení a zapojení" "Přívod pro plošinu v 1 PP"	m	35,00	94,55	3 309,08	URS 2019 I * 0,99
22	741	741122743	Montáž kabel Cu plný kulatý panceroovaný žila 5x6 až 10 mm2 ułożení pevně (např. CYKYDY) "Včetně uložení a zapojení" "Přívod pro plošinu v 1 PP"	m	35,00	70,19	2 456,69	URS 2019 I * 0,99
23		ZL 76 02	Jistič B 32/3 "Cena v místě a čase obvyklá" "Přívod pro plošinu v 1 PP"	ks	1,00	497,95	497,95	Cena v místě a čase obvyklá
24	741	741320175	Montáž jističů třípólových nn do 63 A ve skříně "Přívod pro plošinu v 1 PP"	ks	1,00	337,59	337,59	URS 2019 I * 0,99
			Přívod zdvižná plošina ZTP				593,00	
25	741	741999305 SPC	D+M Kabel CYKY 3x2,5 - Specifikace dle PD "Včetně uložení a zapojení" "Přívod zdvižná plošina ZTP"	m	-10,00	39,80	-396,00	Dle SoD (D1 4.7 SILNOPROUD)
26	741	741999306 SPC	D+M Kabel CYKY 5x2,5 - Specifikace dle PD "Včetně uložení a zapojení" "Přívod zdvižná plošina ZTP"	m	10,00	56,10	561,00	Dle SoD (D1 4.7 SILNOPROUD)
27	M	35822111	Jistič 1pólový-charakteristika B 16A "CU URS 2019 1 * 0,99" "Přívod zdvižná plošina ZTP"	kus	-1,000	116,82	-116,82	Dle SoD ZL 42
28	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříně "CU URS 2019 1 * 0,99" "Přívod zdvižná plošina ZTP"	kus	-1,000	134,64	-134,64	Dle SoD ZL 42
29		ZL 76 03	Jistič B 16/3 "Cena v místě a čase obvyklá" "Přívod zdvižná plošina ZTP"	ks	1,00	341,87	341,87	Cena v místě a čase obvyklá
30	741	741320175	Montáž jističů třípólových nn do 63 A ve skříně "Přívod zdvižná plošina ZTP"	ks	1,00	337,59	337,59	URS 2019 I * 0,99
31		34111076	Přívodní kabel z RH do rozvodny výměníkové stanice kabel instalační jádro Cu olně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2 "CU URS 2019 1 * 0,99" "Přívod rozvaděč kotelna, přívod vstupující do 1 NP a zpět do prostor rozvodny v 1 PP"	m	37,00	117,81	4 358,97	URS 2019 I * 0,99
32	741	741122133	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 4x10 mm2 zaráženy v trubkách (např. CYKY) "CU URS 2019 1 * 0,99" "Přívod rozvaděč kotelna, přívod vstupující do 1 NP a zpět do prostor rozvodny v 1 PP"	m	37,00	47,92	1 772,89	URS 2019 I * 0,99
33		ZL 76 02	Jistič B 32/3 "Cena v místě a čase obvyklá" "Přívod rozvaděč kotelna, přívod vstupující do 1 NP a zpět do prostor rozvodny v 1 PP"	ks	1,00	497,95	497,95	Cena v místě a čase obvyklá
34	741	741320175	Montáž jističů třípólových nn do 63 A ve skříně "Přívod rozvaděč kotelna, přívod vstupující do 1 NP a zpět do prostor rozvodny v 1 PP"	ks	1,00	337,59	337,59	URS 2019 I * 0,99
			Doplnění úprav v rozvaděči RP a napájení serverů				754,38	
35	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříně "CU URS 2019 1 * 0,99" "Doplnění rozvaděče RPO a napájení serverů"	kus	3,000	134,64	403,92	Dle SoD ZL 42
36	M	35822111	Jistič 1pólový-charakteristika B 16A "CU URS 2019 1 * 0,99" "Doplnění rozvaděče RPO a napájení serverů"	kus	3,000	116,82	350,46	Dle SoD ZL 42
37		ZL 76 03	Doplnění rozvaděče - impulzní relé Impulzní relé - 230 VAC 1 Z "Cena v místě a čase obvyklá" "Doplnění rozvaděče - impulzní relé"	ks	17,00	1 370,86	23 304,62	Cena v místě a čase obvyklá
38	M	35822109	Jistič 1pólový-charakteristika B 10A "CU URS 2019 1 * 0,99" "Doplnění rozvaděče - impulzní relé"	kus	23,000	136,62	3 142,26	Dle SoD ZL 42
39		741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříně "CU URS 2019 1 * 0,99"	kus	23,000	134,64	3 096,72	Dle SoD ZL 42

		"Doplnění rozvaděče - imoulní relé"			23,00				
40	ZL 76 01	Jistič s proudovým chráničem B16-003/AC	kus	10,00	1 100,55	11 005,50	Cena v místě a čase obvyklá		
		"Cena v místě a čase obvyklá"		10,00					
41 741	741321002	Montáž proudových chráničů do rozvaděčů nn do 25 A ve skříních	kus	10,00	170,28	1 702,80	URS 2019 I * 0,99		
		"CÚ URS 2019 I * 0,99"							
		"Doplnění rozvaděče - imoulní relé"		10,00					
		Kabeláž pro pohony oken přístavby				30 865,89			
							Die SoD		
42 741	741999306 SPC	D+M Kabel CYKY 5x2,5 - Specifikace dle PD	m	261,00	56,10	15 764,10	(D1 4.7 SILNOPROUD)		
		"Včetně uložení a zapojení"							
		"Kabeláž pro pohony oken přístavby"		261,00					
							Die SoD		
43 741	741999304 SPC	D+M Kabel CYKY 3x1,5 - Specifikace dle PD	m	146,00	31,50	4 721,20	(D1 4.7 SILNOPROUD)		
		"Včetně uložení a zapojení"							
		"Kabeláž pro pohony oken přístavby"		146,00					
44	ZL 76 04	Svorkovnice s krytím pro pohyblivý přívod 5x2,5 mm ² Cu	ks	16,00	90,35	1 445,60	Cena v místě a čase obvyklá		
		"Cena v místě a čase obvyklá"							
		"Kabeláž pro pohony oken přístavby"		16,00					
45 741	741231004	Montáž svorkovnice do rozvaděče - řadová vodič do 16 mm ² se zapojením vodičů	kus	16,00	32,18	514,80	URS 2019 I * 0,99		
		"CÚ URS 2019 I * 0,99"							
		"Kabeláž pro pohony oken přístavby"		16,00					
46	ZL 76 05	Krabice univerzální do sádkarionu	ks	32,00	22,17	709,44	Cena v místě a čase obvyklá		
		"Cena v místě a čase obvyklá"							
		"Kabeláž pro pohony oken přístavby"		32,00					
47 741	741112002	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová pro sádkarionové příčky	kus	32,00	60,86	2 568,26	URS 2019 I * 0,99		
		"CÚ URS 2019 I * 0,99"							
		"Kabeláž pro pohony oken přístavby"		32,00					
48	ZL 76 06	Ochranné žaluziové jednodílné	ks	16,00	66,00	1 568,00	Cena v místě a čase obvyklá		
		"Cena v místě a čase obvyklá"							
		"Kabeláž pro pohony oken přístavby"		16,00					
49 741	741310011	Montáž ovladače náhlenný 1/0-tlačítkový zaplnací prostředek normální	kus	16,00	136,62	2 185,92	URS 2019 I * 0,99		
		"CÚ URS 2019 I * 0,99"							
		"Kabeláž pro pohony oken přístavby"		16,00					
50	210100002	Ukončení vodičů na svorkovnic s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 6 mm ²	ks	48,00	28,51	1 368,58	URS 2019 I * 0,99		
		"Včetně uložení a zapojení"							
		"Kabeláž pro pohony oken přístavby"		48,00					
		741				23 231,00			
51 741	741999802 SPC	D+M Pomocný materiál - Specifikace dle PD	sada	1,00	2 331,00	2 331,00	Cena v čase a místě obvyklé		
		"Spojovací a upevňovací materiál, hmoždinky, vrtul, sídla"		1,00					
62 741	HZ92221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	50,00	418,00	20 900,00	Die SoD		
		"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 741"		50,00					
		"Zednická výpomoc: doplňkové práce, kompletace abod"							

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMER

Stavba: Stavební úpravy objektu Gayerových kasáren vč. přístavby, Opletalova 334/2, Hradec Králové
 Objekt: D.1.1. ASR - NOVÝ STAV
 Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
 Zhotovitel: Společnost BAK-GEOSAN, Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek
 Místo: Hradec Králové

P.C.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
		PSV	Práce a dodávky PSV				68 633,78	
		ZL 76 12	Centrální ovládání ventilátoru				57 175,75	
			Pohybové čidlo stopení	kus	22,00	1 362,21	30 056,60	Cena v místě a čase obvyklá
			"Cena v místě a čase obvyklá"					
742		741311004	Demontáž rozvaděče	kus	22,00	281,16	6 185,52	URS 2019 I * 0,99
			"CU URS 2021 I * 0,99"					
			"Ovládání ventilátoru na WC a v kuchyňkách"					
		ZL 76 13	Relé SMRT pod vypínač	kus	14,00	505,06	8 330,87	Cena v místě a čase obvyklá
			"Cena v místě a čase obvyklá"					
742		741330741	Montáž relé nezávislé časové	kus	14,00	332,64	4 656,96	URS 2019 I * 0,99
			"CU URS 2021 I * 0,99"					
			"Ovládání ventilátoru na WC a v kuchyňkách"					
		741599304						
741		SPC	D+M Kabel CYKY 3x1,5 - Specifikace dle PD	m	138,00	31,90	4 402,20	Dle SoD (D1 47 SILNCPROUD)
			"Včetně uložení a zapojení"					
			"Ovládání ventilátoru na WC a v kuchyňkách"					
					138,00			
		34571524	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, 132x132mm, hloubka 72mm	ks	22,00	100,98	2 221,56	DLE SOD ZL70
			"CU URS 2021 I * 0,99"					
			"Ovládání ventilátoru na WC a v kuchyňkách"					
		741112063	Montáž krabice přístrojové zapuštěná plastová čtyřhranná	ks	22,00	35,05	771,01	URS 2019 I * 0,99
			"CU URS 2021 I * 0,99"					
			"Ovládání ventilátoru na WC a v kuchyňkách"					
					22,00			
		35441875	svorka křížová pro vodič D 6-10mm	ks	23,00	23,96	551,03	URS 2019 I * 0,99
			"CU URS 2021 I * 0,99"					
			"Ovládání ventilátoru na WC a v kuchyňkách"					
					22,00			
		741	Elektromontážní práce - Ostatní				11 458,02	
		741599802						
741		SPC	D+M Pomocný materiál - Specifikace dle PD	sada	1,00	1 426,02	1 426,02	Dle SoD
			"Spojovací a příslušovací materiál, hmoždinky, vrutky, sádra"					
		741	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	24,00	416,00	10 032,00	Dle SoD
			"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 741"					
					24,00			
			"Železnická výpomoc, doplňkové práce, kompletace apod."					

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu Gayerových kasáren vč. přístavby, Opletalova 334/2, Hradec Králové

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Společnost BAK-GEOSAN, Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek

Místo: Hradec Králové

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
		PSV	Práce a dodávky PSV				58 148,99	
			Kondenzátní potrubí pro klimatizace				38 878,55	
28	722	721173110 SPC	D+M Potrubí pro odvod kondenzátu, Systém PP-RCT PN10, D 20x2,0 mm - Specifikace dle PD " Vrstvené potrubí pro odvod kondenzátu s hliníkovou vložkou . "	m	36,00	380,00	13 680,00	Dle SoD
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny vytvoření a zapravení prostupů. "					
			"Místnost 1.25"		7,00			
			"Místnost 4.16"		5,00			
			"Místnost 4.17"		24,00			
29	722	721173110 SPC	D+M Potrubí pro odvod kondenzátu, Systém PP-RCT PN10, D 32x2,9 mm - Specifikace dle PD " Vrstvené potrubí pro odvod kondenzátu s hliníkovou vložkou . "	m	35,00	550,00	19 250,00	Dle SoD
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny vytvoření a zapravení prostupů. "					
			"Místnost 4.16"		9,00			
			"Místnost 4.17"		26,00			
33	721	721173111 SPC	D+M Sifon pro odvod kondenzátu DN 32 - Specifikace dle PD " 4.NP . "	kus	1,00	480,00	480,00	Dle SoD
					1,00			
40	721	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	71,00	25,00	1 775,00	Dle SoD
83	725	998725204	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 36 m	%	0,28	334,10	93,55	Dle SoD
84	725	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV "Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 725"	hod	12,00	300,00	3 600,00	Dle SoD
			" Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace apod. "					
			Tepelná izolace potrubí pro odvod kondenzátu ze střešních žaluzií				19 270,44	
		ZL 76_26	Izolace vata PIPO ALS DN 80 tl. 30mm " 5.NP stará budova = 13 + 12 m "	m	47,00	294,22	13 828,15	Cena v místě a čase obvyklá
			" 4.NP stará budova východ = 10,5 + 11,5 m "		25,00			
					22,00			
		ZL 76_27	Izolace vata PIPO ALS DN 100 tl. 30mm " 4.NP stará budova západ = 11 + 5,1 + 1 m "	m	17,10	318,26	5 442,29	Cena v místě a čase obvyklá
					17,10			

- [Elektroinstalace ABB](#)
 - [Modulární přístroje](#)
 - [Rozvodnice](#)
 - [Přístroje](#)
 - [Classic](#)
 - [Swing / Swing L](#)
 - [Spínače](#)
 - [Bez rámečku](#)
 - [S rámečkem](#)
 - [Jednoduché](#)
 - [Dělené](#)
 - [S průzorem](#)
 - [Žaluziové](#)
 - [S vyšším IP](#)
 - [Zásuvky](#)
 - [Kryty zaslepovací](#)
 - [Sdělovací technika](#)
 - [Stmívače](#)
 - [Pohybová čidla](#)
 - [Termostaty](#)
 - [Ostatní](#)
 - [Rámečky](#)
- [Tango](#)
- [Levit / Levit M](#)
- [Neo / Neo Tech](#)
- [Element](#)
- [Time / Time Arbo](#)
- [Decenio](#)
- [Future linear](#)
- [Solo / Solo carat](#)
- [Alpha Exclusive](#)
- [Impuls](#)
- [ABB-free@home](#)
- [AudioWorld](#)
- [ABB-Welcome Midi](#)
- [Stmívače a regulátory](#)
- [Snímače pohybu](#)
- [Dálkové ovládání](#)
- [Produkty pro vyšší bezpečnost](#)
- [Přístroje s vyšším IP](#)
 - [Profil 45](#)
- [Zásuvky jiných systémů](#)
- [Ostatní přístroje](#)
- [Průmyslové spínače ABB](#)
- [Zásuvkové boxy a AC nabíjecí sloupky](#)
- [Zdravotnictví](#)
- [Signalizační systém](#)
- [ABB i-bus KNX](#)

[/ Elektroinstalace ABB](#) / [Swing / Swing L](#) / [Spínače](#) / [S rámečkem](#) / [Žaluziové](#) / [3557G-C88340 S1](#)

3557G-C88340 S1 Ovládač žaluziový jednopólový (1/0+1/0 s blokováním), světle šedá, ABB Swing



Ovládač



kód:	3557G-C88340 S1
EAN:	8595017287046
výrobce:	ABB s.r.o.
hmotnost:	0,065 kg / ks
balení:	20 ks/bal. 1440 ks/pal
Ušetříte 22,90 Kč = Sleva 19%	
běžná cena s DPH 21%:	146,29 Kč
cena s DPH 21%:	118,58 Kč
běžná cena bez DPH:	120,90 Kč
cena bez DPH:	98,00 Kč
cena za:	1 ks
dostupnost e-shop:	skladem 12 ks
dostupnost pobočky:	12 ks

Množství: 1 ks [přidat do košíku](#)

Popis

3557G-C88340 S1 Ovládač žaluziový jednopólový (1/0+1/0 s blokováním), světle šedá, ABB Swing

Ovládač [Swing](#) žaluziový jednopólový

10 A, 250 V AC

Design: [Swing](#)

Řazení: 1/0+1/0 s blokováním

Varianta: světle šedá

[Odebírat novinky](#)

[+ Elektroinstalace ABB](#)

- [+ Modulární přístroje](#)
- [+ Rozvodnice](#)
- [+ Přístroje](#)
- [+ Classic](#)
- [+ Swing / Swing L](#)
- [+ Tango](#)
 - [+ Spínače](#)
 - [+ Zásuvky](#)
 - [+ Sdílovací technika](#)
 - [+ Stmívače](#)
 - [+ Časové spínače](#)
 - [+ Pohybová čidla](#)
 - [+ Bezdrátové ovládání](#)
 - [▸ Žaluziové](#)
 - [+ Termostaty](#)
 - [▸ Regulátory otáček](#)
 - [▸ Osvětlení LED](#)
 - [+ Ostatní](#)
 - [▸ Kryty zaslepovací](#)
 - [▸ Svorkovnice](#)
 - [▸ Zásuvky centrálního vysávání](#)
- [+ Rámečky přístrojů](#)
- [+ Levit / Levit M](#)
- [+ Neo / Neo Tech](#)
- [+ Element](#)
- [+ Time / Time Arbo](#)
- [+ Decento](#)
- [+ Future linear](#)
- [+ Solo / Solo carat](#)
- [+ Alpha Exclusive](#)
- [+ Impuls](#)
- [+ ABB-free@home](#)
- [+ AudioWorld](#)
- [+ ABB-Welcome Midi](#)
- [+ Stmívače a regulátory](#)
- [+ Snímače pohybu](#)
- [+ Dálkové ovládání](#)
- [+ Produkty pro vyšší bezpečnost](#)
- [+ Přístroje s vyšším IP](#)
 - [▸ Profil 45](#)
- [+ Zásuvky jiných systémů](#)
- [+ Ostatní přístroje](#)
- [+ Průmyslové spínače ABB](#)
- [+ Zásuvkové boxy a AC nabíjecí sloupky](#)
- [+ Zdravotnictví](#)

3938A-A106 B Svorkovnice s krytem pro pohyblivý přívod 5x2,5 mm² Cu, bílá, ABB Tango



kód:	3938A-A106 B
EAN:	8595017220548
výrobce:	ABB s.r.o.
hmotnost:	0,057 kg / ks
balení:	5 ks/bal, 1080 ks/pal
cena s DPH 21%:	109,32 Kč
cena bez DPH:	90,35 Kč
cena za:	1 ks
dostupnost e-shop:	skladem >200 ks
dostupnost pobočky:	>200 ks


Množství: 1 ks [do košíku](#)

[Odebrat novinky](#)

[/ Křabice](#) / [Do sádrokartonu](#) / [9063-32](#)

- [+ Elektroinstalace ABB](#)
- [+ Elektroinstalace TEM](#)
- [+ Elektroinstalace Legrand](#)
- [+ Elektroinstalace Schneider](#)
- [+ Elektroinstalace Farnell](#)
- [+ Dům a zahrada](#)
- [+ Elektronika](#)
- [+ Kabely, vodiče, bužírky](#)
- [+ Komunikace](#)
- [+ Křabice](#)
 - [▸ Nábytkové křabice](#)
 - [▸ Na omítku](#)
 - [▸ Pod omítku](#)
 - [▸ Lištové](#)
 - [▸ Do sádrokartonu](#)
 - [▸ Do zateplení](#)
 - [▸ S vyšším krytím](#)
 - [▸ Křabice Future linear](#)
 - [▸ Nouzové, požární](#)
 - [▸ Ostatní](#)
 - [▸ Podlahové křabice](#)
 - [▸ Víčka](#)
 - [▸ Vrutě](#)
 - [▸ Příslušenství](#)
- [+ Měřicí přístroje](#)
- [+ Modulární přístroje](#)
- [+ Nářadí](#)
- [+ Objímky, patice](#)
- [+ Ochrana proti přepětí](#)
- [+ Ovládání a signalizace](#)
- [+ Pojistky](#)
- [+ Průmyslové vidlice, zásuvky, spínače](#)
- [+ Rozvodnice](#)
- [+ Světelné zdroje](#)
- [+ Svítidla](#)
- [+ Svorky a svorkovnice](#)
- [+ Spotřební materiál](#)
- [+ Termostaty](#)
- [+ Úložný materiál](#)
- [+ Upevňovací materiál](#)
- [+ Uzemnění a hromosvod](#)
- [+ Ventilátory](#)
- [+ Vytápění a ohřev TUV](#)
- [+ Zvonky a gongy](#)
- [+ Ostatní](#)
- [+ Výrodejní](#)
 - [▸ Akční nabídka - Slevy](#)
 - [▸ Novinky](#)

9063-32 Křabice univerzální, do sádrokartonu, ABB s.r.o.

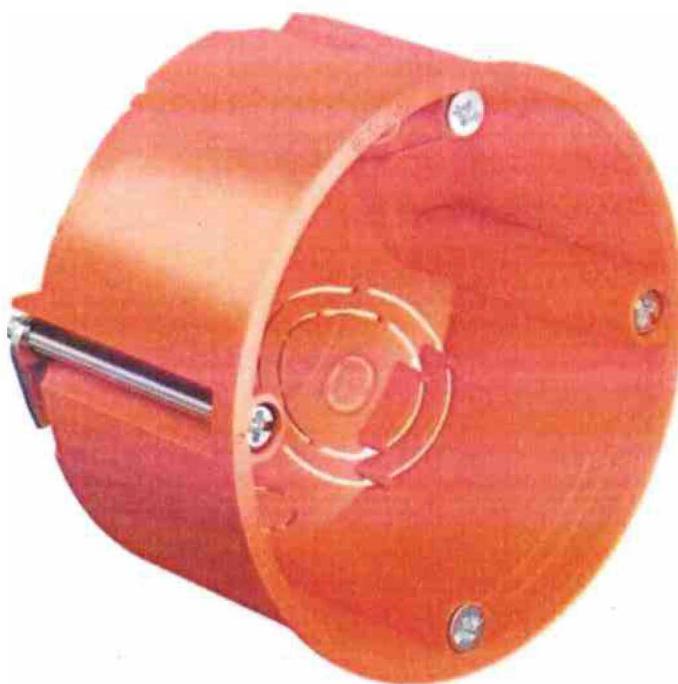

kód:	9063-32
EAN:	4013456549326
výrobce:	ABB s.r.o.
hmotnost:	0,023 kg / ks
balení:	10 ks/bal
cena s DPH 21%:	26,83 Kč
cena bez DPH:	22,17 Kč
cena za:	1 ks
dostupnost e-shop:	skladem 40 ks
dostupnost pobočky:	40 ks

Výrobci

Vyberte prosím

Akční nabídka



Popis

9063-32 Křabice univerzální, do sádrokartonu, ABB s.r.o.

Množství:

1 ks

[DO KOŠÍKŮ](#)



ABB Jistič 16B/3 S203M-B-16

ABB

Kód ELFETEX

EAN

Kód výrobce

MO cena s DPH

1

10.321.677

4016779549691

2CDS273001R0165

413,66 Kč/ks

Přibližný termín dodání:

 K objednání
 12 dní

Zkontrolovat dostupnost na pobočkách



Informace o produktu

S203M-B16; 3 fázový jistič, jmenovitý proud In: 16 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA

Značka

ABB

Modulové jističe

Vypínací charakteristika

B

Počet pólů celkem

3

Počet chráněných pólů	3
Jmenovitý proud	16 A
Jmenovité napětí	400 V
Jmenovité izolační napětí Ui	440 V
Měřitelná pevnost zkratového napětí Uimp	4 kV
Dimenzovaná vypínací schopnost Icn podle EN 60898 při 230 V	10 kA
Dimenzovaná vypínací schopnost Icn podle EN 60898 při 400 V	10 kA
Dimenzovaná vypínací schopnost Icn podle EN 60947-2 při 230 V	15 kA
Dimenzovaná vypínací schopnost Icn podle EN 60947-2 při 400 V	25 kA
Druh napětí	AC / DC
Frekvenční rozsah	50 - 60 Hz
Třída omezení energie	3
Kategorie přepětí	3
Stupeň znečištění	3
Možnost dalšího zařízení	Ano
Šířka vyjádřená počtem modulárních jednotek	3
Montážní hloubka	69 mm
Stupeň krytí (IP)	IP20
Okolní teplota při provozu	-25 - 55 °C

Mohlo by Vás zajímat



EATON Jistič 2B/1 PL6

Kód ELFETEX: 10.069.531

164,80 Kč/ks

MO cena s DPH

 106 ks



EATON Jistič 10C/3N PL7

Kód ELFETEX: 10.093.592

1 040,03 Kč/ks

MO cena s DPH

 K objednání



instal-trade
www.cvejn.cz

CVEJN s.r.o.

Žižkovo náměstí 9

549 01 Nové Město nad Metují

tel : 491 471 153


fax : 491 814 780

info@cvejn.cz

Nabídkový rozpočet

Zakázka

Číslo zakázky	2018 182.20
Zakázka	SMARTmuzeum Hradec Králové - PMR 18 - kanalizace od střešních žaluzií
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	



Zakázka:

SMARTmuzeum Hradec Králové - PMR 18 - kanalizace od střešních žaluzií

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_01: Zdravotní instalace	19 271		19 271
713: Izolace tepelné	19 271		19 271
Celkem (bez DPH)	19 271		
DPH	—		
DPH 0 % ze základny: 19 271	—		
Celkem (včetně DPH)	19 271	CZK	

Poř.	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
SO_01: Zdravotní instalace					19 271		-	19 271
713: Izolace tepelné					19 271		-	19 271
1.	izolace vata PIPO ALS DN 80 tl. 30mm	m	47,0	294,22	13 828	-	-	13 828
2.	izolace vata PIPO ALS DN 100 tl. 30mm	m	17,1	318,26	5 442	-	-	5 442



elektroinstalace a hromosvody

11.02.2021

Zakázka číslo: 041018

Mobil: 730158221

cerny@elektro-sdruzeni.cz

STAVBA: Stavební úpravy objektu Gayrových kasáren, Opletalova 334/2, Hradec Králové

INVESTOR: Královéhradecký kraj

REKAPITULACE	materiál	montáž	celkem
Vícepráce 14	35 860,46	4 858,00	40 718,46
Mezisoučet	35 860,46	4 858,00	40 718,46
Podružný materiál			
PPV			
Doprava			
Ostatní			
HZS			
Mezisoučet			0,00
CENA bez DPH			40 718
Daňový základ	15,0%	0	0
Daňový základ	21,0%	40 718	8 551
Daň celkem			8 551
CENA s DPH			49 269

Vypracoval: Martin Tomeš



NAZEV	MJ	JC mat.	JC mont.	materiál	montáž	JC celkem	Celkem	
Vícepráce 14				35 860 Kč	4 858 Kč		40 718,46	
Ovládání ventilátorů na WC a v kuchyňkách								
Pohybové čidlo stropní	ks	22,00	1208,71	157,50	26591,62	3465,00	1366,21	30 056,62
Relé SMRT pod vypínač	ks	14,00	495,56	99,50	6937,84	1393,00	595,06	8 330,84
D+M Pomocný materiál - Specifikace dle PD	ks	1,00	2331,00	0,00	2331,00	0,00	2331,00	2 331,00

[< Zpět na Acti 9 iTL+ hybridní impulzní relé pro spínání LED svítidel](#)



Schneider Electric A9C15032 impulzní relé iTL+ - 1P+N - 1Z - 16A - cívka 230 VAC 50Hz

Kód: A9C15032

[Technik online](#)

Výrobce: Schneider Electric

EAN: 3606480376979

Dostupnost: Obvykle skladem

(Pro upřesnění prosím volejte [+420 775 573 833](tel:+420775573833))

Cena s DPH **1 659 Kč** (68.83 €)

Cena bez DPH 1 370,86 Kč (56.88 €)

1

ks

PŘIDAT DO KOŠÍKU

Doprava od 100 Kč nebo zdarma při nákupu nad 5 000 Kč

Osobní odběr na více jak 1500 místech po celé ČR



POTŘEBUJETE PORADIT?

Radislav Kovář, majitel



[Redacted phone number]



[Redacted email address]

POPIS

Základní popis

Použití spouště	Standardní
Řada výrobků	ITL
Typ výrobku nebo přístroje	Impulzní relé
Označení přístroje	ITL+
Popis pólů	1P + N
Umístění nulového vodiče	Vlevo
Složení kontaktů	1 Z
[In] jmenovitý proud	16 A
Typ sítě	AC
Napětí ovládacího obvodu	230 V AC 50 Hz

Doplňky

Frekvence sítě	50 Hz
[Ue] jmenovité provozní napětí	230 V AC 50 Hz
Typ ovládání	Dálkové a manuální ovládání
Typ ovládacího signálu	Impulzní
Spínací frekvence	6 spínacích operací/min.
Délka impulzu	50 ms...1 s
Typ dálkového ovládání	Prosvětlené tlačítko 5 mA
Místní signalizace	ON/OFF signalizace
Montáž	Pevná
Montážní držák	DIN lišta
Rozteč 9 mm	2
Výška	84 mm
Šířka	18 mm
Hloubka	60 mm
Elektrická životnost	5000000 cyklu
Kompatibilita přístroje	Bez příslušenství

Prostředí

Standardy	EN 669-2-2
Označení kvality	NF
Úroveň hluku	< 30 dB
Teplota okolního prostředí pro provoz	-5...55 °C

MÁTE DOTAZY

VŠE O NÁKUPU

KONTAKT

ODBĚR NOVINEK


Vaše e-mailová adresa

OK

- + [Elektroinstalace ABB](#)
- + [Elektroinstalace TEM](#)
- + [Elektroinstalace Legrand](#)
- + [Elektroinstalace Schneider](#)
- + [Elektroinstalace Famatec](#)
- + [Dům a zahrada](#)
- + [Elektronika](#)
- + [Kabely, vodiče, bužírky](#)
- + [Komunikace](#)
- + [Krabice](#)
- + [Měřicí přístroje](#)
- + [Modulární přístroje](#)
 - + [Chrániče](#)
 - + [Chrániče s jističem](#)
 - + [Jističe](#)
 - [Řada 6kA](#)
 - [Řada 10kA](#)
 - [Řada 15kA](#)
 - [Řada 25kA](#)
 - [Řada 30kA a více](#)
 - [Řada DC a speciální](#)
 - [Měřicí přístroje](#)
 - [Obloukové ochrany](#)
 - [Odpínače](#)
 - [Odpínače pojistkové](#)
 - [Ovládací a signalizační moduly USS](#)
 - [Pomocné kontakty](#)
 - [Propojovací lišty](#)
- + [Přepětové ochrany](#)
 - [Přepínače](#)
- + [Relé](#)
 - [Schodišťové automaty](#)
 - [Spínací hodiny](#)
- + [Spínače](#)
 - [Spouštěče](#)
 - [Stmivače](#)
- + [Stykače](#)
 - [Světelná návěstí](#)
 - [Vypínače](#)
 - [Zdroje a trafo](#)
 - [Zvonky](#)
 - [Automatické nahazovače](#)
- + [Příslušenství](#)
- + [Vypínací spoušť](#)
 - [Ostatní](#)
- + [Nářadí](#)
- + [Objímky, patice](#)
- + [Ochrana proti přepětí](#)
- + [Ovládání a signalizace](#)
- + [Pojistky](#)

[/](#) [Modulární přístroje](#) [/](#) [Jističe](#) [/](#) [Řada 10kA](#) [/](#) [PL7-B32/3 \(263392\)](#)

PL7-B32/3 (263392) Jistič 3P 32A B 10kA, EATON

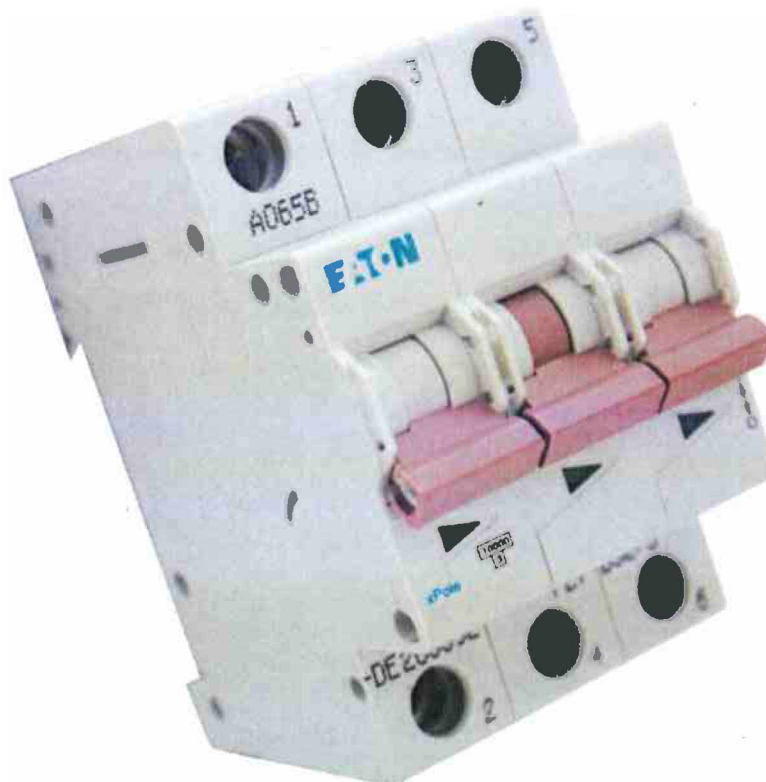

kód:	PL7-B32/3 (263392)
EAN:	4015082633929
výrobce:	Eaton Elektrotechnika s.r.o.
hmotnost:	0,360 kg / ks
balení:	4 ks/bal, 40 ks/krt
cena s DPH 21%:	602,52 Kč
cena bez DPH:	497,95 Kč
cena za:	1 ks
dostupnost e-shop:	skladem 18 ks
dostupnost pobočky:	29 ks

Množství: 1 ks [do košíku](#)

Popis

[Odebírat novinky](#)



Zvětšit obrázek - zoom

Produkt #: BO618516--

Jistič s proudovým chráničem B16-003/AC

Série BOLF, Typ AC, Typ Nezpóžděný, Norma ČSN EN 61009

CZK 1100,55/1 ks

Cenové informace

Za : 1 ks

Vaše cena bez DPH:

1100,55

rodeje: 1 ks

množství: 1 ks

Skladem: 5.931 ks

za 1 pracovní den 1.084 ks

1.247 ks ihned k vyzvednutí


KOUPIT TEĎ


Ostatní možnosti

Favorit

Přidat do seznamu

Požádat o projektovou cenu

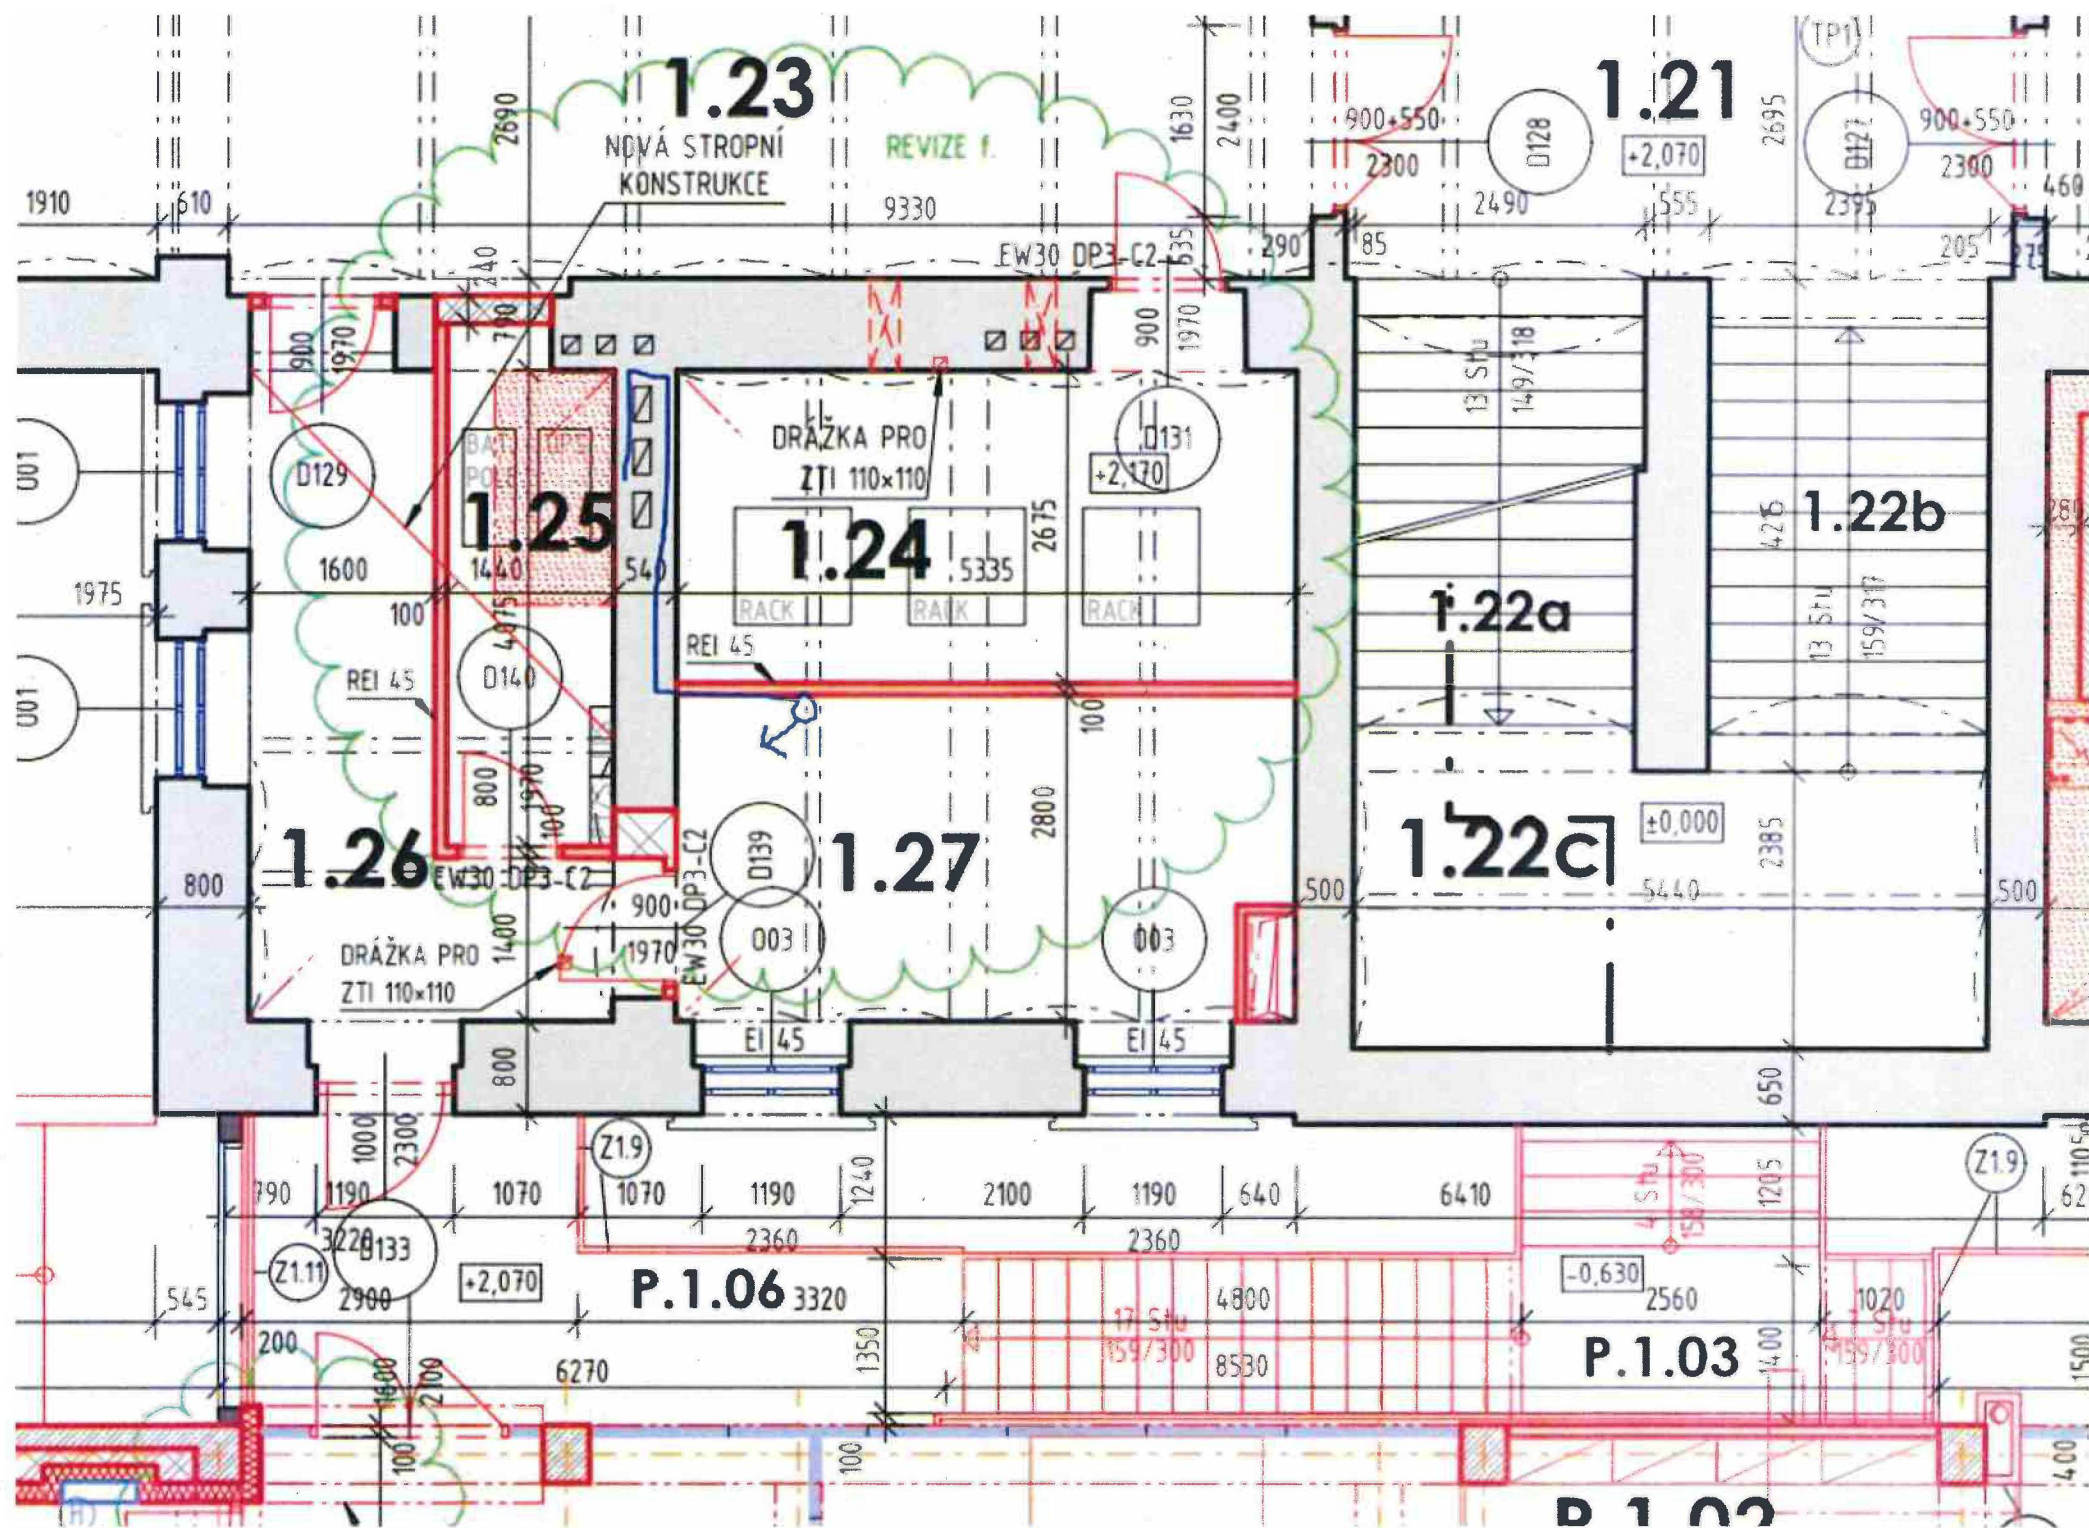


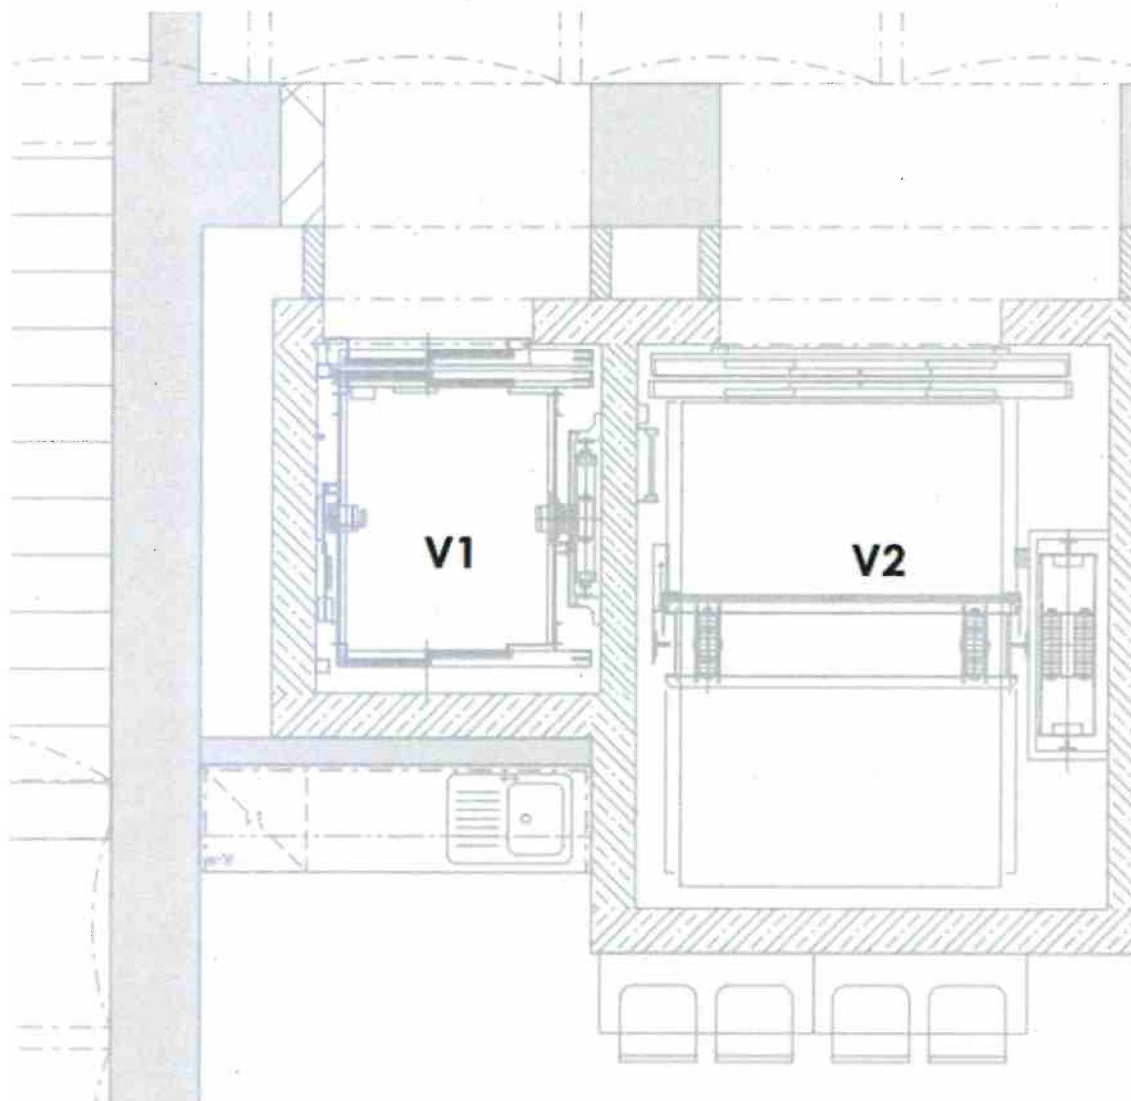







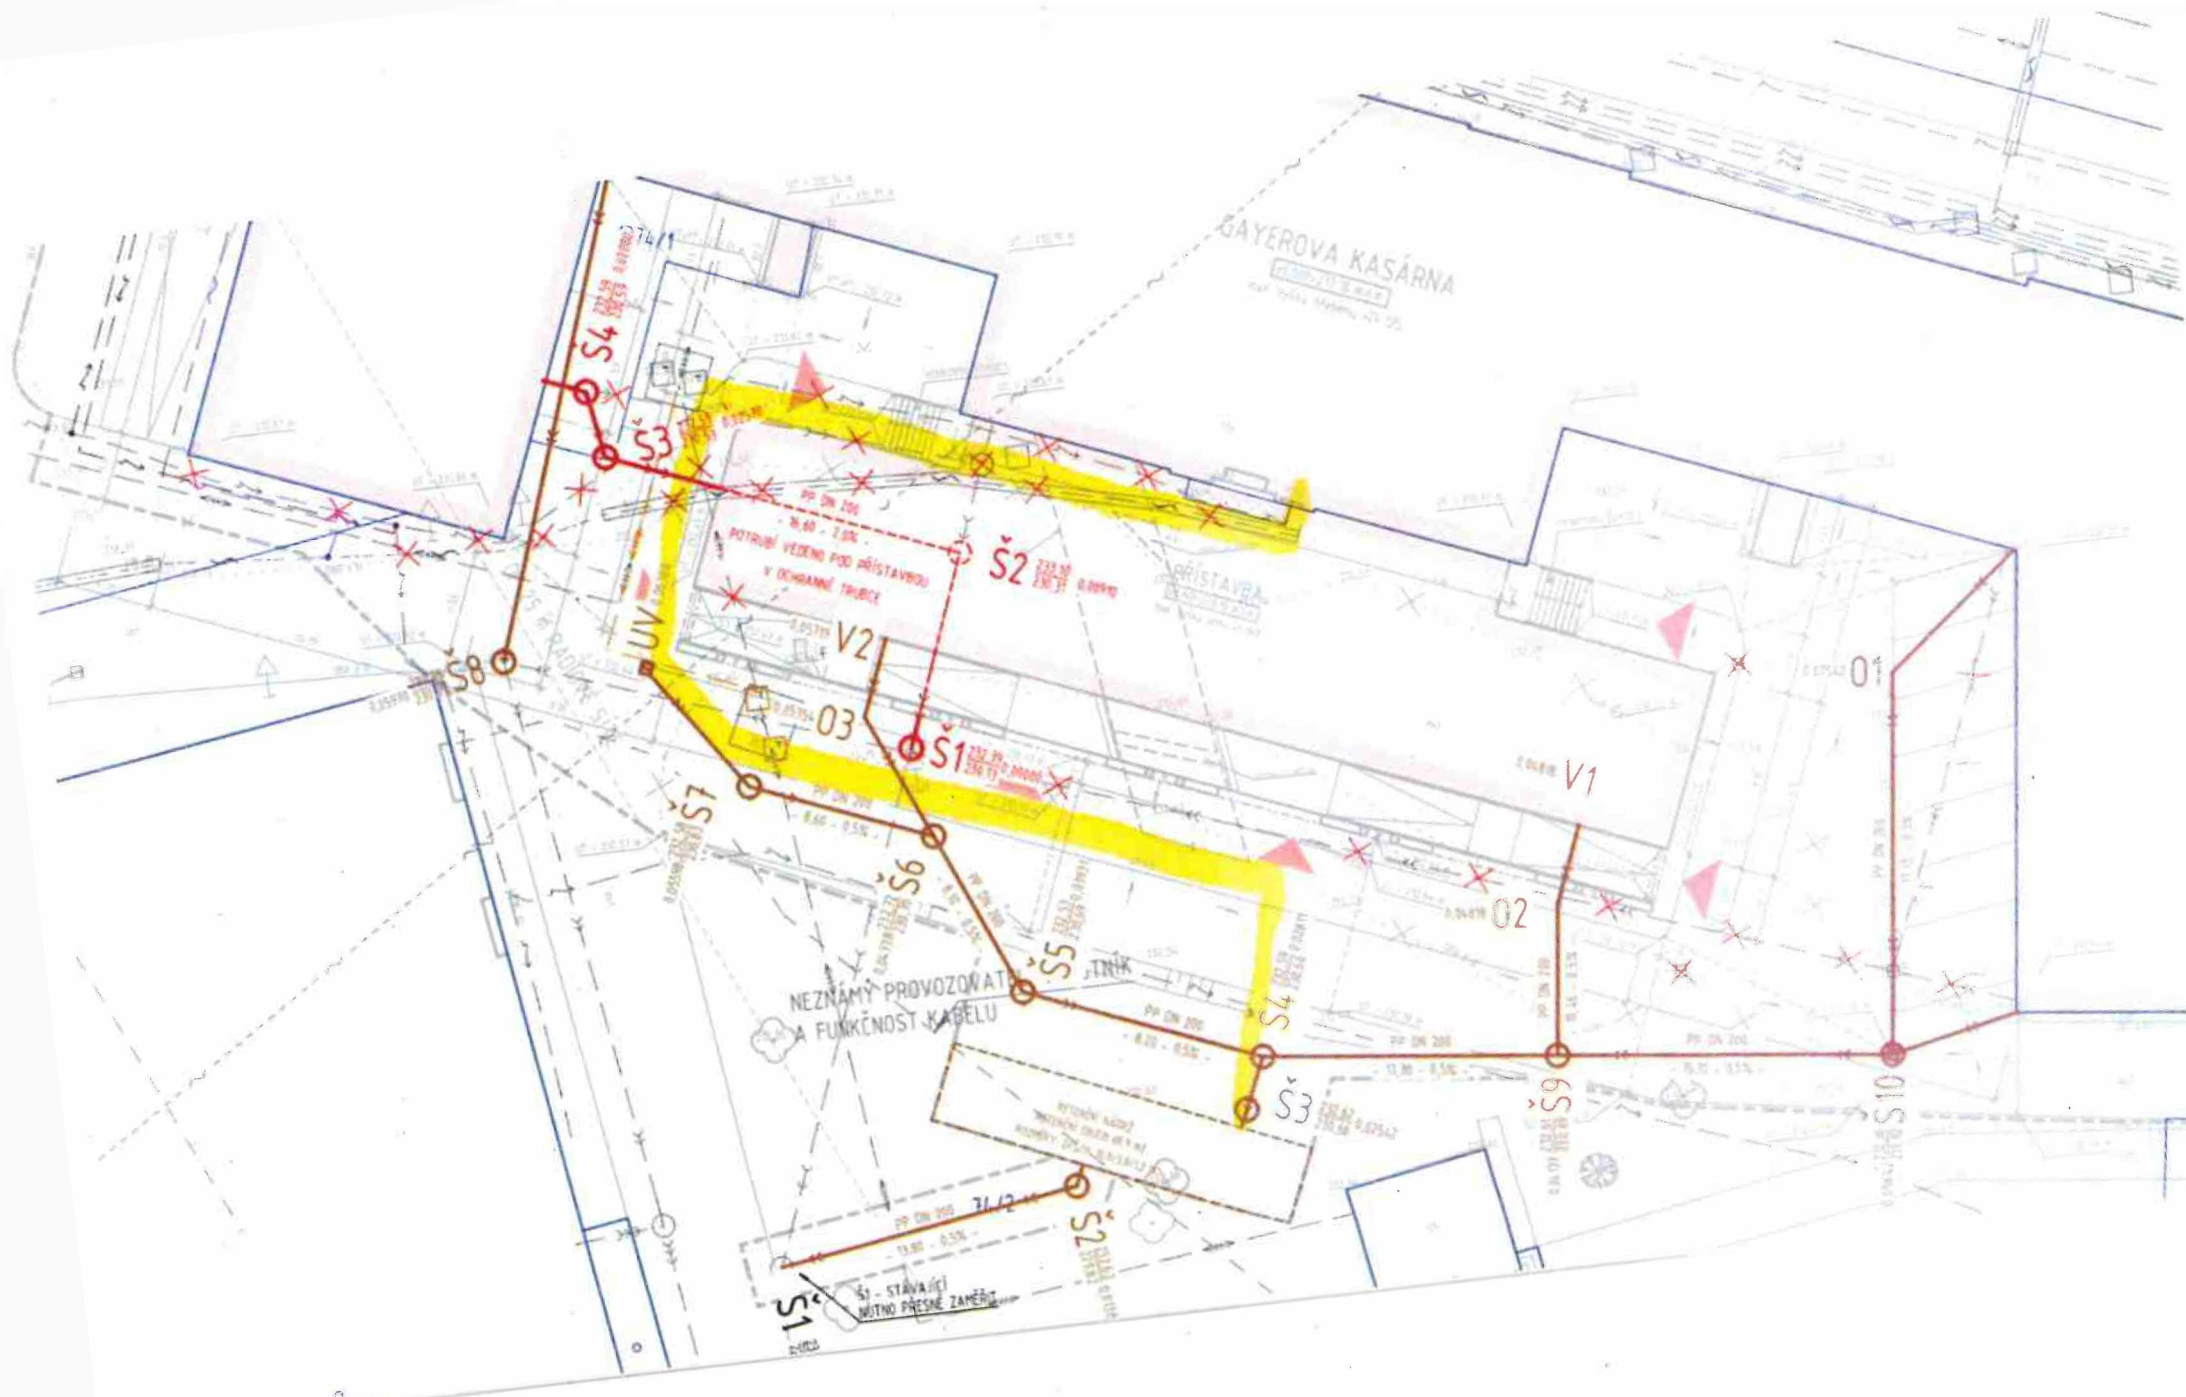

7.6.1.1

13/RB9

18/RB9

ZÁŠUVKA



Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Zhotovitel:	Společnost BAK-GEOSAN, Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek
Projekt:	SMARTmuzeum: modernizace depozitářů, technického a technologického zázemí Muzea východních Čech v Hradci Králové
Místo:	Hradec Králové
Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0011170
Smlouva o dílo ze dne 04.02.2019	

ZMĚNOVÝ LIST		ZL	77
		revize:	
Objednatel:	Společnost	Zastoupena (Jméno, Příjmení)	
	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	Mgr. Martin Cervíček	
Zhotovitel:	Společnost BAK-GEOSAN, Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek	Ing. Radek Mrázek, MBA	
		Ivan Havel	
		Ing. Kamil Vykydal	
Vydáno dne:			
PŘEDMĚTEM ZMĚNOVÉHO LISTU - ZADÁVACÍHO LISTU			
<i>Z důvodu zvýšení variability ovládání projektorů v m. č. P.01.06, které musí umožnit připojení audio a video jak v přední části, tak v zadní části místnosti, bylo nutné upravit rozvody elektroinstalace. Změna nemění celkovou povahu zakázky.</i>			
• Rozpočet, viz. v příloha č. 1 • Cenové nabídky, viz. v příloha č. 2 • Schema, viz. v příloha č. 3 • Trasy kabelů, viz. v příloha č. 4			
DOPAD NA CENU (bez DPH):		DOPAD NA ČAS realizace v souvislosti s tímto ZL:	
Celkem odpočty:	0,00 Kč	Termín pro vyprojektování změny:	
Celkové odpočty a připočty:	36 206,96 Kč	Termín pro provedení změny:	
Celkem připočty:	36 206,96 Kč	Dopad na dílčí termíny:	NE
Cena díla po poslední změně:	223 357 330,62 Kč	Dopad na termín dokončení:	NE
Podpisem zástupců obou smluvních stran se tento „ZL“ nepovažuje za písemný dodatek k výše uvedené smlouvě o dodatku Smlouvy o dílo			
Zástupce Objednatele: Ing. Václav Nýč		Datum: 15.03.2021	
Zástupce Objednatele: Ing. Roman Kosář		Datum: 15.03.2021	
Technický dozor investora: Ing. Luboš Kasper		Datum: 15.03.2021	
Generální projektant: Ing. Martin Uličný		Datum: 15.03.2021	
Zástupce Zhotovitele: Karel Laš		Datum: 15.03.2021	
Za Zhotovitele vypracoval: Ing. Petr Hanzlík		Datum: 15.03.2021	
Za Zhotovitele kontroloval: Ing. Michal Holub		Datum: 15.03.2021	
Za Zhotovitele kontroloval: Ing. Michal Štátný		Datum: 15.03.2021	
Za Zhotovitele kontroloval: Lukáš Laštovička, DiS.		Datum: 15.03.2021	

ZADÁNÍ S VYKAZEM VÝMÉR

Stavba: Stavební úpravy objektu Gayerových kasáren vč. přístavby, Opletalova 334/2, Hradec Králové
 Objekt: D.1.4.8. ELEKTRICKÉ KOMUNIKACE
 Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
 Zhotovitel: Společnost BAK-GEOSAN, Žitnická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek
 Místo: Hradec Králové

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava	
		PSV	Práce a dodávky PSV				36 206,96		
			Zásuvky v projekční místnosti m. č. P.01.06				26 531,05		
13	741	741999113 SPC	D+M Datová zásuvka 2xRJ45 Cat 6a - Specifikace dle PD "včetně instalace, krabice, rámečku, Montáž do podlahové krabice" "m.č. P.01.06 dle výkresu č. 1.1.b.2.05_g_PUDORYS 1 PP PRÍSTAVBA - NOVÝ STAV - 841x1365"	kus	4,00	460,00	1 840,00	Dle SoD	
			"včetně montáže, zapojení, úložného materiálu "		4,00				
35	741	741999506 SPC	D+M Kabel UTP Cat 6a - Specifikace dle PD "včetně montáže, zapojení, úložného materiálu " "m.č. P.01.06 dle výkresu č. 1.1.b.2.05_g_PUDORYS 1 PP PRÍSTAVBA - NOVÝ STAV - 841x1365"	m	347,00	28,80	9 993,60	Dle SoD	
		ZL 77 01	Náplň datového rozvaděče a ukončení kabelu UTP "včetně montáže, zapojení, úložného materiálu "	m	8,00	419,06	3 352,49	Cena v místě a čase obvyklá	
			"Cena v místě a čase obvyklá"		8,00				
49	741	7419991310	D+M Kabel HDMI - Specifikace dle PD "včetně montáže, zapojení "	m	23,00	75,10	1 727,30	Dle SoD	
			"včetně montáže, zapojení "		23,00				
51	741	ZL 77 02	D+M Proměnění datových vývodů vč. Projekce o měření - Specifikace dle PD "B x vývod z rozvaděče"	sada	1,00	797,04	797,04	Cena v místě a čase obvyklá	
		ZL 77 03	MOSN PREDK ZAS HDMI V1 4 1M HL 079378 "včetně montáže, zapojení, úložného materiálu "	ks	1,00	1 176,82	1 176,82	Cena v místě a čase obvyklá	
			"Cena v místě a čase obvyklá"		1,00				
		742430031	Montáž kabelu HDMI se zakončením v zásuvce nebo ušabici "včetně montáže, zapojení, úložného materiálu "	ks	1,00	678,13	678,13	URS 2019 I * 0,89	
			"URS 2019 I * 0,89"		1,00				
		ZL 77 04	LEGRAND, MOSN PREDK ZAS JACK 3,5 1M, 078779 "včetně montáže, zapojení, úložného materiálu "	ks	2,00	738,05	1 476,10	Cena v místě a čase obvyklá	
			"Cena v místě a čase obvyklá"		2,00				
		741313001	Montáž zásuvky (polozapustitelná bezroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů "včetně montáže, zapojení, úložného materiálu "	ks	2,00	87,22	174,44	URS 2019 I * 0,99	
			"URS 2019 I * 0,99"		2,00				
		ZL 77 05	Kabel audio 3,5 mm JACK, 20 m "včetně montáže, zapojení, úložného materiálu "	ks	1,00	861,00	861,00	Cena v místě a čase obvyklá	
			"Cena v místě a čase obvyklá"		1,00				
		741	741110002	Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložená pevně "CU URS 2019 I * 0,99"	m	10,000	32,97	329,67	Dle SoD ZL 42
			"Zásuvky v projekční místnosti m. č. P.01.06"		10,000				
	M	34571095	trubka elektroinstalací tuhá z PVC D 36,6/40 mm, délka 3m "CU URS 2019 I * 0,99"	m	10,000	26,63	266,31	Dle SoD ZL 42	
			"Zásuvky v projekční místnosti m. č. P.01.06"		10,000				
		741	741110001	Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm uložená pevně "CU URS 2019 I * 0,99"	m	22,000	29,80	655,60	Dle SoD ZL 42
			"Zásuvky v projekční místnosti m. č. P.01.06"		22,000				
	M	34571092	trubka elektroinstalací tuhá z PVC D 17,4/20 mm, délka 3 m "CU URS 2019 I * 0,99"	m	22,000	10,30	226,51	Dle SoD ZL 42	
			"Zásuvky v projekční místnosti m. č. P.01.06"		22,000				
		ZL 77 06	Parapetní kanál dutý 170 x 70 mm, dl. 2 m "včetně montáže, zapojení, úložného materiálu "	ks	2,00	516,16	1 032,32	Cena v místě a čase obvyklá	
			"Cena v místě a čase obvyklá"		2,00				
		741110513	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky přes 120 do 180 mm s víčkem "včetně montáže, zapojení, úložného materiálu "	m	4,00	100,96	403,92	URS 2019 I * 0,99	
			"URS 2019 I * 0,99"		4,00				
19	741	741999202 SPC	D+M Zásuvka 230 V/16 A - Specifikace dle PD "včetně instalace, napojení, rámečku, inst. krabice "	kus	2,00	194,70	389,40	Dle SoD	
			"včetně instalace, napojení, rámečku, inst. krabice "		2,00				
39	741	741999305 SPC	D+M Kabel CYKY 3x2,5 - Specifikace dle PD "včetně uložení a zapojení "	m	24,00	39,60	950,40	Dle SoD	
			"včetně uložení a zapojení "		24,00				
		741	Elektromontážní práce - Ostatní				9 675,91		
		ZL 77 07	D+M Pomocný materiál - Specifikace dle PD "Společný a přepravní materiál, hmoždinky, vrtky, šádra, "	sada	1,00	479,91	479,91	Cena v místě a čase obvyklá	
			"Hodinová účtovací sazba elektrikář"		1,00				
		741	HZS2221	Hodinová účtovací sazba elektrikář "Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 741 "	hod	22,00	9 195,00	Dle SoD	
			"Zednická výpomoc, doprňkové práce, kompletace apod. "		22,00				

[Úvodní stránka](#) [Domovní spínače a zásuvky](#) [Legrand](#)

LEGRAND 078779 MOSN PŘEDK. ZÁS. JACK 3,5 1M

Objednací kód	81271600
Výrobce	LEGRAND
Dodavatelský kód	078779
EAN	3245060787790
Balení	10 KS
Celní sazebník	85369010

MOC bez DPH 738,05 CZK

MOC s DPH 893,04 CZK

Uvedená cena je za 1 KS

Není skladem

[DETAIL PRODUKTU](#)[DOTAZ K PRODUKTU](#)

Parametry

Instalace na omítku	Ne
Instalace pod omítku	Ano
Instalace do kanálu	Ano
Podlahová nádrž/montáž pod podlahu	Ano
Druh upevnění	Zaklapnutí
Typ konektoru	Ostatní
Kategorie	Ostatní
Barva	Bílá
Druh připojení	Ostatní
Stíněný kryt	Ne
Samostatná uzemňovací přípojka	Ne
Centrální deska	Ano

Doplňující informace

Předkonektorovaná zásuvka (15cm). Připojení na šroubové svorky. 3,5 mm jack konektory lze použít pro stereo připojení audio signálu z přenosného zdroje.

Zařazeno v kategoriích

[Domovní spínače a zásuvky](#) [Legrand](#)

[Chat](#)

S textovým polem	Ne
Možnost designu	Ne
Způsob montáže stínící přípojky	Ostatní
Směr vývodu	Rovné
S ochranou proti prachu	Ne
Krytí (IP)	IP40
Hmotnost	0,03 kg



... nejen
elektrotechnický
velkoobchod

modu

Vyhledat



PRODUKTY

8. listopadu

PRŮBĚH

[úvodní strana](#) [produkty](#) [spínače, vypínače a zásuvky](#) [domovní](#)

079378 MOSN PŘEDK.ZÁS.HDMI V1.4

Kód dodavatele: 079378

EAN: 3245060793784

Objednací kód: SKLI

Značka: **legrand**

Zásuvka předkonektorová HDMI, Mosaic, hliník



Dostupnost: V e-shopu na dotaz

**1 423,95
Kč**1 176,82 Kč bez
DPH

① Některé zboží může být navýšeno na minimální balen
případných změnách množství. Vás budeme informov
potvrzení objednávky nebo na dotaz. Maloobchodní c
platné pouze při nákupu přes e-shop.

Vložit do košíku

Popis produktu

Zásuvka předkonektorová HDMI typ A, v barvě hliník...

- 1 modul
- v 1.4 zásuvka (15 cm)
- pro přenos HD digitálního audio/video signálu mezi zdrojem a kompatibilním přijímačem
- přenos až 4K: 30fp a 1080p:60fps na celkovou vzdálenost 10 m s použitím A/V patch kabelů Legrand obj.č. 051727 / 32 / 33 / 34 / 35

Přístroje **Mosaic™** zajišťují flexibilitu a rozmanitost pro všechny typy elektroinstalací.

Přístroje **Mosaic™** poskytují

- univerzální a efektivní řešení
- širokou nabídku inovativních a ergonomických funkcí
- jednoduché připojení na síťoproud, aleboproud a řízení elektroinstalace

Řešení pro různé typy projektů, jako jsou nemocnice, kanceláře, školy, hotely....

Parametry

Kontaktní formulář

Značka:	Legrand
Provedení:	Kartáč
Šířka:	65 mm
Materiál:	Ocel
Povrch:	S práškovým nástřikem
Předražení:	Ne
Řada:	Mosaic
Typ přístroje:	HDMI zásuvka
Instalace na omítku:	Ne
Instalace pod omítku:	Ano

Zobrazit více

Rámečky

Související produkty

Barevné varianty

Ostatní

Touto web stránkou poskytujeme služby, personalizaci reklamy a analyzuje návštěvnost soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Souhlasím

11. 3. 2021

079378 MOSN PŘEDK.ZÁS.HDMI V1.4 1M HL

Kód: 078801

 [V e-shopu na dotaz](#) [Celkem skladem 41 ks](#)

82.04 Kč s DPH

67.80 Kč bez DPH

1

ks

079301 MOSN PL. RÁM. 1M HLIN

Kód: 079301

 [V e-shopu na dotaz](#)

184.32 Kč s DPH

152.33 Kč bez DPH

1

ks

079308 MOSN PL. RÁM. 4X2M HOR. HLIN

Kód: 079308

 [V e-shopu na dotaz](#)

418.27 Kč s DPH

345.68 Kč bez DPH

1

ks

079302 MOSN PL. RÁM. 2M HLIN

Kód: 079302

 [V e-shopu na dotaz](#)

129.64 Kč s DPH

107.14 Kč bez DPH

1

ks

079315 MOSN PL. RÁM. 5M HOR. HLIN

Kód: 079315

 [V e-shopu na dotaz](#)

280.54 Kč s DPH

231.85 Kč bez DPH

1

ks

079328 MOSN PL. RÁM. 2X10M VER. HLIN

Kód: 079328

 [V e-shopu na dotaz](#)

1,356.10 Kč s DPH

1,120.74 Kč bez DPH

1

ks

NOVINKY E-MAILEM

Zadejte e-mail a přihlašte se k odběru novinek e-mailem.

 odeslat

ELEKTRO S.M.S. NA FACEBOOKU

Buďte s námi ve spojení na Facebooku.

KATEGORIE PRODUKTŮ

[Automatizace detekce](#)

O NÁKUPU

[Způsoby platby](#)

O FIRMĚ

[Profil a historie](#)

ELEKTRO SMS

[Reference](#)

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze užívání webu cookies. [Pro více informací klikněte zde.](#)

 Souhlasím

[Kabely, vodiče a příslušenství](#)[Komunikace](#)[Nářadí a měřicí přístroje](#)[Ostatní elektroinstalační materiál](#)[Osvětlení](#)[Rozvaděče](#)[Rozvaděčové přístroje a příslušenství](#)[Spínače, vypínače a zásuvky](#)[Stožáry](#)[Světelné zdroje](#)[Topné a chladicí systémy](#)[Úložný materiál](#)[Ventilátory](#)[Zabezpečení a čidla](#)[Obchodní podmínky](#)[Reklamáce](#)[Vrácení zboží](#)[Ochrana osobních informací](#)[Kontakty](#)

ELEKTRO S.M.S., spol. s r.o.

Dobrovodská 43, 370 06 České Budějovice

IČ: 40743624

DIČ: CZ40743624

Tel: 387 007 311

E-mail: ecommerce@elektrosms.cz[Podmínky užívání](#)[Mapa webu](#)

© Copyright 2021 ELEKTRO S.M.S., spol s r.o., Všechna práva vyhrazena.

PARAPETNÍ KANÁL DUTÝ


PK 170X70 D_HD

2D

3D

PŘÍLOHY A CERTIFIKACE

ILUSTRACNÍ OBRÁZEK

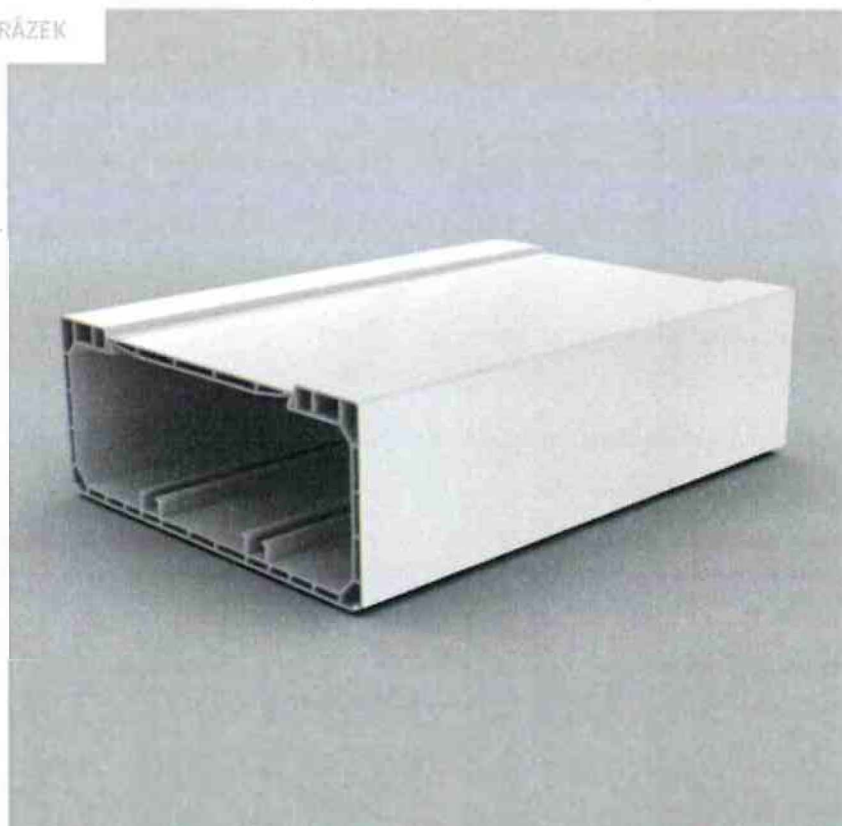

(https://www.kopos.cz/sites/default/files/product/2017/11/03/pk_170x70_d.jpg)



Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.

Souhlasím

Více informací

Hmotnost	1,83 kg/m
Barva	bílá
Materiál	PVC
Bezolovnatý materiál	ano
Samozhášivý materiál	30 s
Teplotní odolnost	-5 - 60 °C
Zkouška žhavou smyčkou	850 °C
Mechanická ochrana	IK07
Odolnost proti nárazu	1 J
Šířka	169 mm
Výška	70 mm
Délka	2 m
Vnitřní plocha	9300 mm ²
Tolerance Lišty se dodávají v délkách s tolerancí ±0,5 % při 20 °C.	
Použití Jsou odolné proti agresivnímu a chemickému prostředí. Neodolávají UV záření, nejsou vhodné do venkovního prostředí.	
Doporučení výrobce V případě montáže stínícího kanálu SK 40X33 (vyšší) nelze použít přístroje s větší montážní hloubkou např. přístroje s přepětovou ochranou. Výrobce doporučuje hloubku konkrétního přístroje před montáží prověřit.	
Třída reakce na oheň podkladového materiálu	A1 - F
Umožňuje montáž dvojzásuvky	ano
Umožňuje montáž nástěnné zásuvky	ano
Stupeň krytí	IP 40
Odpovídá normám	ČSN EN 50 085-1
Popis balení	balení - karton
Ochranná folie	ano

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.

[Souhlasím](#)
[Více informací](#)

516,16 Kč/m

624,55 Kč s DPH

Množství

m > 100 skladem

PŘIDAT DO KOŠÍKU

POPIS PRODUKTU

PŘÍSLUŠENSTVÍ

PODOBNE ZBOŽÍ

Určen pro uložení silových a sdělovacích obvodů, zabezpečovacího vedení a dalších rozvodů. Jednotlivá vedení je možno elektromagneticky odstínit vložením stínícího kanálu, který se do kanálu upevňuje pomocí příchytěk PSK 1. Pro klasické přístroje, které se instalují do přístrojové krabice zacvaknuté v drážkách dna kanálu.

2021 KOPOS KOLÍN a.s. - [Podmínky užití](#) | [Mapa stránek](#) | [Zásady zpracování osobních údajů](#)

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.

Souhlasím

Více informací



elektroinstalace a hromosvody


05.03.2021
Zakázka číslo: 041018

STAVBA: Stavební úpravy objektu Gayerových kasáren, Opletalova 334/2, Hradec Králové
INVESTOR: Královéhradecký kraj

REKAPITULACE		materiál	montáž	celkem
Vícepráce 15		4 807,94	682,50	5 490,44
Mezisoučet		4 807,94	682,50	5 490,44
Podružný materiál				
PPV				
Doprava				
Ostatní				
HZS				
Mezisoučet				0,00
CENA bez DPH				5 490
Daňový základ	15,0%	0		0
Daňový základ	21,0%	5 490		1 153
Daň celkem				1 153
CENA s DPH				6 643

Vypracoval: Martin Tomeš

NAZEV	MJ	JC mat.	JC mont.	materiál	montáž	JC celkem	Celkem
Vícepráce 15				4 808 Kč	683 Kč		5 490,44
Zásuvky v projekční místnosti							
Náplň datového rozvaděče a ukončení kabelu UTP	ks	8,00	366,56	52,50	2932,49	420,00	3 352,49
KABEL AUDIO KABEL 3,5mm JACK M/M, 20M	ks	1,00	598,50	262,50	598,50	262,50	861,00
D+M Proměření datových vývodů vč. Protokolu o měření							
- Specifikace dle PD	ks	1,00	797,04	0,00	797,04	0,00	797,04
D+M Pomocný materiál - Specifikace dle PD	ks	1,00	479,91	0,00	479,91	0,00	479,91

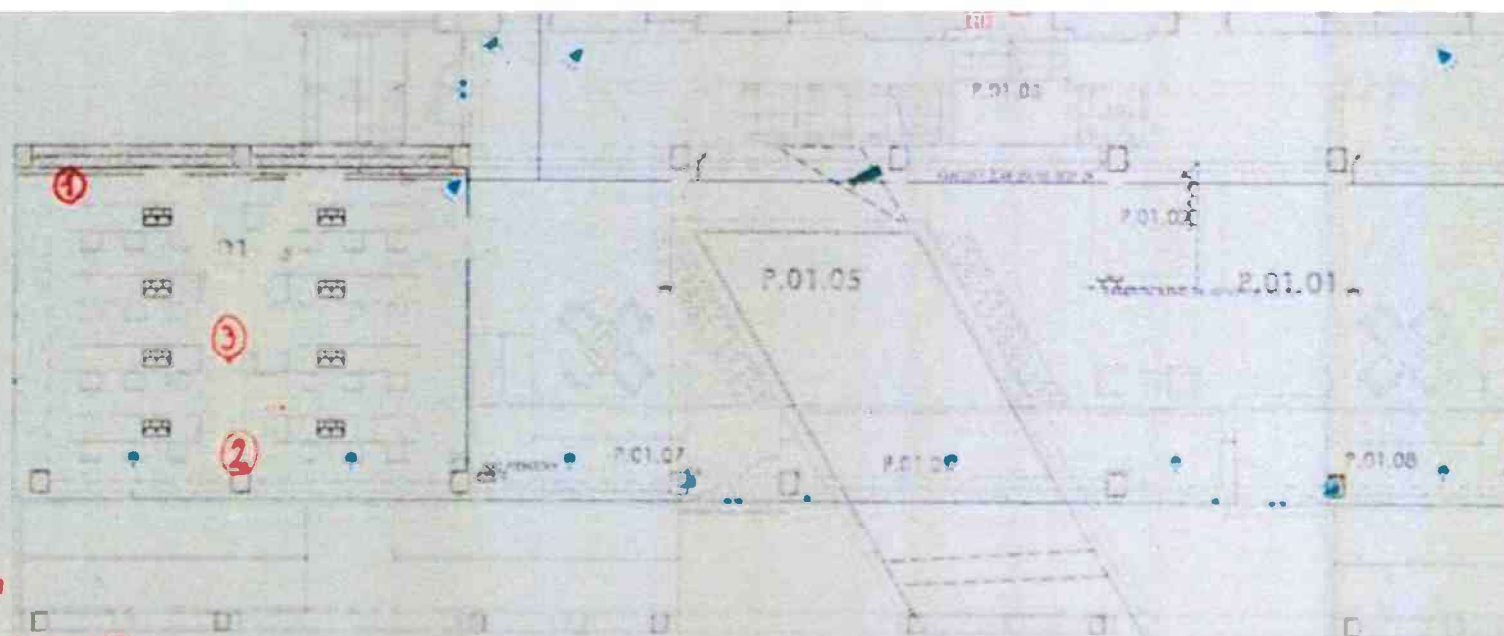


③ HDMI do ③
↳ HDMI do ②
↳ 12V4S do ①
↳ 12V4S do ②
↳ 24V4S do BACK

Year	Value	Unit
2000	100.0	100.0
2001	100.0	100.0
2002	100.0	100.0
2003	100.0	100.0
2004	100.0	100.0
2005	100.0	100.0
2006	100.0	100.0
2007	100.0	100.0
2008	100.0	100.0
2009	100.0	100.0
2010	100.0	100.0
2011	100.0	100.0
2012	100.0	100.0
2013	100.0	100.0
2014	100.0	100.0
2015	100.0	100.0
2016	100.0	100.0
2017	100.0	100.0
2018	100.0	100.0
2019	100.0	100.0
2020	100.0	100.0
2021	100.0	100.0
2022	100.0	100.0
2023	100.0	100.0
2024	100.0	100.0
2025	100.0	100.0
2026	100.0	100.0
2027	100.0	100.0
2028	100.0	100.0
2029	100.0	100.0
2030	100.0	100.0
2031	100.0	100.0
2032	100.0	100.0
2033	100.0	100.0
2034	100.0	100.0
2035	100.0	100.0
2036	100.0	100.0
2037	100.0	100.0
2038	100.0	100.0
2039	100.0	100.0
2040	100.0	100.0
2041	100.0	100.0
2042	100.0	100.0
2043	100.0	100.0
2044	100.0	100.0
2045	100.0	100.0
2046	100.0	100.0
2047	100.0	100.0
2048	100.0	100.0
2049	100.0	100.0
2050	100.0	100.0
2051	100.0	100.0
2052	100.0	100.0
2053	100.0	100.0
2054	100.0	100.0
2055	100.0	100.0
2056	100.0	100.0
2057	100.0	100.0
2058	100.0	100.0
2059	100.0	100.0
2060	100.0	100.0
2061	100.0	100.0
2062	100.0	100.0
2063	100.0	100.0
2064	100.0	100.0
2065	100.0	100.0
2066	100.0	100.0
2067	100.0	100.0
2068	100.0	100.0
2069	100.0	100.0
2070	100.0	100.0
2071	100.0	100.0
2072	100.0	100.0
2073	100.0	100.0
2074	100.0	100.0
2075	100.0	100.0
2076	100.0	100.0
2077	100.0	100.0
2078	100.0	100.0
2079	100.0	100.0
2080	100.0	100.0
2081	100.0	100.0
2082	100.0	100.0
2083	100.0	100.0
2084	100.0	100.0
2085	100.0	100.0
2086	100.0	100.0
2087	100.0	100.0
2088	100.0	100.0
2089	100.0	100.0
2090	100.0	100.0
2091	100.0	100.0
2092	100.0	100.0
2093	100.0	100.0
2094	100.0	100.0
2095	100.0	100.0
2096	100.0	100.0
2097	100.0	100.0
2098	100.0	100.0
2099	100.0	100.0
2100	100.0	100.0

- SAFETY RECORD
- SAFETY INSURANCE LABEL
- SAFETY INSURANCE LABEL & PROTECTION SHIELD
- SAFETY INSURANCE LABEL AND PROTECTION & NO. 10000
- COIN (NO. 1000)
- ELEMENTARY LABEL
- COIN (NO. 1000)
- SAFETY (NO. 1000)
- SAFETY

PROJEKČNÍ MÍSTNOST
TRASY KABELŮ

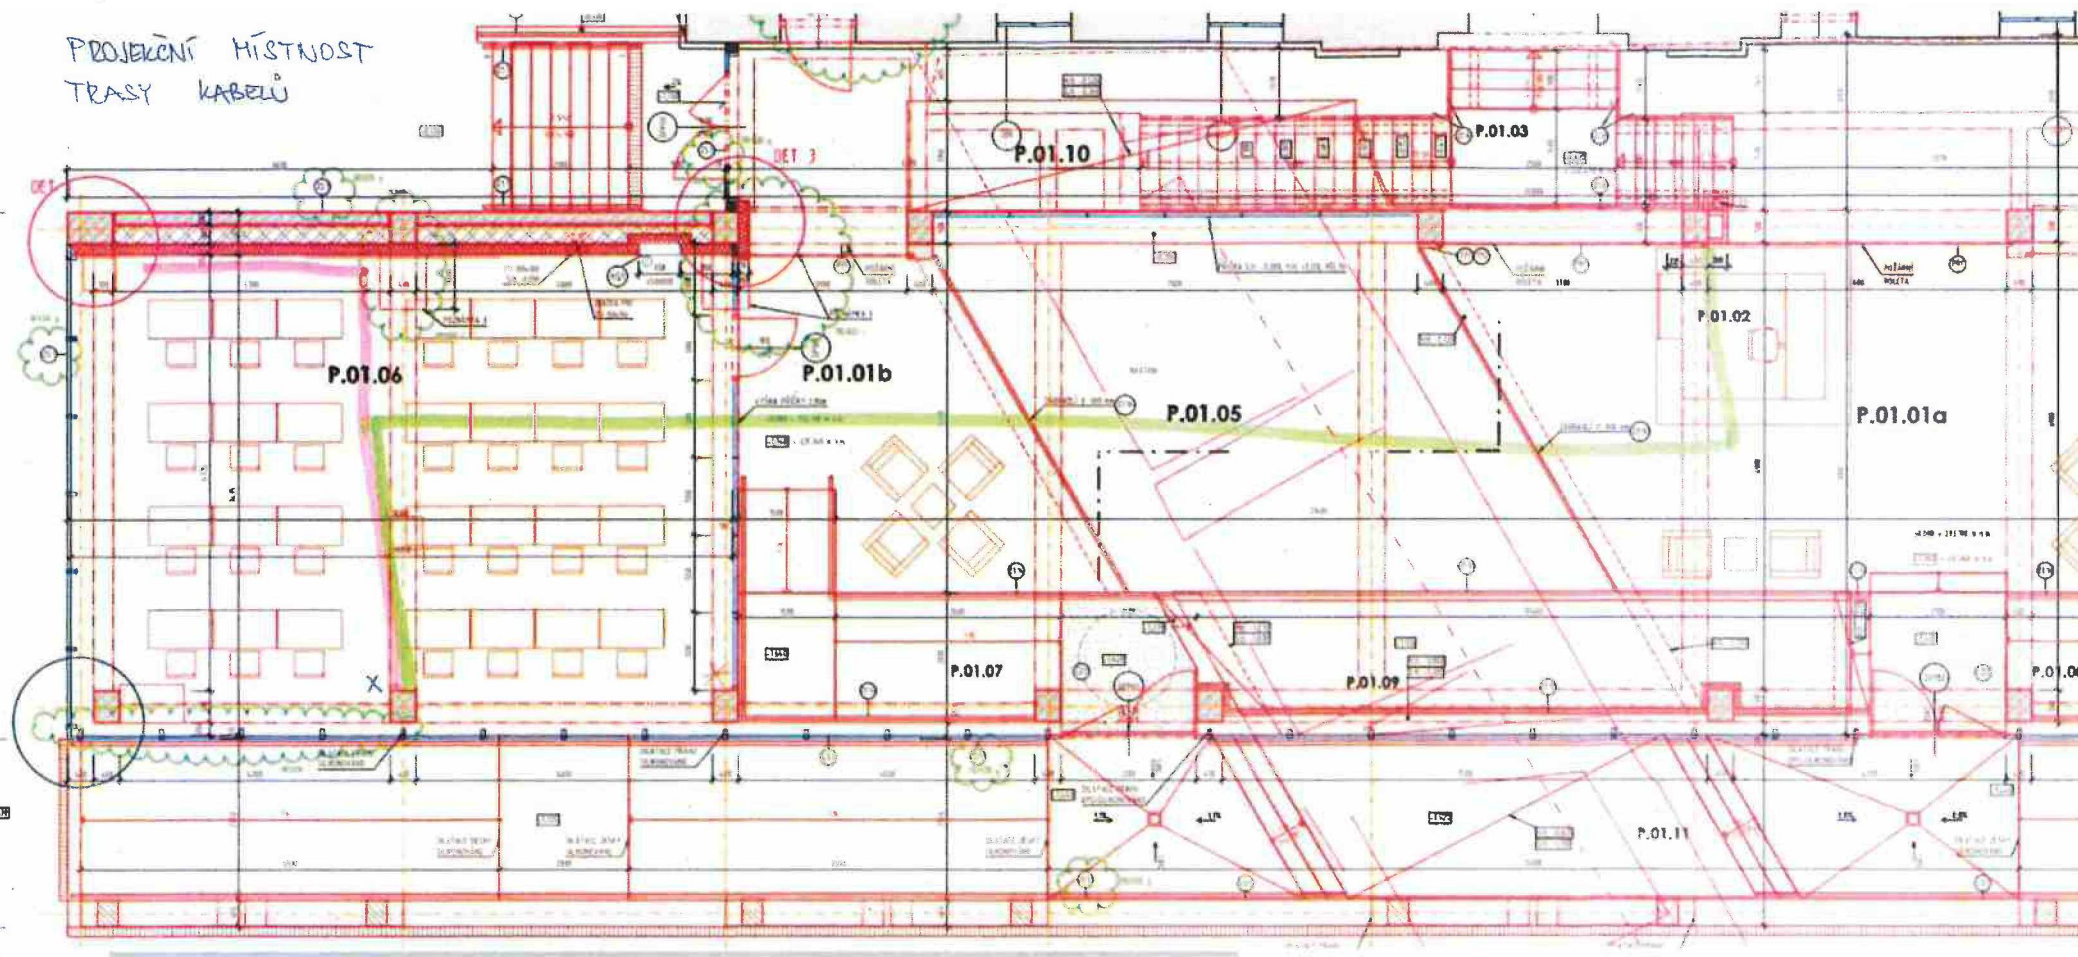

— TRASA KABELŮ UTP DO RACKU

— HDMI KABEL + AUDIO

X HKP ZAŠUVEK (PROPOJ. S PŮVODNÍMI)
DATOVÁ (VČETNĚ PROPOJ. S PROJEKTOREM)



Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Zhotovitel:	Společnost BAK-GEOSAN, Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek
Projekt:	SMARTmuzeum: modernizace depozitářů, technického a technologického zázemí Muzea východních Čech v Hradci Králové
Místo:	Hradec Králové
Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0011170
Smlouva o dílo ze dne 04.02.2019	

ZMENOVÝ LIST		ZL	78
		revize:	
	Společnost	Zastoupena (Jméno, Příjmení)	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	Mgr. Martin Cervíček	
Zhotovitel:	Společnost BAK-GEOSAN, Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek	Ing. Radek Mrázek, MBA Ivan Havel Ing. Kamil Vykydal	
Vydáno dne:			
PŘEDMĚTEM ZMĚNOVÉHO LISTU - ZADÁVACÍHO LISTU			
<i>V průběhu realizace stavby byla předložena aktualizace prováděcí dokumentace PBR, následně byla objednatelům upřesněna stavební konstrukce, která zajistí požární odolnost, tj. v 1.PP v luhových depozitářích č.m. 01.13 a 01.14 bude celistvý podhled s požární odolností 45 minut a v depozitářích nábytku m.č. 01.22 budou spodní pásnice válcovaných nosníků obloženy ORDEXALEM s požární odolností 30 min. Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které investor jednající s náležitou péčí nemohl předvidat. Změna nemění celkovou povahu zakázky.</i>			
• Rozpočet, viz. v příloha č. 1 • Cenová nabídka, viz. v příloha č. 2 • Upřesnění TDS k požární odolnosti a materiálu PO ke ze dne 11.3.2021, viz. v příloha č. 3			
DOPAD NA CENU (bez DPH):		DOPAD NA ČAS realizace v souvislosti s tímto ZL:	
Celkem odpočty:	0,00 Kč	Termín pro vyprojektování změny:	----
Celkové odpočty a připočty:	97 120,01 Kč	Termín pro provedení změny:	----
Celkem připočty:	97 120,01 Kč	Dopad na dílčí termíny:	NE
Cena díla po poslední změně:	223 454 450,63 Kč	Dopad na termín dokončení:	NE
Podpisem zástupců obou smluvních stran se tento „ZL“ nepovažuje za písemný dodatek k výše uvedené smlouvě o dílo, dodatkem Smlouvy o dílo			
<u>Zástupce Objednatel:</u> Ing. Václav Nýč		Datum: 15.03.2021	
<u>Zástupce Objednatel:</u> Ing. Roman Kosař		Datum: 15.03.2021	
<u>Technický dozor investora:</u> Ing. Luboš Kasper		Datum: 15.03.2021	
<u>Generální projektant:</u> Ing. Martin Uličný		Datum: 15.03.2021	
<u>Zástupce Zhotovitele:</u> Karel Laš		Datum: 15.03.2021	
<u>Za Zhotovitele vypracoval:</u> Ing. Petr Hanzlík		Datum: 15.03.2021	
<u>Za Zhotovitele kontroloval:</u> Ing. Michal Holub		Datum: 15.03.2021	
<u>Za Zhotovitele kontroloval:</u> Ing. Michal Stasný		Datum: 15.03.2021	
<u>Za Zhotovitele kontroloval:</u> Lukáš Laštovička, DiS.		Datum: 15.03.2021	

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu Gayerových kasáren vč. přístavby, Opletalova 334/2, Hradec Králové

Objekt: D.1.1. ASR - NOVÝ STAV

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Společnost BAK-GEOSAN, Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek

Místo: Hradec Králové

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	M.J.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
		PSV	Práce a dodávky PSV				53 759,48	
1	ZL 78	01	D=M Proti požární ochrana ocelových pásnic obkladem ORDEXAL bez povrchové úpravy "Cena v místě a čase obvyklá" "m d 01.22 dle výkresu D 1.1 b.2.04 q PUDORÝS 1.PP - NOVÝ STAV 594x1365" "Cena v místě a čase obvyklá" Délka pásnice 5,89 m, š. 0,12 m, 10 ks Délka pásnice 4 m, š. 0,12 m, 1 ks Délka pásnice 2,71 m, š. 0,12 m, 1 ks Délka pásnice 5,9 m, š. 0,12 m, 9 ks	bm	118,71	388,00	46 059,48	Cena v místě a čase obvyklá
		99	Přesun hmot				7 700,00	
93	HZS	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník "Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoc, doplňkové práce a dodávky kompletace apod."	hod	28,00	275,00	7 700,00	Dle SoD
					28,00			

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu Gayerových kasáren vč. přístavby, Opletalova 334/2, Hradec Králové
 Objekt: D.1.1, ASR - NOVÝ STAV

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		PSV	Práce a dodávky PSV				43 360,53	
		763	Montované konstrukce – dřevostavby, sádrokartony				40 957,54	
			SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI					
1		763131441	120 URS 2019 I " 0,99	m2	44,87	850,41	38 157,90	URS 2019 I "0,99
			"m č. 01.13. 01.14. (17,81+27,06)"		44,87			
109	763	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	44,87	27,50	1 233,93	Dle SoD
			Dle SoD		44,87			
125	763	998763404	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 36 m	%	2,02	393,92	795,71	Dle SoD
126	HZS	HZS2171	Hodinová zúčtovací sazba sádrokartonář	hod	2,00	385,00	770,00	Dle SoD
			"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 763."		2,00			
		783	Nátěry				2 402,99	
			Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otlěrůvzdorných v místnostech					
189	784	784211103 RTO	výšky do 5,00 m - vhodná na SDK konstrukce	m2	44,87	46,20	2 072,99	Dle SoD
			Dle SoD					
			"m č. 01.13. 01.14"		44,87			
190	HZS	HZS2311	Hodinová zúčtovací sazba malíř, natěrač, lakýrnik	hod	1,00	330,00	330,00	Dle SoD
			"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 784."		1,00			
			" Zednická vypomoc,doplňkové práce,kompletace spod."					
CELKEM							40 957,54	

Ing. Petr Hanzlík
přípravář
GEOSAN GROUP a. s.
U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7
mobil: [redacted]
[redacted]

Dvůr Králové n. L., 11.3.2021

Věc: **NABÍDKA Č. 151/21.2****Na provedení protipožární ochrany**

Stavební akce: SMART muzeum: modernizace depozitářů, technického a technologického zázemí Muzea východních Čech v Hradci Králové

NABÍDKU PŘEDKLÁDÁ:Společnost **J.SEIDL a spol., s.r.o.**, zastoupená Petrem Vykouřilem - odd. zakázky**ZADÁNÍ :**

Protipožární ochrana ocelových pásnic obkladem ORDEXAL.

PODKLADY PRO VYPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Výkaz výměr.

CENOVÁ NABÍDKA:**ORDEXAL OK**

délka pásnice (bm)	šířka pásnice (mm)	m2/bm	cena/bm	cena celkem
4	120	0,16	388 Kč	1 552 Kč
5,89	120	0,16	388 Kč	2 285 Kč
5,89	120	0,16	388 Kč	2 285 Kč
5,89	120	0,16	388 Kč	2 285 Kč
5,89	120	0,16	388 Kč	2 285 Kč
5,89	120	0,16	388 Kč	2 285 Kč
5,89	120	0,16	388 Kč	2 285 Kč
5,89	120	0,16	388 Kč	2 285 Kč
5,89	120	0,16	388 Kč	2 285 Kč
5,89	120	0,16	388 Kč	2 285 Kč
5,89	120	0,16	388 Kč	2 285 Kč
2,71	120	0,16	388 Kč	1 051 Kč
5,9	120	0,16	388 Kč	2 289 Kč
5,9	120	0,16	388 Kč	2 289 Kč
5,9	120	0,16	388 Kč	2 289 Kč
5,9	120	0,16	388 Kč	2 289 Kč
5,9	120	0,16	388 Kč	2 289 Kč
5,9	120	0,16	388 Kč	2 289 Kč
5,9	120	0,16	388 Kč	2 289 Kč
5,9	120	0,16	388 Kč	2 289 Kč
5,9	120	0,16	388 Kč	2 289 Kč

CELKEM 46 059 Kč

V CENĚ JE ZAHRNUTO

Vedlejší rozpočtové náklady patrné ze zadání (doprava, atd.).

V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO

DPH.

ZÁVĚREM:

Nabídka byla zpracována na základě našich zkušeností a poznatků s přípravou a realizací stavebních akcí obdobného charakteru. Zpracováním této nabídky bylo ze strany společnosti J.SEIDL a spol., s.r.o. reagováno na veškeré známé skutečnosti, uvedené v zadání této poptávky.

Cenová nabídka zahrnuje ceny za kompletní provedení díla, mimo zvláštních opatření, která jsou uvedena v nabídce. Ceny jsou stanoveny na základě cen materiálových vstupů ke dni předložení nabídky. Při nárůstu nebo snížení těchto cen o více než 5% se tato změna promítne do celkové ceny dodávky díla.

Osvědčení, potřebná ke kolaudačnímu řízení jsou součástí námi provedeného díla.

S pozdravem



Garanční doložka číslo: 151/21.2



Výše uvedená nabídka byla zpracována členskou organizací č. **002/99** a to pod odbornou gescí Asociace "Požární ochrana staveb". Asociace tímto současně potvrzuje, že navržené řešení vychází výhradně z ověřených a certifikovaných materiálů a odpovídá předepsaným postupům a technologiím tak, jak byly průkazně ověřeny zkouškami ve státem akreditovaných zkušebních laboratořích. Všechny navržené tloušťky vrstev nátěrů, nástřiků či obkladů odpovídají v závislosti na poměru O/F či zjištěném krytí ocelové výztuže schváleným dimenzačním tabulkám, případně je lze doložit výpočtem či znaleckým posudkem. Níže podepsaný člen asociace zároveň souhlasí s registrací realizované akce, event. následnou nezávislou kontrolou zhotoveného díla a všemi důsledky, vyplývajícími z případně zjištěných vad.

Zneužití ochranné známky asociace bude stíháno dle zákona

Od: Luboš Kasper <[REDACTED]>
Odesláno: čtvrtek 11. března 2021 7:29
Komu: ŠŤASTNÝ Michal - BAK stavební společnost a.s.; Lukáš Laštovička; Vladislav Kališ
Kopie: [REDACTED]
Předmět: SMART - dosažení PO 120 min u stropů

Dobrý den.


Stropy v 1.PP v lihových depozitářích budou mít SDK podhled s PO 45 min.

Strop nad depozitářem nábytku (tj nad 1.PP) bude mít spodní pásnice válcovaných nosníků obloženy ORDEXALEM s PO 30 min.

Ing. Luboš Kasper
kolmá 500
541 03 Trutnov 3

603209045
kasper@luboskasper.cz

TECHNICKÁ ZPRÁVA



ZMĚNY	ÚPRAVA DISPOZICE DLE POŽADAVKŮ INVESTORA	DATUM	09/2020	PODPIS	Ing. I. BEDNÁRKOVÁ
	ÚPRAVA DISPOZICE DLE POŽADAVKŮ INVESTORA		05/2020		Ing. I. BEDNÁRKOVÁ

INVESTOR:

Královéhradecký kraj	Královéhradecký kraj Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 495 817 111, fax: +420 495 817 338 e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz
----------------------	--

PROJEKTANT:

ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Ivana BEDNÁRKOVÁ	TECHNICO architects & engineers TECHNICO Opava s.r.o. Hradecká 1576/51 746 01 Opava tel: 553 760 970 info@technico.cz
VYPRACOVAL:	Ing. Ivana BEDNÁRKOVÁ	
KONTROLOVAL:	Ing. Martin ULÍČNÝ	

ČÁST DOKUMENTACE:

D.1.3.1. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Stavební úpravy objektu Gayerových kasáren vč. přístavby, Opletalova 334/2, Hradec Králové K.ú. Hradec Králové, parc.č. st. 291/4	FORMAT	A4
	DATUM	03/2021
	STUPEŇ	DPS
	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	TO-483-DPS
TECHNICKÁ ZPRÁVA	MĚŘITKO	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.3.1.a._b

Stavební úpravy objektu Gayerových kasáren vč.přístavby

Opletalova 334/2, Hradec Králové


D.1.3.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY

Upřesnění provedení protipožárních úprav v místnostech 01.22, 01.13 a 01.14:

Protipožární úprava spodních pásnic stropních nosníků v místnosti č. 01.22 bude pro dosažení požární odolnosti 120 min obložena ORDEXALEM s požární odolností 45 min.

V místnostech 01.13 a 01.14 bude požární odolnosti 120 min dosaženo při použití sádkartonového podhledu s požární odolností 30 min.

V Opavě 03/2021





Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Zhotovitel:	Společnost BAK-GEOSAN, Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek
Projekt:	SMARTmuzeum: modernizace depozitářů, technického a technologického zázemí Muzea východních Čech v Hradci Králové
Místo:	Hradec Králové
Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0011170
Smlouva o dílo ze dne 04.02.2019	

ZMĚNOVÝ LIST		ZL	79
		revize:	
	Společnost	Zastoupena (Jméno, Příjmení)	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové	Mgr. Martin Červíček	
Zhotovitel:	Společnost BAK-GEOSAN, Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek	Ing. Radek Mrázek, MBA Ivan Havel Ing. Kamil Vykydal	
Vydáno dne:			
PŘEDMĚTEM ZMĚNOVÉHO LISTU - ZADÁVACÍHO LISTU			
<i>S ohledem na úpravu nosných konstrukcí přístavby a změny skladby obvodové stěny na ose „C“, tj. skladby P-F2, viz ZL36 je nutné provést úpravu upevnění požárních rolet v 1.PP objektu přístavby, aby byla zajištěna celistvost parozábrany a byly eliminovány tepelné mosty. Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které investor jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Změna nemění celkovou povahu zakázky.</i>			
• Rozpočet, viz. v příloha č. 1 • Cenová nabídka, viz. v příloha č. 2 • Zápis z KD č.65, viz. příloha č. 3			
DOPAD NA CENU (bez DPH):		DOPAD NA ČAS realizace v souvislosti s tímto ZL:	
Celkem odpočty:	0,00 Kč	Termín pro vyprojektování změny:	----
Celkové odpočty a připočty:	42 470,00 Kč	Termín pro provedení změny:	----
Celkem připočty:	42 470,00 Kč	Dopad na dílčí termíny:	NE
Cena díla po poslední změně:	223 496 920,63 Kč	Dopad na termín dokončení:	NE
Podpisem zástupců obou smluvních stran se tento „ZL“ nepovažuje za písemný dodatek k výše uvedené smlouvě o dílo			
Zástupce Objednatele: Ing. Václav Nyč		Datum: 15.03.2021	
Zástupce Objednatele: Ing. Roman Kosář		Datum: 15.03.2021	
Technický dozor investora: Ing. Luboš Kasper		Datum: 15.03.2021	
Generální projektant: Ing. Martin Uličný		Datum: 15.03.2021	
Zástupce Zhotovitele: Karel Laš		Datum: 15.03.2021	
Za Zhotovitele vypracoval: Ing. Petr Hanzlík		Datum: 15.03.2021	
Za Zhotovitele kontroloval: Ing. Michal Holub		Datum: 15.03.2021	
Za Zhotovitele kontroloval: Ing. Michal Štastný		Datum: 15.03.2021	
Za Zhotovitele kontroloval: Lukáš Laštovička, DiS.		Datum: 15.03.2021	

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu Gayerových kasáren vč. přístavby, Opletalova 334/2, Hradec Králové
Objekt: D.1.1.c.02. VÝPIS OKEN

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		PSV	Práce a dodávky PSV				9 963,00	
		766	Konstrukce truhlářské				9 963,00	
1		ZL 80_01	D+M Mřížka hliník, ral 9010	ks	9,00	520,00	4 680,00	cena v místě a čase obvyklá
			" m.č. 1.30 (1 ks), 1.01 (5 ks), 1.02 (1 ks), 3.20 (1 ks), 3.21 (1 ks) "		9,00			
2		ZL 80_02	D+M Šoupě	ks	9,00	480,00	4 320,00	cena v místě a čase obvyklá
12	766	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1,10	90,00	99,00	dle SOD
13	766	HZS2121	Hodinová zúčtovací sazba truhlář	hod	2,00	432,00	864,00	dle SOD
			"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 766 "		2,00			
			" Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace apod "					
		<u>Celkem</u>					9 963,00	
		CÉLKEM	D.1.1.c.02. VÝPIS OKEN				9 963,00	

Bak

17.02.2021

CENOVÁ NABÍDKA č. 49

úprava

akce: **Smart Hradec Králové**

Odpoččet - pol. 01:

Parapet dle smlouvy již vyrobený - odpoččet 0
Osazení vnitřních parapetů 10 ks - odpoččet -3830

Připočet (č.m. 1.30 - 1 ks, 1.01 - 5 ks, 1.02 - 1 ks, 3.20 - 1 ks, 3.21 - 1 ks)

Parapet k oknům s roletou	2 760 Kč
Montáž parapetu	1 003 Kč
Mřížka hliník, ral 9010	350 Kč
Osazení mřížky	970 Kč
Šoupě	900 Kč
Montáž šoupěte	900 Kč
CELKEM BEZ DPH 1 ks	6 883 Kč

CELKEM BEZ DPH 9 ks **61 947 Kč**


Připočet (č.m. 1.01-1ks)

Parapet k oknům s roletou	2 760 Kč
Montáž parapetu	1 003 Kč
CELKEM BEZ DPH 1 ks	<u>3 763 Kč</u>

Vícepráce celkem bez DPH **61 880 Kč**

TRUST-ts spol. s r.o.
Pavel Stodolovský



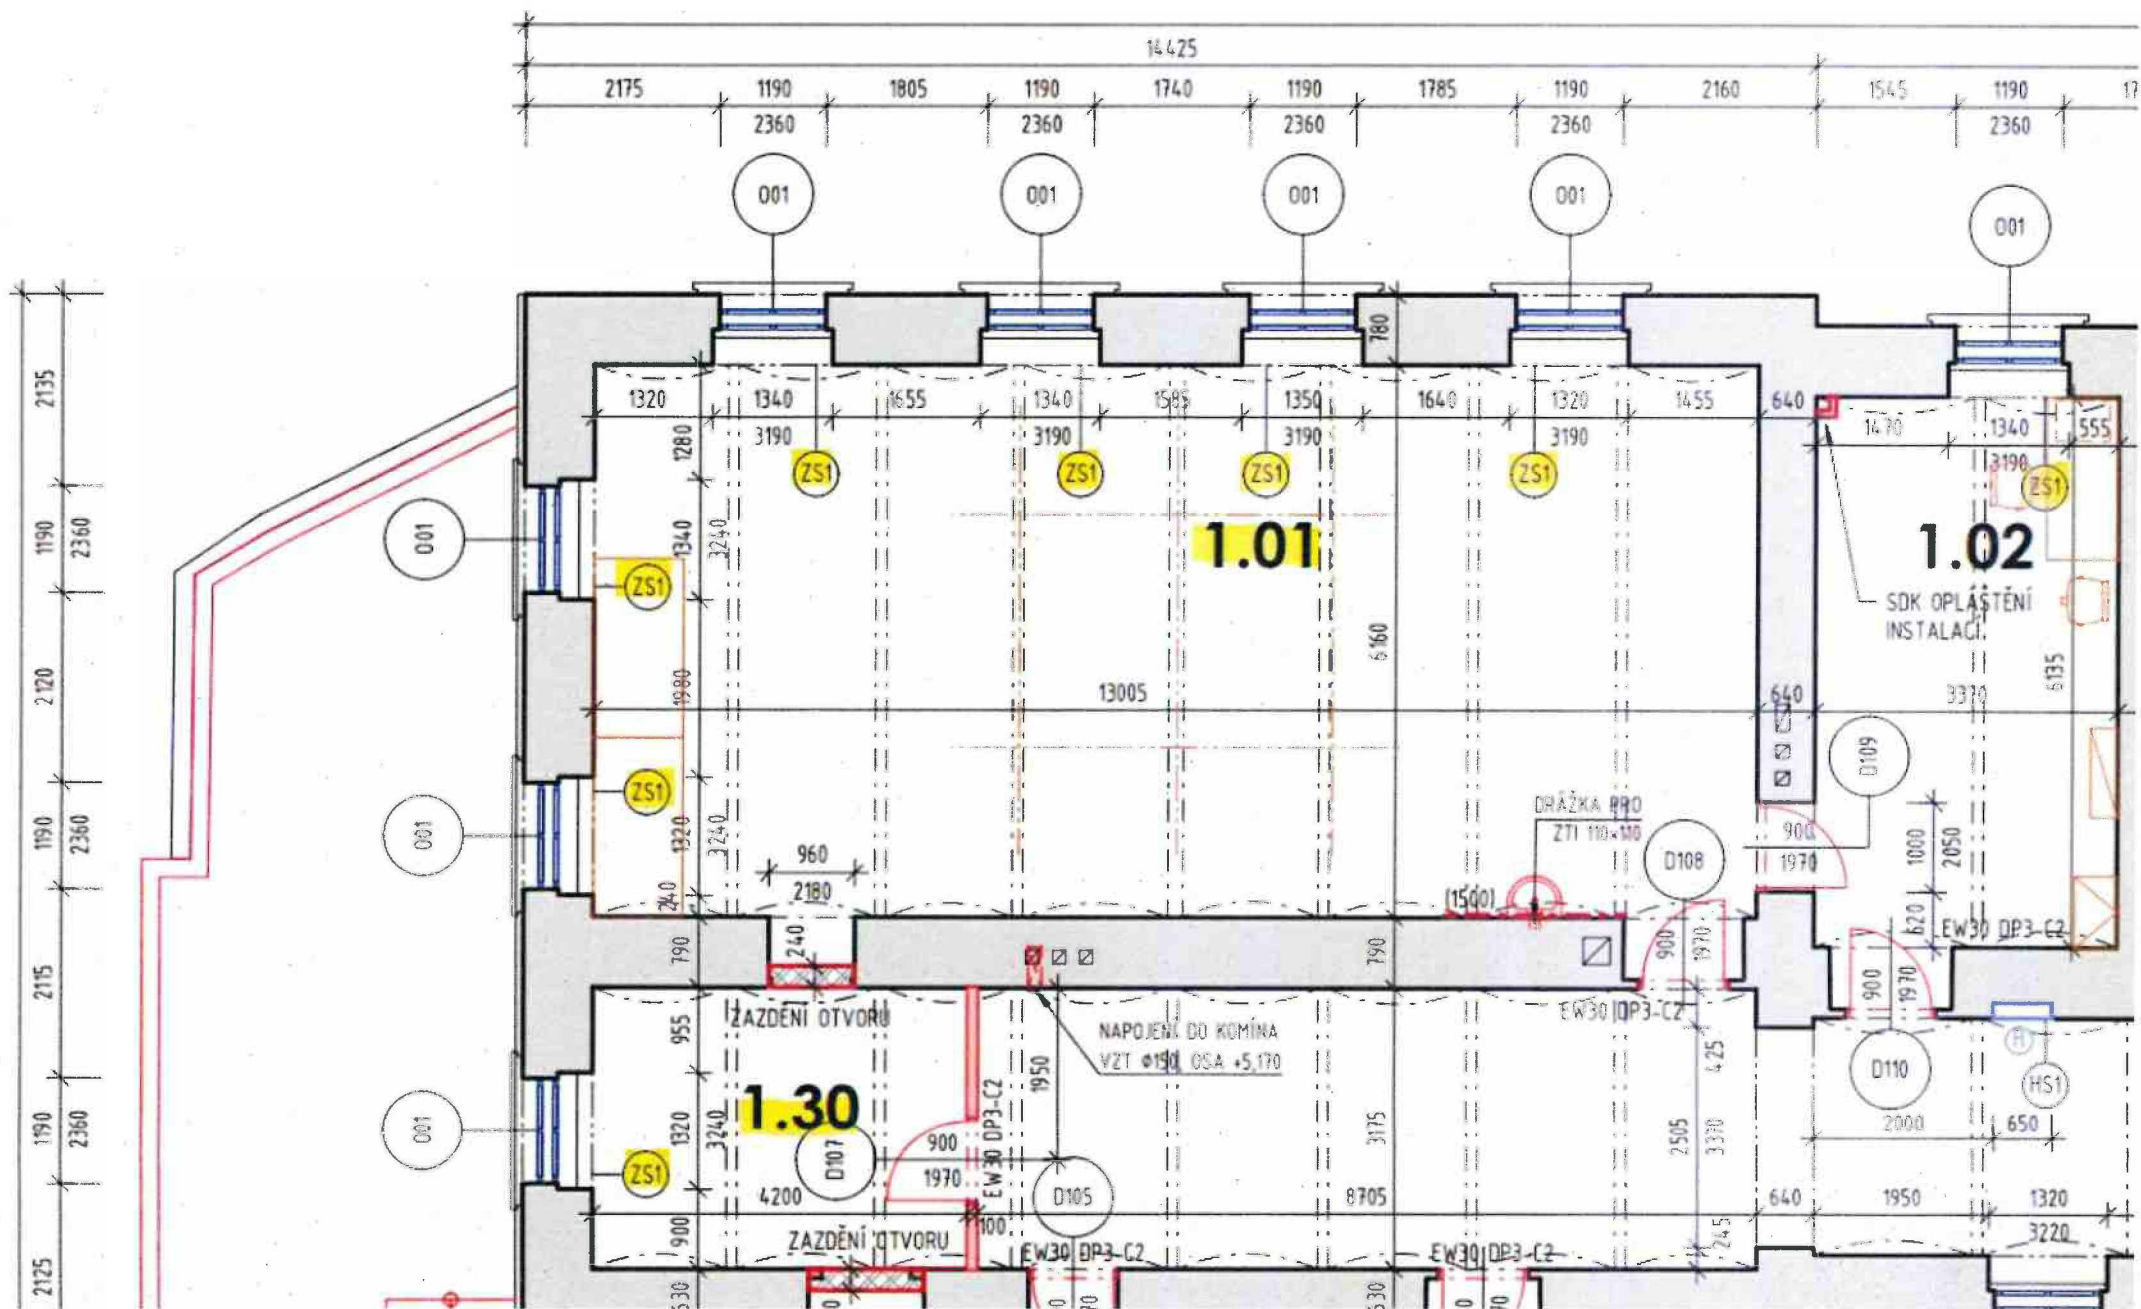

SMART muzeum

Zápis z kontrolního dne č: 61/2021

Datum konání: 10.02.2021

Přítomni:

Investor: KÚ KHK – Kosař
GP: TECHNICO Opava – Koráb - omluven
GD sdružení BAK, Geosan: Kališ, Šťastný, Laštovička
MMHK – OPP: J. Faltá - omluven
NPÚ Josefov: B. Adámková - omluvena
CIRI: J. Štěrbová
MVČ: Černá, Zámečník - omluveni
TDI: L. Kasper

KD č.60 se koná v době nouzového stavu.

KD 62 se uskuteční 17.2.2021 (středa) od 8,00 hodin.

1

Kontrolní den se koná vždy ve středu od 8,00 hod se srazem účastníků v objektu zařízení

Prováděné práce v období 3.2. – 10.2.2021

Přístavba :

- Lištování LOP kolem spojovacího krčku
- Dokončení montáže SDK podhled 1.PP
- Osazování koncových prvků slaboproud, silnoproud 1.NP
- Montáž zábradlí ramp
- Osazování zvlhčovačů

Stávající budova:

- Montáž žaluzií pro VZT 4.NP východ
- Malby, nátěry 1.PP
- Oprava omítek 4.NP
- Osazování koncových prvků silnoproud, slaboproud
- Osazování koncových prvků silnoproud do rozvaděčů
- Obklady, dlažby 1.PP chodba
- Renovace schodišťových stupňů hlavního schodiště
- Zaklopení SDK pro opláštění rozvodů VZT
- Zahájení montáže obložkových zárubní
- Oprava, doplnění a renovace linkrusty



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



- 59.4. Plyn – MVČ nepožaduje. Potrubí je provedeno dle PD, bude zaslepeno. Plynoměr nebude osazen. Propouští HUP. Musí se řešit. Navrhujeme ventil zrušit a nahradit zátkou. Projednat s dodavatelem plynu. Z: MVČ, GD

(KD 60,61) Trvá

- 59.5. MVČ požaduje provést zakrytí technologie zvedací plošiny v chodbě 1.PP. Z: GD

(KD 60) Rám z jacklu, opláštění z tahokovu, barva šedá. Z: GD

(KD 61) Dále cestou ZL, vypouští se.

- 59.6. MVČ požaduje schůzku ve věci realizace serverovny za účasti p.Pavla a pracovníků Elektrosdružení. Z:GD

(KD 60,61) pracovníci zhotovitele jsou nemocní, schůzka příští týden.

- 60.1. Uzávěry rozvodu vody budou osazeny revizními dvířky (plast, rozměr dle velikosti uzávěru nebo velikosti obkladu). Z: GD

(KD 61) Dále cestou ZL, vypouští se.

- 60.2. Řešit v m.č. 3.03. umístění klima jednotky. GD předá podklad k vnitřní jednotce.

Z:GD, TDS. T: KD 61

(KD 61) Vyřešeno, vypouští se.

6

Nové úkoly:

- 61.1. Poklopy v chodbě 1.PP budou provedeny nově na zadláždění. Zhotovitel dále upozorňuje na nerovnost těchto ocelových konstrukcí osazených do podlah. Připraví řešení. Z: GD, T: KD 62

- 61.2. V místnostech se zatemněním vnitřními roletami bude provede širší a hlubší parapet tak, aby po stažení rolety neprosvítalo světlo. Z důvodu zachování proudění vzduchu od radiátoru je nutné doplnit do parapetu větrací mřížky s funkcí zatemněno, odtemněno. GD předloží typ mřížky. Dále formou ZL, Vypouští se. Z: GD

Vzorkování:

- V. 50.1. GD předložil DD na hliníkové dveře (5 ks) mezi přístavbou a starou budovou. TDS přepošle na OPP MMHK a NPÚ. Z: TDS

(KD 51) OPP MMHK souhlasí, TDS vystaví žádost na vydání závazného stanoviska. Z: TDS

- V. 53.1. TDS a OPP MMHK dnes provedl kontrolu rozpracované zpevněné plochy nádvoří u levého vstupu. Bez připomínek.

- V. 60.1. GD předložil SLV na vnitřní teracové stupně přístavby – byl vybrán vzorek 679, stupně opatřeny protiskluzovou drážkou.

- V. 60.2. GD předložil vzorek dilatační lišty do dlažeb. Předloží SLV. (KD 61) Trvá



V.60.3. GD připravil v 2.NP k odsouhlasení vzorek epoxidové stěrky.

(KD 61) Epoxidová stěrka odsouhlasena, trvá odsouhlasit provedení soklu. Z: GD

V.61.1. GD předložil technický list na vinylovou krytinu zdvojené podlahy. GD předloží vzorkovník
barev.
Z: GD, T: KD 61


V.61.2. Byl odsouhlasen vzorek soklu ve schodišti. Vypouští se.

V.61.3. Byl odsouhlasen vzorek plastových revizních dvířek na ZTI. GD předloží SLV. Vypouští se.

V Hradci Králové 10.02.2021

Zapsal: Ing. L. Kasper

Přílohy: prezenční listina, popis hlášení MaB.

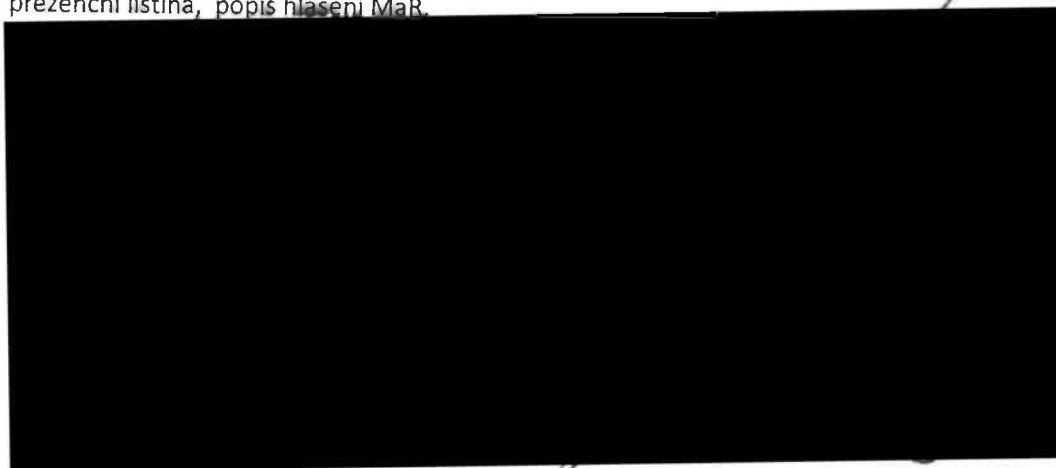

7



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Zhotovitel:	Společnost BAK-GEOSAN, Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek
Projekt:	SMARTmuzeum: modernizace depozitářů, technického a technologického zázemí Muzea východních Čech v Hradci Králové
Místo:	Hradec Králové
Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0011170
Smlouva o dílo ze dne 04.02.2019	

ZMĚNOVÝ LIST		ZL	80
		revize:	

	Společnost	Zastoupena (Jméno, Příjmení)
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	Mgr. Martin Cervíček
Zhotovitel:	Společnost BAK-GEOSAN, Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek	Ing. Radek Mrázek, MBA Ivan Havel Ing. Kamil Vykydal
Vydáno dne:		

PŘEDMĚTEM ZMĚNOVÉHO LISTU - ZADÁVACÍHO LISTU

Na základě specifického požadavku na zatemnění místnosti č. 1.01 a 1.30 (fotograf) vnitřními roletami a zároveň i možnosti zabránění pronikání denního světla v místě vnitřního parapetu a předcházení značné kondenzace vlhkosti na oknech v zimním období, je nutné do vnitřních parapetů vsadit mřížku a soupu. Mřížky v parapetech zajistí v otevřeném stavu proudění tepla z topných těles na okenní výplně, čímž teplý vzduch z těles zabráni nadměrné kondenzaci vlhkosti na oknech v zimním období v m.č. 1.01 a 1.30. Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které investor jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Změna nemění celkovou povahu zakázky.

- Rozpočet, viz. v příloha č. 1
- Cenová nabídka, viz. příloha č. 2
- Zápis z KD č. 61, viz. příloha č. 3
- Půdorys, viz. příloha č. 4

DOPAD NA CENU (bez DPH):		DOPAD NA ČAS realizace v souvislosti s tímto ZL:	
Celkem odpočty:	0,00 Kč	Termín pro vyprojektování změny:	----
Celkové odpočty a připočty:	9 963,00 Kč	Termín pro provedení změny:	----
Celkem připočty:	9 963,00 Kč	Dopad na dílčí termíny:	NE
Cena díla po poslední změně:	223 506 883,63 Kč	Dopad na termín dokončení:	NE

Podpisem zástupců obou smluvních stran se tento „ZL“ nepovažuje za písemný dodatek k výše uvedené smlouvě, nýbrž
nutné řešit dodatkem Smlouvy o dílo

Zástupce Objednatele:
Ing. Václav Nýč
Datum:
15.03.2021

Zástupce Objednatele:
Ing. Roman Kosář
Datum:
15.03.2021

Technický dozor investora:
Ing. Luboš Kasper
Datum:
15.03.2021

Generální projektant:
Ing. Martin Uličný
Datum:
15.03.2021

Zástupce Zhotovitele:
Karel Laš
Datum:
15.03.2021

Za Zhotovitele vypracoval:
Ing. Karel Borkovec
Datum:
15.03.2021

Za Zhotovitele kontroloval:
Ing. Michal Holub
Datum:
15.03.2021

Za Zhotovitele kontroloval:
Ing. Michal Štastný
Datum:
15.03.2021

Za Zhotovitele kontroloval:
Lukáš Laštovička, DiS.
Datum:
15.03.2021

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu Gayerových kasáren vč. přístavby, Opletalova 334/2, Hradec Králové
Objekt: D.1.1.c.07. VÝPIS OSTÁTNÍCH VÝROBKŮ
Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Zhotovitel: Společnost BAK-GEOSAN, Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek
Místo: Hradec Králové

P.C	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
		PSV	Práce a dodávky PSV				42 470,00	
1.		ZL 79 01	D+M Pomocná ocelová konstrukce pro protipožární rolety	seda	1,00	42 470,00	42 470,00	Cena v místě a čase obvyklá
			*Cena v místě a čase obvyklá					
			Jackel 60 x 50 x 4 6 ks					
			L 100 x 60 x4 1 ks			2178,00		
			Tabule plech			4671,00		
			střih			1150,00		
			ohyb			1075,00		
			doprava - přesun hmot			4356,00		
			nátěr			12100,00		
			Montáž			16940,00		

IČO: 71828672
 DIČ: CZ7704205432
 Číslo účtu: 670100-2200120639/6210

TopVrata.cz
 Kladenská 725/79
 160 00 Praha 6

Telefon: 234 139 743
 Fax: 222 360 427
 Email: jurecka.petr@topvrata.cz

Cenová nabídka číslo: 21022501 – D+M pomocné OK pro požární uzávěry:

Stöbich Brandschutz s. r. o.
 Zvonařka 14
 617 00 Brno
 Pan Václav Toman

Na základě vaší poptávky předkládám následující cenovou nabídku:

Provedení protipožárního nátěru včetně potřebných certifikátů.

D+M pomocné OK - muzeum Hradec			
	ks	cena/ks	cena
jackel 80X50X4	6	363,00 Kč	2 178,00 Kč
L 100x80x4			
tabule plech	1	4 671,00 Kč	4 671,00 Kč
stříh	5	230,00 Kč	1 150,00 Kč
ohyb	5	215,00 Kč	1 075,00 Kč
doprava - přesuny hmot a kapacit	1	4 356,00 Kč	4 356,00 Kč
nátěr práce	5	1 452,00 Kč	7 260,00 Kč
nátěr barva	1	4 840,00 Kč	4 840,00 Kč
montáž	7	2 420,00 Kč	16 940,00 Kč
Celkem bez DPH			42 470,00 Kč
DPH	21%		-
s DPH			-
uhrazené zálohy			0,00 Kč
Celkem k úhradě			42 470,00 Kč
DLE ZÁKONA O DPH §92e REŽIM PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI. DAŇ ODVEDE ZÁKAZNÍK.			

Vypracoval: Petr Jurečka – 602 582 732
 V Praze dne 25.2.2021





SMART muzeum

Zápis z kontrolního dne č: 65/2021

Datum konání: 10.03.2021

Přítomni:

Investor: KÚ KHK – Kosař
GP: TECHNICO Opava – Koráb - omluven
GD sdružení BAK, Geosan: Šťastný, Laštovička, Kališ, Holub
MMHK – OPP: J. Falta - omluven
NPÚ Josefov: B. Adámková - omluvena
CIRI: J. Štěrbová
MVČ: Černá, Zámečník - omluveni
TDI: L. Kasper

KD č.64 se koná v době nouzového stavu.

KD 65 se uskuteční 10.3.2021 (středa) od 8,00 hodin.

1

Kontrolní den se koná vždy ve středu od 8.00 hod se srazem účastníků v objektu zařízení

Prováděné práce v období 3.3. – 10.3.2021

Přístavba :

- Dokončovací práce na SDK konstrukci, osazování revizních dvířek
- Osazování koncových prvků slaboproud, silnoproud 1.NP
- Montáž zábradlí ramp
- Provádění venkovní komunikace

Stávající budova:

- Malby, nátěry 1.PP – 4.NP
- Oprava omítek 1.PP
- Osazování koncových prvků silnoproud, slaboproud
- Osazování koncových prvků silnoproud do rozvaděčů
- Renovace schodišťových stupňů hlavního schodiště
- Pokračování montáže obložkových zárubní a osazování dveřních křídel
- Oprava, doplnění a renovace linkrusty
- Obklady a dlažby 1.PP
- Montáž a osazování sanity
- Provádění finálních povrchů epoxidových stěrek



(KD 61) Chybí závazná stanoviska ke zpevněným plochám a dveře mezi starou a novou
budovou. Z: TDS, T:KD 63

57.1. MVČ určí umístění čísla popisného na objektu. Z: MVČ, T: KD 58

(KD 58) Trvá

(KD 59) ČP umístit na přístavbě nad hlavní vstup, odsouhlasit i umístění názvů ulic s
OPP MMHK. Z: TDS

64.1. GD prověří s dodavatelem dopravního značení projednání s DI – zrušení vodorovného
značení parkovacích míst s výjimkou místa pro invalidu. Zde projednat doplnění svislé
dopravní značky. Z: GD, T: KD 65

(KD 65) Žádost o uměnu DZ podána.

64.2. GD připraví složky dokladů ke kolaudacím podmiňujících staveb (přípojky, přeložky).
Z: GD, T: kontrola KD 66

64.3. GD upozorňuje, že pro montáž požárních rolet je nutné dodat pomocnou ocelovou
konstrukci (eliminace tepelných mostů a prostupů parozábranou). GD předloží návrh
ZL. Z: GD, T: KD 65

(KD 65) Vypouští se, dále cestou ZL.

64.4. GD bude tento týden provádět keramické obklady a hydroizolace na WC invalidi č.m.
01.36. Není dosažena bez opatření min velikost rozměru místnosti 1600 mm. Žádáme
GD o stanovisko k rozměrům této místnosti. Spěchá.

Z: GP, T: 05.03.2021

(KD 65) Minimální velikost dle GP 1600 na 1600 mm. Znamená to úpravu
(přisekání) nosné stěny. Dále cestou ZL. Vypouští se.

64.5. GD předložil CN na ochranu ocelovou konstrukci k technologii zvedací plošiny. CN je
pro INV nepřijatelná. GD předloží návrh na D+M ochranného sloupku (pacholík).

Z: GD, T: KD 65

(KD 65) CN na sloupek schválena, dále cestou ZL. Vypouští se.

64.6. Dořešit nutnost provedení dřezů v rozsahu dle PD. TDS prověří u KHS HK. Napojení
koncových prvků slaboproudu i silnoproudu bude v recepci provedeno k předání díla na
provizorní stůl. GD zde nechá dostatečnou rezervu kabelů (min 2m).

Z: GD

(KD 65) Dřez bude osazen jen v místě dle požadavku na odběrné místo KHS KHK
(4.NP). GD zde dodá a osadí skříňku s dřezem a baterií. Dále cestou ZL. Vypouští
se.

Nové úkoly:

65.1. MVČ uzavře smlouvu s ASTOR COMPLEXem o připojení objektu na PCO a
smlouvu s HZS KHK. MVČ u ASTOR COMPLEX musí objednat i PLÁN
ZDOLÁVÁNÍ POŽÁRU. Z: MVČ



65.2. GD zpracuje plán předpřejímek, přejímek, zaškolení obsluhy, závěrečných kontrolních dohlídek. Z: GD, T: KD 66

65.3. GD předloží poslední návrh ZL do KD 66 Z: GD

65.4. Stavby na pozemcích MHK zůstanou na pozemcích MHK. Přístavba bude zaměřena vč venkovních schodišť. Z: GD

Vzorkování:

V. 50.1. GD předložil DD na hliníkové dveře (5 ks) mezi přístavbou a starou budovou. TDS přepošle na OPP MMHK a NPÚ. Z: TDS

(KD 51) OPP MMHK souhlasí, TDS vystaví žádost na vydání závazného stanoviska. Z: TDS


V. 53.1. TDS a OPP MMHK dnes provedl kontrolu rozpracované zpevněné plochy nádvoří u levého vstupu. Bez připomínek.


V.55.1. Deska pod umyvadla v soc zař šaten v 1.PP bude dezén dub. Vypouští se.


V Hradci Králové 10.03.2021

Zapsal: Ing. L. Kasper

Přílohy: prezenční listina

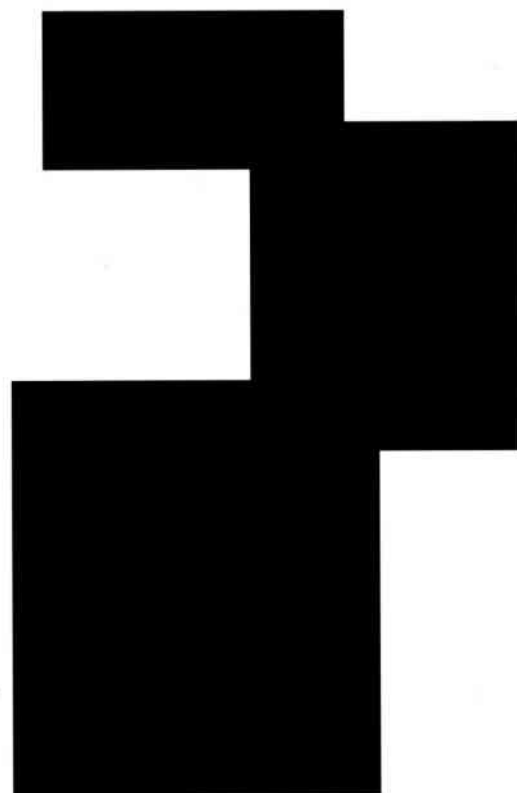

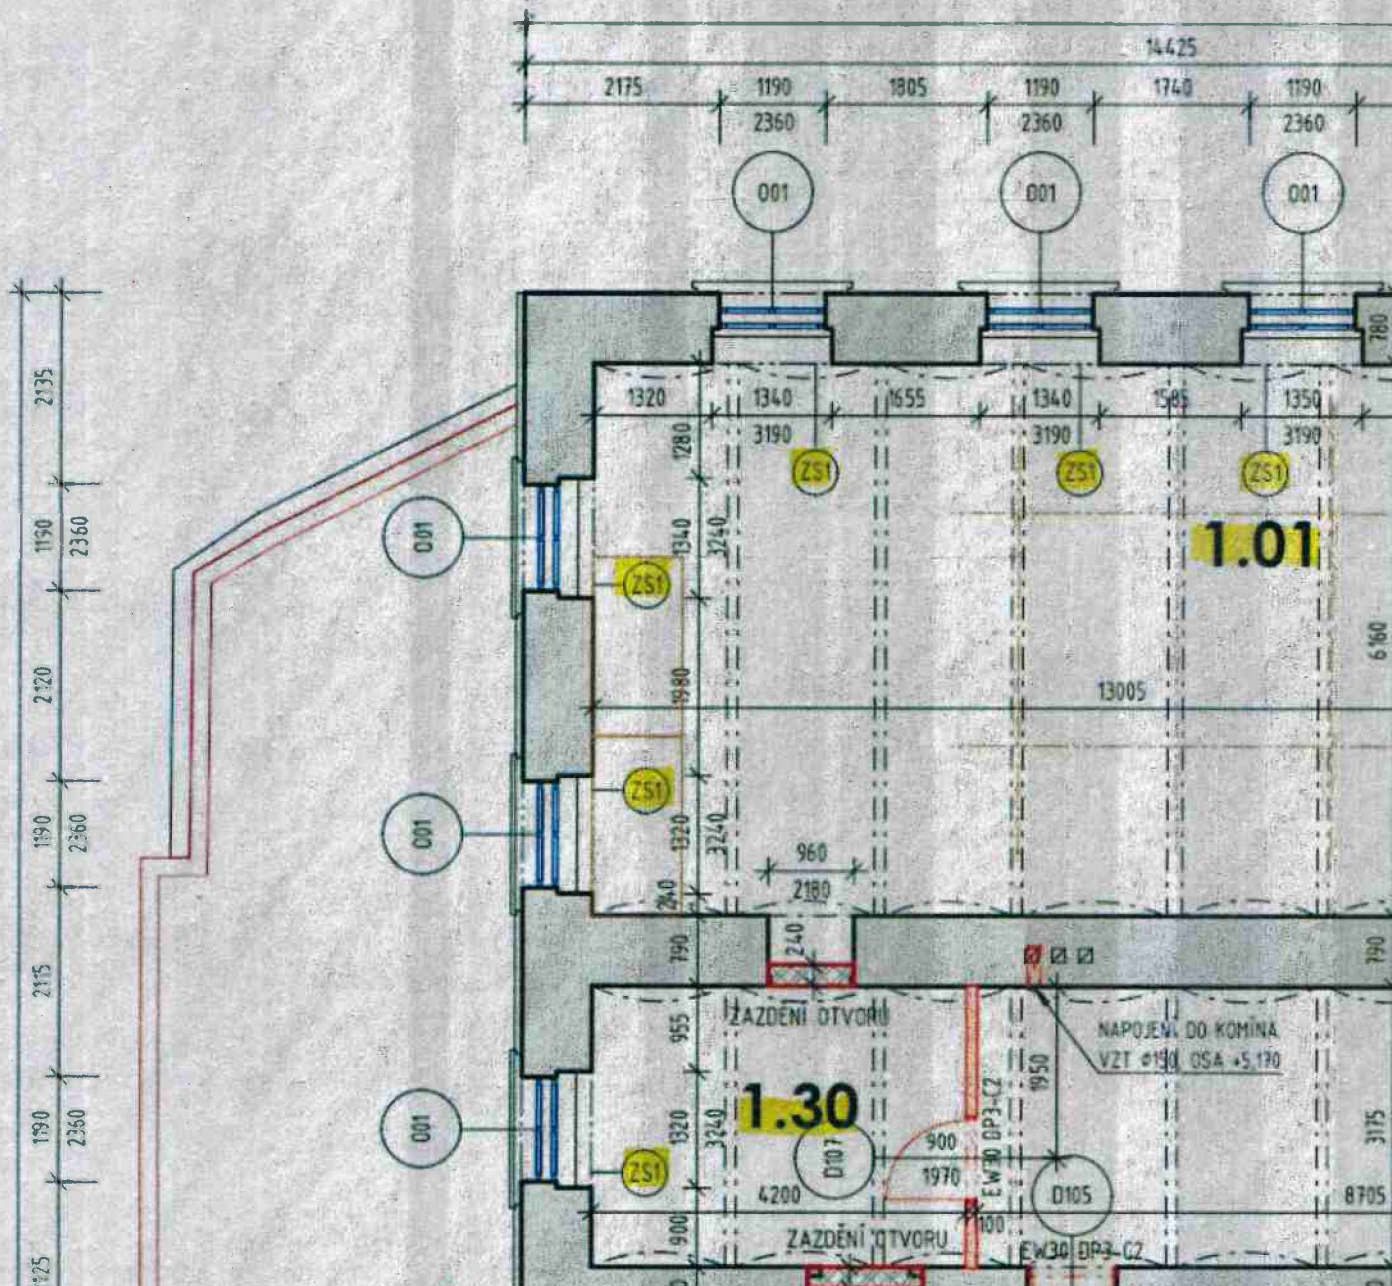

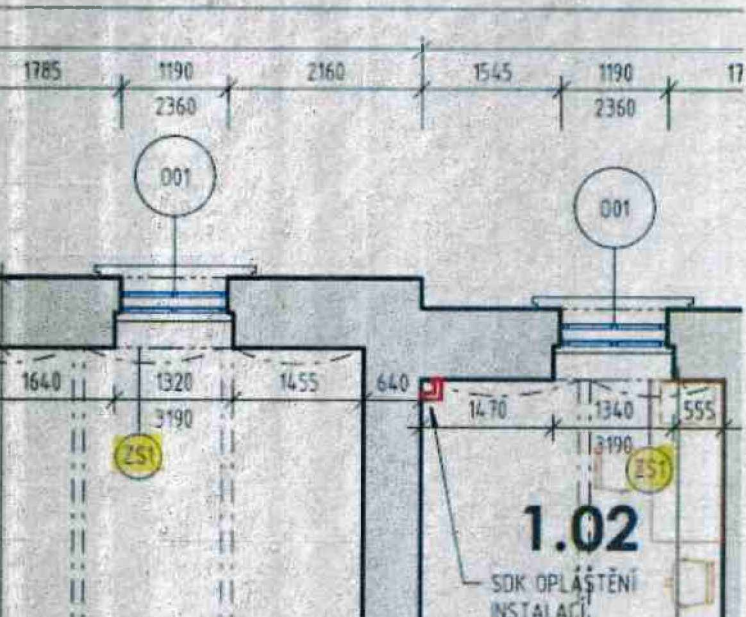



Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Zhotovitel: Společnost BAK-GEOSAN, Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek
Projekt: SMARTmuzeum: modernizace depozitářů, technického a technologického zázemí Muzea východních Čech v Hradci Králové
Místo: Hradec Králové
Registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0011170
Smlouva o dílo ze dne 04.02.2019

ZMĚNOVÝ LIST		ZL	81
		revize:	
Objednatel:	Společnost Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	Zastupena (Jméno, Příjmení) Mgr. Martin Cerveček	
Zhotovitel:	Společnost BAK-GEOSAN, Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek	Ing. Radek Mrázek, MBA Ivan Havel Ing. Kamil Vykydal	
Vydáno dne:			
PŘEDMĚTEM ZMĚNOVÉHO LISTU - ZADÁVACÍHO LISTU			
Na základě revize prováděcí dokumentace byl doplněn do výpisu ostatních výrobků nápis "MUSEUM" na fasádě přístavby. Na základě požadavku OPP MMHK je vybráno písmo výšky textu 500 mm, písmo bude z nerez materiálu P3, který bude nalakován do zlaté barvy (dle vzorku gondar), odsazen bude od povrchu betonové atiky o 40mm, závitové tyče budou kryty trubkou upevňující jednotlivá písmena v RAL 9005. Tato změna nemění celkovou povahu zakázky.			
• Rozpočet, viz. v příloha č. 1 • Cenová nabídka, viz. příloha č. 2 • Výpis ostatních výrobků, viz. příloha č. 3 • Zápis z KD č.63, viz. příloha č. 4			
DOPAD NA CENU (bez DPH):		DOPAD NA ČAS realizace v souvislosti s tímto ZL:	
Celkem odpočty:	0,00 Kč	Termín pro vyprojektování změny:	----
Celkové odpočty a připočty:	50 532,48 Kč	Termín pro provedení změny:	----
Celkem připočty:	50 532,48 Kč	Dopad na dílčí termíny:	NE
Cena díla po poslední změně:	223 557 416,11 Kč	Dopad na termín dokončení:	NE
Podpisem zástupců obou smluvních stran se tento „ZL“ nepovažuje za písemný dodatek k výše uvedenému smluvnímu textu, který by mohl být nutně řešit dodatkem Smlouvy o dílo.			
<u>Zástupce Objednatel:</u> Ing. Václav Nýč		Datum: 15.03.2021	
<u>Zástupce Objednatel:</u> Ing. Roman Kosář		Datum: 15.03.2021	
<u>Technický dozor investora:</u> Ing. Luboš Kasper		Datum: 15.03.2021	
<u>Generální projektant:</u> Ing. Martin Uličný		Datum: 15.03.2021	
<u>Zástupce Zhotovitele:</u> Karel Laš		Datum: 15.03.2021	
<u>Za Zhotovitele vypracoval:</u> Ing. Karel Borkovec		Datum: 15.03.2021	
<u>Za Zhotovitele kontroloval:</u> Ing. Michal Holub		Datum: 15.03.2021	
<u>Za Zhotovitele kontroloval:</u> Ing. Michal Štastný		Datum: 15.03.2021	
<u>Za Zhotovitele kontroloval:</u> Lukáš Laštovička, DiS.		Datum: 15.03.2021	

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu Gayerových kasáren vč. přístavby, Opletalova 334/2, Hradec Králové
Objekt: D.1.1.c.07. VYPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		PSV	Práce a dodávky PSV				50 532,48	
		790	Ostatní práce a dodávky				50 532,48	
		ZL 81_01	Dodávka a montáž nápisu "MUZEUM" na fasádě	kpl	1,00	49 600,00	49 600,00	cena v místě a čase obvyklá
16	790	998790901 SPC	Přesun hmot pro ostatní výrobky v objektech v do 36 m	%	1,88	496,00	932,48	dle SCD
Celkem							50 532,48	
CELKEM		D.1.1.c.07. VYPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ					50 532,48	

NABÍDKA ZBOŽÍ A SLUŽEB

Dodavatel : VÝPRACHTICKÝ s.r.o.



VÝPRACHTICKÝ

C 20712 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Humburky 2

504 01 Humburky

IČ : 27469051

DIČ : CZ27469051

Řada dokladu : 800

Číslo dokladu : 210045

Zakázka č. : Z0478

Popis zakázky : Nápis MUZEUM

Způsob dopravy : Dodavatelem

Forma úhrady : Platebním příkazem 30dní

Datum pořízení : 01.03.2021

Datum platnosti :

Termín dodání : 15.3.2021

Odběratel : BAK stavební společnost, a.s.

Žitenická 871/1

190 00 Praha

IČ : 28402758 DIČ : CZ28402758

Zastoupený: Ing. Šťastný Michal

603567321

Řádek	Popis položky	Množství MJ	Kč/MJ	Celkem	DPH %	Celkem s DPH
1	Dodávka a montáž nápisu "MUZEUM" Výroba – pálení na laseru Výroba - navaření ZT M8-150, Výroba - navaření TR16/2 s mezikružím pr 30/16 tl. 3mm Hutní materiál - nerez TR 16/2 - 2m, Hutní materiál - nerez P3 - 500x2500mm, Spotřební montážní materiál Lakování písmen na zlato, Lakování distančních podložek na černo - RAL 9005 Doprava do lakovny a zpět (2x) (Dymokury), Doprava hutního materiálu, Doprava pracov. na stavbu Osazení písmen – montáž, vč. MT, DMT lešení	1,00 kpl	49 600,00	49 600,00	0	49 600,00
		1,00		49 600,00		49 600,00

Celkem Kč bez DPH:

49 600,00

Celkem Kč vč. DPH:

49 600,00

Povrchová úprava: Komaxit - písmo zlaté, distance černé - RAL 9005

Zajištění staveništní manipulace: vlastní mechanizace a doprava, objednatel zajistí pouze přístup

Záruční doba: 24 měsíců, Třída provedení: EXC2

Pracovní doba: PO-PÁ: od 7:00 - 17:00, mimo svátky.

Případné vícepráce budou doučovány. Hodinová sazba pro případné vícepráce činí 600Kč/hod/osobu.


Pozastávky po dobu záruky nenabízíme.

Poznámky: Prodloužená záruka na 60 měsíců

Případné VCP zde v sazbě 480 Kč/hod/osoba


VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

Stavební úpravy objektu Gayerových kasáren vč. přístavby, Opletalova 334/2, Hradec Králové

POL.	NÁZEV	POPIS	PODLAŽÍ	ks/m/kpl
PR1	PROTIPOŽÁRNÍ ROLETA 	TEXTILNÍ ROLETOVÝ UZÁVĚR ODDĚLUJÍCÍ POŽÁRNÍ ÚSEKY A BRÁNÍCÍ ŠÍŘENÍ POŽÁRU MEZI NIMI. OVLÁDÁNÍ EPS. V KLIDOVÉM BODU JE UZÁVĚR V HORNÍ POLOZE V UZAVŘENÉM NÁBALU V PODHLEDU. PŘI POŽÁRU SE AKTIVUJE A PROBĚHNE SPUŠTĚNÍ UZÁVĚRU. SPECIFIKACE: VODÍČÍ LIŠTY NA STĚNĚ, UZAVÍRACÍ SPODNÍ HRANA, TEXTILNÍ NEMOŘLAVÁ CLONA, NAVÍJECÍ BUBEN, POHON. MONTÁŽ NÁBALU NA PRŮVLAK V KONSTRUKCI V PODHLEDU. SV. ŠÍŘKA 4600 mm, VÝŠKA 2860 mm - 2 ks, SV. ŠÍŘKA 3700 mm, VÝŠKA 2860 mm - 1 ks, SV. ŠÍŘKA 2600 mm, VÝŠKA 2860 mm - 1 ks POŽÁRNÍ ODOLNOST DLE PBŘ EW30 DP3	2.PP	0
			1.PP	4
			1.NP	0
			2.NP	0
			3.NP	0
			4.NP	0
			STŘECHA	0
			CELKEM	4 ks
NF	NÁPIS NA FASÁDĚ	FASÁDNÍ 3D NÁPIS	CELKEM	1 ks

NF

NÁPIS NA FASÁDĚ

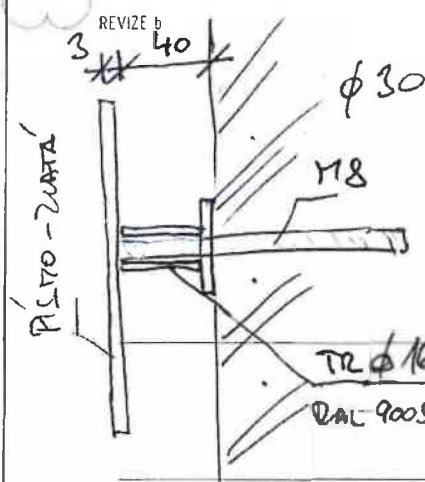

FASÁDNÍ 3D NÁPIS

NÁPIS „MUSEUM“ VYROBEN ZE SILNÉHO PLECHU

PŘÍPEVNĚNÉHO NA PVC PÍSMENA

PÍSMENA JSOU PŘÍPEVNĚNA NA DISTANČNÍCH ZÁVITOVÝCH TYČÍCH

PRO ODSAZENÍ OD POVRCHU MIN. 40mm

HLOUBKA PÍSMEN JE 20 mm

VÝŠKA TEXTU 500 mm

BARVA: MAT. ZLATÁ

POZN.: FONT PÍSMŮ PŘEVZAT - INSPIRACE HLAVNÍ BUDOVA MUZEUM VÝCHODNÍCH ČECH V HRADCI KRÁLOVÉ

SOUHLASÍ
10.02.2021

MUSEUM

Staci P3

VZORCE BARVY - KODAKIT



INSPIRAČNÍ OBRÁZKY HLAVNÍ BUDOVY MUZEUM VÝCHODNÍCH ČECH



OFICIÁLNÍ LOGO MUZEUM

MUSEUM

MUSEUM VÝCHODNÍCH ČECH
V HRADCI KRÁLOVÉ

POZN.: DODAVATEL BUDE PŘED VÝROBOU ŘEŠENÍ ATYPICKÝCH PRVKŮ KONZULTOVAT S INVESTOREM
VEŠKERÉ POLOŽKY BUDOU INVESTOROVÍ VZORKOVÁNY

Strana:
4

SMART muzeum

Zápis z kontrolního dne č: 63/2021

Datum konání: 24.02.2021

Přítomni:

Investor: KÚ KHK – Kosař
GP: TECHNICO Opava – Koráb - omluven
GD sdružení BAK, Geosan: Šťastný, Laštovička, Kališ
MMHK – OPP: J. Falta - omluven
NPÚ Josefov: B. Adámková - omluvena
CIRI: J. Štěrbová - omluvena
MVČ: Černá, Zámečník - omluveni
TDI: L. Kasper

KD č.63 se koná v době nouzového stavu.

KD 64 se uskuteční 03.3.2021 (středa) od 8,00 hodin.

1

Kontrolní den se koná vždy ve středu od 8,00 hod se srazem účastníků v objektu zařízení

Prováděné práce v období 17.2. – 24.2.2021

Přístavba :

- Montáž SDK kolem průvlaku na ose C
- Osazování koncových prvků slaboproud, silnoproud 1.NP
- Montáž zábradlí ramp

Stávající budova:

- Montáž žaluzii pro VZT 4.NP východ
- Malby, nátěry 1.PP
- Oprava omítek 4.NP
- Osazování koncových prvků silnoproud, slaboproud
- Osazování koncových prvků silnoproud do rozvaděčů
- Obklady, dlažby 1.NP, 4.NP chodba
- Renovace schodišťových stupňů hlavního schodiště
- Zaklopení SDK pro opláštění rozvodů VZT
- Pokračování montáže obložkových zárubní
- Oprava, doplnění a renovace linkrusty
- Chemické očištění pískovcových hlav na schodišti ve 3.NP
- Obklady a dlažby 1.PP
- Montáž zdvojené podlahy



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



(KD 62) MaR a silnoproudý technicky vyřešeny, ZL na silno i slabý proud GD zpracuje do 19.2.2021. Z: GD, T: kontrola KD 63

(KD 63) ZL GD zašle do 26.2.2021.

57.1. MVČ určí umístění čísla popisného na objektu. Z: MVČ, T: KD 58

(KD 58) Trvá

(KD 59) ČP umístit na přístavbě nad hlavní vstup, odsouhlasit i umístění názvů ulic s OPP MMHK. Z: TDS

58.2. MVČ sdělí, jak jsou zajištěny dodávky kuchyňských linek. Stavba má jako součást plnění dodávku a montáž dřezových baterií a dřezů. Nikoli však vlastní kuchyňské linky (4 ks). Linky jsou důležité, stavba bez nich nejde zkolaudovat. Stavba je potřebuje dodat do max 15.3.2021. Z: MVČ, T: info KD 59

(KD 59,60) Trvá, řeší se. Jednání proběhne příští týden.

(KD 61,62) Trvá

(KD 63) Kuchyňské linky viz samostatné VŘ. Vypouští se.

59.6. MVČ požaduje schůzku ve věci realizace serverovny za účasti p. Pavla a pracovníků Elektrosdružení. Z:GD

(KD 60,61) pracovníci zhotovitele jsou nemocní, schůzka příští týden.

(KD 62) Jednání může proběhnout pátek od 10,00 hod.

(KD 63) Splněno, vypouští se.

5

Nové úkoly:

63.1. Vnitřní zábradlí na hlavním schodišti – madlo - budou natřeny kovářskou černí. Vypouští se.

Vzorkování:

V. 50.1. GD předložil DD na hliníkové dveře (5 ks) mezi přístavbou a starou budovou. TDS přeposle na OPP MMHK a NPÚ. Z: TDS

(KD 51) OPP MMHK souhlasí, TDS vystaví žádost na vydání závazného stanoviska. Z: TDS

V. 53.1. TDS a OPP MMHK dnes provedl kontrolu rozpracované zpevněné plochy nádvoří u levého vstupu. Bez připomínek.

V. 60.1. GD předložil SLV na vnitřní teracové stupně přístavby – byl vybrán vzorek 679, stupně opatřeny protiskluzovou drážkou.

V.63.1. GD předložil vzorky povrchové úpravy nápisu MUSEUM. Jsou v příloze zápisu

V Hradci Králové 24.02.2021

Zapsal: Ing. L. Kasper

Přílohy: prezenční listina, vzorky barvy nápisu MUSEUM.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Zhotovitel:	Společnost BAK-GEOSAN, Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek
Projekt:	SMARTmuzeum: modernizace depozitářů, technického a technologického zázemí Muzea východních Čech v Hradci Králové
Místo:	Hradec Králové
Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/001/17/0
Smlouva o dílo ze dne 04.02.2019	

ZMĚNOVÝ LIST	ZL	82
	revize:	

Objednatel:	Společnost	Zastoupena (Jméno, Příjmení)
	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	Mgr. Martin Červíček
Zhotovitel:	Společnost BAK-GEOSAN, Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek	Ing. Radek Mrázek, MBA Ivan Havel Ing. Kamil Vykydal
Vydáno dne:		

PŘEDMĚTEM ZMĚNOVÉHO LISTU - ZADÁVACÍHO LISTU

Projektová dokumentace neobsahovala ve výkazu výměr úpravu schodišťového ramena mezi 1.PP a 1.NP původní budovy. Z tohoto důvodu je nutné provést opravu a současně demontáž značně poškozených kovových listů u teraco stupňů. Proveďte se zbrusušením nášlapné plochy teraco stupně na čistou vrstvu včetně odsekání nesoudržných částí podtupnice a proveďte se zpětná montáž nových kovových listů, které se natřou. Současně bylo nutné druhé oslabené schodišťové rameno staticky podepřít. Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které investor jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Změna nemění celkovou povahu zakázky.

- Rozpočet: viz. příloha č. 1
- Zápis z KD č. 59, viz. příloha č. 2
- Návrh možného podchycení schodišťových stupňů, viz. příloha č. 3
- Fotodokumentace, viz. příloha č. 4

DOPAD NA CENU (bez DPH):		DOPAD NA ČAS realizace v souvislosti s tímto ZL:	
Celkem odpočty:	0,00 Kč	Termín pro vyprojektování změny:	----
Celkové odpočty a připočty:	187 048,59 Kč	Termín pro provedení změny:	----
Celkem připočty:	187 048,59 Kč	Dopad na dílčí termíny:	NE
Cena díla po poslední změně:	223 744 464,70 Kč	Dopad na termín dokončení:	NE

Podpisem zástupců obou smluvních stran se tento „ZL“ nepovažuje za písemný dodatek k výše uvedené smlouvě o dílo. Tento ZL bude nutně řešit dodatkem Smlouvy o dílo

Zástupce Objednatel:
Ing. Václav Nýč
Datum:
15.03.2021

Zástupce Objednatel:
Ing. Roman Kosař
Datum:
15.03.2021

Technický dozor investora:
Ing. Luboš Kasper
Datum:
15.03.2021

Generální projektant:
Ing. Martin Uličný
Datum:
15.03.2021

Zástupce Zhotovitele:
Karel Laš
Datum:
15.03.2021

Za Zhotovitele vypracoval:
Ing. Karel Borkovec
Datum:
15.03.2021

Za Zhotovitele kontroloval:
Ing. Michal Holub
Datum:
15.03.2021

Za Zhotovitele kontroloval:
Ing. Michal Štastný
Datum:
15.03.2021

Za Zhotovitele kontroloval:
Lukáš Lašovička, DiS.
Datum:
15.03.2021

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu Gayerových kasáren vč. přístavby, Opletalova 334/2, Hradec Králové

Objekt: D.1.1. ASŘ - NOVÝ STAV

JKSO: 901.46.13

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		FSV	Práce a dodávky PSV				156 216,58	
		772	Podlahy z kamene				156 216,58	
####	772	77299901 SPC	D+M Repase stávajícího kamenného schodiště včetně soklů - Specifikace dle PD " V ceně : " "- Výměna poškozených prvků, doplnění podlahy včetně soklů, vyčištění, vyspravení, impregnace, leštění, voskování, zakonzervování apod. " " Schodiště 1.PP " 8.41+2.405*0,145*12 1.rameno: (0,318*12*2,35)+(0,145*12*2,35) 2.rameno: (0,318*13*2,4)+(0,145*13*2,4) " Schodiště 1.NP " 9.4+2,49*0,149*13+9.2+2,395*0,159*13 1.rameno: (0,325*13*2,48)+(0,145*13*2,48) 2.rameno: (0,325*13*2,48)+(0,145*13*2,48) " Schodiště 2.NP " 9.5+2,48*0,150*13+9.63+2,48*0,149*13 1.rameno: (0,325*13*2,47)+(0,145*13*2,47) 2.rameno: (0,325*13*2,48)+(0,145*13*2,48)	m2	18,44	7 590,00	139 978,16	dle SOD
						-12,59		
						13,22		
						14,40		
						-28,37		
						15,16		
						15,16		
						-28,79		
						15,10		
						15,16		
####	772	598772203	Přesun hmot procentní pod podlahy z kamene v objektech v do 60 m	%	7,20	1 399,78	10 078,43	dle SOD
####	HZS	HZS2331	Hodinová zúčtovací sazba podlaží	hod	16,00	385,00	5 160,00	dle SOD
			"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 772."			16,00		
			" Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapřívání prostupů, apod."					
			Celkem				156 216,58	
		CELKEM	D.1.1. ASŘ - NOVÝ STAV				156 216,58	

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu Gavelových kasáren vč. přístavby, Opčelova 334/2, Hradec Králové
 Objekt: D.1.1.c.05. VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

P.C.	KCN	Kód položky	Popis	J.M.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		PSV	Práce a dodávky PSV				30 832,00	
		767	Konstrukce zámečnické				30 832,00	
		767095115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností od 100 kg	kg	80,000	32,27	2 581,82	Dle SoD ZL 71
			IPN 160		80,000			
			Source!		80,000			
		13010718	ocel profilová IPN 160 jakost 11 375	t	0,060	26 200,000	2 096,00	URS 2019 I * 0,99
			0,06		0,060			
	K	783301311	Odmastění zámečnických konstrukcí vodou reditelným odmašťovačem	m2	2,700	52,77	142,47	Dle SoD ZL 71
			2,7		2,700			
	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,700	100,58	272,65	Dle SoD ZL 71
								Dle SoD ZL 71
	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	2,700	97,02	261,95	Dle SoD ZL 71
								Dle SoD ZL 71
	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,700	99,99	269,97	Dle SoD ZL 71
								Dle SoD ZL 71
	K	783342101	Trnění včetně přebroušení zámečnických konstrukcí polyuretanovým tmelem	m2	2,700	103,85	280,67	Dle SoD ZL 71
###	768	808787204	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 tn	%	1,82	56,25	102,37	dle SOD
###	H2S	H2S2131	Hodinová zúčtovací sazba zámečnick	hod	58,00	426,00	24 824,00	dle SoD
			* Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767 *		58,00			
			* Zednické výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, doklínování, vysekání kapes, zednická nosníku *					

Celkem

30 832,00

CELKEM	ID.1.1.c.05. VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ	30 832,00
--------	---	-----------

SMART muzeum

Zápis z kontrolního dne č: 59/2021

Datum konání: 27.01.2021

Přítomní:

Investor: KÚ KHK – Kosař
GP: TECHNICO Opava – Koráb - omluven
GD sdružení BAK, Geosan: Laštovička, Kališ, Šťastný
MMHK – OPP: J. Falta – omluven
NPÚ Josefov: B. Adámková - omluvena
CIRI: J. Štěrbová
MVČ: Černá, Zámečník
TDI: L. Kasper

KD č.58 se koná v době nouzového stavu.

KD 60 se uskuteční 02.2.2021 (středa) od 8,00 hodin.

1

Kontrolní den se koná vždy ve středu od 8,00 hod se srazem účastníků v objektu zařízení

Prováděné práce v období 20.1. – 27.1.2021

Přístavba :

- Lištování LOP
- SDK podhled 1.PP
- Montáž lávky přes bastion
- Montáž zábradlí ramp

Stávající budova:

- Montáž žaluzii pro VZT 4.NP východ
- Malby, nátěry 1.NP
- Oprava omítek 1.PP
- Osazování koncových prvků silnoproud, slaboproud
- Montáž VZT 1.NP západ
- Rozvody silnoproud, slaboproud 1.PP
- Úprava kotelen 1.PP – nové rozvody ÚT
- SDK podhled 5.NP krov
- Úprava krovu pro osazení střešních žaluzií pro VZT



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Nové úkoly:

- 59.1. MVČ předá manuál na nápis MUZEUM. Materiál písmene nerez, povrchová úprava zlatá barva. Způsob kotvení dle parkovacího domu. Odsazení písmene od monolitu cca 40 mm. MVČ manuál nápisu pošle do konce týdne. Z: MVČ
- 59.2. Keramické obklady budou provedeny u kuchyňských linek i na obou bocích v š. min 600 mm. Z: GD.
- 59.3. V úklidové komoře č.m. 1.29 bude provedeno připojení pro automatickou pračku. Z: GD
- 59.4. Plyn – MVČ nepožaduje. Potrubí je provedeno dle PD, bude zaslepeno. Plynoměr nebude osazen. Propouští HUP. Musí se řešit. Navrhujeme ventil zrušit a nahradit zátkou. Projednat s dodavatelem plynu. Z: MVČ, GD
- 59.5. MVČ požaduje provést zakrytí technologie zvedací plošiny v chodbě 1.PP. Z: GD
- 59.6. MVČ požaduje schůzku ve věci realizace serverovny za účasti p.Pavla a pracovníků Elektrosdružení. Z:GD
- 59.7. V místnostech se zastíněním bude proveden širší vnitřní parapet tak, aby zastínění došlo až k parapetu. V parapetu nebude vsazena větrací mřížka (nelze z důvodu pronikání světla). Z: GD, vypouští se.
- 59.8. GD upozorňuje, že oprava 1 ramena schodiště z 1.PP do 1.NP chybí ve výkazu výměr. Budou se opravovat obě ramena. GD předloží návrh ZL. Vypouští se.

7

Vzorkování:

- 50.1. GD předložil DD na hliníkové dveře (5 ks) mezi přístavbou a starou budovou. TDS přeposle na OPP MMHK a NPÚ. Z: TDS
(KD 51) OPP MMHK souhlasí, TDS vystaví žádost na vydání závazného stanoviska. Z: TDS
- 53.1. TDS a OPP MMHK dnes provedl kontrolu rozpracované zpevněné plochy nádvoří u levého vstupu. Bez připomínek.

V Hradci Králové 27.01.2021

Zapsal: Ing. L. Kasper


Přílohy: prezenční listina




EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program




MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

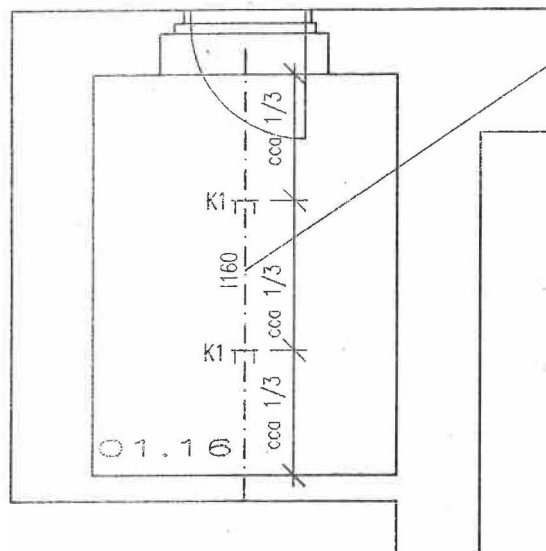

DÉLKU NOSNÍKU DOMĚŘIT NA MÍSTĚ, NOSNÍK ULOŽIT DO KAPES VE ZDIVU
NA PODBETONÁVKU TL. MIN. 50 mm, DÉLKA ULOŽENÍ MIN. 150 mm
NOSNÍK ZAJISTIT PROTI KLOPENÍ CCA VE TŘETINÁCH JEHO DÉLKY POMOCÍ
KOTVENÍ K1

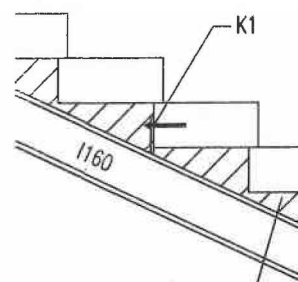


PROSTOR MEZI HORNÍ PŘÍRUBOU
A SCHOD. STUPNÍ VYKLÍNOVAT,
VYPLNIT BETONEM A ZDIVEM Z CP



P8-200/150
PŘIVAŘIT K HORNÍ PŘÍRUBĚ
NOSNÍKU

M10-150
VLEPIT DO OSY SCHODIŠŤOVÉHO
STUPNĚ DO HLoubKY 100 mm
NAPŘ. TMELEM FISCHER FIS-V

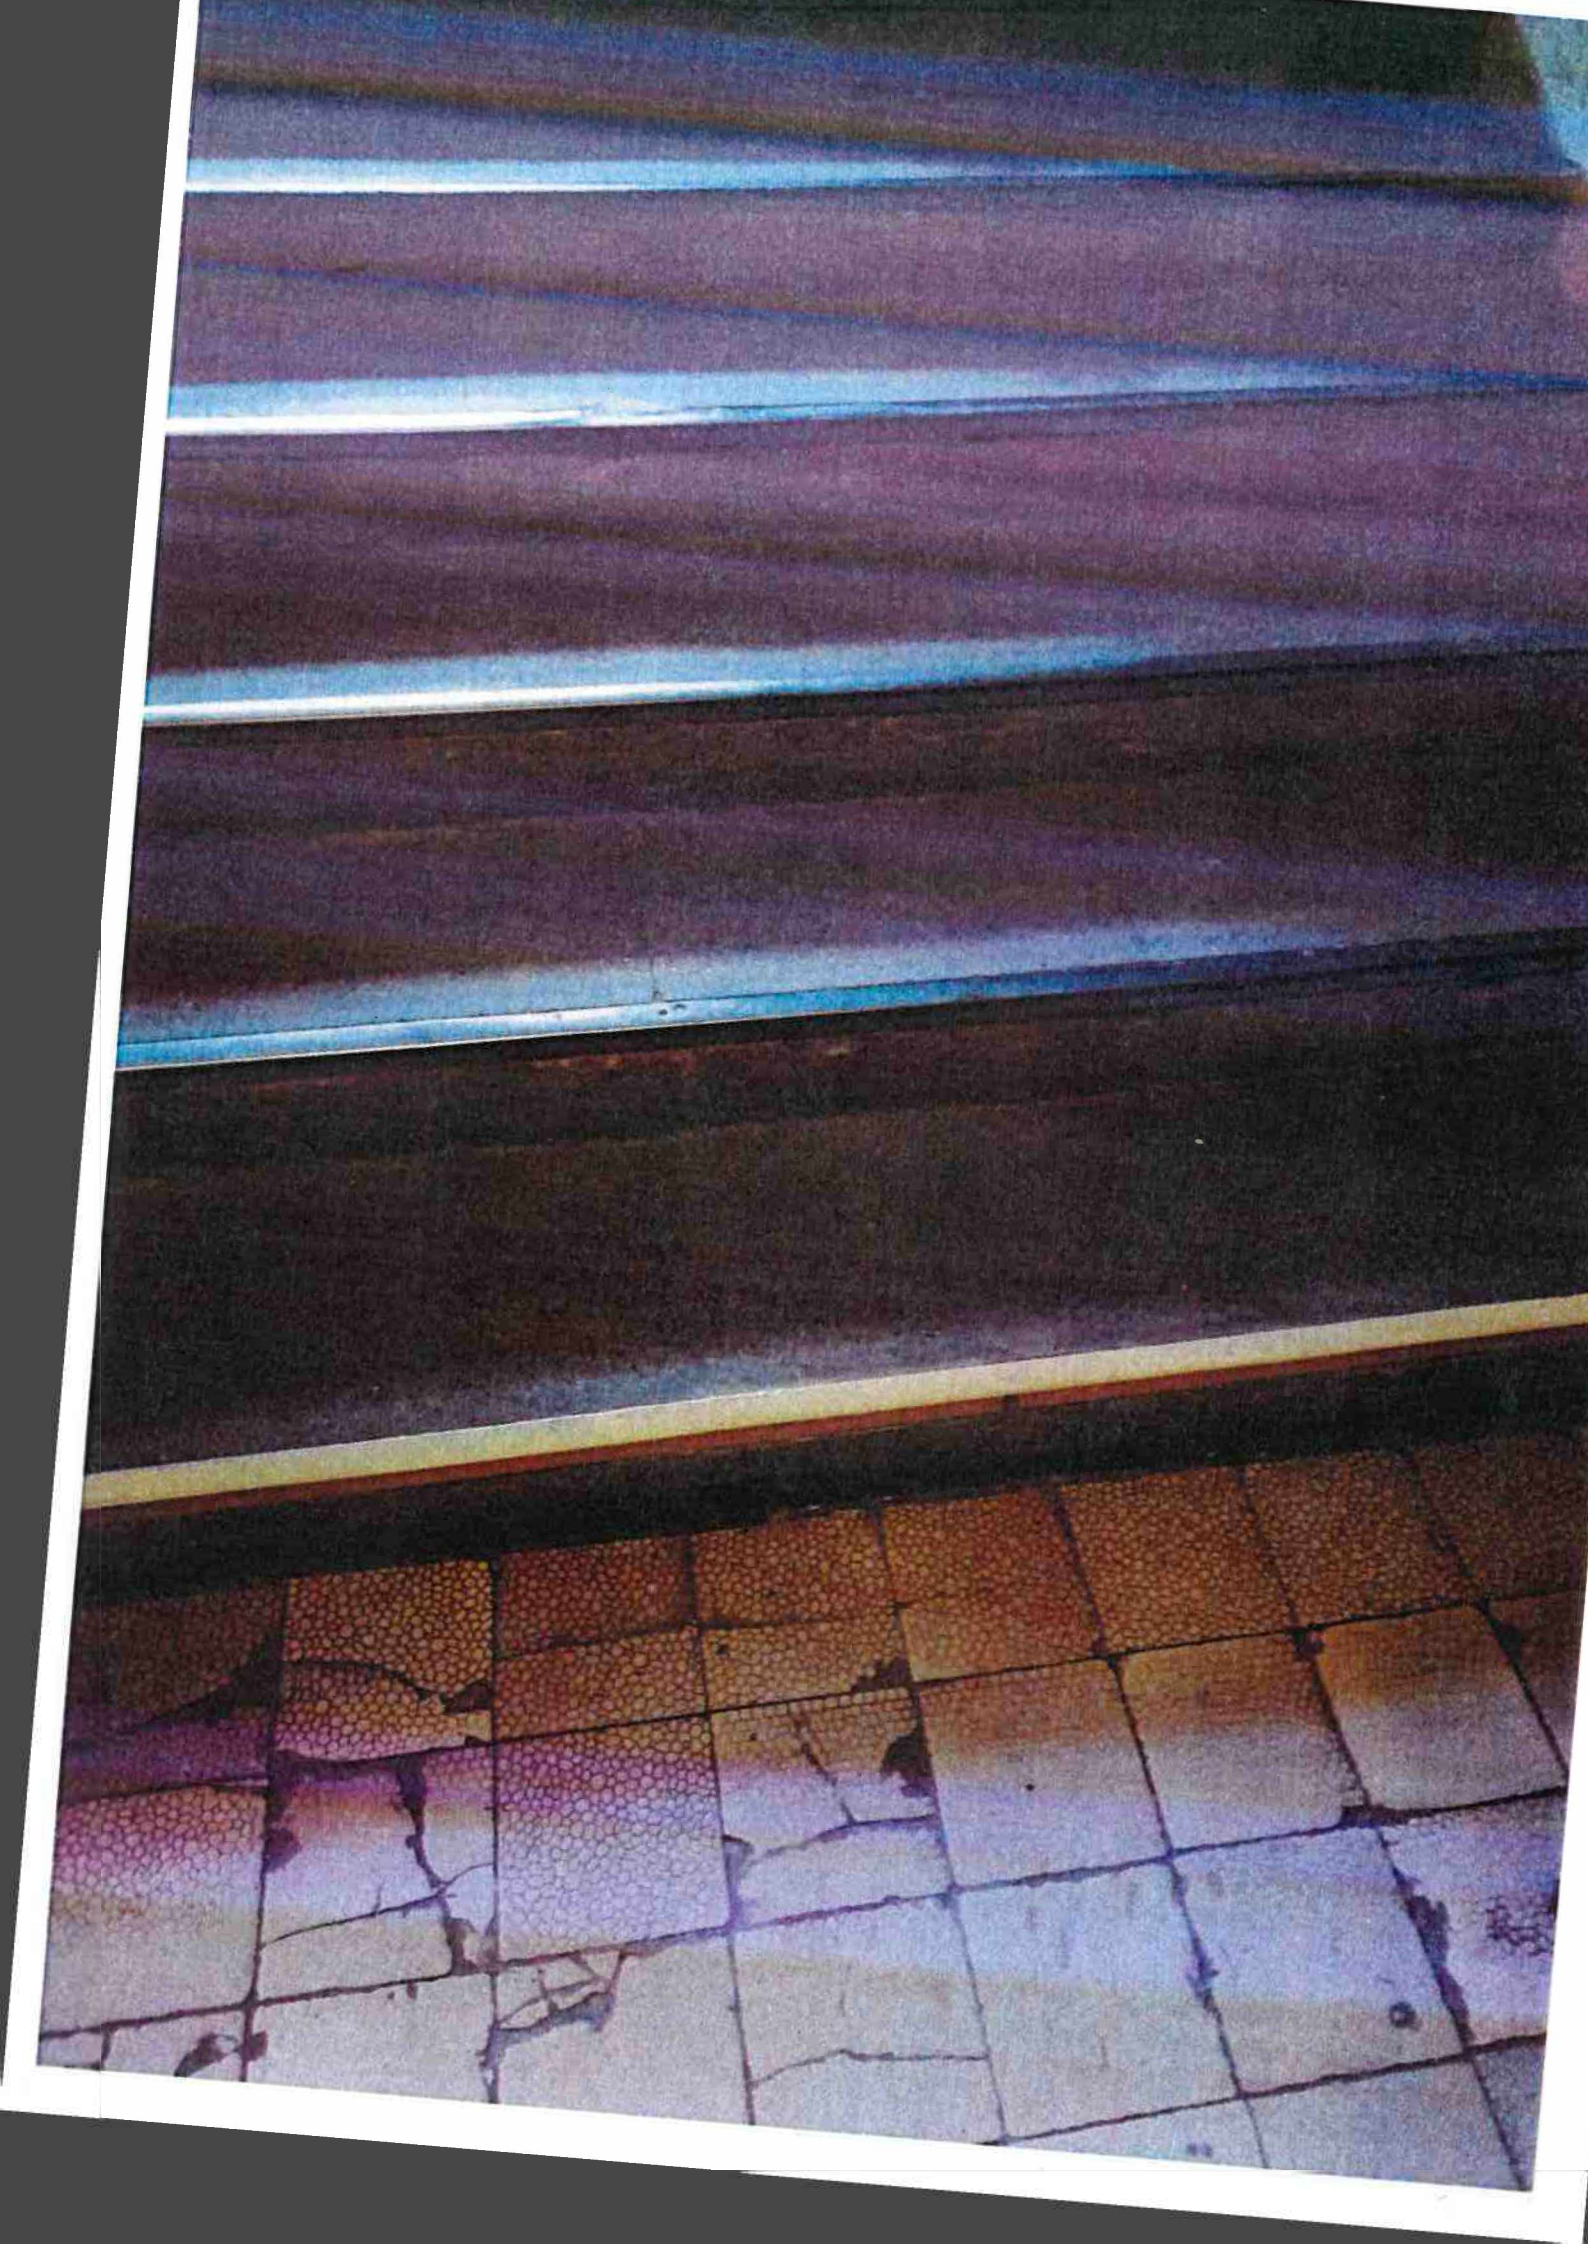



Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Zhotovitel:	Společnost BAK-GEOSAN, Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek
Projekt:	SMARTmuzeum: modernizace depozitářů, technického a technologického zázemí Muzea východních Čech v Hradci Králové
Místo:	Hradec Králové
Registrační číslo projektu:	CZ.06.2.33/0.0/0.0/16_036/0011170
Smlouva o dílo ze dne 04.02.2019	

ZMĚNOVÝ LIST		ZL	83
		revize:	
	Společnost	Zastoupena (Jméno, Příjmení)	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	Mgr. Martin Červíček	
Zhotovitel:	Společnost BAK-GEOSAN, Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek	Ing. Radek Mrázek, MBA Ivan Havel Ing. Kamil Vykydal	
Vydáno dne:			
PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU - ZADÁVACÍHO LISTU			
<i>Na základě revize prováděcí dokumentace generálním projektantem byl revidován zámečnický výrobek Z 1.12 o odnímatelné zábradlí u jednotlivých oken na schodišti mezi 3.NP - 5.NP a doplnění podlahových bezpečnostních zárazek u zrcátek schodiště viz dílenská dokumentace zámečnických výrobků Z 1.12a a Z 1.12b, která je nedílnou přílohou tohoto změnového listu. Dále bylo doměřeno zábradlí z 1.12 na schodišťové podestě k nově představené SDK stěně k půlstoce. Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které investor jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Změna nemá celkovou povahu zakázky.</i>			
• Rozpočet, viz. v příloha č. 1 • Dílenská dokumentace Z 1.12a, Z1.12b, viz. příloha č. 2			
DOPAD NA CENU (bez DPH):		DOPAD NA ČAS realizace v souvislosti s tímto ZL:	
Celkem odpočty:	0,00 Kč	Termín pro vyprojektování změny:	----
Celkové odpočty a připočty:	21 147,05 Kč	Termín pro provedení změny:	----
Celkem připočty:	21 147,05 Kč	Dopad na dílčí termíny:	NE
Cena díla po poslední změně:	223 765 611,75 Kč	Dopad na termín dokončení:	NE
Podpisem zástupců obou smluvních stran se tento „ZL“ nepovažuje za písemný dodatek k výše uvedené smlouvě o dílo. Tento ZL bude nutně řešit dodatkem Smlouvou o dílo			

Zástupce Objednatel:
Ing. Václav Nýč
Datum:
15.03.2021

Zástupce Objednatel:
Ing. Roman Kosař
Datum:
15.03.2021

Technický dozor investora:
Ing. Luboš Kasper
Datum:
15.03.2021

Generální projektant:
Ing. Martin Uličný
Datum:
15.03.2021

Zástupce Zhotovitele:
Karel Laš
Datum:
15.03.2021

Za Zhotovitele vypracoval:
Ing. Karel Borkovec
Datum:
15.03.2021

Za Zhotovitele kontroloval:
Ing. Michal Holub
Datum:
15.03.2021

Za Zhotovitele kontroloval:
Ing. Michal Štastný
Datum:
15.03.2021

Za Zhotovitele kontroloval:
Lukáš Laštovička, DiS
Datum:
15.03.2021

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SMART MUZEUM MODERNIZACE DEPOZITÁŘU, TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO ZÁZEMÍ MUzea
VÝCHODNÍCH ČECH

Objekt: Z 1.12b

Místo: HRADEC KRÁLOVÉ

Oslovení:

Zadavatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

Projektant: TECHNICO

Zhotovitel: SDRUŽENÍ BAK GEOSAN

Zpracovatel: OPAVA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 835,51	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				628,06	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				628,06	
1	K	953965115	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 130 mm	kus	8,000	78,51	628,06	Dle SoD ZL 71
			8		8,000			
	D		Práce a dodávky PSV				923,45	
	D	767	Konstrukce zámečnické				705,98	
2	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	10,790	38,31	413,40	Dle SoD ZL 71
	VV		pl.5		10,790			
	VV		Součet		10,790			
3	M	13611218	plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl.5mm	t	0,012	24 651,000	292,58	Dle SoD ZL 71
	VV		70,79*1,1		0,012			
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				217,47	
7	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	0,620	52,77	32,72	Dle SoD ZL 71
	VV		0,62		0,620			
8	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,620	100,98	62,61	Dle SoD ZL 71
9	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	0,620	97,02	60,15	Dle SoD ZL 71
10	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,620	99,99	61,99	Dle SoD ZL 71
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				1 284,00	
19	HZS	HZS2131	Hodinová zúčtovací sazba zámečnick	hod	3,000	428,00	1 284,00	dle SOD
	VV		výroba zábradlí 1 pracovník x 3 hod		3,000			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SMART MUZEUM MODERNIZACE DEPOZITÁŘU, TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO ZÁZEMÍ MUZEA
VÝCHODNÍCH ČECH

Objekt: Z 1.12a

Místo: HRADEC KRÁLOVÉ

Zodavatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

Zhotovitel: SDRUŽENÍ BAK GEOSAN

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

TECHNICO
OPAVA


PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							10 621,16	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 198,20	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 198,20	
1	K	953965115	Koševní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 130 mm	kus	28,000	78,51	2 198,20	Dle SoD ZL 71
	vv		7*4		28,000			
	D		Práce a dodávky PSV				4 142,96	
	D	767	Konstrukce zámečnické				3 301,75	
2	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg	kg	53,211	32,27	1 717,33	Dle SoD ZL 71
	vv		L 50x5		12,492			
	vv		ještě 50x3		40,719			
	vv		Součet		53,211			
3	M	14550246	profil ocelový čtvercový svařovaný 50x50x3	t	0,045	27 720,000	1 241,60	Dle SoD ZL 71
	vv		40,719*1,1		0,045			
4	M	13010420	úhelník oceli rovnost. Jakost 11 375 50x50x5mm	t	0,014	24 948,00	342,82	URS 2019 I * 0,99
	vv		12,492*1,1		0,014			
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				841,21	
7	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	1,850	52,77	97,62	Dle SoD ZL 71
	vv		1,85		1,850			
8	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,850	100,98	186,81	Dle SoD ZL 71
9	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	1,850	97,02	179,49	Dle SoD ZL 71
10	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,850	99,99	184,98	Dle SoD ZL 71
11	K	783342101	Tmelení včetně přebroušení zámečnických konstrukcí polyuretanovým tmelem	m2	1,850	103,95	192,31	Dle SoD ZL 71
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				4 280,00	
19	HZS	HZS2131	Hodinová zúčtovací sazba zámečnick	hod	10,000	428,00	4 280,00	dle SOD
	vv		výroba zábradlí 1 pracovník x 10 hod		10,000			

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu Gayerových kasáren vč. přístavby, Opletalova 334/2, Hradec Králové


Objekt: D.1.1.c.05. VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		PSV	Práce a dodávky PSV				21 147,05	
		767	Konstrukce zámečnické				21 147,05	
###	767	767999112 SPC	D+M Schodišťové zábradlí schodiště - Specifikace ve výpisu zámečnických výrobků -	m	2,04	3 584,50	7 312,38	dle SOD
			Z1 12		-8,90			ZL 27
			" 3 NP "		-8,90			ZL 27
			" 4 NP "		16,08			
			" Ramena " 3,74+4,08+4,13+4,13		3,76			
			" Mezipodesily " 0,64+0,63+0,63+1,86					
12a	767	ZL 83_1	D+M Schodišťové zábradlí schodiště	kpl	1,00	10 621,16	10 621,16	viz samostatný rozpočet Z 1.12a
			" viz samostatný rozpočet Z 1.12a "					
12b	767	ZL 83_2	D+M Schodišťové zábradlí schodiště	kpl	1,00	2 835,51	2 835,51	viz samostatný rozpočet Z 1.12b
			" viz samostatný rozpočet Z 1.12b "					
###	766	698767204	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m	%	1,82	207,69	378,00	dle SOD
Celkem							21 147,05	
CELKEM		D.1.1.c.05. VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ					21 147,05	

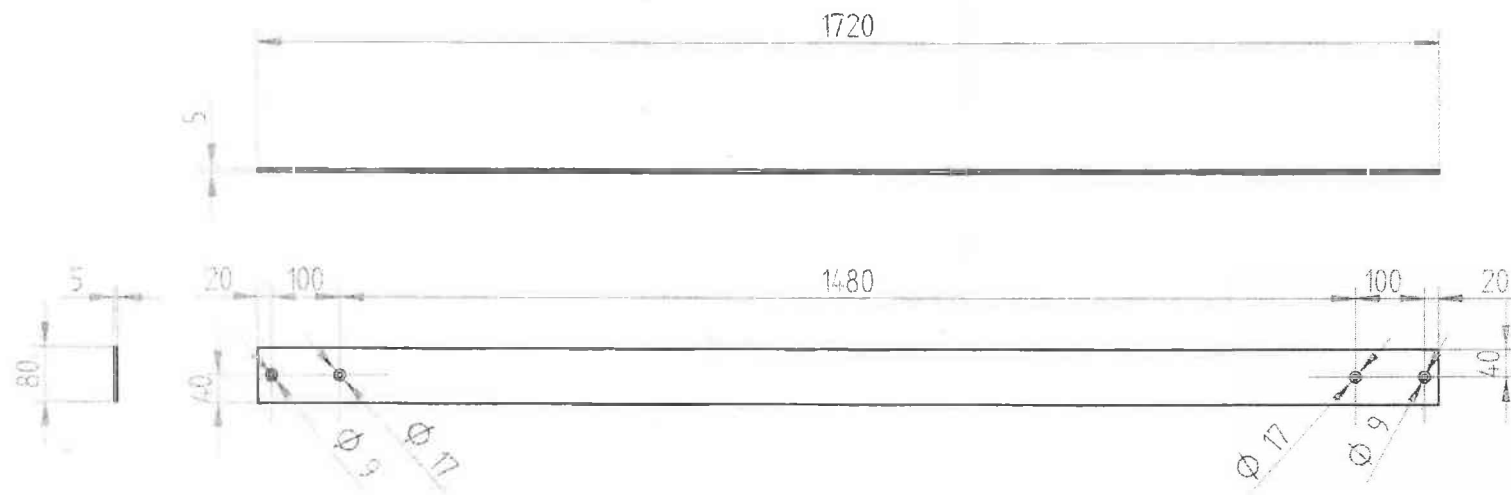


Z112-B					
2ks					
číslo pozice	název souboru	Název	množství	Hmotnost (přibližně)	plocha m ²
1	dl - 10	Pl-5x80-1720	2	10,79	0,52
2	Hmoždinky	12/150	2ks		

Solid Edge		DATE	
Author	DATE	DATE	DATE
Checked	DATE	DATE	DATE
Approved	DATE	DATE	DATE
SOLID EDGE FILE SPECIFICATIONS		FILE NAME	FILE
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS		FILE SIZE	FILE
UNITS: mm, kg, m		FILE	FILE

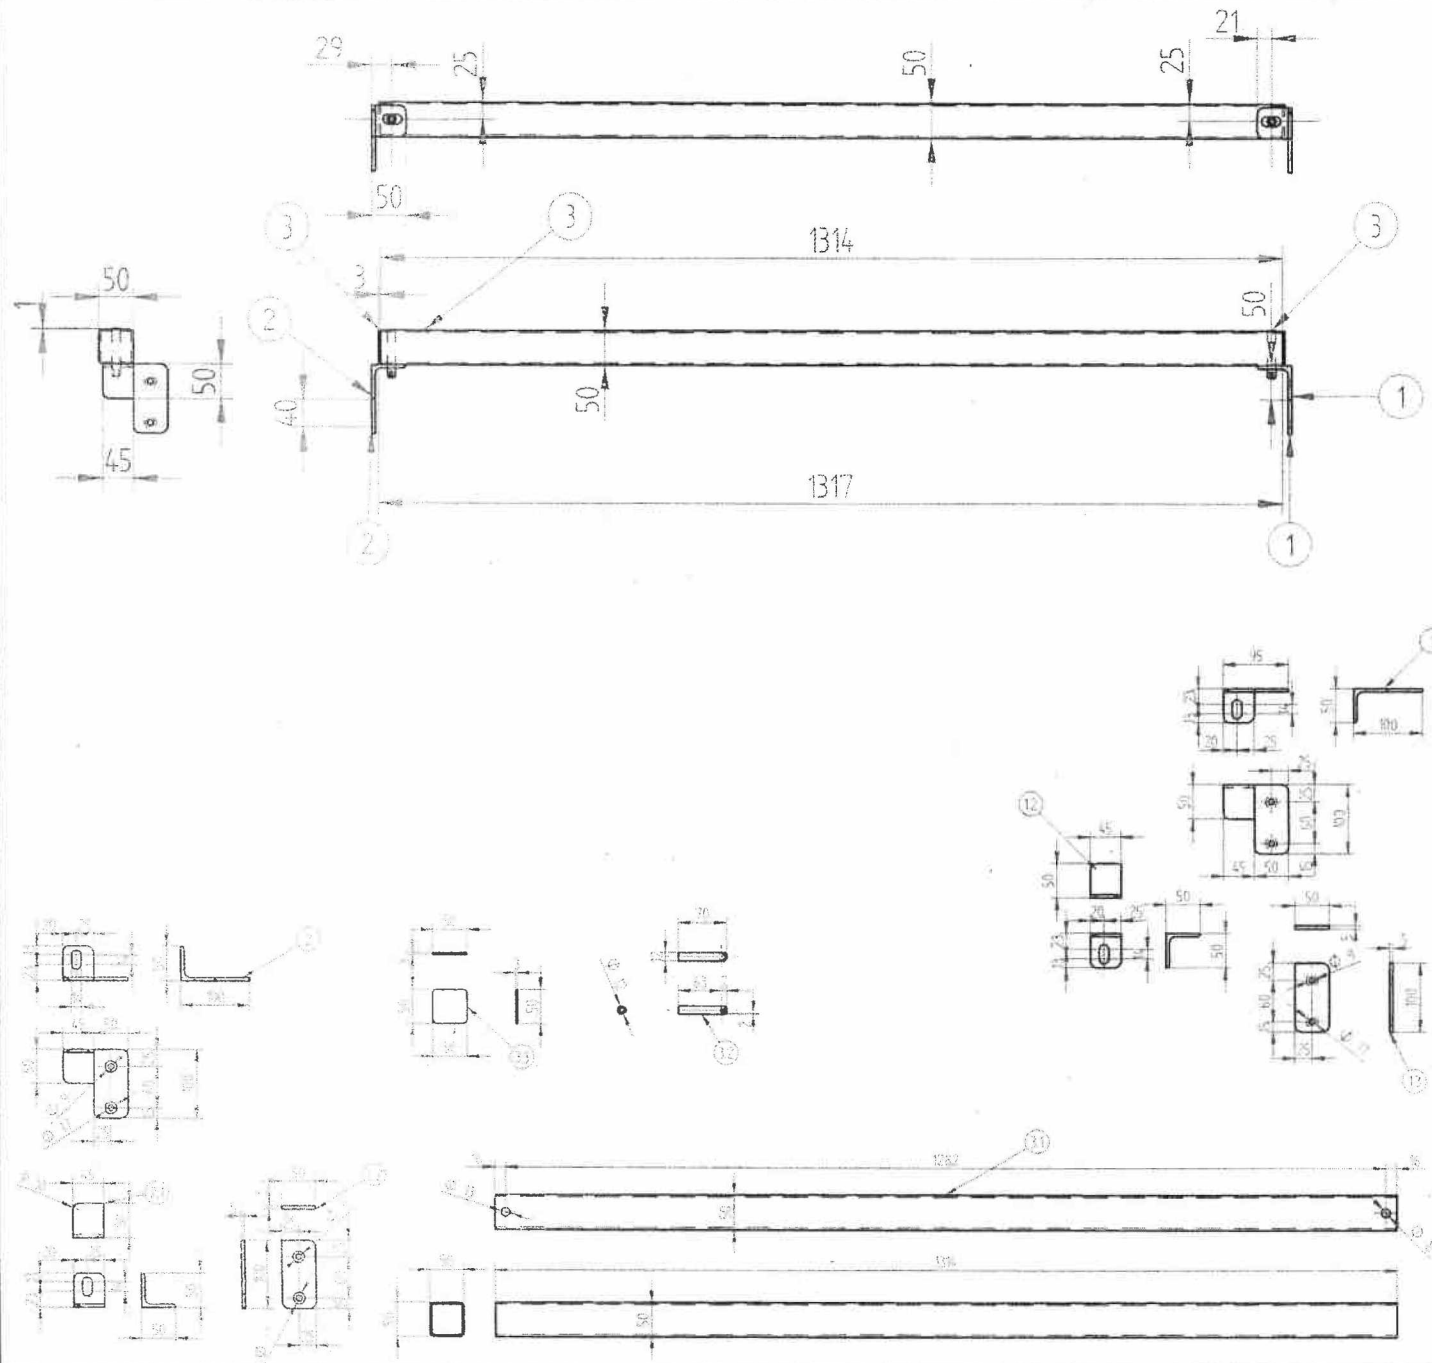

REVISION HISTORY			
REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED



Z112-A celkem 7ks materiál RAL 9006					
část pozice	název součásti	Název	množství	Hmotnost (přibližně)	plocha m ²
	S-2	Z112-A	celkem 7ks	53,211 kg	1,85
1	K-2	L-50x5-45	14	5,246 kg	
2	K-1	L-50x5-45	14	6,246 kg	
3	M-2	ještě-50x3-1320	7	40,719 kg	
11	kolíky	12/150	28ks		

NAME	DATE	Solid Edge	
DRAWN	DATE		
CHECKED	DATE	REV	
ENG APPR	DATE	REV	
MGR APPR	DATE	REV	
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS ANGLES IN °		REV	
2 PL AXXXX 3 PL AXXXX		REV	
SLATE		REV	



Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Zhotovitel:	Společnost BAK-GEOSAN, Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek
Projekt:	SMARTmuzeum: modernizace depozitářů, technického a technologického zázemí Muzea východních Čech v Hradci Králové
Místo:	Hradec Králové
Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0011170
Smlouva o dílo ze dne 04.02.2019	

ZMĚNOVÝ LIST	ZL	84
	revize:	

Objednatel:	Společnost Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	Zastoupena (Jméno, Příjmení) Mgr. Martin Červíček
Zhotovitel:	Společnost BAK-GEOSAN, Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek	Ing. Radek Mrázek, MBA Ivan Havel Ing. Kamil Vykydal
Vydáno dne:		

PŘEDMĚTEM ZMĚNOVÉHO LISTU - ZADÁVACÍHO LISTU

Na základě požadavku na snadnou údržbu (úklid atp.) při užívání díla je požadováno provést na stropní ŽB desce "sarkofágu", tj. kolem bastionu pod schody přístavby (v ose C) epoxidovou stěrku v jedné vrstvě (bez vyrovnání povrchu stropní desky) a dále úpravy stěny původně z konstrukčního betonu do ŽB konstrukce opatřené pohledovou stěrku. Neboť železobetonové stěny "sarkofágu" byly projekčně uvažovány bez požadavku na pohledovou kvalitu, budou celoplošně přestěrkovány materiálem blížící se barvě přírodního betonu, při zachování původní rovinnosti betonových konstrukcí. Změna nemění celkovou povahu zakázky.

- * Rozpočet, viz. v příloha č. 1
- * Cenová nabídka, viz. příloha č. 2

DOPAD NA CENU (bez DPH):		DOPAD NA ČAS realizace v souvislosti s tímto ZL:	
Celkem odpočty:	0,00 Kč	Termín pro vyprojektování změny:	
Celkové odpočty a připočty:	22 786,04 Kč	Termín pro provedení změny:	
Celkem připočty:	22 786,04 Kč	Dopad na dílčí termíny:	NE
Cena díla po poslední změně:	223 788 397,79 Kč	Dopad na termín dokončení:	NE

Podpisem zástupců obou smluvních stran se tento „ZL“ nepovažuje za písemný dodatek k výše uvedené smlouvě o dílo. Tento ZL bude nutně být dodatkem Smlouvy o dílo

Zástupce Objednatel:
Ing. Václav Nýč
Datum:
15.03.2021

Zástupce Objednatel:
Ing. Roman Kosář
Datum:
15.03.2021

Technický dozor investora:
Ing. Luboš Kasper
Datum:
15.03.2021

Generální projektant:
Ing. Martin Uličný
Datum:
15.03.2021

Zástupce Zhotovitele:
Karel Las
Datum:
15.03.2021

Za Zhotovitele vypracoval:
Ing. Karel Borkovec
Datum:
15.03.2021

Za Zhotovitele kontroloval:
Ing. Michal Holub
Datum:
15.03.2021

Za Zhotovitele kontroloval:
Ing. Michal Štastný
Datum:
15.03.2021

Za Zhotovitele kontroloval:
Lukáš Laštovička, DiS.
Datum:
15.03.2021

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu Gayerových kasáren vč. přístavby, Opletalova 334/2, Hradec Králové

Objekt: D.1.1. ASŘ - NOVÝ STAV

JKSO: 801.46.1.3

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		PSV	Práce a dodávky PSV				22 786,04	
		783	Nátěry				22 786,04	
		783813101	Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových povrchů	m2	11,73	59,99	703,73	URS 2019 I * 0,99
			" Nátěr betonového povrchu stropní desky " 6,9*1,7		11,73			
		783817101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr hladkých betonových povrchů	m2	11,73	76,92	902,31	URS 2019 I * 0,99
			" Úprava povrchu venkovního pohledového betonu. Nátěr ochranný, protiprašný, bezbarvý, petropropustný, omyvatelný "					
			" Nátěr betonového soklu " 6,9*1,7		11,73			
		ZL84_1	Stěrka stěn kolem bastionu	m2	16,50	1 123,64	18 540,00	cena v místě a čase obvyklá
			" Master Emaco N-350 "					
###	HZS	HZS2311	Hodinová zúčtovací sazba malíř, natěrač, lakýrník	hod	8,00	330,00	2 640,00	dle SOD
			"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 783 "		8,00			
			" Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace apod. "					
			Celkem				22 786,04	
		CELKEM	D.1.1. ASŘ - NOVÝ STAV				22 786,04	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Smart Muzeum HK - Betonové stěrky

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

LZ STAVBY A DEMOLICE s.r.o.

Zpracovatel:

Kohoutek

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

18 540,00

D	HSV	Práce a dodávky HSV					18 540,00
---	-----	---------------------	--	--	--	--	-----------

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					18 540,00
---	---	-------------------------------------	--	--	--	--	-----------

1	K	938532111	Broušení nerovností do 2 mm - Fakturace na základě skutečné plochy	m2	16,500	546,07	9 010,09
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

2	K	985312112R	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl 3 mm - ASOCRET-BIS-1/6	m2	16,500	577,57	9 529,91
---	---	------------	--	----	--------	--------	----------



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

SMARTmuzeum: modernizace depozitářů, technického a
technologického zázemí Muzea východních Čech v Hradci Králové
CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/001/170

Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Zhotovitel:	Společnost BAK-GEOSAN, Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek
Projekt:	SMARTmuzeum: modernizace depozitářů, technického a technologického zázemí Muzea východních Čech v Hradci Králové
Místo:	Hradec Králové
Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/001/170
Smlouva o dílo ze dne 04.02.2019	

ZMĚNOVÝ LIST		ZL	85
		revize:	
Objednatel:	Společnost Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	Zastoupena (Jméno, Příjmení) Mgr. Martin Cervíček	
Zhotovitel:	Společnost BAK-GEOSAN, Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek	Ing. Radek Mrazek, MBA Ing. Havel Ing. Kamil Výkydal	
Vydáno dne:			
PŘEDMĚTEM ZMĚNOVÉHO LISTU - ZADÁVACÍHO LISTU			
<i>S ohledem na dokončení parkovacího domu v areálu Gayerových kasáren a jeho veřejného provozování, OPP MMHK požaduje nerealizovat nová dočasná parkovací stání v jihovýchodním a severozápadním rohu, v podélném a šikmém řazení a zůstane k realizaci pouze jedno vyhrazené parkovací stání a k němu bude doplněno svislé dopravní značení V101 - Vyhrazené parkoviště pro voz. přepravující os. těžce postiženou nebo os. těžce pohybově postižené. Dále objednatel žádá po Zhotoviteli zajistit vybavení místnosti bezbariérového WC m.č. 01.36 WC madly a zrcadlem pro imobilní osobu. Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které investor jednájící s náležitou péčí nemohl předvídat. Změna nemění celkovou povahu zakázky.</i>			
• Rozpočet, viz. v příloha č. 1 • Zápis z KD č. 14, viz. příloha č. 2 • Cenová nabídka, viz. příloha č. 3			
DOPAD NA CENU (bez DPH):		DOPAD NA ČAS realizace v souvislosti s tímto ZL:	
Celkem odpočty:	-492,84 Kč	Termín pro vyprojektování změny:	----
Celkové odpočty a připočty:	28 836,98 Kč	Termín pro provedení změny:	----
Celkem připočty:	29 329,82 Kč	Dopad na dílčí termíny:	NE
Cena díla po poslední změně:	223 817 234,77 Kč	Dopad na termín dokončení:	NE

Podpisem zástupců obou smluvních stran se tento „ZL“ nepovažuje za písemný dodatek k výše uvedené smlouvě o dílo. Tento ZL bude nutně řešit dodatek Smlouvy o dílo

Zástupce Objednatel:
Ing. Václav Nýč
Datum:
15.03.2021

Zástupce Objednatel:
Ing. Roman Kosař
Datum:
15.03.2021

Technický dozor investora:
Ing. Luboš Kasper
Datum:
15.03.2021

Generální projektant:
Ing. Martin Uličný
Datum:
15.03.2021

Zástupce Zhotovitele:
Karel Laš
Datum:
15.03.2021

Za Zhotovitele vypracoval:
Ing. Karel Borkovec
Datum:
15.03.2021

Za Zhotovitele kontroloval:
Ing. Michal Holub
Datum:
15.03.2021

Za Zhotovitele kontroloval:
Ing. Michal Šťastný
Datum:
15.03.2021

Za Zhotovitele kontroloval:
Lukáš Lašovička, DiS.
Datum:
15.03.2021

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu Gayerových kasáren vč. přístavby, Opletalova 334/2, Hradec Králové

Objekt: D.1.4.10. VNĚJŠÍ VYBAVENÍ BUDOV

Část: ZPEVNĚNÉ PLOCHY

JKSO: 822.55.2/3

-492,84

7 926,05

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
HSV		Práce a dodávky HSV					7 433,21	
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání					7 433,21	
###	221	915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	m	-44,40	6,50	-288,60	dle SOD
			" Značení V10c - Stání šikmá " - 5,3*8		-42,40			
			" Značení V10a - Stání podélné " - 2,0*3		-6,00			
			" Značení V10a - Stání podélné " - 2,0*2		4,00			
###	221	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	-44,40	4,60	-204,24	dle SOD
			" Značení V10c - Stání šikmá " - 5,3*8		-42,40			
			" Značení V10a - Stání podélné " - 2,0*3		-6,00			
			" Značení V10a - Stání podélné " - 2,0*2		4,00			
		914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzoli	kus	1,00	194,04	194,04	URS 2019 I * 0,99
		914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	1,00	250,47	250,47	URS 2019 I * 0,99
		40445535	značka dopravní svislá retroreflexní fólie II 1 FeZn-Al rám 500x700mm	kus	1,00	898,92	898,92	URS 2019 I * 0,99
			" vyhlazené parkoviště pro invalidy "		1,00			
		40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	1,00	496,98	496,98	URS 2019 I * 0,99
		40445253	vičko plastové na sloupek D 60mm	kus	1,00	16,63	16,63	URS 2019 I * 0,99
		40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	1,00	69,00	69,00	URS 2019 I * 0,99
		ZL B5_01	Zajištění změny místní úpravy	kpl	1,00	6 000,00	6 000,00	cena v místě a čase obvyklá
		Celkem					7 433,21	
CELKEM		ZPEVNĚNÉ PLOCHY					7 433,21	

Stavba: Stavební úpravy objektu Gayerových kasáren vč. přístavby, Opletalova 334/2, Hradec Králové
Objekt: D.1.1.c.07, VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

[illegible]

SMART muzeum

Zápis z kontrolního dne č: 65/2021

Datum konání: 10.03.2021

Přítomni:

Investor: KÚ KHK – Kosař
GP: TECHNICO Opava – Koráb - omluven
GD sdružení BAK, Geosan: Šťastný, Laštovička, Kališ, Holub
MMHK – OPP: J. Falta - omluven
NPÚ Josefov: B. Adámková - omluvena
CIRI: J. Štěrbová
MVČ: Černá, Zámečník - omluveni
TDI: L. Kasper

KD č.64 se koná v době nouzového stavu.

KD 65 se uskuteční 10.3.2021 (středa) od 8,00 hodin.

1

Kontrolní den se koná vždy ve středu od 8.00 hod se srazem účastníků v objektu zařízení

Prováděné práce v období 3.3. – 10.3.2021

Přístavba :

- Dokončovací práce na SDK konstrukci, osazování revizních dvířek
- Osazování koncových prvků slaboproud, silnoproud 1.NP
- Montáž zábradlí ramp
- Provádění venkovní komunikace

Stávající budova:

- Malby, nátěry 1.PP – 4.NP
- Oprava omítek 1.PP
- Osazování koncových prvků silnoproud, slaboproud
- Osazování koncových prvků silnoproud do rozvaděčů
- Renovace schodišťových stupňů hlavního schodiště
- Pokračování montáže obložkových zárubní a osazování dveřních křídel
- Oprava, doplnění a renovace linkrusty
- Obklady a dlažby 1.PP
- Montáž a osazování sanity
- Provádění finálních povrchů epoxidových stěrek



(KD 61) Chybí závazná stanoviska ke zpevněným plochám a dveře mezi starou a novou budovou.
Z: TDS, T:KD 63

57.1. MVČ určí umístění čísla popisného na objektu. Z: MVČ, T: KD 58

(KD 58) Trvá

(KD 59) ČP umístit na přístavbě nad hlavní vstup, odsouhlasit i umístění názvů ulic s OPP MMHK.
Z: TDS

64.1. GD prověří s dodavatelem dopravního značení projednání s DI – zrušení vodorovného značení parkovacích míst s výjimkou místa pro invalidu. Zde projednat doplnění svislé dopravní značky. Z: GD, T: KD 65

(KD 65) Žádost o uměnu DZ podána.

64.2. GD připraví složky dokladů ke kolaudacím podmiňujících staveb (přípojky, přeložky).
Z: GD, T: kontrola KD 66

64.3. GD upozorňuje, že pro montáž požárních rolet je nutné dodat pomocnou ocelovou konstrukci (eliminace tepelných mostů a prostupů parozábranou). GD předloží návrh ZL.
Z: GD, T: KD 65

(KD 65) Vypouští se, dále cestou ZL.

64.4. GD bude tento týden provádět keramické obklady a hydroizolace na WC invalidi č.m. 01.36. Není dosažena bez opatření min velikost rozměru místnosti 1600 mm. Žádáme GD o stanovisko k rozměrům této místnosti. Spěchá.

Z: GP, T: 05.03.2021

(KD 65) Minimální velikost dle GP 1600 na 1600 mm. Znamená to úpravu (přisekání) nosné stěny. Dále cestou ZL. Vypouští se.

64.5. GD předložil CN na ochranu ocelovou konstrukci k technologii zvedací plošiny. CN je pro INV nepřijatelná. GD předloží návrh na D+M ochranného sloupku (pacholík).

Z: GD, T: KD 65

(KD 65) CN na sloupek schválena, dále cestou ZL. Vypouští se.

64.6. Dořešit nutnost provedení dřezů v rozsahu dle PD. TDS prověří u KHS HK. Napojení koncových prvků slaboproudu i silnoproudu bude v recepci provedeno k předání díla na provizorní stůl. GD zde nechá dostatečnou rezervu kabelů (min 2m).

Z: GD

(KD 65) Dřez bude osazen jen v místě dle požadavku na odběrné místo KHS KHK (4.NP). GD zde dodá a osadí skříňku s dřezem a baterií. Dále cestou ZL. Vypouští se.

Nové úkoly:

65.1. MVČ uzavře smlouvu s ASTOR COMPLEXem o připojení objektu na PCO a smlouvu s HZS KHK. MVČ u ASTOR COMPLEX musí objednat i PLÁN ZDOLÁVÁNÍ POŽÁRU.
Z: MVČ

65.2. GD zpracuje plán předpřejímek, přejímek, zaškolení obsluhy, závěrečných kontrolních dohlídek. Z: GD, T: KD 66

65.3. GD předloží poslední návrh ZL do KD 66 Z: GD

65.4. Stavby na pozemcích MHK zůstanou na pozemcích MHK. Přístavba bude zaměřena vč venkovních schodišť. Z: GD

Vzorkování:

V. 50.1. GD předložil DD na hliníkové dveře (5 ks) mezi přístavbou a starou budovou. TDS přepošle na OPP MMHK a NPÚ. Z: TDS

(KD 51) OPP MMHK souhlasí, TDS vystaví žádost na vydání závazného stanoviska. Z: TDS

V. 53.1. TDS a OPP MMHK dnes provedl kontrolu rozpracované zpevněné plochy nádvoří u levého vstupu. Bez připomínek.

V.55.1. Deska pod umyvadla v soc zař šaten v 1.PP bude dezén dub. Vypouští se.

V Hradci Králové 10.03.2021

Zapsal: Ing. L. Kasper

Přílohy: prezenční listina

3852275

List č.

Datum	Denní záznamy stavby
	- PROVÁZENÍ EPAXID STERILNÝ ZNP - PŘÍPRAVA PRO EPAXIDOVÉ STERILNÝ INP - MONTÁŽ - ZÁBRADLÍ PŘÍSTAVBA - ELEKTRO - PŮDA NAP - PŘÍSTAVBA NAP + APP - APP
2021	POČASÍ: 4° POLOJASNO - 4°C
UT	13° POLOJASNO - 1°C
	14° JASNO 0°C
	ROSLIN HOD: 2°C 3°C
	TLACOVNÍ DOBA: 4° - 14°
	POČET PRACOVNÍKŮ: PAVATA, LILLY, SANDA,
	6 x LE, 8 x ES, 5 x BOMA, 2 x KUDIEL, 1 x MT,
	1 x CUEJN, 2 x JIKA, 2 x JOFA, 6 x STAVO HL,
	1 x MOSEU, 4 x TOP, 8 x NIKLO, 0 x VOBODA
	POUŽITÁ MECHANIZACE: 1 x TRAKTOR BUL, 1 x TATEL,
	1 x HUTNÍCI DECLA, DOBNE' RUCHI UPRADI
	PROVÁZENÍ PRÁCE:
	- PROVÁZENÍ EPAXIDOVÝCH STERILNÝ ZNP
	- PŘÍPRAVA PŮDY PRO EPAXIDOVÉ STERILNÝ INP
	- PŘÍSTAVBA DLAŽE, KOSTEL - DVŮR
	- MONTÁŽ - SÍTL - SCHODISTE S-TUP
	- ELEKTRO - KONCEPCE PRŮVY - APP PŘÍSTAVBA
	- ZÁBRADLÍ APP PŘÍST.
	- ŽITÍ NAP + APP
	- POCLADEN DLAŽBY TRP CHODBY + HŘEŠTOV
	- ČISTIP BASTICAN PRŮVODNÍ ŽEMINOU
	- HYDROIZOLACE TERČATA CHODBY APP + HŘEŠTOV
	- OPRAVA OPLATEK - SÍDLOV - ZNP + PENETRACE
	- DEMONTÁŽ KESEK PŘÍSTAVBY 420cm
új 9.3.2021	S OMEZENÍM NA VYBUDOVÁNÍ A PŘEDVÝMĚNĚNÍ PARKOVACÍHO DOPROU V OMEZENÝCH KAPACITÁCH POČASÍ NUTNOST REKONSTRUKCE NOVA DOKONČENÍ PRÁCE STANÍ V JV A SV ŘADU STAVBY START BUDE PŘEDVÝMĚNĚNÍ POUZE 1. STAN, PRO KVALITU VODNÍK PRÁCEM NEBUDE S TERMOPLASTU

OP 1276 VY3/13

ZA OPP MMH
FAKTA
K

OP KHK
K

Cenová nabídka: Smart Muzeum Hradec Králové, Gayerova kasárna

Zhotovitel: INKA - dopravní značení Hradec Králové s.r.o.

Objednatel: BAK stavební společnost, a.s.; (sdružení BAK – Geosan)

Zajištění změny místní úpravy a svislé dopravní značení pro invalidu

Zařízení místní úpravy: 6. 000 ,- Kč

IP12 s úchyty vč. sloupku , ukotvení -2135,- Kč

Betonáž sloupku s montáží DZ - 1500 ,- Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Přeji příjemný zbytek dne .

S pozdravem

PhDr. Pešková Denisa
příprava a realizace staveb
mobil: [REDACTED]
[REDACTED]
web: www.inka-znaceni.cz



INKA - dopravní značení Hradec Králové s.r.o.

Obránců míru 258

503 02 Předměřice nad Labem

IČO: 27478866

DIČ: CZ27478866



DOPRAVNÍ ZNAČENÍ · HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o.


SANITINO

Kolo Evolution - Zrcadlo sklopné, 600x450 mm L31201100

Výrobce: [Kolo](#) Série: [Evolution](#) Kat. č.: L31201100



DOPRAVA
ZDARMA



Sklopné zrcadlo, vhodný doplněk pro tělesně postižené možnost sklopení... [Zobrazit celý popis](#)

~~11 166 Kč~~ Ušetříte 4 858 Kč (44 %)

6 308 Kč s DPH (5 213 Kč bez DPH)

Expedice obvykle do 12 dní



[Termíny a ceny doručení](#)

1

PŘIDAT DO KOŠÍKU



[Přidat do nákupního seznamu](#)

Možnosti platby



VISA

GoPay





★★★★★ 97 %

★★★★★ doposledí služby

★★★★★ kvalita komunikace

Tržebnost a dostupnost zboží



S nákupem **vám poradíme**



Nejširší **nabídka skladem**

Informace o produktu

Sklopné zrcadlo, vhodný doplněk pro tělesně postižené

- možnost sklopení 0 - 22 stupňů
- rozměr: 600 x 450 x 5 mm
- balení včetně montážní sady do zdiva

Ilustrativní foto

Technické informace

Výrobce:	<u>Kolo</u>
Série:	<u>Evolution</u>
Kat. č.:	L31201100
EAN:	4250365204612

Produkty série Evolution

KONTAKTUJTE NÁS



[redacted] (po-pá, 7-17h)



Napište nám

Platební metody:



VISA

GoPay G▶



SANITINO

Copyright 2008-2021 © SANITINO s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

SANITINO


Aqualine Doplnky - Zrcadlo s LED osvětlením, 1000x800 mm, skleněná polička ATH55

Výrobce: [Aqualine](#)

Série: [Doplnky](#)

Kat. č.: ATH55

 **DOPRAVA
ZDARMA**



Fazetové zrcadlo s LED podsvícením a poličkou materiál hliník, barva... [Zobrazit celý popis](#)

~~4 990 Kč~~ Ušetříte 399 Kč (8 %)

4 591 Kč s DPH (3 794 Kč bez DPH)

[Skladem u dodavatele](#)

 [Termíny a ceny doručení](#)



PŘIDAT DO KOŠÍKU

 [Přidat do nákupního seznamu](#)

Možnosti platby





★★★★★ 97 %

★★★★★ dodací lhůta

★★★★★ kvalita komunikace

nejlepší online prodejce koupelny

Varianty produktu



Aqualine Doplnky - Zrcadlo s LED osvětlením, 1000x800 mm ATH7

bez poličky

Skladem u dodavatele

4 131 Kč



Doprava zdarma nad 1 000 Kč



Nejširší nabídka skladem

Informace o produktu



Fazetové zrcadlo s LED podsvícením a poličkou

- materiál hliník, barva chrom/chrom mat
- v horní části LED podsvícení
- rozměr 1000 x 800 mm
- rozměr skleněné poličky 1000 x 100 x 6 mm
- kolébkový vypínač
- barva světla 5000 K
- světelný tok 1197 lm
- výkon max. 15 W
- napětí 230 V

Přílohy

[Montážní návod](#)

[Technická specifikace](#)

Technické informace

Produkty série Doplnky



KONTAKTUJTE NÁS



+420 468 006 468 (po-pá, 7-17h)



Napište nám



Platební metody:



VISA

GoPay



SANITINO

Copyright 2008-2021 © SANITINO s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

i Vážení zákazníci, naše prodejny jsou otevřené v omezeném provozu. Více informací. **Sjednejte si on-line schůzku** a využijte **akční nabídku na návrh vaší nové koupelny nebo kuchyně.**



Zkuste napsat např. vana, dřez... (nebo zadejte hledaný výraz...)



PRODUKTY

SJEDNAT SCHŮZKU

DOMŮ > VŠECHNY PRODUKTY > KOUPELNOVÉ DOPLŇKY > PROGRAM PRO SENIORY A HANDICAPOVANÉ
> MADLO LESK SANELA OBLÝXNASTENNE CM SLZM03D



Madlo lesk Sanela oblýxnastenne cm SLZM03D

Nerezové madlo pevné, délka 900 mm, s lesklým povrchem, od známé společnosti Sanela.

Více o produktu



Na objednávku

Běžná doba dodání 14 dní

3 198 Kč / ks

-

1

+

PŘIDAT DO KOŠÍKU

NÁŠ KÓD ZBOŽÍ: SLZM03D

ZNAČKA: SANELA

KATEGORIE: MADLA A PODHLAVNÍKY , PROGRAM PRO SENIORY A HANDICAPOVANÉ

Mohlo by se vám líbit



Madlo Bemeta Help 82,9 cm nerez 301102081

2 709 Kč



Madlo Bemeta Help 67 cm nerez 301102011

1 379 Kč



Obdélníková vana Kaldewei EUROWA 150x70 cm smaltovaná ocel alpská bílá

2 210 Kč

33

Informace o produktu

Dokumenty

Montážní

PDF

Nerezové madlo pevné, délka 900 mm, s lesklým povrchem, od známé společnosti Sanela.

[návod](#)

SANELA spol. s r.o. je předním českým výrobcem kompletního sortimentu sanitární elektroniky. Hlavním cílem společnosti je uspokojit vysoké nároky zákazníků na moderní sociální zařízení a jejich vybavení. Obchodní značka je spojována s kvalitními výrobky nové generace sanitární techniky.

Společnost byla založena v roce 1997 v Lanškrouně, kde vlastní výrobní závod. V současné době nabízí výrobní program široké portfolio výrobků, které jsou plně využívány na sociálních zařízeních ve veřejném i privátním sektoru a v gastronomických provozech.

Hmotnost a balení

Balení	1 ks
Hmotnost balení	2,5 kg

Zobrazit všechny technické parametry

Recenze

[NAPSAT RECENZI](#)[ZOBRAZIT VŠE](#)[ZOBRAZIT VŠE](#)

Naposledy prohlížené

Madlo mat Sanela oblýxnastenne cm SLZM03SX	Koupelnová skříňka pod umyvadlo Ideal Standard Connect Air 120x44x51,7 cm bílá lesk/bílá mat E0822B2	Koupelnová skříňka pod umyvadlo Ideal Standard Connect Air 130x44x51,7 cm bílá lesk/bílá mat E0824B2	Koupelnová skříňka pod umyvadlo Ideal Standard 100x44x49 cm bílá lesk T0052OV

Madlo mat Sanela
oblýxnastenne cm SLZM03SX

Koupelnová skříňka pod
umyvadlo Ideal Standard

Koupelnová skříňka pod
umyvadlo Ideal Standard

Koupelnová skříňka po
umyvadlo Ideal Standa

3 090 Kč

14 577 Kč

15 060 Kč

10 98

O SPOLEČNOSTI

O nás
Příběh SIKO
Naše hodnoty
SIKO ocenění
Kariéra
Pro média
Kontakty

VŠE O NÁKUPU

Jak nakupovat
Doprava a platba
Obchodní podmínky
Reklamace
Ochrana osobních údajů
Stav zakázky
Nákup na splátky

SLUŽBY

Projektový konzultant
Grafický návrh koupelny
Grafický návrh kuchyně
Koupelna na klíč
Kuchyně na klíč
Plánovače a konfiguratory
Katalogy

SIKO PRO FIRMY

Velkoobchod
Developerské oddělení
ELITE BATH+KITCHEN
Architekti, projektanti
Instalatéři a obkladači

SIKO v EU: Livea.fr



NAPIŠTE NÁM



NÁS

SLEDUJTE

Po-Pá 8:00 - 20:00

So-Ne 8:00 - 19:00



© SIKO KOUPELNY a.s. | Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line. V případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

i Vážení zákazníci, naše prodejny jsou otevřené v omezeném provozu. [Více informací.](#) **Sjednejte si on-line schůzku** a využijte **akční nabídku na návrh vaší nové koupelny nebo kuchyně.**



Zkuste napsat např. vana, dřez... (nebo zadejte hledaný výraz...)



PRODUKTY

SJEDNAT SCHŮZKU

DOMŮ > VŠECHNY PRODUKTY > KOUPELNOVÉ DOPLŇKY > PROGRAM PRO SENIORY A HANDICAPOVANÉ
> MADLO BEMETA HELP 68 CM NEREZ 301100601



Madlo Bemeta Help 68 cm nerez 301100601

Nástěnné madlo HELP, o délce 60 cm, nerezové, je užitečným pomocníkem do koupelny. Série HELP je určena pro osoby tělesně postižené, starší a s omezenou pohyblivostí, které potřebují bezbariérové koupelnové vybavení, v němž se dobře obejdou i bez cizí pomoci.

Více o produktu

✓ **Skladem 5+ ks**
Můžete mít ihned na [3 prodejnách](#)

1 049 Kč / ks



PŘIDAT DO KOŠÍKU

NÁŠ KÓD ZBOŽÍ: 301100601K
ZNAČKA: BEMETA
KATEGORIE: PROGRAM PRO SENIORY A HANDICAPOVANÉ
SÉRIE: BEMETA HELP
KONCEPT: BEZBARIEROVÁ KOUPELNA

Mohlo by se vám líbit



Madlo Bemeta Help 82,9 cm
nerez 301102081

2 709 Kč



Madlo Bemeta Help 63 cm
nerez 301122041

2 329 Kč



Sprchové sedátko Bemeta
Help nerez 301102181

3 989 Kč



Madlo Bemeta Help 89
nerez 301102061

1 79

Informace o produktu

Nástěnné madlo HELP, o délce 60 cm, nerezové, je užitečným pomocníkem do koupelny. Série HELP je určena pro osoby tělesně postižené, starší a s omezenou pohyblivostí, které potřebují bezbariérové koupelnové vybavení, v němž se dobře obejdou i bez cizí pomoci.

Výrobky jsou **certifikované** státní zkušebnou a odpovídají legislativě ČR o instalaci produktů do **bezbariérových** prostor. K uchycení jsou dodávány nerez šrouby podle DIN 95, 6×60 mm s hmoždinkami z plastu pro montáž do plných cihel a betonu.

Pro **jiný** druh zdiva je **nutno** zvolit upevňovací prvky **odpovídající** namáhání.

Dokumenty

Certifikát

PDF

Technický
náčrtek

PDF



Hmotnost a balení

Balení	1 ks
Hmotnost balení	0,82 kg

Zobrazit všechny technické parametry ▾

Recenze

[NAPSAT RECENZI](#)[ZOBRAZIT VŠE](#)[ZOBRAZIT VŠE](#)

Naposledy prohlížené



Madlo Multi 40 cm chrom
MAD400CR



Madlo Novaservis
sklopnéx10 cm nerez
R66813,44



Madlo lesk Sanela
oblýxnastenne cm SLZM03Doblýxnastenne cm SLZI



Madlo mat Sane
oblýxnastenne cm SLZI

Madlo Multi 40 cm chrom
MAD400CR

Madlo Novaservis sklopné
cm nerez R66813,44

Madlo lesk Sanela
oblýxnastenne cm SLZM03

Madlo mat Sanela
oblýxnastenne cm SLZM03

589 Kč

2 549 Kč

3 198 Kč

3 09

O SPOLEČNOSTI

O nás
Příběh SIKO
Naše hodnoty
SIKO ocenění
Kariéra
Pro média
Kontakty

VŠE O NÁKUPU

Jak nakupovat
Doprava a platba
Obchodní podmínky
Reklamace
Ochrana osobních údajů
Stav zakázky
Nákup na splátky

SLUŽBY

Projektový konzultant
Grafický návrh koupelny
Grafický návrh kuchyně
Koupelna na klíč
Kuchyně na klíč
Plánovače a konfiguratory
Katalogy

SIKO PRO FIRMY

Velkoobchod
Developerské oddělení
ELITE BATH+KITCHEN
Architekti, projektanti
Instalatéři a obkladači

SIKO v EU: Livea.fr

NAPIŠTE NÁM

SLEDUJTE

NÁS



Po-Pá 8:00 - 20:00

So-Ne 8:00 - 19:00

© SIKO KOUPELNY a.s. | Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line. V případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

i Vážení zákazníci, naše prodejny jsou otevřené v omezeném provozu. [Více informací.](#) **Sjednejte si on-line schůzku** a využijte **akční nabídku na návrh vaší nové koupelny nebo kuchyně.**



Zkuste napsat např. vana, dřez... (nebo zadejte hledaný výraz...)



PRODUKTY

SJEDNAT SCHŮZKU

DOMŮ > VŠECHNY PRODUKTY > KOUPELNOVÉ DOPLŇKY > PROGRAM PRO SENIORY A HANDICAPOVANÉ
> MADLO NOVASERVIS SKLOPNÉ X10 CM NEREZ R66813,44



Madlo Novaservis sklopné x10 cm nerez R66813,44

Madlo v nerezovém provedení x10 cm. Montáž vrtáním.

Více o produktu



Na objednávku

Běžná doba dodání 7 dní

2 549 Kč / ks



PŘIDAT DO KOŠÍKU

NÁŠ KÓD ZBOŽÍ: R66813.44

ZNAČKA: NOVASERVIS

KATEGORIE: PROGRAM PRO SENIORY A HANDICAPOVANÉ

Mohlo by se vám líbit



Madlo Bemeta Help 82,9 cm
nerez 301102081

2 709 Kč



Madlo Bemeta Help 82,9 cm
bílá 301102084

1 359 Kč



Madlo Bemeta Help 68 cm
nerez 301100601

1 049 Kč



Madlo Bemeta Help 61
nerez 301102071

2 489 Kč

Informace o produktu

Hmotnost a balení

Balení	1 ks
Hmotnost balení	2,700 kg

Zobrazit všechny technické parametry ▾

Recenze

NAPSAT RECENZI

ZOBRAZIT VŠE

ZOBRAZIT VŠE

Naposledy prohlížené

 Madlo lesk Sanela oblýxnastenne cm SLZM03D	 Madlo mat Sanela oblýxnastenne cm SLZM03S	 Koupelnová skříňka pod umyvadlo Ideal Standard Connect Air 120x44x51,7 cm bílá lesk/bílá mat E0822B2	 Koupelnová skříňka pod umyvadlo Ideal Standard Connect Air 130x44x51,7 cm bílá lesk/bílá mat E0822B2
3 198 Kč	3 090 Kč	14 577 Kč	15 060 Kč

O SPOLEČNOSTI

O nás
Příběh SIKO
Naše hodnoty
SIKO ocenění
Kariéra
Pro média
Kontakty

VŠE O NÁKUPU

Jak nakupovat
Doprava a platba
Obchodní podmínky
Reklamace
Ochrana osobních údajů
Stav zakázky
Nákup na splátky

SLUŽBY

Projektový konzultant
Grafický návrh koupelny
Grafický návrh kuchyně
Koupelna na klíč
Kuchyně na klíč
Plánovače a konfigurátory
Katalogy

SIKO PRO FIRMY

Velkoobchod
Developerské oddělení
ELITE BATH+KITCHEN
Architekti, projektanti
Instalatéři a obkladači

SIKO v EU: Livea.fr



222 300 400

Po-Pá 8:00 - 20:00

So-Ne 8:00 - 19:00

NAPIŠTE NÁM

shop@siko.cz

NÁS



SLEDUJTE

© SIKO KOUPELNY a.s. | Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line. V případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

SMARTmuzeum: modernizace depozitářů, technického a
technologického zázemí Muzea východních Čech v Hradci Králové
CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0011170

Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Zhotovitel:	Společnost BAK-GEOSAN, Žitnická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek
Projekt:	SMARTmuzeum: modernizace depozitářů, technického a technologického zázemí Muzea východních Čech v Hradci Králové
Místo:	Hradec Králové
Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0011170
Smlouva o dílo ze dne 04.02.2019	

ZMĚNOVÝ LIST		ZL	86
		revize:	
	Společnost	Zastoupena (Jméno, Příjmení)	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	Mgr. Martin Cervíček	
Zhotovitel:	Společnost BAK-GEOSAN, Žitnická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek	Ing. Radek Mrazek, MBA Ivan Havel Ing. Kamil Vykydal	
Vydáno dne:			
PŘEDMĚTEM ZMĚNOVÉHO LISTU - ZADÁVACÍHO LISTU			
Na základě požadavku na ochranu technologie zvedací invalidní plošiny umístěné v chodbě 1.PP (m.č. 01.04) bude před konstrukci plošiny osazen sloupek z trubky průměru cca 108mm délky 1,2m (ukončené záslepkou). Povrchová úprava sloupku bude 2x RAL. Změna nemění celkovou povahu zakázky.			
• Rozpočet, viz. v příloha č. 1 • Cenová nabídka, viz. příloha č. 2 • Zápis z KD č.65, viz. příloha č. 3			
DOPAD NA CENU (bez DPH):		DOPAD NA ČAS realizace v souvislosti s tímto ZL:	
Celkem odpočty:	0,00 Kč	Termín pro vyprojektování změny:	---
Celkové odpočty a připočty:	8 100,00 Kč	Termín pro provedení změny:	---
Celkem připočty:	8 100,00 Kč	Dopad na dílčí termíny:	NE
Cena díla po poslední změně:	223 825 334,77 Kč	Dopad na termín dokončení:	NE

Podpisem zástupců obou smluvních stran se tento „ZL“ nepovažuje za písemný dodatek k výše uvedené smlouvě, nýbrž za její součást. Pro platnost musí být tento ZL součástí Smlouvy o dílo.

Zástupce Objednatel:
Ing. Václav Nýč
Datum:
15.03.2021

Zástupce Objednatel:
Ing. Roman Kosář
Datum:
15.03.2021

Technický dozor investora:
Ing. Luboš Kasper
Datum:
15.03.2021

Generální projektant:
Ing. Martin Uličný
Datum:
15.03.2021

Zástupce Zhotovitele:
Karel Laš
Datum:
15.03.2021

Za Zhotovitele vypracoval:
Ing. Karel Borkovec
Datum:
15.03.2021

Za Zhotovitele kontroloval:
Ing. Michal Holub
Datum:
15.03.2021

Za Zhotovitele kontroloval:
Ing. Michal Štátný
Datum:
15.03.2021

Za Zhotovitele kontroloval:
Lukáš Lašovička, DiS.
Datum:
15.03.2021

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu Gayerových kasáren vč. přístavby, Opletalova 334/2, Hradec Králové

Objekt: D.1.1.c.05. VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		PSV	Práce a dodávky PSV				8 100,00	
		767	Konstrukce zámečnické				8 100,00	
			D+M trubka pr. 108, zastěpená, délka 1,2 m, PU 2 x RAL					cena v místě a čase obvyklá
		767	ZL B8_1	kpl	1,00	8 100,00	8 100,00	
			<u>Celkem</u>				<u>8 100,00</u>	
		CELKEM	D.1.1.c.05. VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ				8 100,00	

SMART muzeum

Zápis z kontrolního dne č: 65/2021

Datum konání: 10.03.2021

Přítomni:

Investor:	KÚ KHK – Kosař
GP:	TECHNICO Opava – Koráb - omluven
GD sdružení BAK, Geosan:	Šťastný, Laštovička, Kališ, Holub
MMHK – OPP:	J. Falta - omluven
NPÚ Josefov:	B. Adámková - omluvena
CIRI:	J. Štěrbová
MVČ:	Černá, Zámečník - omluveni
TDI:	L. Kasper

KD č.64 se koná v době nouzového stavu.

KD 65 se uskuteční 10.3.2021 (středa) od 8,00 hodin.

Kontrolní den se koná vždy ve středu od 8.00 hod se srazem účastníků v objektu zařízení

Prováděné práce v období 3.3. – 10.3.2021

Přístavba :

- Dokončovací práce na SDK konstrukci, osazování revizních dvířek
- Osazování koncových prvků slaboproud, silnoproud 1.NP
- Montáž zábradlí ramp
- Provádění venkovní komunikace

Stávající budova:

- Malby, nátěry 1.PP – 4.NP
- Oprava omítek 1.PP
- Osazování koncových prvků silnoproud, slaboproud
- Osazování koncových prvků silnoproud do rozvaděčů
- Renovace schodišťových stupňů hlavního schodiště
- Pokračování montáže obložkových zárubní a osazování dveřních křídel
- Oprava, doplnění a renovace linkrusty
- Obklady a dlažby 1.PP
- Montáž a osazování sanity
- Provádění finálních povrchů epoxidových stěrek



(KD 61) Chybí závazná stanoviska ke zpevněným plochám a dveře mezi starou a novou
budovou. Z: TDS, T: KD 63

57.1. MVČ určí umístění čísla popisného na objektu. Z: MVČ, T: KD 58

(KD 58) Trvá

(KD 59) ČP umístit na přístavbě nad hlavní vstup, odsouhlasit i umístění názvů ulic s
OPP MMHK. Z: TDS

64.1. GD prověří s dodavatelem dopravního značení projednání s DI – zrušení vodorovného
značení parkovacích míst s výjimkou místa pro invalidu. Zde projednat doplnění svislé
dopravní značky. Z: GD, T: KD 65

(KD 65) Žádost o uměnu DZ podána.

64.2. GD připraví složky dokladů ke kolaudacím podmiňujících staveb (přípojky, přeložky).
Z: GD, T: kontrola KD 66

64.3. GD upozorňuje, že pro montáž požárních rolet je nutné dodat pomocnou ocelovou
konstrukci (eliminace tepelných mostů a prostupů parozábranou). GD předloží návrh
ZL. Z: GD, T: KD 65

(KD 65) Vypouští se, dále cestou ZL.

64.4. GD bude tento týden provádět keramické obklady a hydroizolace na WC invalidi č.m.
01.36. Není dosažena bez opatření min velikost rozměru místnosti 1600 mm. Žádáme
GD o stanovisko k rozměrům této místnosti. Spěchá.

Z: GP, T: 05.03.2021

**(KD 65) Minimální velikost dle GP 1600 na 1600 mm. Znamená to úpravu
(přisekání) nosné stěny. Dále cestou ZL. Vypouští se.**

64.5. GD předložil CN na ochranou ocelovou konstrukci k technologii zvedací plošiny. CN je
pro INV nepřijatelná. GD předloží návrh na D+M ochranného sloupku (pacholík).

Z: GD, T: KD 65

(KD 65) CN na sloupek schválena, dále cestou ZL. Vypouští se.

64.6. Dořešit nutnost provedení dřezů v rozsahu dle PD. TDS prověří u KHS HK. Napojení
koncových prvků slaboproudu i silnoproudu bude v recepci provedeno k předání díla na
provizorní stůl. GD zde nechá dostatečnou rezervu kabelů (min 2m).

Z: GD

**(KD 65) Dřez bude osazen jen v místě dle požadavku na odběrné místo KHS KHK
(4.NP). GD zde dodá a osadí skříňku s dřezem a baterií. Dále cestou ZL. Vypouští
se.**

Nové úkoly:

65.1. MVČ uzavře smlouvu s ASTOR COMPLEXem o připojení objektu na PCO a
smlouvu s HZS KHK. MVČ u ASTOR COMPLEX musí objednat i PLÁN
ZDOLÁVÁNÍ POŽÁRU. Z: MVČ



65.2. GD zpracuje plán předpřejímek, přejímek, zaškolení obsluhy, závěrečných kontrolních dohlídek. Z: GD, T: KD 66

65.3. GD předloží poslední návrh ZL do KD 66 Z: GD

65.4. Stavby na pozemcích MHK zůstanou na pozemcích MHK. Přístavba bude zaměřena vč venkovních schodišť. Z: GD

Vzorkování:

V. 50.1. GD předložil DD na hliníkové dveře (5 ks) mezi přístavbou a starou budovou. TDS přepošle na OPP MMHK a NPÚ. Z: TDS

(KD 51) OPP MMHK souhlasí, TDS vystaví žádost na vydání závazného stanoviska. Z: TDS





V. 53.1. TDS a OPP MMHK dnes provedl kontrolu rozpracované zpevněné plochy nádvoří u levého vstupu. Bez připomínek.

V.55.1. Deska pod umyvadla v soc zař šaten v 1.PP bude dezén dub. Vypouští se.

V Hradci Králové 10.03.2021

Zapsal: Ing. L. Kasper

Přílohy: prezenční listina



NABÍDKA ZBOŽÍ A SLUŽEB

Dodavatel : VÝPRACHTICKÝ s.r.o.



VÝPRACHTICKÝ

C 20712 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Humburky 2

504 01 Humburky

IČ : 27469051

DIČ : CZ27469051

Řada dokladu : 800

Číslo dokladu : 210036

Zakázka č. :

Popis zakázky : SMART HK, trubka před motor

Způsob dopravy : Dodavatelem

Forma úhrady : Platebním příkazem 30dní

Datum pořízení : 4.3.2021

Datum platnosti : 30.4.2021

Termín dodání : dle domluvy

Odběratel : BAK stavební společnost, a.s.

Žitenická 871/1

190 00 Praha

IČ : 28402758 DIČ : CZ28402758

Zastoupený: Ing. Borkovec Karel

Řádek	Text položky	Množství	MJ	Kč/MJ	Celkem	DPH %	Celkem s DPH
1	D+M trubka pr. 108, zaslepená, délka 1,2 m, PÚ 2 x RAL kotvená do podlahy	1,00	ks	0,00	0,00	21	0,00
2	Technická příprava	1,00	ks	1 500,00	1 500,00	21	1 815,00
3	Trubka pr. 108, zaslepení, délka 1,2 m, výroba	1,00	ks	3 300,00	3 300,00	21	3 993,00
4	2x nátěr, doprava	1,00	ks	1 100,00	1 100,00	21	1 331,00
5	Montáž, doprava	1,00	ks	2 200,00	2 200,00	21	2 662,00
		5,00			8 100,00		9 801,00

Celkem Kč bez DPH:

8 100,00

Celkem Kč vč. DPH:

9 801,00

Povrchová úprava: 2x nátěr

Zajištění staveništní manipulace: vlastní mechanizace a doprava, objednatel zajistí pouze přístup

Záruční doba: 24 měsíců, Třída provedení: EXC2

Pracovní doba: PO-PÁ: od 7:00 - 17:00, mimo svátky.

Případné vícepráce budou doúčtovány. Hodinová sazba pro případné vícepráce činí 600Kč/hod/osobu.

Pozastávky po dobu záruky nenabízíme.

Poznámky:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

SMARTmuzeum: modernizace depozitářů, technického a
technologického zázemí Muzea východních Čech v Hradci Králové
CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/001/17/0

Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Zhotovitel:	Společnost BAK-GEOSAN, Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek
Projekt:	SMARTmuzeum: modernizace depozitářů, technického a technologického zázemí Muzea východních Čech v Hradci Králové
Místo:	Hradec Králové
Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0011170
Smlouva o dílo ze dne 04.02.2019	

ZMĚNOVÝ LIST		ZL	87
		revize:	
Objednatel:	Společnost Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	Zastoupena (Jméno, Příjmení)	Mgr. Martin Červíček
Zhotovitel:	Společnost BAK-GEOSAN, Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek	Ing. Radek Mrázek, MBA Ivan Havel Ing. Kamil Vykýdal	
Vydáno dne:			

PŘEDMĚTEM ZMĚNOVÉHO LISTU - ZADÁVACÍHO LISTU

Při provádění stavby bylo zjištěno, že komínové sopouchy pro odvod vzduchu z prostor půd nemají zajištěn odvod kondenzátu mimo konstrukci komína. Z tohoto důvodu je nutné na konstrukci komína doplnit nádoby na zachyt zkonenzované vzdušné vlhkosti z prostor sopouchů a zabránění tak neřízenému výtoku vody do stavebních konstrukcí, rozsah počtu nádob je stanoven zástupcem objednatele. Kondenzát bude zachycen v nádobě a bude údrbou objektu při užívání Díla pravidelně vyléván do kanalizace v objektu Muzea. Změna nemění celkovou povahu zakázky.

- Rozpočet, viz. v příloha č. 1
- Zápis z KD, viz. v příloha č. 2
- Cenová nabídka, viz. příloha č. 3

DOPAD NA CENU (bez DPH):		DOPAD NA ČAS realizace v souvislosti s tímto ZL:	
Celkem odpočty:	0,00 Kč	Termín pro vyprojektování změny:	----
Celkové odpočty a připočty:	16 541,19 Kč	Termín pro provedení změny:	----
Celkem připočty:	16 541,19 Kč	Dopad na dílčí termíny:	NE
Cena díla po poslední změně:	223 841 875,96 Kč	Dopad na termín dokončení:	NE

Podpisem zástupců obou smluvních stran se tento „ZL“ nepovažuje za písemný dodatek k výše uvedené smlouvě o dílo. Tento ZL bude nutné řešit dodatkem Smlouvy o dílo

Zástupce Objednatele:
Ing. Václav Nýč
Datum:
15.03.2021

Zástupce Objednatele:
Ing. Roman Kosář
Datum:
15.03.2021

Technický dozor investora:
Ing. Luboš Kasper
Datum:
15.03.2021

Generální projektant:
Ing. Martin Uličný
Datum:
15.03.2021

Zástupce Zhotovitele:
Karel Laš
Datum:
15.03.2021

Za Zhotovitele vypracoval:
Ing. Karel Borkovec
Datum:
15.03.2021

Za Zhotovitele kontroloval:
Ing. Michal Holub
Datum:
15.03.2021

Za Zhotovitele kontroloval:
Ing. Michal Štastný
Datum:
15.03.2021

Za Zhotovitele kontroloval:
Lukáš Laštovička, DiS.
Datum:
15.03.2021

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SMART MUZEUM MODERNIZACE DEPOZITÁŘŮ, TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO ZÁZEMÍ MUZEA VÝCHODNÍCH ČECH

Objekt:

ZL POSLEDNÍ DODATEK - POSLEDNÍ DODATEK

Soupis:

00100 - ZACHYCENÍ KONDENZÍTU Z KOMÍNŮ

Místo: HRADEC KRÁLOVÉ

Datum: 1. 1. 2020

Zadavatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

Projektant: TECHNICO OPAVA

Zhotovitel: SDRUŽENÍ BAK GEOSAN

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							16 541,19	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 083,96	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 083,96	
1	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	22,000	47,50	1 045,00	Dle SoD
	vv		22*1		22,000			
2	K	953991121	Dodání a osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvorů (s dodáním hmot) ve stěnách do zdva z cihel nebo měkkého kamene, vnější profil hmoždinky 10 až 12 mm	kus	88,000	23,17	2 038,96	CS ÚRS 2019 01
	vv		"HMOŽDINKY PRO DRŽÁK NÁDOBY" 22 *2*2		88,000			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				13 457,23	
D	762		Konstrukce tesařské				3 564,77	
3	K	762085111	Práce společné pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků, šroubů délky do 150 mm	kus	88,000	21,29	1 873,52	Dle SoD
	vv		"OBDOBNÁ POLOŽKA" 22*2*2		88,000			ZL 37
4	M	31142019	vrut univerzální hlava půlkulová drážka křížová ZZ 5x70mm	100 kus	9,240	161,37	1 491,06	CS ÚRS 2019 01
	vv		88,000*0,1*1,05		9,240			
5	K	998762204	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	%	5,95	33,65	200,19	Dle SoD
D	767		Konstrukce zámečnické				9 892,46	
6	K	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	44,000	117,81	5 183,64	Dle SoD
	vv		"MONTÁŽ DRŽÁKŮ NÁDOB NA STĚNU 22 KUSŮ * A 21 KG/KUS					ZL 30
	vv		22*2		44,000			
7	M	ZL 87_01	DRŽÁK TRZHLÍKŮ 17*10*15-20 CM	PÁR	22,000	135,00	2 970,00	cena v místě a čase obvyklá
8	M	ZL 87_02	ODPAŘOVACÍ NÁDOBA - TRUHLÍK S MISKOU CAMELIA 40,2*17 CM, OBJEM 9 L, BÍLÁ	KUS	22,000	71,00	1 562,00	cena v místě a čase obvyklá
9	K	998767204	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	%	1,82	97,16	176,82	CS ÚRS 2019 01

SMART muzeum

Zápis z kontrolního dne č: 58/2021

Datum konání: 20.01.2021

Přítomni:

Investor: KÚ KHK – Kosař
GP: TECHNICO Opava – Koráb - omluven
GD sdružení BAK, Geosan: Laštovička, Kališ, Šťastný
MMHK – OPP: J. Falta – omluven
NPÚ Josefov: B. Adámková - omluvena
CIRI: J. Štěrbová
MVČ: Černá, Zámečník, Drahorád - omluveni
TDI: L. Kasper

KD č.58 se koná v době nouzového stavu.

KD 59 se uskuteční 27.1.2021 (středa) od 8,00 hodin.

Kontrolní den se koná vždy ve středu od 8.00 hod se srazem účastníků v objektu zařízení

Práce na následující období 13.1. –20.1.2021

Přístavba :

- Lištování LOP
- SDK podhled 1.NP
- Montáž lávky přes bastion
- Čištění bastionu

Stávající budova:

- Montáž konstrukce nákladního výtahu
- Malby, nátěry 1.NP
- Oprava omítek 1.PP
- Osazování koncových prvků silnoproud, slaboproud
- Montáž VZT 1.NP západ
- Rozvody silnoproud, slaboproud 1.PP
- Obklady, dlažby 2.NP chodba
- Úprava kotelen 1.PP – nové rozvody ÚT
- SDK podhled 5.NP krov



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



57.3. Na KD 58 bude provedena kontrola vnějších viditelných částí monolitu.
Z: INV, TDS, GD, T: KD 58

Nové úkoly:

58.1. GD upozorňuje, že část subdodavatelů je v souvislosti s pandemií COVID 19 v karanténě nebo přímo pozitivní. Tato skutečnost částečně ovlivňuje postup prací.

58.2. MVČ sdělí, jak jsou zajištěny dodávky kuchyňských linek. Stavba má jako součást plnění dodávku a montáž dřezových baterií a dřezů. Nikoli však vlastní kuchyňské linky (4 ks). Linky jsou důležité, stavba bez nich nejde zkolaudovat. Stavba je potřebuje dodat do max 15.3.2021.
Z: MVČ, T: info KD 59

58.3. GD žádá MVČ o prohlídku stavby do 22.1.2020 – řešit kuchyňské linky, je provedena část dlažby chodeb.
Z: MVČ, T: do 22.1.2020

58.4. Kondenzát z komínů bude sveden do kondenzačních nádob umístěných v podkroví. Vypouští se.
Z: GD

58.5. Nové radiátory budou napojeny na původní přípojevací potrubí. Rozvody potrubí se neupravují.
Z: GD, vypouští se.

58.6. GD na základě požadavku OPP MMHK provede kamenickou opravu pískovcového ostění hlavních vstupních dveří. GD předloží CN a návrh ZL.
Z: GD, T: KD 60

58.7. GD požaduje osadit fakturační elektroměr. Při zahájení stavby byl odpojen a zdemontován. MVČ požádá o obnovení dodávky el. Z: MVČ, T: kontrola KD 59

58.8. Paní Štěrbová zašle text pamětní desky. Umístění bude dohodnuto s MVČ.
Z: Štěrbová, MVČ, T: KD 59

Vzorkování:

50.1. GD předložil DD na hliníkové dveře (5 ks) mezi přístavbou a starou budovou. TDS přepošle na OPP MMHK a NPÚ.
Z: TDS
(KD 51) OPP MMHK souhlasí, TDS vystaví žádost na vydání závazného stanoviska. Z: TDS

53.1. TDS a OPP MMHK dnes provedl kontrolu rozpracované zpevněné plochy nádvoří u levého vstupu. Bez připomínek.

V Hradci Králové 20.01.2021

Zapsal: Ing. L. Kasper

Přílohy: prezenční listina, celkový situační výkres



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

✓ Jsme tu pro vás - máme otevřeno



Zahrada · Pěstování · Květináče a truhlíky · Příslušenství · Držáky k truhlíkům

Držák truhlíků balkon.17x10,5-20 cm nastavitelný kov. (2ks)

MA245737

★★★★★ 1 hodnocení | Značka: M.A.T.



163 Kč / bal

135 Kč bez DPH

(více než 3 bal)

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.

🔍 Jsme tu pro vás - máme otevřeno




Zahrada Pěstování Květináče a truhlíky Truhlíky Truhlíky s miskou

Truhlík s miskou CAMELIA 40,2 x 17 cm, 9l, bílá

MA344195

☆☆☆☆☆ **Neohodnoceno**



86 Kč / sada

71 Kč bez DPH

(více než 3 sada)

1 Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.
