I/14 Solnice, obchvat
Harmonogram výstavby
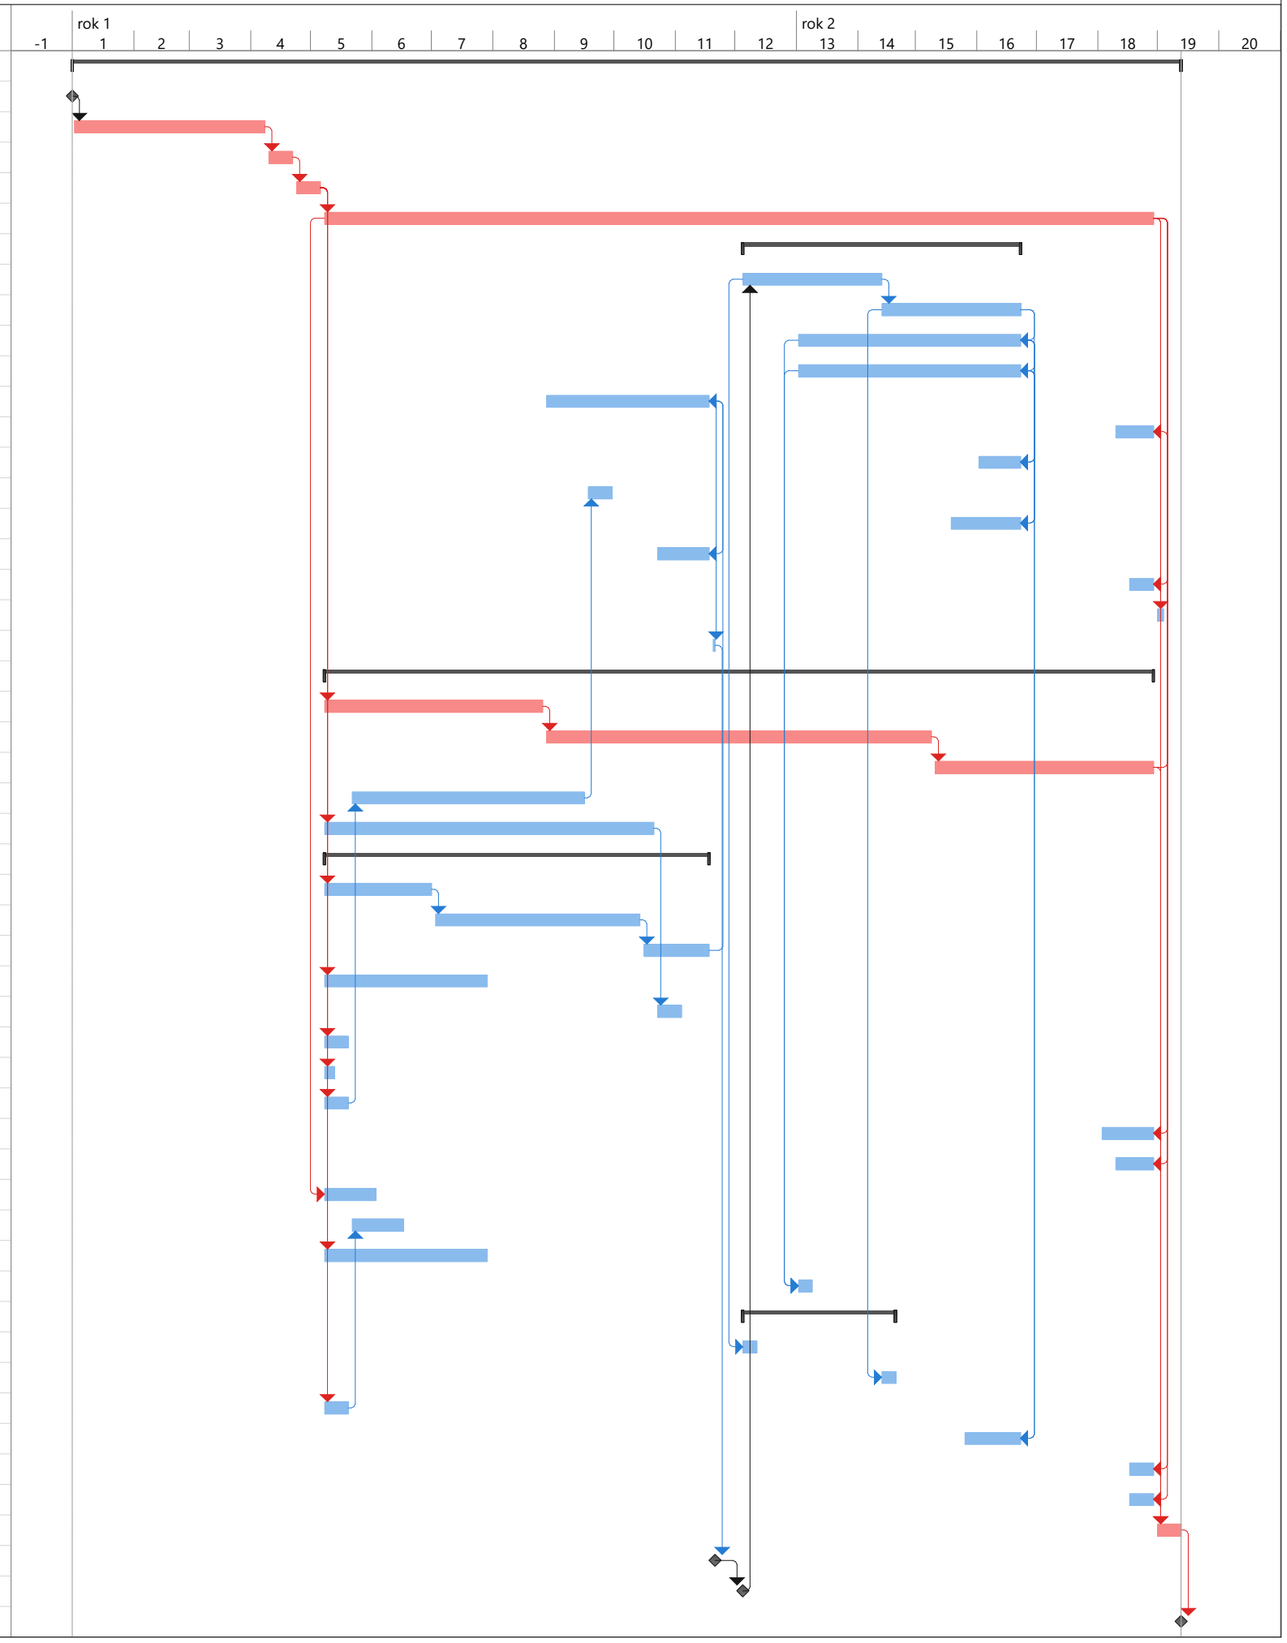
ID	Název úkolu	Doba trvání	Předchůdci	Následníci
1	**I/14 Solnice, obchvat**	**80 týdny**		
2	Zahájení stavby	0 týdny		3
3	Základní vytyčovací síť	14 týdny	2	4
4	SO 810.3 Příprava stavebních pozemků	2 týdny	3	5
5	SO 810.2 Skrývka ornice	2 týdny	4	6;26;31;33;34;35;45;22;28;40
6	SO 101 Hlavní trasa silnice I/14	60 týdny	5	36FF;37FF;38SS;18FF;19;47FF;48FF;49
7	**SO 110 Okružní křižovatka v km 1,690**	**20 týdny**		
8	SO 110 Okružní křižovatka (POV-ET2)	10 týdny	51	43SS;9
9	SO 110 Okružní křižovatka (POV-ET3)	10 týdny	8	44SS;10FF;11FF
10	SO 111 Okružní křižovatka v km 0,023	16 týdny	9FF	14FF;41SS;16FF;46FF
11	SO 111.1 Okružní křižovatka v km 0,023 - SS KHK	16 týdny	9FF	14FF;41SS;16FF;46FF
12	SO 120 Přeložka silnice III/29845 v km 1,177	12 týdny	30FF	17FF;20
13	SO 121 Přeložka místní komunikace v km 0,183	3 týdny	24FF	
14	SO 122 Přeložka silnice III/3213 v km 0,000	3 týdny	10FF;11	
15	SO 134 Přeložka stezky pro chodce a cyklisty v km 0,485	2 týdny	25	
16	SO 135 Přeložka stezky pro chodce a cyklisty v km -0,007	5 týdny	10FF;11	
17	SO 150 Přeložka polní cesty k silnici III/29845 v km 1,189	4 týdny	12FF	
18	SO 151 Přístupové cesty k pozemkům	2 týdny	6FF	
19	SO 190.1 Dopravní značení (ŘSD ČR)	3 dny	6	
20	SO 190.2 Dopravní značení (SS KHK)	1 den	12	50
21	**SO 201 Estakáda v km 0,068-0,324**	**60 týdny**		
22	Spodní stavba	16 týdny	5	23
23	NK (1 takt 4 týdny; 7 taktů)	28 týdny	22	24
24	Vybavení, dokončovací práce	16 týdny	23	13FF;49
25	SO 202 Most v km 0,485	17 týdny	35	15
26	SO 203 Most přes Dlouhou strouhu v km 0,587	24 týdny	5	32
27	**SO 220 Most na silnici III/29845 v km 1,177**	**28 týdny**		
28	Spodní stavba	8 týdny	5	29
29	NK	15 týdny	28	30
30	Vybavení, dokončovací práce	5 týdny	29	12FF
31	SO 260 Propust Močince v km 1,481	12 týdny	5	
32	SO 320 Úprava vodotečí Povodí Labe	2 týdny	26	
33	SO 330 Přeložka tlakové kanalizace	2 týdny	5	
34	SO 331 Přeložka dešťové kanalizace	1 týden	5	
35	SO 340 Přeložka vodovodu	2 týdny	5	25
36	SO 360 Retenční příkopy Dlouhá strouha	4 týdny	6FF	
37	SO 361 Retenční příkop Močinec	3 týdny	6FF	
38	SO 380 Přeložky a úpravy meliorací	4 týdny	6SS	
39	SO 391.1 Vodohospodářská opatření na povodí Bělé	4 týdny	45	
40	SO 391.2 Rekonstrukce zatrubnění vodního náhonu	12 týdny	5	
41	SO 431.1 Přeložka VO OK v km 0,023 město Solnice	1 týden	10SS;11	
42	**SO 431.2 VO OK v km 1,690 město Solnice**	**11 týdny**		
43	SO 431.2 VO OK (POV-ET2)	1 týden	8SS	
44	SO 431.2 VO OK (POV-ET3)	1 týden	9SS	
45	SO 520 Přeložka plynovodu STL GasNet	2 týdny	5	39
46	SO 760 Protihluková stěna v km 0,050 vlevo	4 týdny	10FF;11	
47	SO 801 Vegetační úpravy	2 týdny	6FF	
48	SO 830 Rekultivace území	2 týdny	6FF	
49	Dokončovací práce	2 týdny	6;24	52
50	Zprovoznění III/29845 (konec etapy 1)	0 týdny	20	51FS+2 týdny
51	Omezení provozu na II/321 (začátek etapy 2)	0 týdny	50FS+2	8
52	Zprovoznění stavby	0 týdny	49
