SITUACE ZOV M 1 : 200

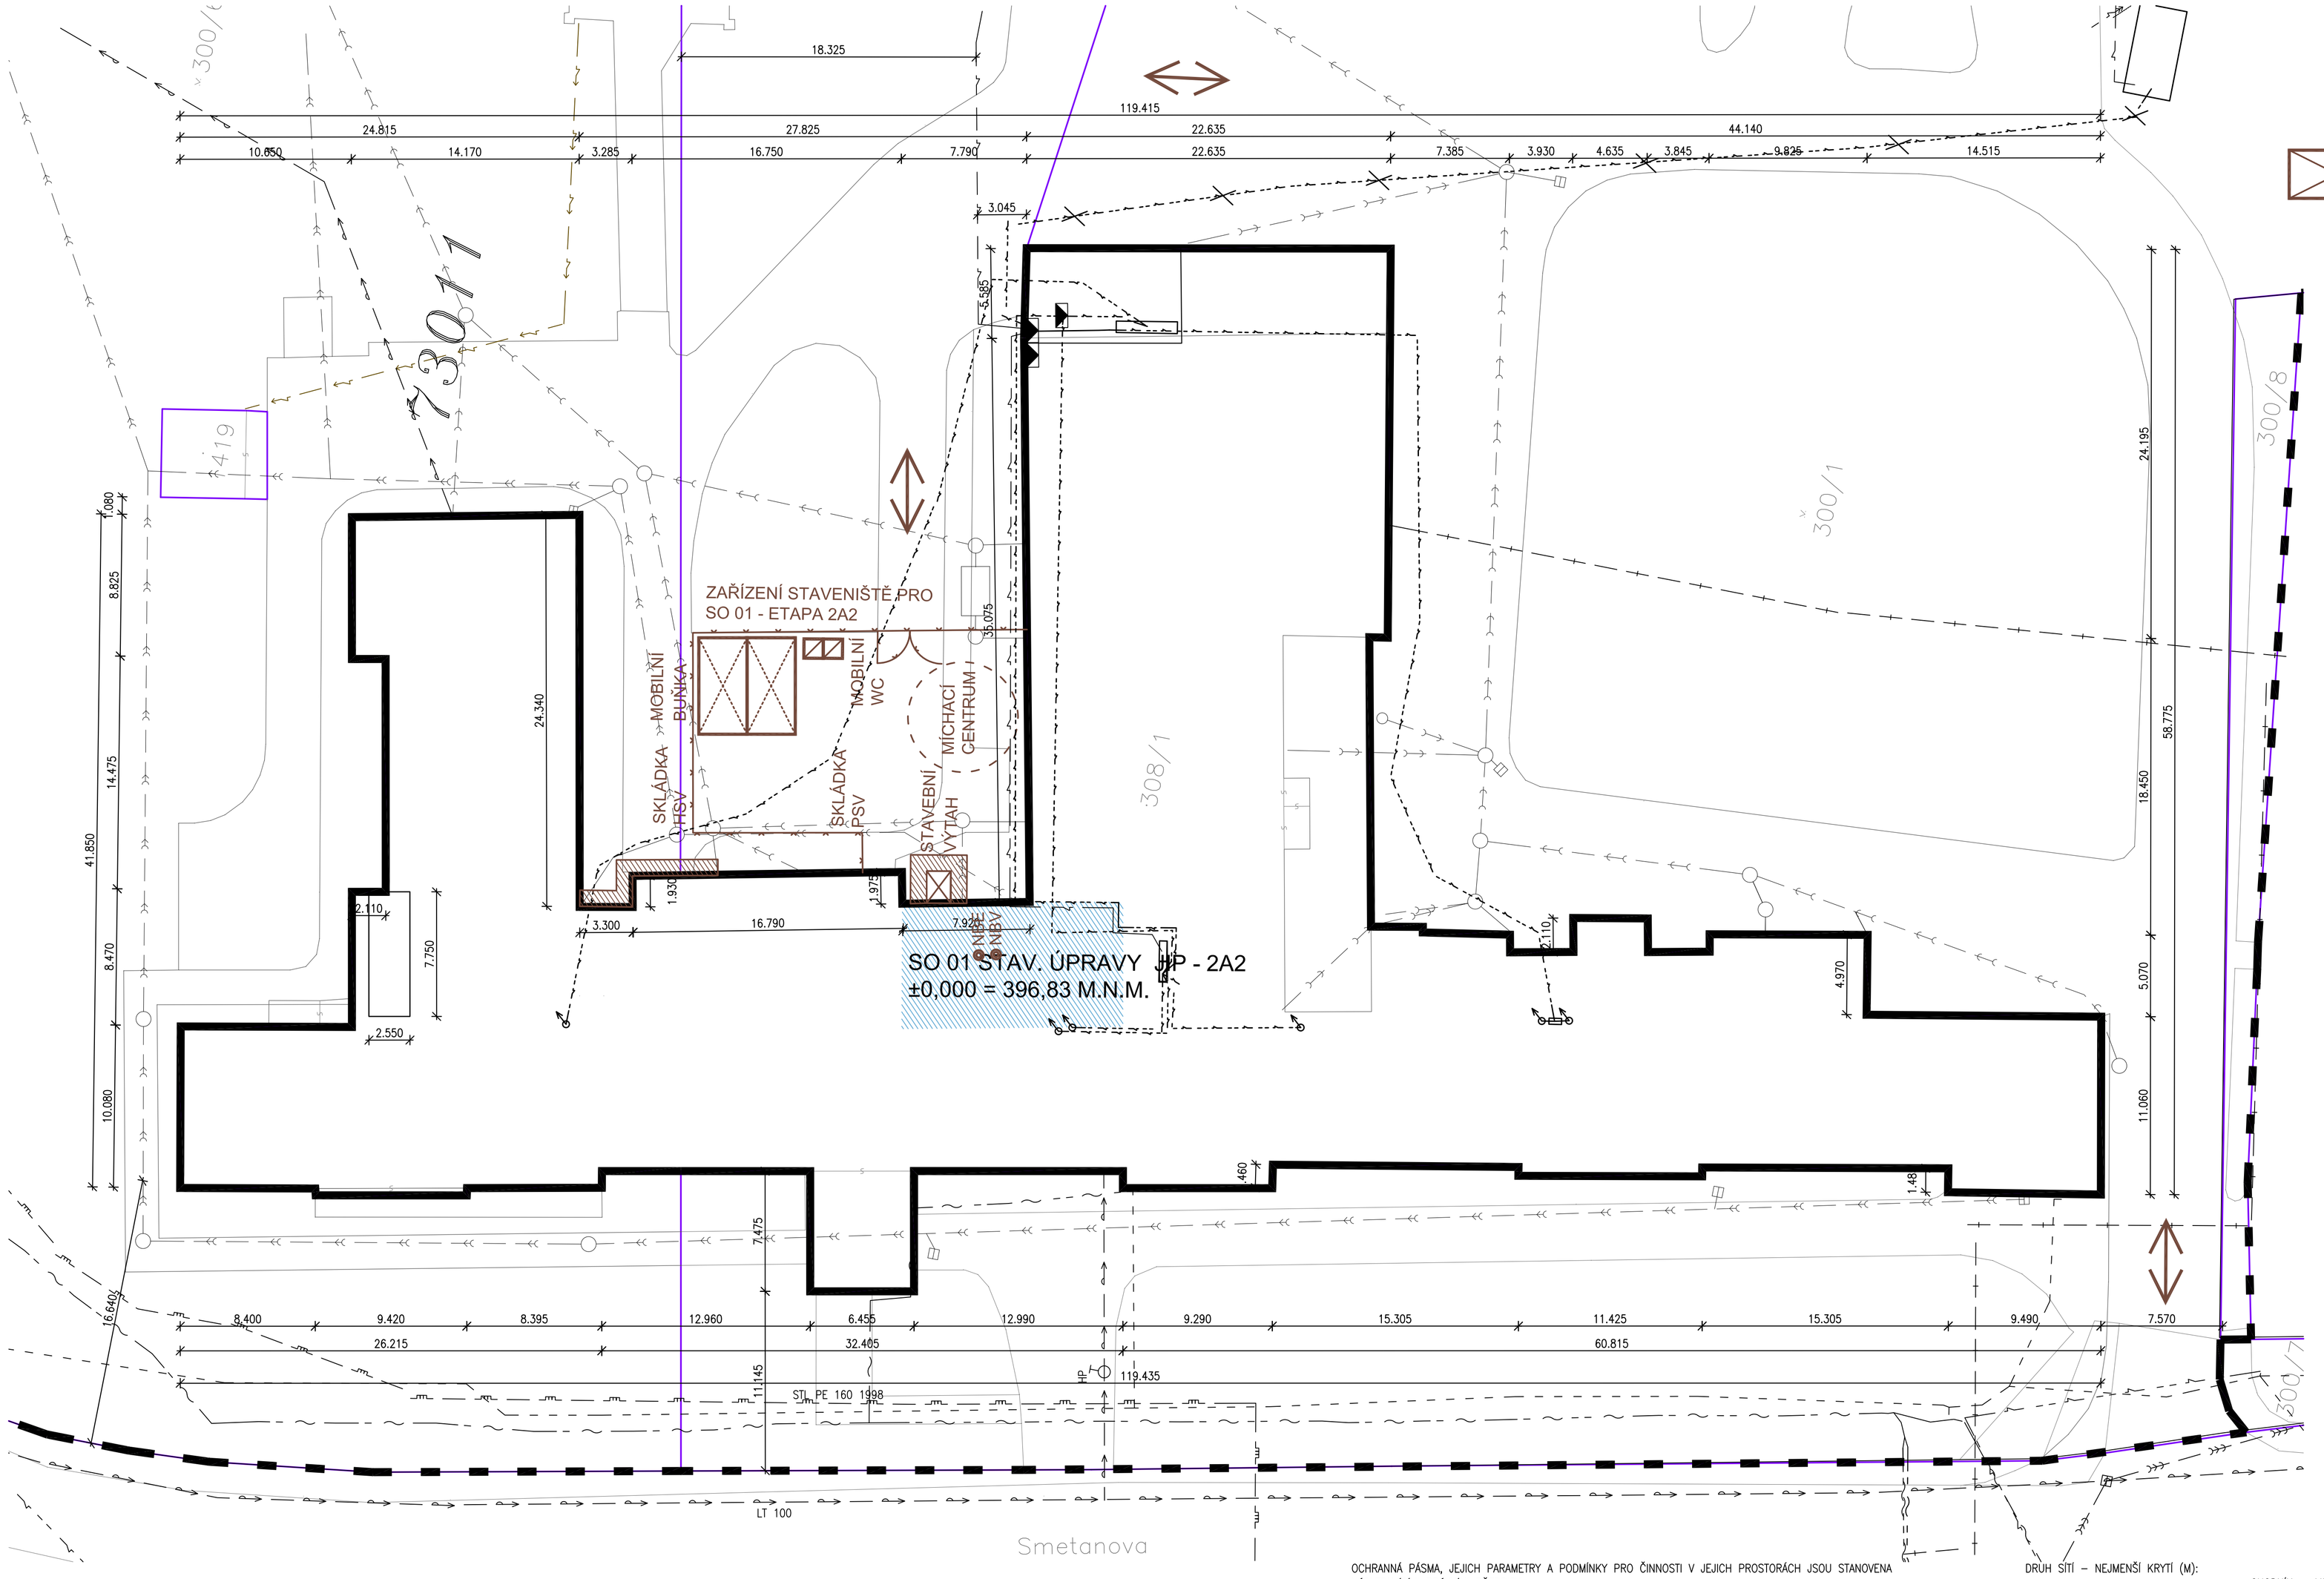

LEGENDA ZOV:

- VJEZD A VÝJEZD ZE STAVENIŠTĚ, PŘÍJEZD KE STAVENIŠTI
- SKLAD DEPONIÍ A MEZIDEPONIÍ
- MOBILNÍ WC
- SKLADY STAVENIŠTĚ (HSV, PSV)
- STAVEBNÍ VÝTAH
- NBE – NAPOJOVACÍ BOD ELEKTŘINY PRO STAVBU
- NBV – NAPOJOVACÍ BOD VODY PRO STAVBU
- OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ
- LEŠENÍ
- SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY JIP – ETAPA 2A2

VLASTNICKÉ POMĚRY:

PARCELA	VLASTNÍK
ST.P.Č. 308/1	KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245/2, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
P.P.Č. 300/1	KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245/2, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
P.P.Č. 300/6	KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245/2, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
P.P.Č. 298/8	KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245/2, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
ST.P.Č. 308/2	KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245/2, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
ST.P.Č. 308/3	KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245/2, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
ST.P.Č. 1419	KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245/2, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
P.P.Č. 809	KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245/2, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ SPRÁVA SILNIC KRÁLOVEHRADECKÉHO KRAJE, KUTNOHORSKÁ 59/23 PLAČICE, 500 04 HRADEC KRÁLOVÉ

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ A OBJEKTŮ:

- STÁVAJÍCÍ OBJEKT NEMOCNICE BROUMOV
- STÁVAJÍCÍ POZEMKOVÉ HRANICE
- STÁVAJÍCÍ SLUČKY
- HRANICE POZEMKŮ NEMOCNICE
- STÁVAJÍCÍ JEDNOTNÁ KANALIZACE – VAK NÁCHOD, A.S.
- STÁVAJÍCÍ VODOVOD – VAK NÁCHOD, A.S.
- STÁVAJÍCÍ AREÁLOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- STÁVAJÍCÍ AREÁLOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- STÁVAJÍCÍ ELEKTRO NN NADZEMNÍ – ČEZ DISTRIBUCE A.S.
- STÁVAJÍCÍ ELEKTRO VN NADZEMNÍ – ČEZ DISTRIBUCE A.S.
- STÁVAJÍCÍ ELEKTRO NN PODZEMNÍ – ČEZ DISTRIBUCE A.S.
- STÁVAJÍCÍ AREÁLOVÉ ELEKTRO NN PODZEMNÍ
- STÁVAJÍCÍ AREÁLOVÉ ELEKTRO NN PODZEMNÍ
- STÁVAJÍCÍ ELEKTRO NN NADZEMNÍ
- STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD STL PODZEMNÍ – RWE DISTRIBUČNÍ SLUŽBY, S.R.O.
- STÁVAJÍCÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ NADZEMNÍ – TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA BROUMOVA
- STÁVAJÍCÍ TEPLOVODNÍ ROZVODY PODZEMNÍ – TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ BROUMOV
- ZAMĚŘENÝ PRŮBĚH METALICKÉHO KABELU – ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA A.S.
- NADZEMNÍ SÍTĚ – ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA A.S.
- NEZAMĚŘENÝ PRŮBĚH METALICKÉHO KABELU – ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA A.S.
- STÁVAJÍCÍ VJEZD A VÝJEZD DO AREÁLU
- STÁVAJÍCÍ VSTUPY DO OBJEKTU
- STÁVAJÍCÍ AREÁLOVÝ KABEL 4xAYKY 3x240+120 V PVC CHRÁNIČCE PRŮM. 110 (OD TRANSFORMÁTORU K PS2)
- STÁVAJÍCÍ AREÁLOVÝ KABEL 3xAYKY 3x240+120 V PVC CHRÁNIČCE PRŮM. 110 (OD PS2 K RH-MDO)

OBSAHOVÝ LIST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:

D.1	**STAVEBNÍ OBJEKTY**	
D.1.1	SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY JIP - ETAPA 2A2	
D.1.1.1	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
D.1.1.2	STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ	
D.1.1.3	POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ	
D.1.1.4	ZDRAVOTNÍ TECHNIKA	
D.1.1.5	ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD	
D.1.1.6	VYTÁPĚNÍ	
D.1.1.7	MEDICINÁLNÍ PLYNY	
D.1.1.8	VZDUCHOTECHNIKA	
D.1.1.9	ELEKTROINSTALACE SLABOPROUD	
D.1.1.10	ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE (VIZ DÍL D.1.1.09)	
D.1.1.11	MĚŘENÍ A REGULACE	
D.2	**INŽENÝRSKÉ OBJEKTY**	
NEJSOU PŘEDMĚTEM TÉTO DOKUMENTACE		
D.3	**PROVOZNÍ SOUBORY**	
D.3.1	PS 01 LÉKAŘSKÁ TECHNOLOGIE – SO 01 (2A2)	

LEGENDA NAVRHOVANÝCH SÍTÍ A OBJEKTŮ:

- STÁVAJÍCÍ OBJEKT NEMOCNICE BROUMOV
  SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY JIP – ETAPA 2A2

POZNÁMKA:

– ÚROVEŇ PODLAHY 1PP –3,300 M
– ÚROVEŇ PODLAHY 1NP ±0,000 M = 396,88 M.N.M. (B.P.V.) = ÚROVEŇ 1NP DOSTAVBY Z R. 1970
– ÚROVEŇ PODLAHY 2NP +4,050 M
– ÚROVEŇ PODLAHY 3NP +7,950 M

– ZÁKRESY STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ JSOU INFORMATIVNÍ. PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT VYTÝČENY VŠECHNY PODZEMNÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ NACHÁZEJÍCÍ SE V PROSTORU VÝSTAVBY A V JEJÍM OKOLÍ, PŘÍPADNĚ MUSÍ BÝT PROVEDENO I JEJICH ZABEZPEČENÍ PROTI POŠKOZENÍ.
– PŘI KŘÍŽENÍ A SOUBĚHU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ MUSÍ BÝT DODRŽENY MINIMÁLNÍ ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI DANÉ PLATNÝMI NORMAMI, ZEJMÉNA ČSN 73 6005.
– SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BPV
– DOPRAVNÍ NAPOJENÍ NA VEŘEJNÉ PLOCHY ZŮSTÁVÁ STÁVAJÍCÍ A TO STÁVAJÍCÍM SJEZDEM Z P.P.Č. 300/1 (VLASTNÍK – KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ) NA P.P.Č. 809 (VLASTNÍK – KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ, HOSPODAŘENÍ SE SVĚŘENÝM MAJETKEM – SPRÁVA SILNIC KRÁLOVEHRADECKÉHO KRAJE).

DATUM ZMĚNY	POPIS ZMĚNY

OCHRANNÁ PÁSMA, JEJICH PARAMETRY A PODMÍNKY PRO ČINNOSTI V JEJICH PROSTORÁCH JSOU STANOVENA NÁSLEDUJÍCÍMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY:
ZÁKON Č. 458/2000 SB. O PODMÍNKÁCH PODNIKÁNÍ A O VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ (ENERGETICKÝ ZÁKON), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

DRUH SÍTĚ	OCHRANNÉ PÁSMO – VZDÁLENOST OD POVRCHU SÍTĚ (M)
VODOVOD DO DN 500	1,5
VODOVOD NAD DN 500	2,5
KANALIZACE DO DN 500	1,5
KANALIZACE NAD DN 500	2,5
NÍZKOTLAKÝ NEBO STŘEDOTLAKÝ PLYNOVOD	1,0
TEPELNÁ SÍŤ	2,5
ELEKTRICKÝ KABEL DO 110 KV	1,0
ELEKTRICKÝ KABEL NAD 110 KV	3,0
ELEKTRONICKÉ KOMUNIKAČNÍ VEDENÍ	1,5

DRUH SÍTÍ – NEJMENŠÍ KRYTÍ (M):

	CHODNÍK	VOZOVKA	VOLNÝ TERÉN
SILOVÉ KABELY			
NÍZKÉ NAPĚTÍ (NN) DO 1 KV	0,35	1,0	0,35
VYSOKÉ NAPĚTÍ (VN) DO 10 KV	0,5	1,0	0,7
VYSOKÉ NAPĚTÍ (VN) DO 35 KV	1,0	1,0	1,0
VELMI VYSOKÉ NAPĚTÍ (VVN) DO 220 KV	1,3	1,3	1,3
SDĚLOVACÍ KABELY			
MÍSTNÍ	0,4	0,9	0,6
DÁLKOVÉ	0,5	0,9	0,6
OPTICKÉ MÍSTNÍ (DÁLKOVÉ)	0,4 (0,5)	0,9 (1,2)	0,6 (1,0)
PLYNOVODNÍ POTRUBÍ	0,8	1,0	0,8
VODOVODNÍ POTRUBÍ	1,5	1,5	1,5
TEPELNÉ SÍTĚ	0,5	1,0	0,5
STOKY A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY	1,0	1,8	1,0

HLAVNÍ ING. PROJEKTU	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	MĚŘÍTKO: 1 : 200
LIBOR KLUBAL, DIS.	ING. PAVEL TÖMA	LIBOR KLUBAL, DIS.	FORMÁT: 10 A4
			DATUM: 19.11.2017

INVESTOR : KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

AKCE : NEMOCNICE BROUMOV – STAVEBNÍ ÚPRAVY 2NP JIP – ETAPA 2A2

Na parcele: st.p.č. 308/1, p.p.č. 300/1, 300/6
Katastrální území: BROUMOV

C – SITUACE STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY — Č. PARE

NÁZEV PŘÍLOHY : SITUACE ZOV — ČÍSLO PŘÍLOHY C. 05

ZPRACOVATEL:
INS spol. s r.o.
projektový a inženýrský ateliér
Poříčný 413
547 01 Náchod
Tel.: 491 422 226
ins.atelier@insnachod.cz
www.insnachod.cz

EV. Č. AKCE 1566 44 17
