

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 16. 2. 2024

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zástupce: Mgr. Martin Červíček, hejtman
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
dále též „objednatel“

a

Společnost / podnikatel Společnost GEOSAN – BAK – Urgent Náchod Vedoucí společník GEOSAN GROUP a.s.

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 12459

se sídlem: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín
zastoupený: Luděk Kostka, předseda představenstva
Ivan Havel, člen představenstva
Ing. Kamil Vykydal, výkonný ředitel, na základě plné moci
JUDr. Ing. Karel Kutnohorský, ředitel závodu pozemních staveb Čechy, na
základě plné moci
IČO: 28169522
DIČ: CZ28169522
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Společník BAK stavební společnost a.s.

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 14336

se sídlem: Žitenická 871/1, Prosek, 190 00 Praha 9
zastoupený: Ing. Radek Mrázek, MBA, místopředseda představenstva
IČO: 28402758
DIČ: CZ28402758

(dále jen „**zhotovitel**“ nebo „**dodavatel**“)

(objednatel a zhotovitel jednotlivě také jako „smluvní strana“, společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 16. 2. 2024, ve znění dodatku č. 1, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem

veřejné zakázky nazvané: „**Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod** " (dále jen „veřejná zakázka“).

I. Účel dodatku

1. Tento dodatek je dále uzavírán dle čl. 6 odst. 6.3 a odst. 6.4 a čl. 16 odst. 16.2 původní smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon“) v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací – víceprací, méněprací a nutných změn:

a) Jedná se o změny dle § 222 odst. 4 zákona, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné pro zhotovení díla – práce podle Změnového listu č. 4B a č.6

vícepráce: 212 631,25 Kč bez DPH

méněpráce: - 41 615,02 Kč bez DPH

b) Jedná se o změny podle § 222 odst. 6 zákona, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky – práce podle Změnového listu č. 1, č. 2, č. 3, č. 4A, č. 5, č. 7, č. 8, č. 9, č. 10 a č. 11

vícepráce: 1 899 096,84 Kč bez DPH

méněpráce: - 11 718,37 Kč bez DPH
2. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou změnové listy č. 1 až č. 3, č. 4A, č. 4B, č. 5 až č. 11, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
3. Změny podle odst. 1 tohoto článku činí:

vícepráce: 2 111 728,09 Kč bez DPH

méněpráce: - 53 333,39 Kč bez DPH
4. Celková smluvní cena se tedy **navyšuje o 2 058 394,70 Kč bez DPH.**
5. V souvislosti se změnami uvedenými ve změnovém listu č. 10 se prodlužuje termín plnění o 3 týdny a uzlový bod pro dokončení přístavby pavilonu A o 13 týdnů.

II. Vymezení rozsahu změn

1. Čl. 5 odst. 5.2 původní smlouvy se mění a nově zní takto:

5.2 Termíny a místa plnění díla jsou stanoveny následovně:

5.2.1 Dokončení stavebních prací nejdéle **do 33 týdnů od výzvy** objednatele k zahájení plnění dle prvního odstavce bodu 5.1 tohoto článku.

zajištění kolaudace (zajištění vydání kolaudačního souhlasu či jiného opatření příslušného stavebního úřadu, na jehož základě bude možné trvale užívat dokončenou stavbu ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) nejdéle **do 4 týdnů ode dne dokončení stavebních prací.** V této lhůtě bude probíhat zkušební provoz stavby.

Celková doba realizace: dílo bude předáno nejdéle **do 37 týdnů od výzvy** objednatele k zahájení plnění.

5.2.2 Objednatel zároveň stanoví **dílčí závazný termín postupu realizace – uzlový bod následovně:**

Předání výrobní dokumentace železobetonových a ocelových, hliníkových konstrukcí včetně statického posouzení do: **60 kalendářních dnů** ode dne předání staveniště.

Dokončení přístavby pavilonu A do: **33 týdnů** ode dne zahájení plnění.

Dokončení opěrných zdí s ozn. OS1, OS2 a schodiště s ozn. SCH1 v předprostoru do: **24 týdnů** ode dne zahájení plnění.

Místo plnění: Dolní areál Oblastní nemocnice Náchod a.s., Purkyňova 446, 547 01 Náchod

2. Čl. 6 odst. 6.2 původní smlouvy se mění a nově zní takto:

Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí

cena celkem bez DPH 88 459 123,11 Kč

DPH samostatně 18 576 415,85 Kč

cena celkem s DPH 107 035 538,96 Kč

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek je ve smyslu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje na jejím jednání konaném dne 10. 6. 2024.

Přílohy:

Změnové listy č. 1, č. 2, č. 3, č. 4A, č. 4B, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8, č. 9, č. 10 a č. 11

Seznam změnových listů

Změny závazků ze smlouvy

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Mgr. Martin Červíček, hejtman
Královéhradecký kraj

.....

Luděk Kostka, předseda představenstva
GEOSAN GROUP a.s.



.....

Ivan Havel, člen představenstva
GEOSAN GROUP a.s.



.....

Ing. Radek Mrázek, MBA,
místopředseda představenstva
BAK stavební společnost a.s

ZMĚNOVÝ LIST				001	
Provedení vyklizení objektu a odstranění střešního kačírku					
Stavba:	Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod				
Objekt:	SO-01 Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B SO-00 Příprava staveniště				
Předkládá:	Společnost GEOSAN - BAK - Urgent Náchod			Datum:	05.03.2024
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny		1	listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady		0	listů, výkresů
osobně	X	3) Fotodokumentace a ostatní přílohy		5	listů
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení:					
Vyklizení vnitřního vybavení nebylo v projektu uvažováno Ve výkazu uvažováno s odstraněním kačírkových střešních násypů v tl. do 100 mm					
1.2 Popis nového řešení:					
Provedení vyklizení volného nábytku a kuchyňských linek a starých kuchyňských spotřebičů z objektu A i B a provedení odvozu a likvidace na řízené skládce odpadů včetně poplatku. Demontáž a likvidace medicínálních ramp zavěšených ze stropů na objektech A a B. Odstranění násypu střechy v tl. do 150 mm					
2 Zdůvodnění změny:					
Při předání a převzetí staveniště byl upřesněn rozsah stávajícího vybavení (zastavěný a volný nábytek včetně starých spotřebičů), které uživatel vyhodnotil jako nevyužitelné a ponechal je v prostoru stavby pavilonu A a B k likvidaci. Dále v prostoru stavby byly zjištěny stávající staré stropní medicínální rampy v prostoru bývalého ára , které je nutné odstranit. Při provádění odstranění násypu střechy na pavilonu A byla zjištěna větší vrstva kačírkového násypu na opravované střeše . Výše uvedené vícepráce vznikly v důsledku výše uvedených okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:				ANO	☒ NE
4 Dopad do smluvních termínů:				ANO (ovlivní navrh. prodloužení doby smluvního termínu)	☒ NE
5 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00	bez DPH	
	Cena víceprací (přípočet):	+	185 966,14	bez DPH	
	Výsledná ceny změny:		185 966,14	bez DPH	
6 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek					odst. 6
7 Schválil:					
za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:	
GEOSAN GROUP a.s.	CE-ING s.r.o.	Proxion s.r.o.	ON Náchod a.s.	Královéhradecký kraj	

SOUPIS PRACÍ - ZL 01 Provedení vyklizení objektu a odstranění střešního kačírku


Název: Úprava Náchod - Urgentní systém
Objekt: Stavební práce a montáž úpravy pavilonů A a B
Soupis:

01 - Bourací práce

Město:	Náchod	Datum:	05.03.2024
Zakázka:	Královéhradecký kraj	Projektant:	Společnost GEOSAN – BAK – Urgent
Zhotovitel:	Společnost GEOSAN – BAK – Urgent Náchod	Zpracovatel:	Náchod


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							185 966,14	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				178 814,38	
D	997		Přesun sutě				61 619,62	
N	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně hmotnost dle skutečnosti odvezených vyklizených a vybouraných hmot z objektu objektu	t	6 900	998,00	6 886,20	CS ÚRS 2024 01
15	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace hmotnost stavební sutí nasypu střechy	t	28 896	340,26	9 832,15	SOD
16	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením 16 9 28 896 t	t	35 796	219,52	7 857,94	SOD
17	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km hmotnost 16 9 28 896 t	t	214 776	25,25	5 423,09	SOD
19	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 navýšení o hmotnost likvidované sutí nasypu dle skutečnosti	t	6 900	2 744,02	18 933,74	SOD
18	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 navýšení hmotnost likvidované sutí za střechy dle skutečnosti	t	28 896	439,04	12 686,50	SOD
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				4 214,76	
250	K	HZS1291	Demontáž kuchyňských linek a spotřebičů Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	12 000	351,23	4 214,76	SOD
D	9		Demontáž zařízení				112 980,00	
N	K	900R	Demontáž stávajícího mediálního stativu vč zaslepení rozvodu, přesunu hmot 200 ks 1 Stativ	ks	6 000	12 580,00	75 480,00	VLASTNÍ
N	K	900R	Odvoz a likvidace odpadu	ks	6 000	6 250,00	37 500,00	VLASTNÍ
D	PSV		Práce a dodávky PSV				7 151,76	
D	712		Povlakové krytiny				7 151,76	
N	K	712990836	Příplatek k odstranění nasypu přes 10° povlakové krytiny za každých dalších 50 mm II střecha nad 1 NP – pavilon A + B44	m2	344 000	20,79	7 151,76	CS ÚRS 2024 01+0,99


Příloha č. 2 ZL 01

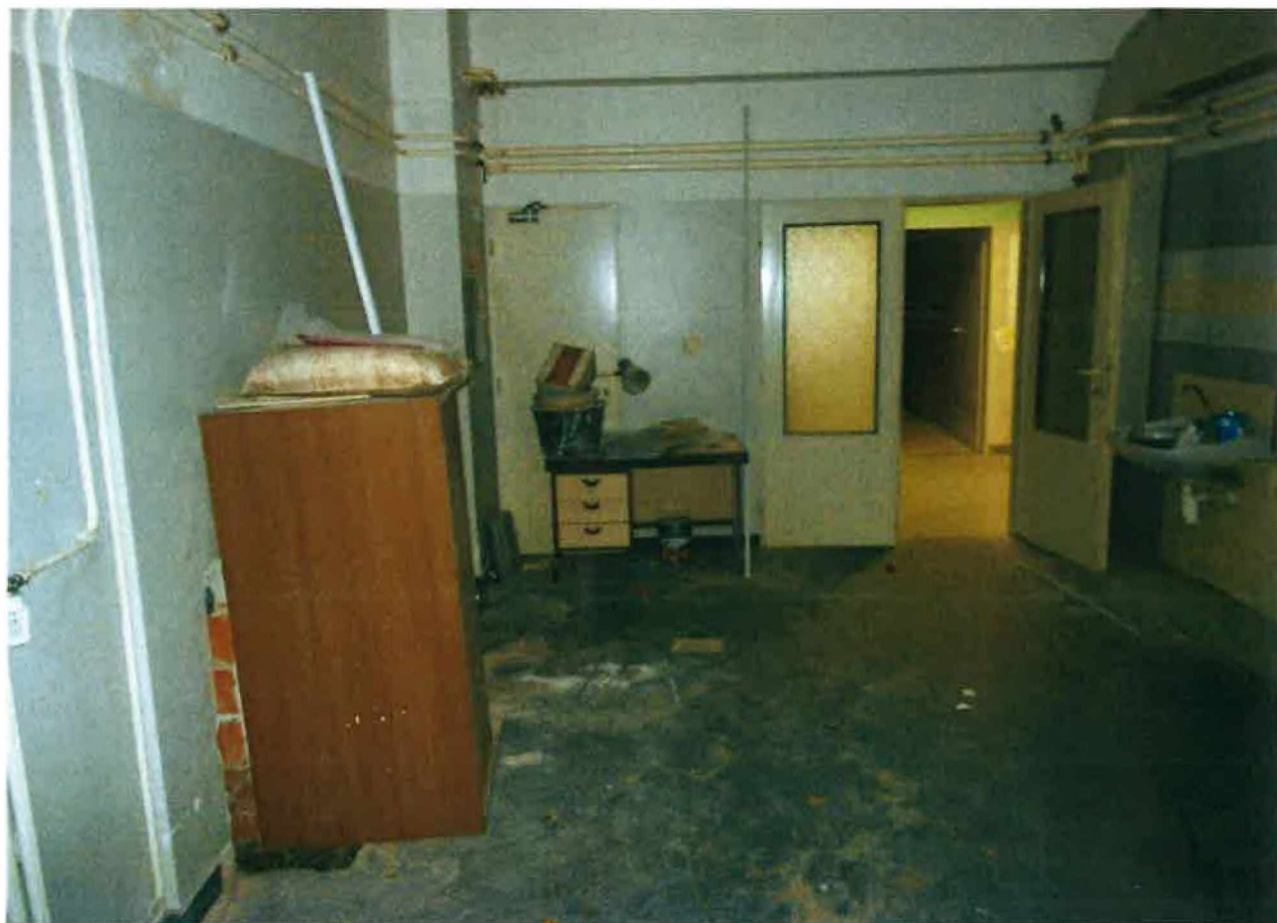





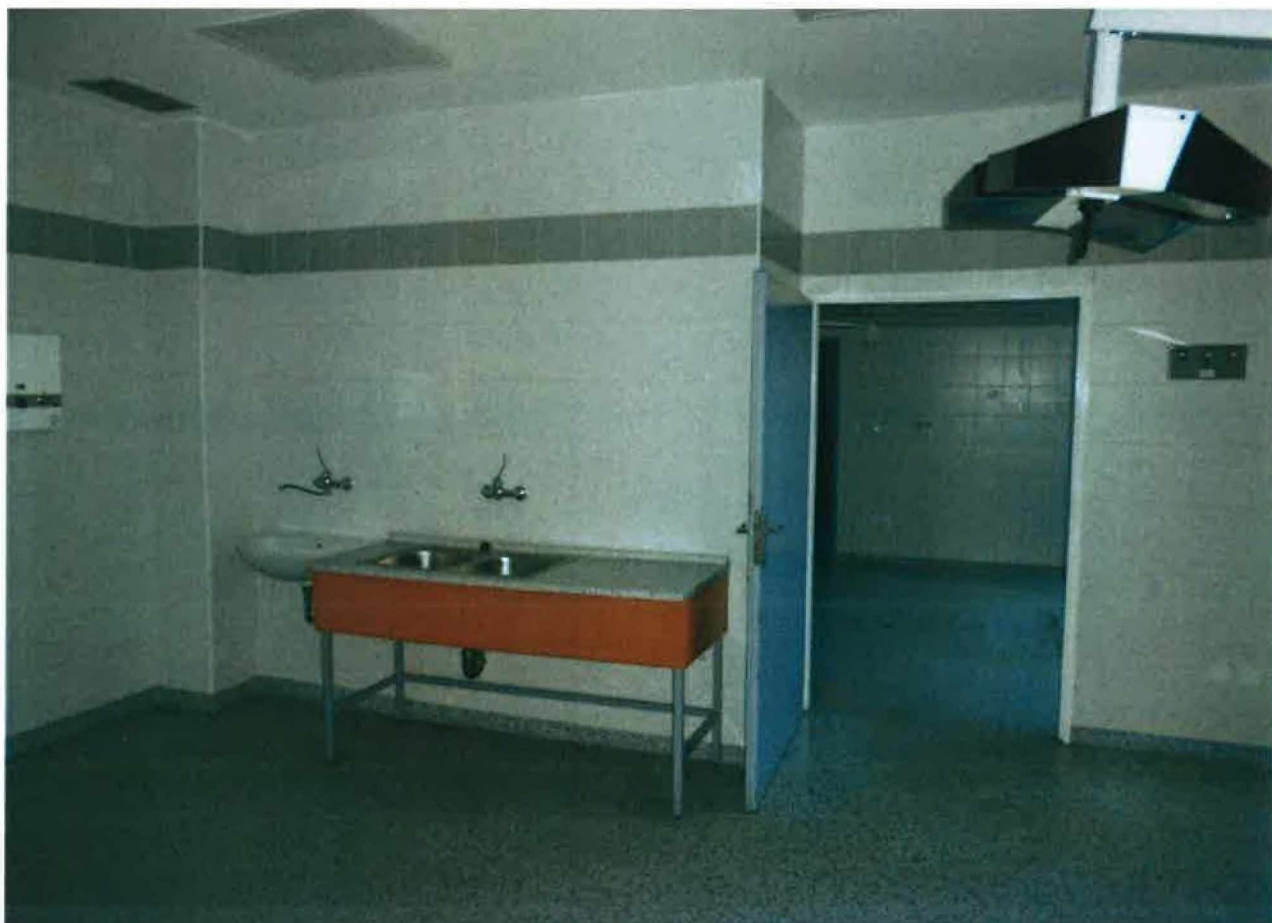

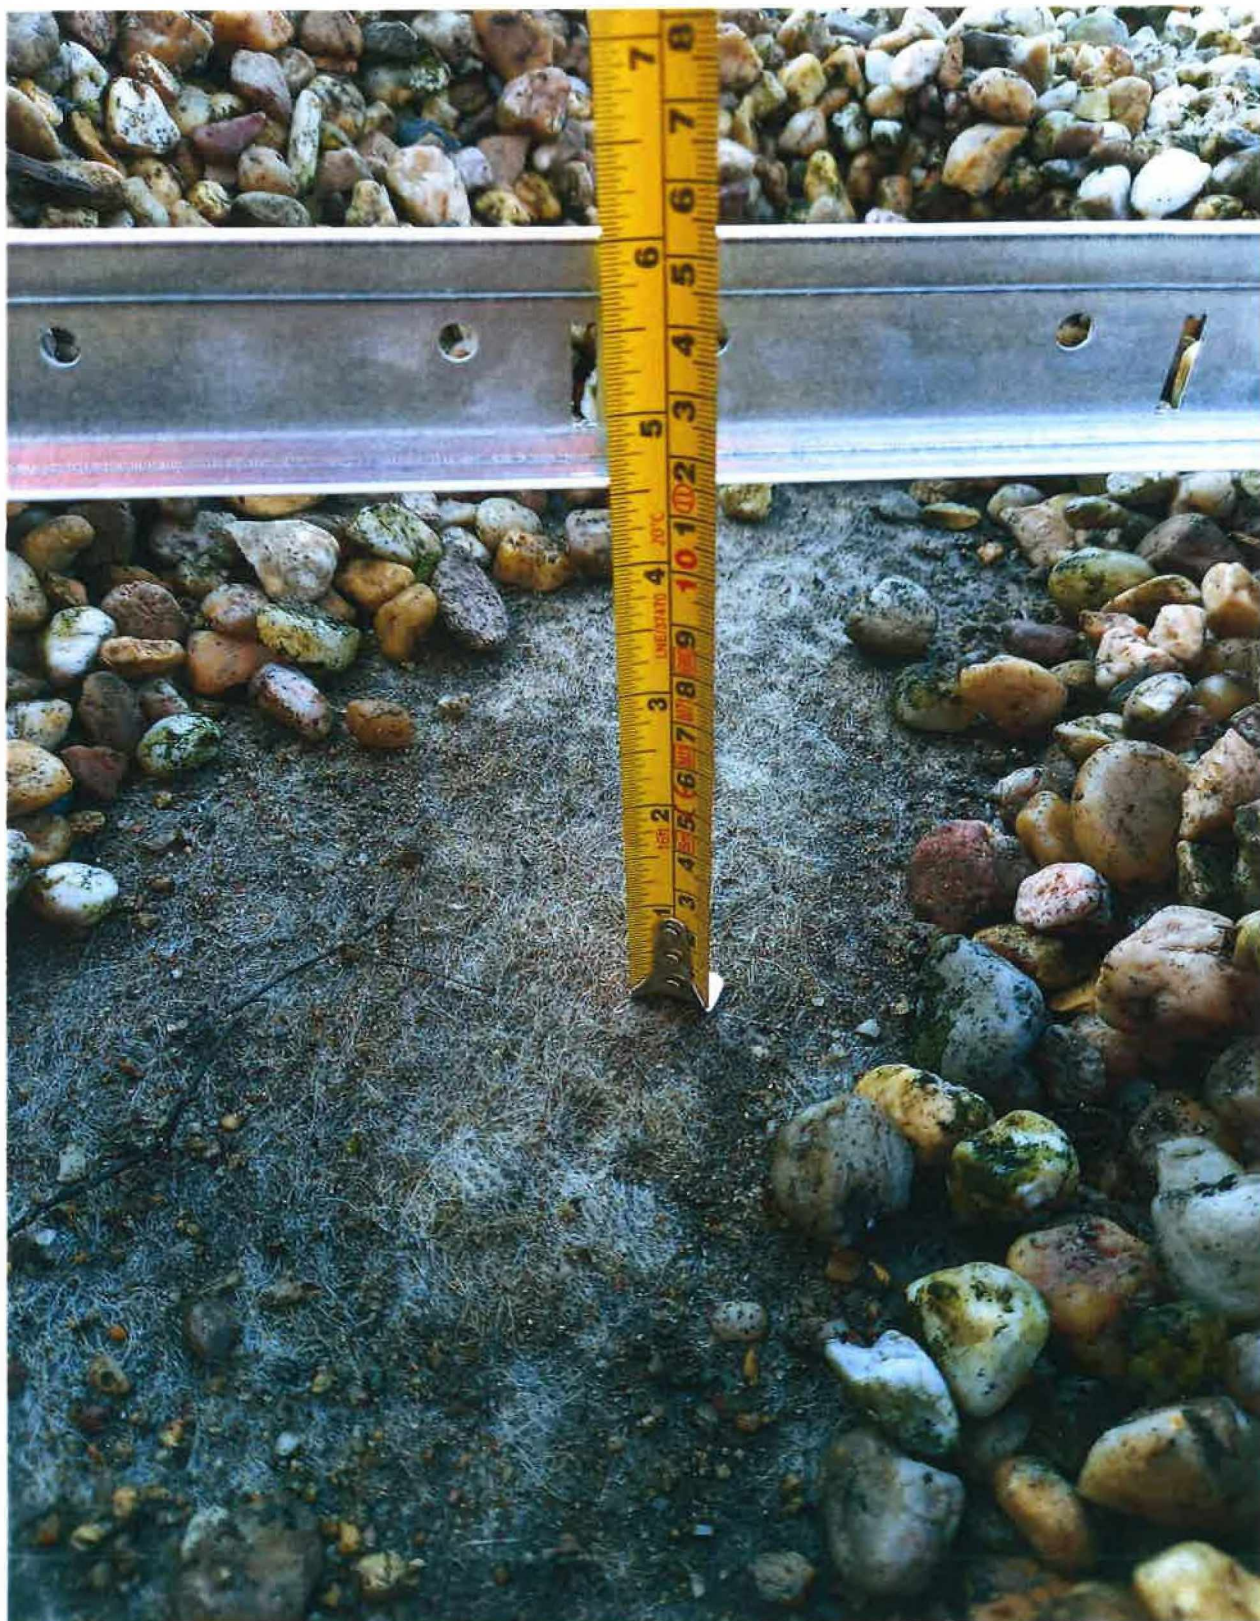

ZMĚNOVÝ LIST					002	
Dodávka bourací práce a příprava staveniště - vícenáklady						
Stavba:		Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod				
Objekt:		SO-00 Příprava staveniště SO-01 Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B				
Předkládá:		Společnost GEOSAN - BAK - Urgent Náchod			Datum: 05.03.2024	
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů				
poštou		1) Položkový rozpočet změny			2 listů	
e-mailem		2) Projektové podklady			0 listů, výkresů	
osobně		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy			0 listů	
1 Technický popis změny:						
1.1 Popis původního řešení: V soupise s výkazem neobsaženy položky vnitřního pomocného lešení, odvozy dřevěného odpadu, poplatky za likvidaci jednotlivých odpadů						
1.2 Popis nového řešení: Doplnění chybějících položek vnitřního pomocného lešení, odvozy dřevěného odpadu, poplatky za likvidaci nově zatříděných jednotlivých odpadů						
2 Zdůvodnění změny: Předmětem změnového listu je oprava položek a doplnění chybného soupisu stavebních prací o položky včetně výkazu týkající se přípravy staveniště a bouracích prací. Tyto uvedené vícepráce vznikly v důsledku výše uvedených okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.						
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:			ANO			NE
4 Dopad do smluvních termínů:			ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)			NE
5 Náklady:		Cena méněprací (odpočet):		–	–9 372,23	bez DPH
		Cena víceprací (přípočet):		+	235 720,07	bez DPH
		Výsledná ceny změny:			226 347,84	bez DPH
6 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek					odst.	6
7 Schválil:						
za zhotovitele:		za TDS:		za AD:		za uživatele:
GEOSAN GROUP a.s.		CE-ING s.r.o.		Proxion s.r.o.		ON Náchod a.s.
						Královéhradecký kraj

SOUPIS PRACÍ - ZL 002 Dodávka bourací práce a příprava staveniště - vícenáklady

Stavba: ON Náchod Urgentní příjem
Objekt: SO-00 - Příprava staveniště

Místo: Náchod Datum: 05.03.2024
Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant:
Zhotovitel: Společnost GEOSAN – BAK – Urgent Náchod Zpracovatel: Společnost GEOSAN – BAK – Urgent Náchod

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							56 306,75	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				56 306,75	
D	1		Zemní práce				56 306,75	
N	K	162201402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	11,000	176,22	1 938,42	CS ÚRS 2024 01*0,99_
N	K	162301942	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	165,000	6,75	1 114,05	CS ÚRS 2024 01*0,99_
	VV		11*15		165,000			
N	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm	kus	14,000	388,10	5 405,40	CS ÚRS 2024 01*0,99_
N	K	162301972	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	210,000	7,91	1 661,12	CS ÚRS 2024 01*0,99_
	VV		14*15		210,000			
N	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	456,500	72,67	33 172,03	CS ÚRS 2024 01*0,99_
N	K	162301981	Příplatek k vodorovnému přemístění křovin D kmene do 100 mm ZKD 1 km	m2	913,000	14,26	13 015,73	CS ÚRS 2024 01*0,99_
	VV		456,5*2		913,000			

SOUPIS PRACÍ - ZL 002 Dodávka bourací práce a příprava staveniště - vícenáklady

Stavba:

ON Náchod Urgentní příjem

Objekt:

SO-01 - Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B

Soupis:

01 - Bourací práce

Místo:

Náchod

Datum:

05.03.2024

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

Společnost GEOSAN – BAK – Urgent Náchod

Zhotovitel:

Společnost GEOSAN – BAK – Urgent Náchod

Zpracovatel:

Společnost GEOSAN – BAK – Urgent Náchod

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

170 041,09

D HSV

Práce a dodávky HSV

170 041,09

D 9

Ostatní konstrukce a práce bourání

115 715,45

77	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1 9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	1 803,770	64 15	115 715 45	CS ÚRS 2024 01*0,99_
----	---	-----------	--	----	-----------	-------	------------	----------------------

VV

Lešení pomocné pro stavební práce dla podhledu 1610 m2 + 153,77 m2

1 803,770

D 997

Přesun sutě

54 325,64

18	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsi nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	-19 641	439 04	8 623 11	SOD
----	---	-----------	---	---	---------	--------	----------	-----

VV

Předpoklad 684 711 4 246-2 773-1 B4
Skutečnost součet hmotností položek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 25, 31, 35, 41, 44
Celkem

675,852

656 710

-19,142

19	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	-0,273	2 744,02	-749,12	SOD
----	---	-----------	---	---	--------	----------	---------	-----

VV

Předpoklad
Skutečnost součet hmotností položek 33, 34
Celkem

2 773

2 500

0 273

20	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	4,820	1 646 41	7 935,70	SOD
----	---	-----------	--	---	-------	----------	----------	-----

VV

Předpoklad
Skutečnost součet hmotností položek 7, 24, 28, 32, 42
Celkem

4 246

9 066

4 820

N	K	997013812	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu na bázi sádky kód odpadu 17 08 02	t	8 419	4 197 60	35 339,68	CS ÚRS 2024 01*0,99_
---	---	-----------	---	---	-------	----------	-----------	----------------------

VV

Předpoklad
Skutečnost součet hmotností položek 29, 30
Celkem

0,000

8 419

6 419

42	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	0 160	197 57	31 61	SOD
----	---	-----------	--	---	-------	--------	-------	-----

VV

Předpoklad
Skutečnost součet hmotností položek 23
Celkem

0,000

0,160

0,160

N	K	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02	t	3 853	4 009,50	15 447,80	CS ÚRS 2024 01*0,99_
---	---	-----------	---	---	-------	----------	-----------	----------------------

VV

Předpoklad
Skutečnost součet hmotností položek 36
Celkem

0 000

3 853

3 853

N	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	2 389	2 069,10	4 943,08	CS ÚRS 2024 01*0,99_
---	---	-----------	--	---	-------	----------	----------	----------------------

VV

Předpoklad
Skutečnost součet hmotností položek 37, 38, 39, 40, 45
Celkem

0 000

2 389

2 389

ZMĚNOVÝ LIST					003	
Přeložky rozvodů vody a kanalizace						
Stavba:		Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod				
Objekt:		SO-01 Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B - 03 - ZTI				
Předkládá:		Společnost GEOSAN - BAK - Urgent Náchod			Datum:	21.03.2024
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů				
poštou		1) Položkový rozpočet změny			1	listů
e-mailem		2) Projektové podklady			2	listů, výkresů
osobně		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy			2	listů
1 Technický popis změny:						
1.1 Popis původního řešení:						
Neobsaženo						
1.2 Popis nového řešení:						
Přeložka vnitřních rozvodů vodovodu a kanalizace mezi 1 a 2NP. pavilonu B.						
2 Zdůvodnění změny:						
Z důvodu bouracích prací je potřeba přeložit provizorní vodovod a kanalizaci mezi patrem 2 a 1NP. pavilon B. Tyto nově zjištěné dočasné, po povrchu vedené rozvody byly provedeny v rámci předchozí úpravy 2NP., která byla provedena uživatelem v rámci drobných úprav a změny užívání stávajících prostor v čase po dokončení projektové dokumentace pro provádění stavby urgentu. Pro provedení odstranění příček vzniká nutnost tyto dočasně zřízené rozvody přeložit za účelem zajištění funkčnosti provozu v druhém patře pavilonu B. Tyto uvedené vícepráce vznikly v důsledku výše uvedených okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.						
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:			ANO			☒ NE
4 Dopad do smluvních termínů:			ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)			☒ NE
5 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00		bez DPH	
	Cena víceprací (přípočet):	+	58 266,92		bez DPH	
	Výsledná ceny změny:		58 266,92		bez DPH	
6 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek					odst.	6
7 Schválil:						
za zhotovitele:		za TDS:		za AD:		za uživatele:
		Cejchan		Mubka		Bužek
						Mrazek
GEOSAN GROUP a.s.		CE-ING s.r.o.		Proxion s.r.o.		ON Náchod a.s.
						Královéhradecký kraj

SOUPIS PRACÍ - ZL 003 Přeložky rozvodů vody a kanalizace

Poř	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
SO 01: Zdravotní instalace					58 266,92	
713: Izolace tepelné					1 559,61	
1	Izolace potrubí TUBEX 22/10	m	15,0	50,38	755,70	SOD
3	Izolace potrubí TUBEX 28/10	m	15,0	50,38	755,70	SOD
11	Přesun hmot pro tepelné izolace	%	3,19	15,11	48,21	SOD
721: Vnitřní kanalizace					15 481,03	
1	Demontáž části stávajícího rozvodu kanalizace	hod	1,0	296,35	296,35	SOD
2	Úprava napojovacích bodů kanalizace	soubor	5,0	503,80	2 519,00	SOD
3	Podchycení stávající kanalizace	hod	2,0	296,35	592,70	SOD
4	Přepojovací práce	hod	3,0	296,35	889,05	SOD
5	Likvidace demontovaného materiálu	hod	1,0	296,35	296,35	SOD
21	Potrubí odpadní hrdlové zvukově izolující - DN 50	m	20,0	366,00	7 320,00	SOD
28	Zavěšení potrubí	m	10,0	181,52	1 815,20	SOD
29	Napojení na stávající potrubí	soubor	5,0	237,08	1 185,40	SOD
35	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech - podle ČSN 73 6760 - vodou, do DN 125	m	20,0	15,56	311,20	SOD
37	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace - výška do 6 m	%	1,68	152,25	255,78	SOD
722: Vnitřní vodovod					41 226,27	
1	Uzavření vodovodu vypuštění napuštění	hod	3,0	296,35	889,05	SOD
2	Demontáž části stávajícího rozvodu vodovodu	hod	3,0	296,35	889,05	SOD
3	Likvidace demontovaného materiálu	hod	1,0	296,35	296,35	SOD
6	Potrubí z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) - D 20x3,4	m	15,0	205,97	3 089,55	SOD
7	Potrubí z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) - D 25x4,2	m	15,0	251,90	3 778,50	SOD
12	Opravy vodovodního potrubí - propojení dosavadního potrubí	soubor	30,0	274,13	8 223,90	SOD
13	Opravy vodovodního potrubí - vsazení odbočky do potrubí	soubor	15,0	539,37	8 090,55	SOD
14	Opravy vodovodního potrubí - zazátkování vývodu	soubor	2,0	21,49	42,98	SOD
17	Montáž vodovodních armatur se dvěma závitů - ostatní, G 3/4 "	soubor	8,0	67,42	539,36	SOD
18	R250D Kulový kohout, PN 42, T 185 C, chromovaný 3/4" červený	kus	8,0	263,76	2 110,08	SOD
19	Montáž vodovodních armatur se dvěma závitů - ostatní, G 1 "	soubor	2,0	74,09	148,18	SOD
20	R250D Kulový kohout, PN 35, T 185 C, chromovaný 1" červený	kus	2,0	411,93	823,86	SOD
21	Montáž vodovodních armatur se dvěma závitů - ostatní, G 5/4 "	soubor	3,0	87,42	262,26	SOD
22	R250D Kulový kohout, PN 35, T 185 C, chromovaný 1 1/4" červený	kus	3,0	586,04	1 758,12	SOD
N	Montáž vodovodních armatur se dvěma závitů - ostatní, G 6/4 "	soubor	1,0	205,92	205,92	URS 2024_01*0,99
N	R250D Kulový kohout, PN 35, T 185 C, chromovaný 1 1/2" červený	kus	1,0	1 459,03	1 459,03	URS 2024_01*0,99
23	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí - potrubí závitové, do DN 50	m	30,0	17,78	533,40	SOD
24	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí - do DN 80	m	30,0	11,85	355,50	SOD
28	DG Přechodka PPr - pozink vnější - 25x3/4"	kus	11,0	74,09	814,99	SOD
29	DG Přechodka PPr - pozink vnější - 32x1"	kus	4,0	120,76	483,04	SOD
30	DG Přechodka PPr - pozink vnější - 40x5/4"	kus	6,0	326,73	1 960,38	SOD
N	DG Přechodka PPr - pozink vnější - 50x6/4"	kus	2,0	578,16	1 156,32	URS 2024_01*0,99
N	Montáž vodovodních armatur s jedním závitěm - ostatní, G 1/2 "	soubor	9,0	51,68	465,12	URS 2024_01*0,99
N	R608D, Vyp Kul koh , s hadicovou vývodkou a zátkou, PN 10, T 90°C, páčka 1/2"	kus	9,0	271,40	2 442,60	URS 2024_01*0,99
31	Přesun hmot pro vnitřní vodovod - výška do 6 m	%	1,0	408,18	408,18	SOD






OBJ. B - 1NP

- TV (3)

- SV (3)

ZDRAVOTNÍ TECHNIKA
vodovod




LEGENDA ZARÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

1. Voda
2. Kanalizace
3. Voda
4. Kanalizace
5. Voda
6. Kanalizace
7. Voda
8. Kanalizace
9. Voda
10. Kanalizace
11. Voda
12. Kanalizace
13. Voda
14. Kanalizace
15. Voda
16. Kanalizace
17. Voda
18. Kanalizace
19. Voda
20. Kanalizace
21. Voda
22. Kanalizace
23. Voda
24. Kanalizace
25. Voda
26. Kanalizace
27. Voda
28. Kanalizace
29. Voda
30. Kanalizace
31. Voda
32. Kanalizace
33. Voda
34. Kanalizace
35. Voda
36. Kanalizace
37. Voda
38. Kanalizace
39. Voda
40. Kanalizace
41. Voda
42. Kanalizace
43. Voda
44. Kanalizace
45. Voda
46. Kanalizace
47. Voda
48. Kanalizace
49. Voda
50. Kanalizace
51. Voda
52. Kanalizace
53. Voda
54. Kanalizace
55. Voda
56. Kanalizace
57. Voda
58. Kanalizace
59. Voda
60. Kanalizace
61. Voda
62. Kanalizace
63. Voda
64. Kanalizace
65. Voda
66. Kanalizace
67. Voda
68. Kanalizace
69. Voda
70. Kanalizace
71. Voda
72. Kanalizace
73. Voda
74. Kanalizace
75. Voda
76. Kanalizace
77. Voda
78. Kanalizace
79. Voda
80. Kanalizace
81. Voda
82. Kanalizace
83. Voda
84. Kanalizace
85. Voda
86. Kanalizace
87. Voda
88. Kanalizace
89. Voda
90. Kanalizace
91. Voda
92. Kanalizace
93. Voda
94. Kanalizace
95. Voda
96. Kanalizace
97. Voda
98. Kanalizace
99. Voda
100. Kanalizace

PROJEKTANT: ING. JAROMÍR DVOŘÁK
PROJEKT: ZDRAVOTNÍ TECHNIKA
MÍSTO: PAVILON "B" - VODOVOD
MĚŘITELSKÝ STAV: 1:50
DOKUMENTACE: 01.1.1.1

PROJEKTANT	ING. JAROMÍR DVOŘÁK
PROJEKT	ZDRAVOTNÍ TECHNIKA
MÍSTO	PAVILON "B" - VODOVOD
MĚŘITELSKÝ STAV	1:50
DOKUMENTACE	01.1.1.1
PROJEKTANT	ING. JAROMÍR DVOŘÁK
PROJEKT	ZDRAVOTNÍ TECHNIKA
MÍSTO	PAVILON "B" - VODOVOD
MĚŘITELSKÝ STAV	1:50
DOKUMENTACE	01.1.1.1

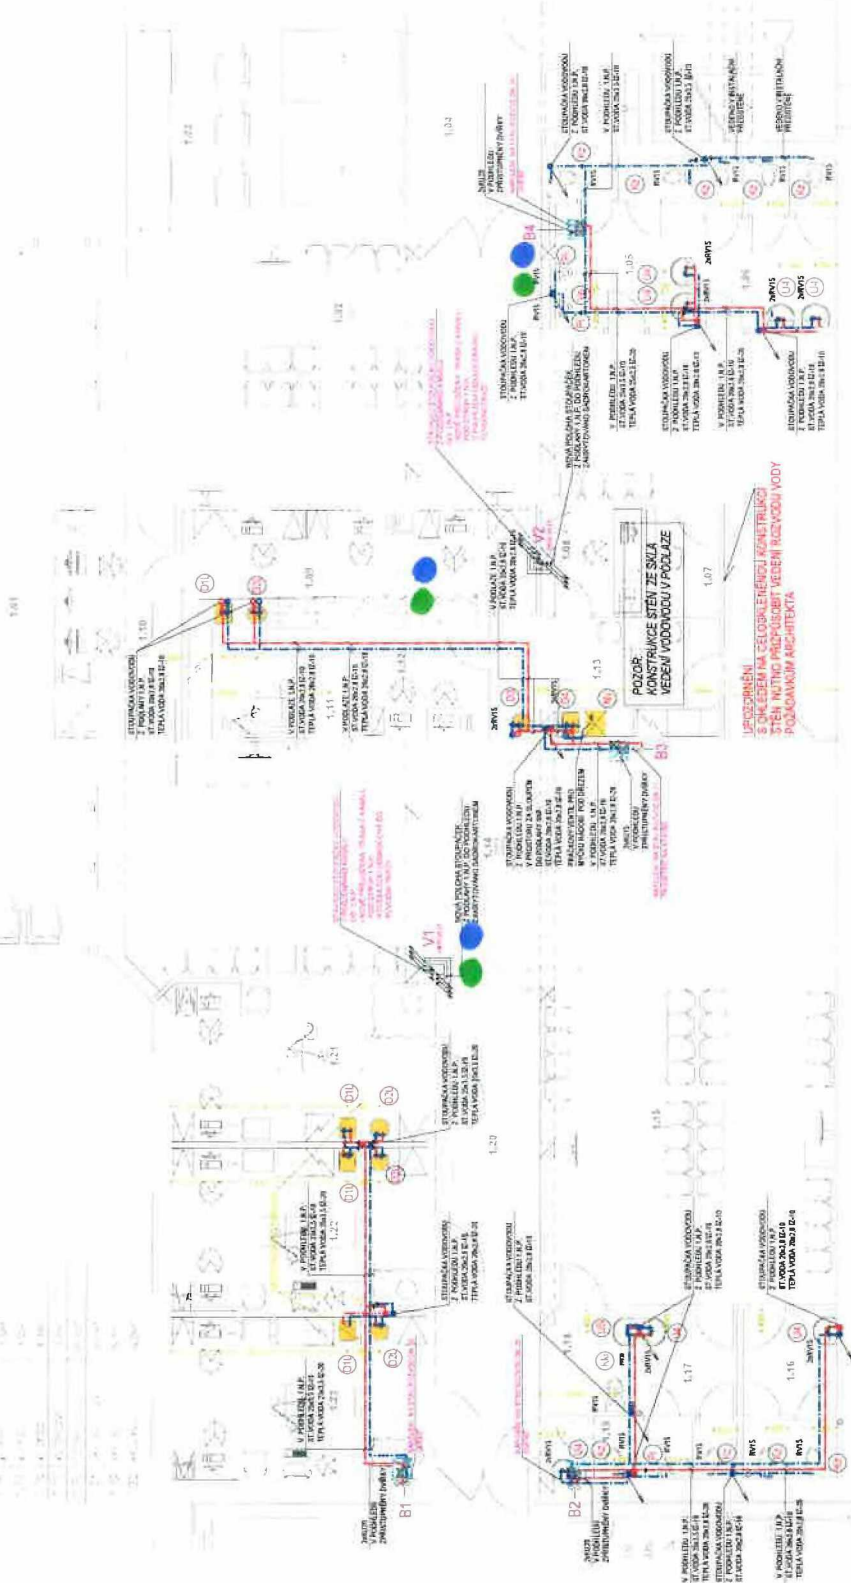


PAVILON "B"

OBJ. B - ENERGOKANÁL

ZDRAVOTNÍ TECHNIKA

vodovod

- - TV (7)
- - SV (9)
- - C (1)



LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- [illegible]

UPOZORNĚNÍ
K PROJEKTU NOVÉHO VODOVODU V PAVLOVU "B" DOJDE PO ROZKRYTÍ POHLEDU V J.N.P.
K PŘEDSTAVĚ TECHNICKÉHO STAVU STÁVAJÍCÍHO VSTŘIKOVÉHO RVSODU Z ODDAVKOVÝCH LETÍ. PRO J.N.P.
HOVÍ RVSOD STUJENKA A TĚLE VODY BUDE NÁPLEN NA STUJENCI (V PŘÍPADĚ NÁVYNOVÝCH TĚL STUJEN
NA REKONSTRUKČNÍ). PŮVNÍ RVSOD PŘES UZÁVĚRY PRO SUPPLEMENT UMÍSTI ZABEZPEČENÍ PŘESNĚTO
Z PŘÍSLUŠNÉHO REMONTNÍHOVOU.

[illegible]

PATLON 'A'

PAVILION "B"

PAVILION 'C'

ZMĚNOVÝ LIST					004A		
Osazení ventilů nutných pro uzavření vodovodních rozvodů pro stavbu							
Stavba:		Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod					
Objekt:		SO-01 Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B - 03 - ZTI					
Předkládá:		Společnost GEOSAN - BAK - Urgent Náchod			Datum: 21.03.2024		
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů					
poštou		1) Položkový rozpočet změny			1 listů		
e-mailem		2) Projektové podklady			2 listů, výkresů		
osobně		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy			0 listů		
1 Technický popis změny:							
1.1 Popis původního řešení: Neobsaženo							
1.2 Popis nového řešení: Provedení výměna ventilů na rozvodu teplé, studené a cirkulační vody v pavilonu A a B.							
2 Zdůvodnění změny: V průběhu provádění bouracích a stavebních prací byly zjištěny nefunkční a chybějící uzavírací ventily, kterými by se daly uzavřít rozvody studené, teplé a cirkulační vody v rekonstruovaných prostorech 1 a 2. NP. pavilonu A a v 1.NP. pavilonu B. Pro provádění bouracích prací a dále pro možnost úpravy rozvodů je nutné pro uzavření rozvodu vsadit uzavírací a vypouštěcí armatury za účelem zajištění dodávek vody v ostatních patrech předmětných pavilonů v průběhu provádění stavebních prací. Tyto uvedené práce vznikly v důsledku výše uvedených okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.							
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO			NE		
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)			NE		
5 Náklady:		Cena méněprací (odpočet):		—	0,00	bez DPH	
		Cena víceprací (přípočet):		+	31 539,57	bez DPH	
		Výsledná ceny změny:			31 539,57	bez DPH	
6 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek					odst. 6		
7 Schválil:							
za zhotovitele:		za TDS:		za AD:		za uživatele:	
[Signature]		[Signature]		[Signature]		[Signature]	
[Redacted Signature]							
GEOSAN GROUP a.s.		CE-ING s.r.o.		Proxion s.r.o.		ON Náchod a.s.	
						Královéhradecký kraj	

SOUPIS PRACÍ - ZL 004 A Osazení ventilů nutných pro uzavření vodovodních rozvodů pro stavbu

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO_01: Zdravotní instalace						31 539,57
SO_01: Výměna ventilu 1.NP rozvodna						11 916,92
722: Vnitřní vodovod						11 916,92
N	72223910	Montáž vodovodních armatur se dvěma závitů - ostatní, G 3/4 "	soubor	2,0	205,92	411,84 CS ÚRS 2024 01*0,99
N	GCM R911	R910 Kul kohout PN35 T 185 °C plnoprotokový, niki, páčka 1"1/2 červený	kus	1,0	1 409,92	1 409,92 CS ÚRS 2024 01*0,99
N	31942769	šroubení topenářské přímé mosaz 6/4"	kus	1,0	797,94	797,94 CS ÚRS 2024 01*0,99
N	72223910	Montáž vodovodních armatur se dvěma závitů - ostatní, G 2 "	soubor	2,0	247,50	495,00 CS ÚRS 2024 01*0,99
N	GCM R911	R910 Kul kohout PN35 T 185 °C plnoprotokový, niki, páčka 2" červený	kus	1,0	2 050,97	2 050,97 CS ÚRS 2024 01*0,99
N	31942770	šroubení topenářské přímé mosaz 2"	kus	1,0	1 326,60	1 326,60 CS ÚRS 2024 01*0,99
19	535Xh016	Montáž vodovodních armatur se dvěma závitů - ostatní, G 1 "	soubor	2,0	74,09	148,18 SOD
N	31942767	šroubení topenářské přímé mosaz 1"	kus	2,0	313,83	627,66 CS ÚRS 2024 01*0,99
N	73422012	Ventil závitový Heimeier STAD regulační přímý G1 PN 25 do 120°C vyvažovací s vypouštěním	kus	1,0	2 365,79	2 365,79 CS ÚRS 2024 01*0,99
28	531DG001	DG Přejchodka PPr - pozink vnější - 25x3/4"	kus	1,0	74,09	74,09 SOD
30	531DG001	DG Přejchodka PPr - pozink vnější - 40x5/4"	kus	1,0	326,73	326,73 SOD
N	72222023	DG Přejchodka PPr - pozink vnější - 50x6/4"	kus	1,0	794,97	794,97 CS ÚRS 2024 01*0,99
N	72222910	Montáž vodovodních armatur s jedním závitěm - ostatní, G 1/2 "	soubor	3,0	51,68	155,04 CS ÚRS 2024 01*0,99
N	GCM R608	R608D Vyp Kul kohout, s hadicovou vývodkou a zátkou, PN 10, T 90°C, páčka 1/2"	kus	3,0	271,40	814,20 CS ÚRS 2024 01*0,99
31	531A2003	Přesun hmot pro vnitřní vodovod - výška do 6 m	%	1,0	117,99	117,99

SO_02: Výměna ventilu 1.NP sklad

8 469,80

722: Vnitřní vodovod

8 469,80

17	535Xh016	Montáž vodovodních armatur se dvěma závitů - ostatní, G 3/4 "	soubor	2,0	67,42	134,84 SOD
N	GCM R911	R910 Kul kohout, PN42 T 185 °C plnoprotokový, niki, páčka 3/4" červený	kus	1,0	397,69	397,69 CS ÚRS 2024 01*0,99
N	31942766	šroubení topenářské přímé mosaz 3/4"	kus	1,0	198,00	198,00 CS ÚRS 2024 01*0,99
21	535Xh016	Montáž vodovodních armatur se dvěma závitů - ostatní, G 5/4 "	soubor	2,0	87,42	174,84 SOD
N	GCM R911	R910 Kul kohout PN35 T 185 °C, plnoprotokový, niki, páčka 1"1/4 červený	kus	1,0	893,30	893,30 CS ÚRS 2024 01*0,99
N	31942768	šroubení topenářské přímé mosaz 5/4"	kus	1,0	482,13	482,13 CS ÚRS 2024 01*0,99
N	72223910	Montáž vodovodních armatur se dvěma závitů - ostatní, G 6/4 "	soubor	2,0	205,92	411,84 CS ÚRS 2024 01*0,99
N	GCM R911	R910 Kul kohout, PN35 T 185 °C plnoprotokový, niki, páčka 1"1/2 červený	kus	1,0	1 409,92	1 409,92 CS ÚRS 2024 01*0,99
N	31942769	šroubení topenářské přímé mosaz 6/4"	kus	1,0	797,94	797,94 CS ÚRS 2024 01*0,99
28	531DG001	DG Přejchodka PPr - pozink vnější - 25x3/4"	kus	2,0	74,09	148,18 SOD
30	531DG001	DG Přejchodka PPr - pozink vnější - 40x5/4"	kus	2,0	326,73	653,46 SOD
N	72222023	DG Přejchodka PPr - pozink vnější - 50x6/4"	kus	2,0	794,97	1 589,94 CS ÚRS 2024 01*0,99
N	WVNSVEI	Ekoplastik ventil D20	kus	1,0	297,43	297,43 CS ÚRS 2024 01*0,99
N	WVNSVEI	Ekoplastik ventil D25	kus	2,0	396,22	796,44 CS ÚRS 2024 01*0,99
31	531A2003	Přesun hmot pro vnitřní vodovod - výška do 6 m	%	1,0	83,86	83,86 SOD

SO_03: Výměna ventilu 1.NP recepce

8 575,71

722: Vnitřní vodovod

8 575,71

17	535Xh016	Montáž vodovodních armatur se dvěma závitů - ostatní, G 3/4 "	soubor	1,0	67,42	67,42 SOD
N	31942766	šroubení topenářské přímé mosaz 3/4"	kus	1,0	198,00	198,00 CS ÚRS 2024 01*0,99
N	73422012	Ventil závitový Heimeier STAD regulační přímý G3/4 PN 25 do 120°C vyvažovací s vypouštěním	kus	1,0	2 119,47	2 119,47 CS ÚRS 2024 01*0,99
21	535Xh016	Montáž vodovodních armatur se dvěma závitů - ostatní, G 5/4 "	soubor	6,0	87,42	524,52 SOD
N	GCM R911	R910 Kul kohout, PN35 T 185 °C, plnoprotokový, niki, páčka 1"1/4 červený	kus	3,0	893,30	2 679,90 CS ÚRS 2024 01*0,99
N	31942768	šroubení topenářské přímé mosaz 5/4"	kus	3,0	482,13	1 446,39 CS ÚRS 2024 01*0,99
28	531DG001	DG Přejchodka PPr - pozink vnější - 25x3/4"	kus	2,0	74,09	148,18 SOD
30	531DG001	DG Přejchodka PPr - pozink vnější - 40x5/4"	kus	4,0	326,73	1 306,92 SOD
31	531A2003	Přesun hmot pro vnitřní vodovod - výška do 6 m	%	1,0	84,91	84,91 SOD

SO_04: Výměna ventilu 2.NP kulařák levá strana

2 577,14

722: Vnitřní vodovod

2 577,14

19	535Xh016	Montáž vodovodních armatur se dvěma závitů - ostatní, G 1 "	soubor	4,0	74,09	296,36 SOD
N	GCM R911	R910 Kul kohout, PN35 T 185 °C plnoprotokový, niki, páčka 1" červený	kus	1,0	622,97	622,97 CS ÚRS 2024 01*0,99
20	01-R250X	R250D Kulový kohout, PN 35 T 185 °C, chromovaný 1" červený	kus	1,0	411,93	411,93 SOD
N	31942767	šroubení topenářské přímé mosaz 1"	kus	2,0	313,83	627,66 CS ÚRS 2024 01*0,99
15	535Xh016	Montáž vodovodních armatur se dvěma závitů - ostatní, G 1/2 "	soubor	2,0	54,83	109,66 SOD
16	01-R250X	R250D Kulový kohout, PN 42 T 185 °C, chromovaný 1/2" červený	kus	-	169,66	0,00 SOD
N	31942765	šroubení topenářské přímé mosaz 1/2"	kus	-	128,70	0,00 CS ÚRS 2024 01*0,99
29	531DG001	DG Přejchodka PPr - pozink vnější - 32x1"	kus	4,0	120,76	483,04 SOD
27	531DG001	DG Přejchodka PPr - pozink vnější - 20x1/2"	kus	-	48,16	0,00 SOD
31	531A2003	Přesun hmot pro vnitřní vodovod - výška do 6 m	%	1,0	25,52	25,52 SOD


'A'



- TV (5)
- 2V (5)
- C (3)

ZDRAVOTNI TEHNIKA

vodovod

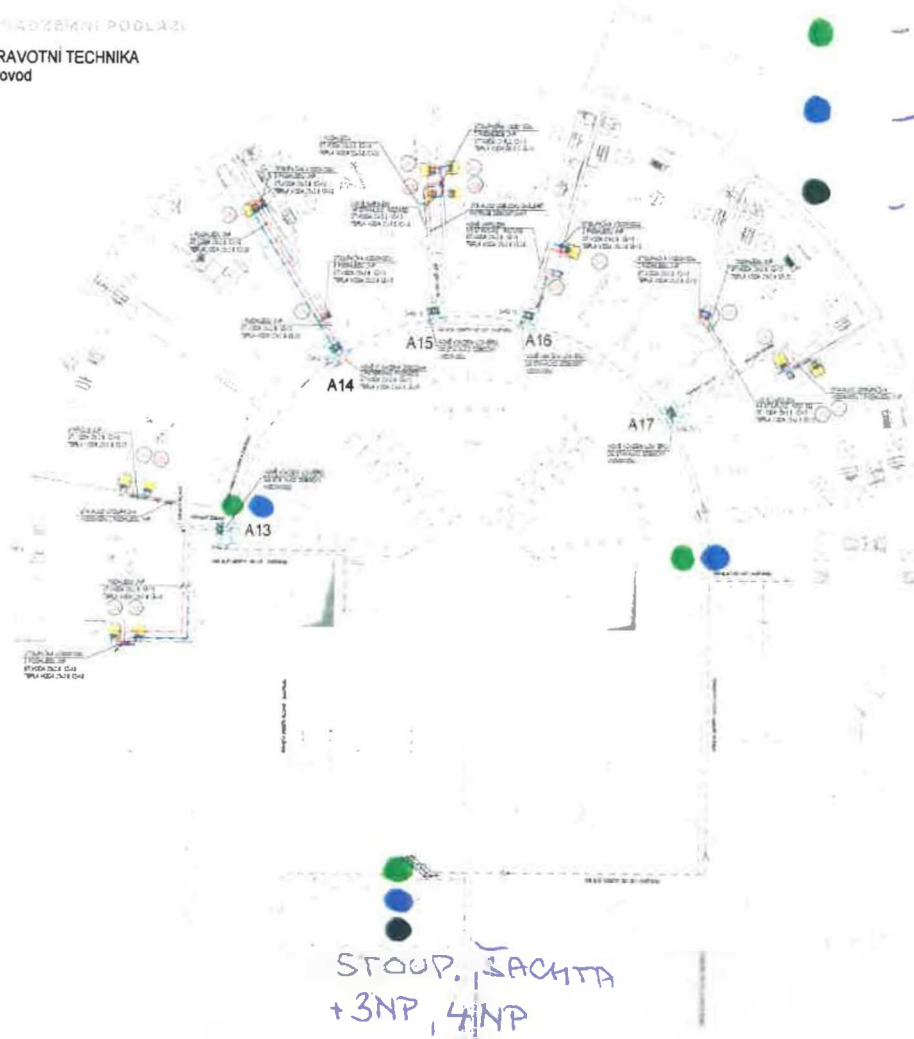

STOUP, 2 ACHTA
+ 3 NP, 4 NP


[illegible][illegible][illegible]

ZMĚNOVÝ LIST					004B	
Požadavek ON na výměnu vodovodních uzávěrů v horních patrech pavilonu A						
Stavba:		Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod				
Objekt:		SO-01 Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B - 03 - ZTI				
Předkládá:		Společnost GEOSAN - BAK - Urgent Náchod			Datum: 21.03.2024	
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů				
poštou		1) Položkový rozpočet změny			1	listů
e-mailem		2) Projektové podklady			1	listů, výkresů
osobně		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy			0	listů
1 Technický popis změny:						
1.1 Popis původního řešení: Nebylo předmětem zadávací dokumentace						
1.2 Popis nového řešení: Provedení výměna ventilů na rozvodu teplé, studené a cirkulační vody v pavilonu A						
2 Zdůvodnění změny: V souvislosti se změnou viz ZL 004A (Osazení ventilů nutných pro uzavření vodovodních rozvodů pro stavbu) a na základě požadavku uživatele je předmětem změnového listu výměna nefunkčních ventilů, kterými by se daly uzavřít rozvody studené, teplé a cirkulační vody v 2-4 NP. pavilonu A.						
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:			ANO			NE
4 Dopad do smluvních termínů:			ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)			NE
5 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00		bez DPH	
	Cena víceprací (přípočet):	+	57 093,83		bez DPH	
	Výsledná ceny změny:		57 093,83		bez DPH	
6 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek					odst.	4
7 Schválil:						
za zhotovitele:	za TDS:		za AD:	za uživatele:	za objednatele:	
	Cejchan		Hrbka	Bužek	Mrazek	
GEOSAN GROUP a.s.	CE-ING s.r.o.		Proxion s.r.o.	ON Náchod a.s.	Královéhradecký kraj	

SOUPIS PRACÍ - ZL 004B Požadavek ON na doplnění uzávěrů v horních patrech - možnost uzávěrů po patrech

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
SO_01: Zdravotní instalace						57 093,83	
SO_05: Výměna ventilu 2.NP kulaták pravá strana						4 451,53	
722: Vnitřní vodovod						4 451,53	
21	535Xh0160-008	Montáž vodovodních armatur se dvěma závitů - ostatní, G 5/4 "	soubor	4,0	87,42	349,68	SOD
N	GCM R910X026	R910 Kul kohout, PN35, T 185°C, pinoprutokový, nikl, páčka 1"1/4 červený	kus	2,0	893,30	1 786,60	CS ÚRS 2024 01*0,99
N	31942768	šroubení topenářské přímé mosaz 5/4"	kus	2,0	482,13	964,26	CS ÚRS 2024 01*0,99
30	531DG001-07	DG Přechodka PPR - pozink vnější - 40x5/4"	kus	4,0	326,73	1 306,92	SOD
31	531Az0030-002	Přesun hmot pro vnitřní vodovod - výška do 6 m	%	1,0	44,07	44,07	SOD
SO_06: Výměna ventilu 2 NP lékárna						21 125,24	
722: Vnitřní vodovod						21 125,24	
N	722239105	Montáž vodovodních armatur se dvěma závitů - ostatní, G 6/4 "	soubor	3,0	205,92	617,76	CS ÚRS 2024 01*0,99
N	GCM R910X027	R910 Kul kohout, PN35, T 185°C, pinoprutokový, nikl, páčka 1"1/2 červený	kus	1,0	1 409,92	1 409,92	CS ÚRS 2024 01*0,99
N	31942769	šroubení topenářské přímé mosaz 6/4"	kus	1,0	797,94	797,94	CS ÚRS 2024 01*0,99
N	X633618	Mosazné šroubení rohové 6/4"	kus	1,0	374,40	374,40	R
N	722239106	Montáž vodovodních armatur se dvěma závitů - ostatní, G 2 "	soubor	4,0	247,50	990,00	CS ÚRS 2024 01*0,99
N	GCM R910X028	R910 Kul kohout, PN35, T 185°C, pinoprutokový, nikl, páčka 2" červený	kus	1,0	2 050,97	2 050,97	CS ÚRS 2024 01*0,99
N	31942770	šroubení topenářské přímé mosaz 2"	kus	1,0	1 326,60	1 326,60	CS ÚRS 2024 01*0,99
N	31942779	šroubení topenářské rohová mosaz 2"	kus	2,0	1 890,90	3 781,80	CS ÚRS 2024 01*0,99
19	535Xh0160-006	Montáž vodovodních armatur se dvěma závitů - ostatní, G 1 "	soubor	2,0	74,09	148,18	SOD
N	31942767	šroubení topenářské přímé mosaz 1"	kus	2,0	313,83	627,66	CS ÚRS 2024 01*0,99
N	734220124 IMI	Ventil závitový Heimeier STAD regulační přímý G1 FN 25 do 120°C vyvažovací s vypouštěním	kus	1,0	2 365,79	2 365,79	CS ÚRS 2024 01*0,99
N	722220236R	DG Přechodka PPR - pozink vnější - 63x2"	kus	4,0	1 148,40	4 593,60	CS ÚRS 2024 01*0,99
N	722220235R	DG Přechodka PPR - pozink vnější - 50x6/4"	kus	2,0	794,97	1 589,94	CS ÚRS 2024 01*0,99
29	531DG001-06	DG Přechodka PPR - pozink vnější - 32x1"	kus	2,0	120,76	241,52	SOD
31	531Az0030-002	Přesun hmot pro vnitřní vodovod - výška do 6 m	%	1,0	209,16	209,16	SOD
SO_07: Výměna ventilu 3.NP						18 733,20	
722: Vnitřní vodovod						18 733,20	
N	722239105	Montáž vodovodních armatur se dvěma závitů - ostatní, G 6/4 "	soubor	4,0	205,92	823,68	CS ÚRS 2024 01*0,99
N	GCM R910X027	R910 Kul kohout, PN35, T 185°C, pinoprutokový, nikl, páčka 1"1/2 červený	kus	2,0	1 409,92	2 819,84	CS ÚRS 2024 01*0,99
N	31942769	šroubení topenářské přímé mosaz 6/4"	kus	2,0	797,94	1 595,88	CS ÚRS 2024 01*0,99
N	722239106	Montáž vodovodních armatur se dvěma závitů - ostatní, G 2 "	soubor	2,0	247,50	495,00	CS ÚRS 2024 01*0,99
N	GCM R910X028	R910 Kul kohout, PN35, T 185°C, pinoprutokový, nikl, páčka 2" červený	kus	1,0	2 050,97	2 050,97	CS ÚRS 2024 01*0,99
N	31942770	Mosazné šroubení přímé 2"	kus	1,0	1 326,60	1 326,60	CS ÚRS 2024 01*0,99
21	535Xh0160-008	Montáž vodovodních armatur se dvěma závitů - ostatní, G 5/4 "	soubor	1,0	87,42	87,42	SOD
N	31942768	šroubení topenářské přímé mosaz 5/4"	kus	1,0	482,13	482,13	CS ÚRS 2024 01*0,99
N	734220124 IMI	Ventil závitový Heimeier STAD regulační přímý G5/4 FN 25 do 120°C vyvažovací s vypouštěním	kus	1,0	2 736,06	2 736,06	CS ÚRS 2024 01*0,99
30	531DG001-07	DG Přechodka PPR - pozink vnější - 40x5/4"	kus	2,0	326,73	653,46	SOD
N	722220235R	DG Přechodka PPR - pozink vnější - 50x6/4"	kus	4,0	794,97	3 179,88	CS ÚRS 2024 01*0,99
N	722220236R	DG Přechodka PPR - pozink vnější - 63x2"	kus	2,0	1 148,40	2 296,80	CS ÚRS 2024 01*0,99
31	531Az0030-002	Přesun hmot pro vnitřní vodovod - výška do 6 m	%	1,0	185,48	185,48	SOD
SO_08: Výměna ventilu 4.NP						12 783,86	
722: Vnitřní vodovod						12 783,86	
N	722239105	Montáž vodovodních armatur se dvěma závitů - ostatní, G 6/4 "	soubor	4,0	205,92	823,68	CS ÚRS 2024 01*0,99
N	GCM R910X027	R910 Kul kohout, PN35, T 185°C, pinoprutokový, nikl, páčka 1"1/2 červený	kus	2,0	1 409,92	2 819,84	CS ÚRS 2024 01*0,99
N	31942769	šroubení topenářské přímé mosaz 6/4"	kus	2,0	797,94	1 595,88	CS ÚRS 2024 01*0,99
21	535Xh0160-008	Montáž vodovodních armatur se dvěma závitů - ostatní, G 5/4 "	soubor	3,0	87,42	262,26	SOD
N	GCM R910X026	R910 Kul kohout, PN35, T 185°C, pinoprutokový, nikl, páčka 1"1/4 červený	kus	1,0	893,30	893,30	CS ÚRS 2024 01*0,99
6	31942768	šroubení topenářské přímé mosaz 5/4"	kus	2,0	482,13	964,26	CS ÚRS 2024 01*0,99
19	535Xh0160-006	Montáž vodovodních armatur se dvěma závitů - ostatní, G 1 "	soubor	2,0	73,22	146,43	SOD
N	31942767	šroubení topenářské přímé mosaz 1"	kus	2,0	313,83	627,66	CS ÚRS 2024 01*0,99
8	734220124 IMI	Ventil závitový Heimeier STAD regulační přímý G1 PN 25 do 120°C vyvažovací s vypouštěním	kus	1,0	2 365,79	2 365,79	CS ÚRS 2024 01*0,99
29	531DG001-06	DG Přechodka PPR - pozink vnější - 32x1"	kus	2,0	120,76	241,52	SOD
30	531DG001-07	DG Přechodka PPR - pozink vnější - 40x5/4"	kus	1,0	326,73	326,73	SOD
N	722220235	DG Přechodka PPR - pozink vnější - 50x6/4"	kus	2,0	794,97	1 589,94	CS ÚRS 2024 01*0,99
31	531Az0030-002	Přesun hmot pro vnitřní vodovod - výška do 6 m	%	1,0	126,57	126,57	SOD

- - TV (5)
- - 2V (5)
- - C (3)

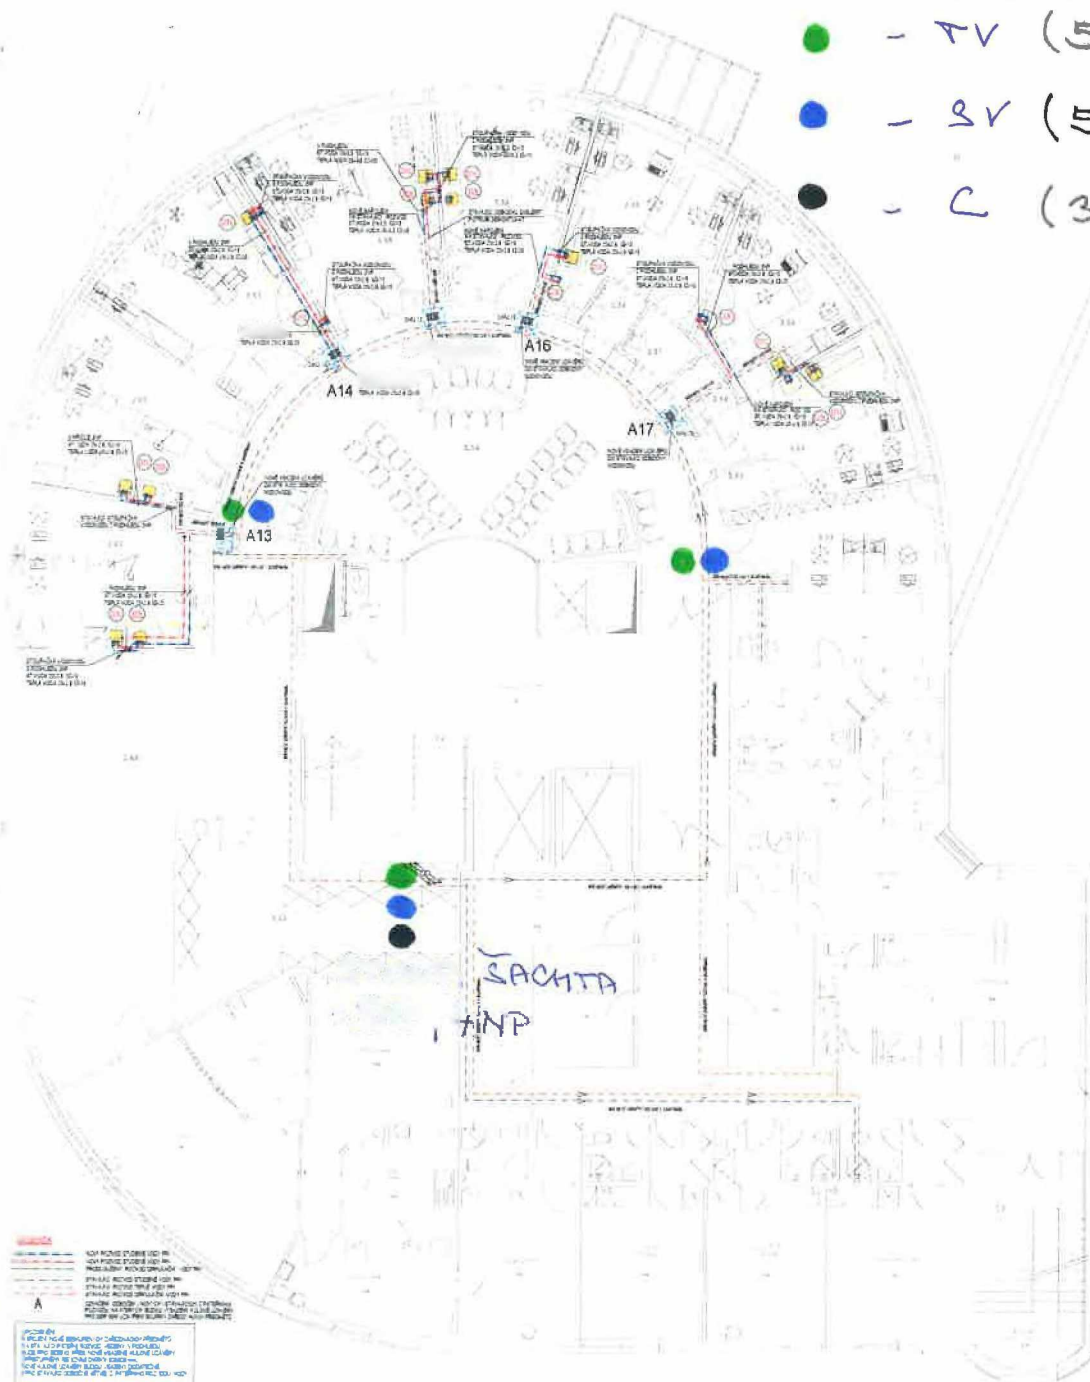

- [illegible]

SINCLAIR[illegible][illegible]

ZMĚNOVÝ LIST

005

Demontáž a zpětná montáž stávajících radiátorů

Stavba:	Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod		
Objekt:	SO-01 Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B - 04 UT		
Předkládá:	Společnost GEOSAN - BAK - Urgent Náchod	Datum:	20.03.2024

Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů	
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem		2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy	2 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

V projektové dokumentaci nebylo uvažováno, bylo uvažováno pouze se zakrytím

1.2 Popis nového řešení:

Demontáž a zpětná montáž stávajících otopných těles v 1 a 2 NP. pavilonu A včetně jejich převozu a uskladnění.

2 Zdůvodnění změny:

Z důvodu provádění oprav a odstranění omítek a obkladů za otopnými tělesy, je nutné stávající tělesa určená pro další provoz zdemontovat, uskladnit a opět osadit v čase dokončení všech povrchových úprav stěn. Tímto řešením budou tělesa i bezpečněji uchráněna při provádění stavebních prací pro zpětné využití. Tyto uvedené práce vznikly v důsledku výše uvedených okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO		NE
---	--	-----	--	----

4 Dopad do smluvních termínů:		ANO		NE
(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)				

5 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	-2 346,14	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	52 718,98	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		50 372,84	bez DPH

6 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	6
---	-------	---

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za TDS - specialistu:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
	Cejchan		Hubka		Mražel
GEOSAN GROUP a.s.	GE-ING s.r.o.		Proxion s.r.o.	ON Náchod a.s.	Královéhradecký kraj

URGENTNÍ PŘÍJEM Přístavba a stavební úpravy části pavilonu A" a "B"**DÍL: VYTÁPĚNÍ**

Vypracoval: ing. Jiří Bohadlo

11.08.23

kód	popis výkonu	m.j.	množství	jedn. cena	Cena
-----	--------------	------	----------	------------	------

Rekapitulace nákladů DÍL: VYTÁPĚNÍ**Vytápění objektu "A"**

735 Ústřední vytápění otopná tělesa	52 718,98
HZS hodinové zúčtovací sazby - zkoušky	-2 346,14
Celkem vytápění objektu "A"	50 372,84

Vytápění objektu "A"**735- Ústřední vytápění - otopná tělesa**

	demontáž deskových těles	ks	37,00	105,58	3 906,46
735-9220	montáž těles panelových douřadých stavební délka přes 1140 mm do 1500 mm	ks	37,00	975,21	36 082,77
	Odvoz, uskladnění a zpětný návoz deskových radiátorů	ks	37,00	300,00	11 100,00
99873-4201	přesun hmot do 6 m výšky	%	3,19	510,89	1 629,75
	734- Ústřední vytápění - otopná tělesa celkem				52 718,98


HZS - hodinové zúčtovací sazby - zkoušky

zabezpečení těles proti znečištění ochrannou folií	ks	-1,00	2 346,14	-2 346,14
--	----	-------	----------	-----------

HZS - hodinové zúčtovací sazby - zkoušky celkem	-2 346,14
--	------------------

V

1.NADZEMNÍ PODLAŽÍ

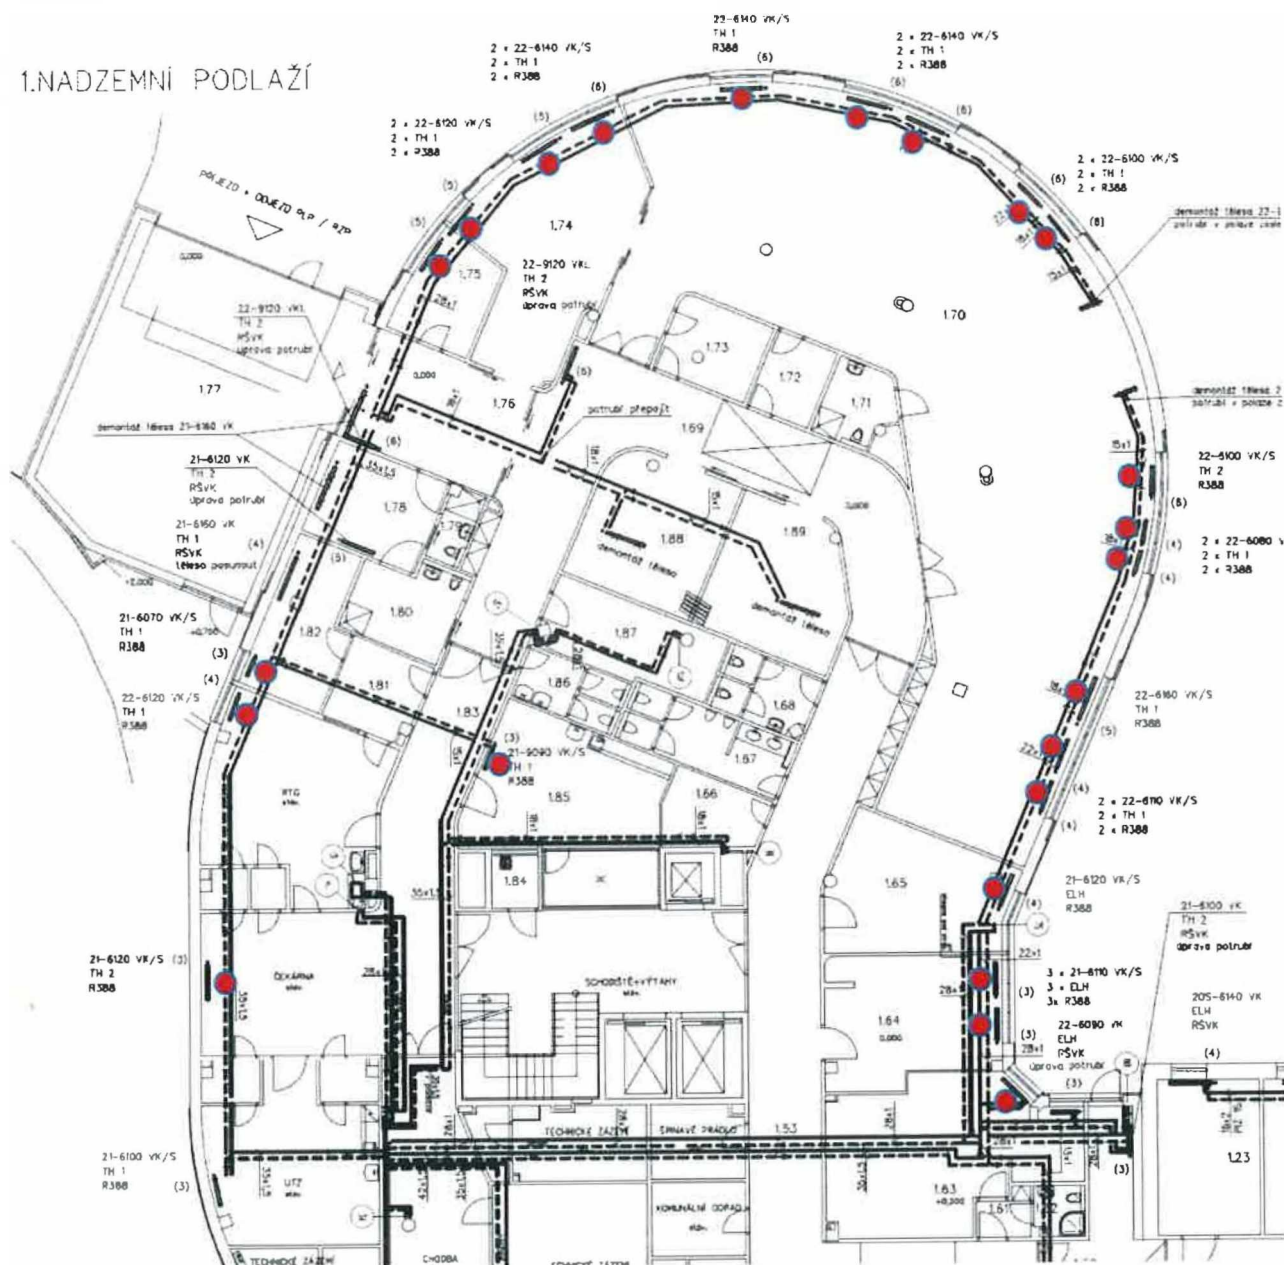

1NP pavilon A

ZMĚNOVÝ LIST				006	
Skutečné provedení délek pilot					
Stavba:		Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod			
Objekt:		SO-04 - Venkovní betonové konstrukce			
Předkládá:		Společnost GEOSAN - BAK - Urgent Náchod		Datum: 27.03.2024	
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny		1 listů	
e-mailem		2) Projektové podklady		0 listů, výkresů	
osobně		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy		1 listů	
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení: Délka pilot včetně výztuže dle projektové dokumentace pro provádění stavby					
1.2 Popis nového řešení: Skutečná délka pilot dle protokolů dodavatele o provedení vrtaných pilot, hmotnost výztuže pilot dle skutečnosti					
2 Zdůvodnění změny:					
Předmětem změnového listu je navýšení délek vrtaných pilot na základě vyhodnocení skutečné geologie při vrtání. Navýšení délek vrtaných pilot a jejich zřízení vychází z protokolů o provedení vrtaných pilot. Viz Příloha č. 2 ZL, dále je předmětem tohoto změnového listu skutečná dodávka a montáž výztuže pilot na podkladu předložené dílenské dokumentace armaturní výztuže pilot.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO		☒ NE	
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení doby smluvního termínu)		☒ NE	
5 Náklady:					
		Cena méněprací (odpočet):	-	-41 615,02	bez DPH
		Cena víceprací (přípočet):	+	155 537,42	bez DPH
		Výsledná ceny změny:		113 922,40	bez DPH
6 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek					odst. 4
7 Schválil:					
za zhotovitele:	za TDS:	za TDS - specialistu:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
GEOSAN GROUP a.s.	CEJING s.r.o.		Proxion s.r.o.	ON Náchod a.s.	Královéhradecký kraj

SOUPIS PRACÍ - ZL 006 Skutečné provedení dělek pilot

Stavba

ON Náchod Urgentní příjem

Objekt:

SO-04 - Venkovní betonové konstrukce

Soupis:

02 - Zastřešení chodníku

Místo: Náchod

Datum: 27 03 2024

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel: Společnost GEOSAN – BAK – Urgent Náchod

Zpracovatel Společnost GEOSAN – BAK – Urgent Náchod

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							113 922,40	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				113 922,40	
D	1		Zemní práce				19 267,39	
30	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	16 804	443 16	7 446 86	SOD
	VV		$((0,75/2)*((0,75/2)*8+((0,9/2)*((0,9/2)*0,9)*3,14*16$		65 676			
			Skutečnost viz příloha		82 480	82 48		
			Celkem		16 804			
32	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	100,824	32,65	3 291 90	SOD
	VV		*6 Přepočtené koeficientem množství		100 824			
31	K	171201221	Poplatek za uložení na skladce (skladkovně) zeminy a kamení kod odpadu 17 05 04	t	26 886	317 21	8 528 63	SOD
	VV		*1 6 Přepočtené koeficientem množství		26 886			
D	2		Zakládání				80 083,00	
34	K	226212712	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 650 do 850 mm hl od 0 do 20 m hornina II	m	18 800	1 931,24	36 307,31	SOD
	VV		*1 6		128 000			
			Skutečnost viz příloha		146 800			
			Celkem		18 800			
28	K	226213312	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 850 do 1050 mm hl od 0 do 20 m hornina II	m	1 800	2 015,21	3 627,38	SOD
	VV		Původní 0,5*1 6		14 400			
			Skutečnost viz příloha		16,200			
			Celkem		1 800			
1	K	231211313	Zřízení pilot svislých zapažených D přes 650 do 1250 mm hl od 0 do 30 m s vytažením pažnic z betonu prostého	m	20,600	335,87	6 918,92	SOD
			původní		142 400			
			Skutečnost viz příloha		163 000			
	VV		celkem		20 600			
2	M	58932935	beton C 25/30 XF1 XA1 kamenivo frakce 0/8	m3	14,074	5 317,92	74 844,41	SOD
	VV		$((0,75/2)*((0,75/2)*8+((0,9/2)*((0,9/2)*0,9)*3,14*16$		65 676			
			Skutečnost viz příloha		79 750			
			Celkem		14 074			
3	K	231611114	Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505	t	-1 622	25 656,61	-41 615,02	SOD
	VV		$((100*65 676)/1000$		6 568			
			Výrobní PD 3,671 + patky 1,063+prodloužení 0,212		4 946			
					-1,622			
D	998		Přesun hmot				14 572,01	
29	K	998001011	Přesun hmot pro piloty nebo podzemní stěny betonované na místě	t	32,382	450,00	14 572,01	SOD

Tabulka odvrtných pilot - sumář

Stavba: Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod

Označní piloty	počet pilot	Délka piloty dle skutečnosti /m/	Délka předvrtu /m/	Délka vrtu /m/	Beton /m3/ piloty	Beton /m3/ patky	Celkem Beton /m3/	Výkopek /m3/
1	1	12,50	1,00	13,50	7,60	0,55	8,15	8,21
2	1	12,50	1,00	13,50	7,60	0,55	8,15	8,21
3	1	8,60	1,20	9,80	5,23	0,55	5,78	5,96
4	1	8,60	1,30	9,90	5,23	0,55	5,78	6,33
6	1	9,10	1,40	10,50	5,53	0,55	6,08	6,38
7	1	9,10	1,40	10,50	5,53	0,55	6,08	6,38
11	1	9,10	1,40	10,50	5,53	0,55	6,08	6,38
13	1	8,60	1,40	10,00	5,23	0,55	5,78	6,08
12	1	8,60	0,00	8,60	2,60	0,55	3,14	3,14
8	1	8,60	1,30	9,90	2,60	0,55	3,14	3,39
5	1	8,60	1,20	9,80	2,60	0,55	3,14	3,32
14	1	8,60	1,20	9,80	2,60	0,55	3,14	3,32
16	1	8,30	0,00	8,30	2,50	0,55	3,05	3,05
10	1	8,60	1,20	9,80	2,60	0,55	3,14	3,32
9	1	9,10	1,20	10,30	5,53	0,55	6,08	6,29
15	1	8,30	0,00	8,30	2,50	0,55	3,05	3,05
		146,80	16,20	163,00	70,99	8,75	79,74	88,88


ZMĚNOVÝ LIST					007													
Bourání podlahy původní přístavby garáží pavilon B																		
Stavba:		Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod																
Objekt:		SO-01 Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B, 01 Bourací práce																
Předkládá:		Společnost GEOSAN - BAK - Urgent Náchod			Datum: 21.03.2024													
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů																
poštou	☐	1) Položkový rozpočet změny			1	listů												
e-mailem	☒	2) Projektové podklady			0	listů, výkresů												
osobně	☐	3) Fotodokumentace a ostatní přílohy			1	listů												
1 Technický popis změny:																		
1.1 Popis původního řešení: Odstranění železobetonové betonové podlahy původní přístavby garáží pavilon B nebyly zahrnuty ve výkazu výměr																		
1.2 Popis nového řešení: Doplnění položek na odstranění železobetonové podlahy původní přístavby garáží pavilon B.																		
2 Zdůvodnění změny:																		
Předmět změnového listu je doplnění chybějících položek soupisu stavebních prací týkajících se odstranění ŽB podlahy původní přístavby garáží pavilon B v místě budoucí přístavby proskleného urgentního vstupu. Tyto uvedené vícepráce vznikly v důsledku výše uvedených okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.																		
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		☐ ANO			☒ NE													
4 Dopad do smluvních termínů:		☐ ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)			☒ NE													
5 Náklady:		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">Cena méněprací (odpočet):</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">–</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0,00</td> <td style="width: 30%;">bez DPH</td> </tr> <tr> <td>Cena víceprací (přípočet):</td> <td style="text-align: center;">+</td> <td style="text-align: right;">80 604,35</td> <td>bez DPH</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Výsledná ceny změny:</td> <td style="text-align: right;">80 604,35</td> <td>bez DPH</td> </tr> </table>					Cena méněprací (odpočet):	–	0,00	bez DPH	Cena víceprací (přípočet):	+	80 604,35	bez DPH	Výsledná ceny změny:		80 604,35	bez DPH
Cena méněprací (odpočet):	–	0,00	bez DPH															
Cena víceprací (přípočet):	+	80 604,35	bez DPH															
Výsledná ceny změny:		80 604,35	bez DPH															
6 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek					odst. 6													
7 Schválil:																		
za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:														
GEOSAN GROUP a.s.	CEJING s.r.o.	Proxion s.r.o.	ON Náchod a.s.	Královéhradecký kraj														

SOUPIS PRACÍ - ZL 07 Bourání podlahy původní přístavby garáží pavilon B

Stavba: ON Náchod Urgentní příjem
Objekt: SO-01 - Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B
Soupis: 01 - Bourací práce

Místo: Náchod Datum: 21.03 2024
Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: PROXION s.r.o
Zhotovitel: Společnost GEOSAN – BAK – Urgent Náchod Zpracovatel: Společnost GEOSAN – BAK – Urgent Náchod

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							80 604,35	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				80 604,35	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				52 247,80	
N	K	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	11 205	2 979,90	33 389,78	CS ÚRS 2024 01*0.99_
			4 5x8 3x0 3					
N	K	965049112	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl přes 100 mm	m3	11 205	1 683,00	18 858,02	CS ÚRS 2024 01*0.99_
			4 5x8 3x0 3					
D		997	Přesun sutě				28 356,55	
15	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	24,651	340,26	8 387,75	SOD
16	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	24,651	219,52	5 411,39	SOD
17	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	147,906	25,25	3 734,63	SOD
	VV		hmotnosti*6 Přepočtené koeficientem množství		147 906			
18	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	24,651	439,04	10 822,78	SOD

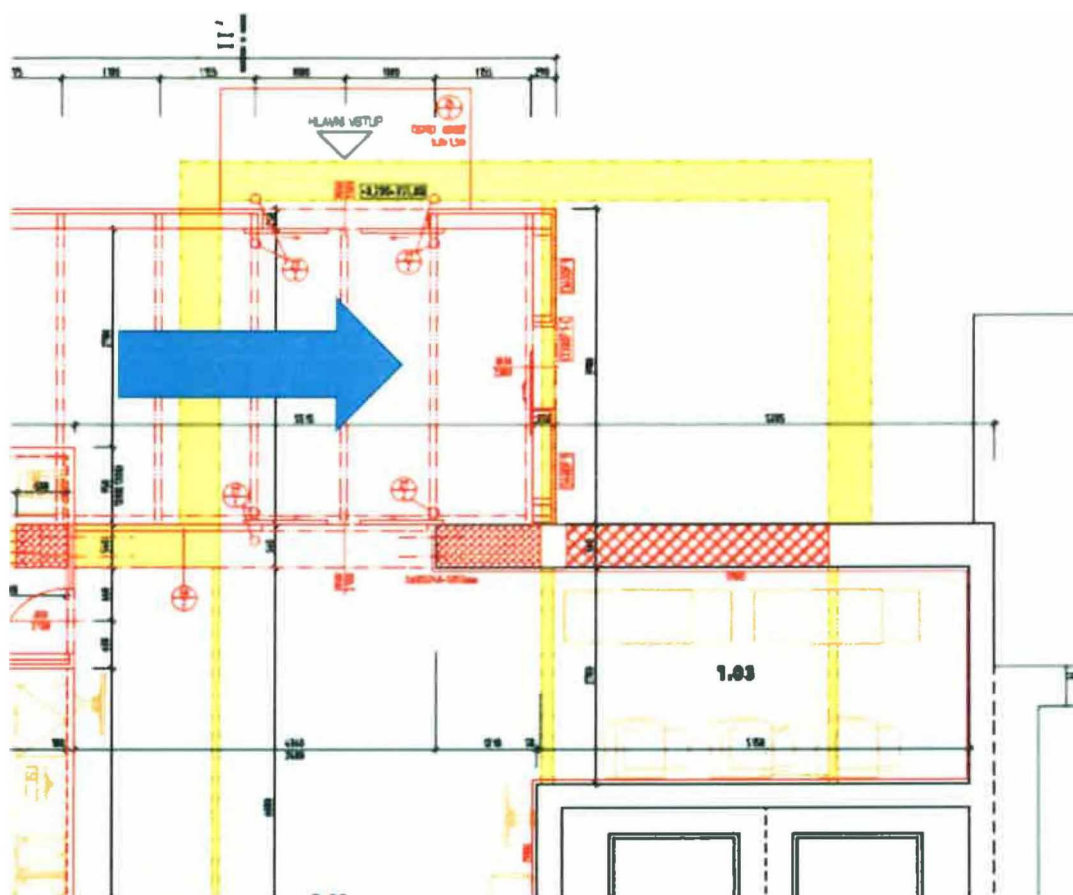

ZMĚNOVÝ LIST

008

Provozní alarm medicijních plynů

Stavba:	Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod		
Objekt:	SO-01 Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B , 11 - Medicijní plyny rozvody		
Předkládá:	Společnost GEOSAN - BAK - Urgent Náchod	Datum:	22.04.2024

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1 listy
e-mailem		2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy	0 listů

1 Technický popis změny:			
1.1 Popis původního řešení:			
V dokumentaci pro provádění stavby zakresleno 5 sestav provozních alarmů medicijních plynů, v soupise stavebních prací uvedeny 4 sestavy			
1.2 Popis nového řešení:			
Doplnění sestav provozního alarmu medicijních plynů			




2 Zdůvodnění změny:			
Výše uvedené sestavy provozního alarmu jsou zakresleny v PD , ale chybějí v soupise stavebních prací - (v soupise stavebních prací včetně výkazu výměr jsou uvedeny pouze 4 ks pro každý plyn, správně má být 5 sestav jak je uvedeno v projektové dokumentaci pro provádění stavby).			

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO	☒ NE
---	--	-----	--

4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	☒ NE
-------------------------------	--	--	--

5 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	24 188,80	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		24 188,80	bez DPH

6 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	6
---	-------	---

7 Schválil:					
za zhotovitele:	za TDS:		za AD:	za uživatele:	za objednatele:
					
					
GEOSAN GROUP a.s.			Proxion s.r.o.	ON Náchod a.s.	Královéhradecký kraj

Akce:				
URGENTNÍ PŘÍJEM – PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI PAVILONU "A" A PAVILONU "B"				
Investor:				
Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové				
Část projektu:				
D.1.4.10 - Medicinální plyn				
ZL 14 Provozní alarm medicijních plynů				

Položky	Celk.počet	m.j.	JC (dodávka, montáž)	Cena Kč
Potrubní rozvod				
Sestava provozního alarmu pro O ₂ :				
- uzavírací ventil DN 6	1	ks	7 786,66 Kč	7 786,66 Kč
- kontrolní manometr, měřící rozsah 0-1 MPa				
- čidlo provozního alarmu s výstupem 4-20 mA				
- propojovací "kostka"				
Sestava provozního alarmu pro Air4bar:				
- uzavírací ventil DN 6	1	ks	7 786,66 Kč	7 786,66 Kč
- kontrolní manometr, měřící rozsah 0-1 MPa				
- čidlo provozního alarmu s výstupem 4-20 mA				
- propojovací "kostka"				
Sestava provozního alarmu pro Vac:				
- uzavírací ventil DN 6	1	ks	7 526,52 Kč	7 526,52 Kč
- kontrolní manometr, měřící rozsah -100-0 kPa				
- čidlo provozního alarmu s výstupem 4-20 mA				
- propojovací "kostka"				
Cena - Potrubní rozvod				23 099,84 Kč
Montáže, revize, zkoušky				
Revize, zk dle ČSN EN 7396-1 ed.2, zkoušky dle LEK	1	ks	162,90 Kč	162,90 Kč
Uvedení do provozu, provozní zkoušky, zkušební provoz	1	ks	37,63 Kč	37,63 Kč
Zaškolení obsluhy	1	ks	19,92 Kč	19,92 Kč
Přesun hmot (doprava materiálu)	1	ks	868,51 Kč	868,51 Kč
Cena - Montáže, revize, zkoušky				1 088,96 Kč
Celková cena bez DPH				24 188,80 Kč

ZMĚNOVÝ LIST					009	
Doplnění schodišťových stupňů						
Stavba:		Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod				
Objekt:		SO-01 Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B				
Předkládá:		Společnost GEOSAN - BAK - Urgent Náchod			Datum: 05.04.2024	
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů				
poštou		1) Položkový rozpočet změny			1 listů	
e-mailem		2) Projektové podklady			listů, výkresů	
osobně		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy			listů	
1 Technický popis změny:						
1.1 Popis původního řešení:						
Provedení dle PD						
1.2 Popis nového řešení:						
Doplnění chybějících kusů prefabrikátů schodiště						
2 Zdůvodnění změny:						
Chyba v rozpočtu.						
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:			ANO			NE
4 Dopad do smluvních termínů:			ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)			NE
5 Náklady:		Cena méněprací (odpočet):		–	0,00	bez DPH
		Cena víceprací (přípočet):		+	32 918,90	bez DPH
		Výsledná ceny změny:			32 918,90	bez DPH
6 Schválil:						
za zhotovitele:		za TDS:		za TDS - specialistu:		za AD:
		[Signature]				[Signature]
GEOSAN GROUP a.s.		CE-ING s.r.o.		Proxion s.r.o.		ON Náchod a.s.
						Královéhradecký kraj

SOUPIS PRACÍ - ZL 009 Doplnění schodišťových stupňů

Stavba:

ON Náchod Urgentní příjem

Objekt:

SO-04 - Venkovní betonové konstrukce

Soupis:

01 - Opěrné stěny, schodiště

Místo:	Náchod	Datum:	30.05.2024
Zadavatel:	Královéhradecký kraj	Projektant:	
Uchazeč:	Společnost GEOSAN – BAK – Urgent Náchod	Zpracovatel:	Společnost GEOSAN – BAK – Urgent Náchod

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							32 918,90	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				32 918,90	
D	4		Vodorovné konstrukce				31 306,90	
34	M	008R	standardní stupeň nosný ŽB 100x35x16cm	kus	31,000	1 009,90	31 306,90	SOD
	VV		"viz venkovní schodiště SCH2 2" 7		7,000			
D	998		Přesun hmot				1 612,00	
63	K	998021021	Přesun hmot pro hal s nosnou kcí zděnou nebo monolitickou v do 20 m	t	3 100	400,00	1 240,00	SOD
64	K	998021024	Příplatek k přesunu hmot hal s nosnou kcí zděnou nebo monolitickou za zvětšený přesun do 500 m	t	3 100	120,00	372,00	SOD

ZMĚNOVÝ LIST					010	
Záporové pažení pro přístavbu pavilonu A						
Stavba:		Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod				
Objekt:		SO-01 - Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B				
Předkládá:		Společnost GEOSAN - BAK - Urgent Náchod			Datum: 19.05.2024	
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů				
poštou		1) Položkový rozpočet změny			3 listů	
e-mailem		2) Projektové podklady			0 listů, výkresů	
osobně		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy			1 listů	
1 Technický popis změny:						
1.1 Popis původního řešení:						
PD řešeno svahováním						
1.2 Popis nového řešení:						
Zajištění stavební jámy pro výstavbu přístavby pavilonu L je navrženo za pomoci mikrozáporové stěny výšky 5 m, délky 10,5 m, která je tvořena 8 ks vrtanými záporami HEB 160, 4 dočasnými pramencovými kotvami, převázkami a dřevěnými pažinami tl. 100 mm.						
2 Zdůvodnění změny:						
V průběhu provádění odkopávek svahu na hloubku 5 m pro přístavbu pavilonu A a to v blízkosti obslužné, přístupové komunikace k pavilonu K, A, E, D, bylo generálním dodavatelem stavby upozorněno na možnost sesunutí tohoto silničního tělesa včetně nesoudržného svahu do prostoru budoucí přístavby. Aby při dalším odkopávání na požadovaný prostor přístavbu nedošlo k sesuvu tohoto terénu s komunikací zatížené zásobovacím nákladním provozem, musí zde být provedeno statické zajištění stavební jámy záporovou stěnou. Sesuvem komunikace včetně svahu by došlo k dlouhodobému omezení chodu nemocnice a k omezení přístupu pacientů do výše zmíněných pavilonů. Tato potřeba realizace záporové stěny vznikla v důsledku výše uvedených okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Realizace záporového pažení generuje dopad do konečného a uzlových termínu viz bod 4 tohoto ZL. Prodloužení lhůty provádění stavebních prací je patrné s Přílohy č. 2 tohoto změnového listu.						
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		☒ ANO			☐ NE	
4 Dopad do smluvních termínů:		☒ ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)			☐ NE	
Prodloužení lhůty dokončení stavebních prací a celkové doby realizace viz čl. 5 odstavce 5.2.1 ve smlouvě o dílo ze dne 16.2.2024 o 3 týdny						
Prodloužení uzlového bodu dokončení přístavby pavilonu A viz v čl. 5 odstavce 5.2.2 ve smlouvě o dílo ze dne 16.2.2024 o 13 týdnů						
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek					odst. 6	
6 Náklady:		Cena méněprací (odpočet):		-	0,00	bez DPH
		Cena víceprací (přípočet):		+	1 094 698,97	bez DPH
		Výsledná ceny změny:			1 094 698,97	bez DPH
7 Schválil:						
za zhotovitele:		za TDS:		za AD:	za uživatele:	za objednatele:
GEOSAN GROUP a.s.		CE-LOG s.r.o.		Proxion s.r.o.	ON Náchod a.s.	Královéhradecký kraj

SOUPIS PRACÍ

Stavba Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod

Objekt: SO-01 - Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B

Soupis ZL 010 _ Záporové pažení pro přístavbu pavilonu A

Místo	Náchod	Datum:
Zadavatel	KRALOVEHRADECKÝ KRAJ	Projektant: Proxion s r o
Uchazeč:	GEOSAN GROUP a s	Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 094 698,97

D	HSV	Práce a dodávky HSV					545 698,97	
D	1	Zemní práce					588 435,44	
N	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného II přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	160 000	73 56	7 356 00	CS ÚRS 2024 01 * 0 99
			ochlazení komulikač		50 000			
			příjezdová cesta pro vrtáčku		50 000			
			Součet		100 000			
N	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	78 500	249 48	19 584 18	CS ÚRS 2024 01 * 0 99
			die přílohy		202 000			
			9 5*13*1		123 500			
			Součet		78 500			
N	K	139711111	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	6 432	2 376 00	15 282 43	CS ÚRS 2024 01 * 0 99
			ruční dočistění prostoru mezi záporami pro vložení výřevy					
			48*10 16-0 026)		6 432			
N	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	84 932	84 35	7 164 01	CS ÚRS 2024 01 * 0 99
			10*5*5		2 600 000			
30	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4 374	208 55	912 20	SOD
			0 156*0 156*3 14/4*1 85*1 5		1 231			
			6*3 00*3 14*0 30*0 30/4*1 85		3 137			
			Celkem		4 374			
32	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	26 244	5 49	1 44 08	SOD
			4 374*6 Přepočtené koeficientem množství		1 231			
N	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	84 932	162 36	13 789 56	CS ÚRS 2024 01 * 0 99
8	K	174151101	Zásyp jam šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	84 932	136 98	11 633 99	SOD
31	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	6 998	241 47	1 685 90	SOD
			4 374*1 6 Přepočtené koeficientem množství		6 998			
3	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojně	m2	160 000	27 22	4 355 20	SOD
			se zhuštěním		1 600 000			
			6*2*5					
N	K	151711111	Osazení zápor ocelových dl do 8 m	m	57 000	1 821 60	103 831 20	CS ÚRS 2024 01 * 0 99
			5*		97 000			
N	M	13010976	opeř profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 110	t	2 810	34 947 00	91 198 04	CS ÚRS 2024 01 * 0 99
			57*43 tl 160*1 65		2 550			
			pomocné kce		0 060			
			Součet		2 610			
N	K	151711131	Vytažení zápor ocelových dl do 8 m	m	57 000	1 059 30	60 380 10	CS ÚRS 2024 01 * 0 99
			5*		57 000			
N	K	151712111	Převážka ocelová zdvojená pro kotvení záporového pažení	m	7 500	8 078 40	60 588 00	CS ÚRS 2024 01 * 0 99
			3 5*2*2		7 500			
			Součet		7 500			
N	K	151712121	Odstranění ocelové převážky zdvojené pro kotvení záporového pažení	m	7 500	2 801 70	21 012 75	CS ÚRS 2024 01 * 0 99
			3 5*2*2		7 500			
			Součet		7 500			
N	K	151721112	Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 10 m s jeho následným odstraněním	m2	48 000	1 188 00	57 024 00	CS ÚRS 2024 01 * 0 99
			48		48 000			
			Součet		48 000			
N	K	153821112	Osazení kolvy kabelové z pramenců nebo drátů pro nosnost přes 0 16 do 0 31 MN	m	35 000	673 20	23 562 00	CS ÚRS 2024 01 * 0 99
			3*9		27 000			
			1*8		8 000			
			Součet		35 000			
N	M	RMAT0001	kolva dočasná 2xLP 15,5/1770	m	35 000	1 500 00	52 500 00	VLASTNÍ
N	K	153822112	Napnutí kabelových kolev při unosnosti kolvy přes 0 16 do 0 31 MN	kus	4 000	9 108 00	36 432 00	CS ÚRS 2024 01 * 0 99
D	2	Zakládání					311 442 53	
N	K	224411112	Vrty maloprofilové D přes 156 do 195 mm úklon do 45° hl do 25 m hor I a II	m	35 000	1 296 90	45 391 50	CS ÚRS 2024 01 * 0 99
			35		35 000			
			Součet		35 000			
N	K	224511112	Vrty maloprofilové D přes 195 do 245 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina I a II	m	57 000	1 881 00	107 217 00	CS ÚRS 2024 01 * 0 99
			57		57 000			
			Součet		57 000			
N	K	227111115	Opažení maloprofilových vrty průměru přes 195 do 245 mm	m	57 000	447 48	25 506 36	CS ÚRS 2024 01 * 0 99
			57		57 000			
			Součet		57 000			
N	K	231111111	Zřízení pilot svislých D 245 mm hl od 0 do 30 m bez vytažení pažnic z betonu prostého	m	24 000	228 69	5 488 56	CS ÚRS 2024 01 * 0 99
N	K	58932310	beton třídy C 12/15 kamenivo frakce 0/8	m3	1 780	3 445,20	6 133 77	CS ÚRS 2024 01 * 0 99
			8*3 00*3 14*0 30*0 30/4*1 05		1 780			
			Součet		1 780			
N	K	281602111	Injekce vrtm povrchové nízkotlaké s dvojitým obtláčovačem mikropilot a kotev tlakem do 0 6 MPa	hod	4 000	2 207 70	8 830 80	CS ÚRS 2024 01 * 0 99
			mikropiloty 1 hod/mikropilotů první etapa		4**			
			Součet		6 000			
N	M	58522153	Cementní struskoporlandskýCEM II/B-M (S LL) 32 5R bal 25 kg PL	t	1,231	4 266 90	5 252 04	CS ÚRS 2024 01 * 0 99
			Injektační směs kotev 1 40m3		1 231			
			35*3 14*0 16*0 16/4*1 4*1 25		4 231			
			Součet		1 231			
N	K	282602113	Injekce vrtm povrchové vysokotlaké s dvojitým obtláčovačem mikropilot a kotev tlakem přes 2 do 4 5 MPa	hod	20 000	4 920,30	9 840 60	CS ÚRS 2024 01 * 0 99
			4*5*2*0 5 1m mikropiloty 0 5 hod/ 0 5m tl. etáž druhá etapa		20 000			
			Součet		20 000			
N	M	58522153	Cementní struskoporlandskýCEM II/B-M (S LL) 32 5R bal 25 kg PL	t	2 160	4 266 90	9 214 50	CS ÚRS 2024 01 * 0 99

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
	VV		4*5*2*0 04*1 35 dříví kolév x délka kořene 5m x dvě pláče x objemová hmotnost		2 160			
	VV		Součet		2 160			
	D	5	Komunikace pozemní				26 532 00	
N	K	564851011	Podklad ze slávkové ŠD plochy do 100 m2 II 150 mm	m2	50 000	231.66	11 583.00	CS ÚRS 2024 01 * 0.99
	VV		ochrana komunikace		50 000			
N	K	564851011	Podklad ze slávkové ŠD plochy do 100 m2 II 200 mm	m2	50 000	288.98	14 949.00	CS ÚRS 2024 01 * 0.99
	VV		přehzdoá cesta pro vřačku		50 000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce bouřám				23 284 80	
N	K	919726123	Geotextilie pro ochranu separaci a filtraci neklaná měrná hm ples 300 do 500 g/m2	m2	240 000	97.02	23 284 80	CS ÚRS 2024 01 * 0.99
	VV		ochrana komunikace		120 000			
	VV		přehzdoá cesta pro vřačku		120 000			
	VV		Součet		240 000			
	D	M	Práce a dodávky M				145 000,00	
	D	N00	Nepojmenované ostatní práce a dodávky				145 000 00	
N	K	R1	Nauoz ndvoz ředpravní naklady vřtací soupravy	kus	2 000	47 500.00	95 000.00	CS VLASTNÍ
N	K	R2	Projektová dokumentace geotechnický dohled statický návrh	kus	1 000	50 000.00	50 000.00	CS VLASTNÍ

Příloha ZL 10

Zahájení zakládání přístavby pavilonu A dle HMG SOD	27.03.2024	Počet dní
Návrh pažení, odsouhlasení ZL	26.04.2024	30
Objednání pažení	29.04.2023	3
Zahájení pažení	29.05.2023	30
Vrtání a osazení HEB	05.06.2023	7
Odtěžení a příprava na vrtání kotev	08.06.2023	3
Vrtání a zalití kotev	13.06.2023	5
Technologická přestávka	23.06.2023	10
Odtěžení a výdřeva	25.06.2023	2
Přeložka kanalizace	02.07.2023	7
Nový termín zakládání	02.07.2024	1
Posun zakládání celkem		98
Rezerva z HMG přístavby		-7
Celkem posun		91

Termíny z SOD	Počet dnů prodloužení	Počet týdnů prodloužení
Dokončení přístavby pavilonu A do: 20 týdnů ode dne zahájení plnění.	91,00	11
Dokončení stavebních prací nejdéle do 30 týdnů od výzvy objednatele k zahájení plnění dle prvního odstavce bodu 5.1 tohoto článku	21,00	3
Celková doba realizace: dílo bude předáno nejdéle do 34 týdnů od výzvy objednatele k zahájení plnění.	21,00	3

ZMĚNOVÝ LIST					011	
Kabeláž pro přesun ústředny EPS						
Stavba:		Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod				
Objekt:		SO-01 Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B, 08.3 - elektrická požární signalizace				
Předkládá:		Společnost GEOSAN - BAK - Urgent Náchod			Datum: 21.03.2024	
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů				
poštou	☐	1) Položkový rozpočet změny			1 listů	
e-mailem	☒	2) Projektové podklady			0 listů, výkresů	
osobně	☐	3) Fotodokumentace a ostatní přílohy			0 listů	
1 Technický popis změny:						
1.1 Popis původního řešení: Neřešeno.						
1.2 Popis nového řešení: Přesunutí stávající ústředny EPS umístěné v 1.NP pavilonu A do pavilonu D						
2 Zdůvodnění změny:						
Z důvodu nutnosti zachování provozování služby ústředny EPS uživatelem nemocnice, která je v současné době umístěna v rekonstruovaných prostorech a v místě předchozí recepce, je nutné tuto EPS dočasně vymístit do dočasné recepce zřízené v pavilonu D, tak aby byla zajištěna 24 hodinová služba. S ohledem na tuto skutečnost je nutné provést natažení kabeláže pro tuto nově umístěnou ústřednu EPS. Tyto uvedené práce vznikly v důsledku výše uvedených okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.						
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		☐	ANO			☒ NE
4 Dopad do smluvních termínů:		☐	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)			☒ NE
5 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00		bez DPH	
	Cena víceprací (přípočet):	+	102 474,61		bez DPH	
	Výsledná ceny změny:		102 474,61		bez DPH	
6 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek					odst.	6
7 Schválil:						
za zhotovitele:	za TDS:		za AD:	za uživatele:	za objednatele:	
	<i>Čejchan</i>		<i>Hubka</i>	<i>Bužek</i>	<i>Prvazek</i>	
GEOSAN GROUP a.s.	CE-ING s.r.o.		Proxion s.r.o.	ON Náchod a.s.	Královéhradecký kraj	

Urgentní příjem oblastní nemocnice Náchod
Vnitřní slaboproudé rozvody - EPS

Rozpočet č: RZ23020

ZL 011 Kabeláž pro přesun ústředny EPS

Rekapitulace rozpočtu

HLAVA III. Základní rozpočtové náklady			
Dodávky a materiál celkem			31 119,80 Kč
Montáže celkem			62 682,24 Kč
Mimostav Doprava			5 879,71 Kč
Spotřební materiál			1 194,32 Kč
Zkušební provoz, Zaškolení obsluhy			1 139,19 Kč
Celkem			102 015,26 Kč
HLAVA XI. Náklady hrazené z provozních prostředků			
Revize			459,35 Kč
Celkem			459,35 Kč
Celkem bez DPH			102 474,61 Kč
Daň z přidané hodnoty			
Základní sazba DPH	21 %	102 474,61 Kč	21 519,67 Kč
Celkem s DPH			123 994,28 Kč

Rozpočet

Dodávka ostatních zařízení a materiálu

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
PC009400	Kabel JF-H(S)H FE 180/E30 2x2x0,8 bezhalogen ohnivodný	340	m	23,81 Kč	8 095,40 Kč SOD
34571790	příchytka kovová oboustranná 32,0x10mm 3ks/m	960	ks	4,12 Kč	3 955,20 Kč URS 2024_01*0,99
PC024660	Protipožární kotva (Šroub OBO Bettermann) MMS-ST M6 6x60	960	ks	20,10 Kč	12 060,00 Kč SOD
	Č. schválení Z-21 1-1503				
	žlab kabelový ocelový děrovaný SZ protipožární P90-R				
34575202	75x60x1,50mm	20	MJ	350,46 Kč	7 009,20 Kč URS 2024_01*0,99
Celkem					31 119,80 Kč

Montáže dle ceníku C22M

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
220 281651	Kabel	340	m	28,29 Kč	9 618,60 Kč SOD
210021055	Montáž příchytok kovových průměru do 40 mm	960	ks	26,61 Kč	25 545,60 Kč URS 2024_01*0,99
220260721	Montáž kabelového žlabu děrovaného nebo neděrovaného [MARS] 62/50 mm	20	m	452,03 Kč	9 040,60 Kč URS 2024_01*0,99
Celkem					45 004,80 Kč

Montáže ostatní

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
	Vybourání otvorů v betonových příchkách a zdech D do 60 mm tl. do				
971042151	450 mm	ks	ř	442,53 Kč	3 540,24 Kč URS 2024_01*0,99
HZS2172	hodinová zúčtovací sazba sádrokartonář odborný	28	h	504,90 Kč	14 137,20 Kč URS 2024_01*0,99
Celkem					17 677,44 Kč

Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod

<i>SOD</i>	<i>86 400 728,41</i>	<i>Bez DPH</i>
<i>D.č.2</i>	<i>2 058 394,700</i>	<i>Bez DPH</i>
<i>Celkem</i>	<i>88 459 123,11</i>	<i>Bez DPH</i>

<i>Číslo ZL</i>	<i>Název změnového listu</i>	<i>Cena víceprací bez DPH</i>	<i>Cena méněprací bez DPH</i>	<i>Celkem ZL Kč bez DPH</i>
	Celkem změnové listy bez DPH pro dodatek č. 2			2 058 394,70
001	Provedení vyklizení objektu a odstranění střešního kačírku	185 966,14	0,00	185 966,14
002	Dodávka bourací práce a příprava staveniště - vícenáklady	235 720,07	-9 372,23	226 347,84
003	Přeložky rozvodů vody a kanalizace	58 266,92	0,00	58 266,92
004A	Osazení ventilů nutných pro uzavření vodovodních rozvodů pro stavbu	31 539,57	0,00	31 539,57
004B	Požadavek ON na výměnu vodovodních uzávěrů v horních patrech pavilonu A	57 093,83	0,00	57 093,83
005	Demontáž a zpětná montáž stávajících radiátorů	52 718,98	-2 346,14	50 372,84
006	Skutečné provedení délek pilot	155 537,42	-41 615,02	113 922,40
007	Bourání podlahy původní přístavby garáží pavilon B	80 604,35	0,00	80 604,35
008	Provozní alarm medicíálních plynů	24 188,80	0,00	24 188,80
009	Doplnění schodišťových stupňů u venkovního schodiště SCH 02	32 918,90	0,00	32 918,90
010	Záporové pažení pro přístavbu pavilonu A	1 094 698,50	0,00	1 094 698,50
011	Kabeláž pro přesun ústředny EPS	102 474,61	0,00	102 474,61

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	86 400 728,41 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 212 631,25 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 41 615,02 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 3	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 212 631,25 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 41 615,02 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	254 246,27 Kč bez DPH		
a) (Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)	254 246 Kč < 140 448 000 Kč	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	0,29 % < 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	86 400 728,41 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	86 400 728,41 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 1 899 096,84 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 11 718,37 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 1 899 096,84 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 11 718,37 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6)	- 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Smluvní cena		86 400 728,41 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 1 899 096,84 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 11 718,37 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		1 887 378,47 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	2,18 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku	2
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 2 111 728,09 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 53 333,39 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	2 058 394,70 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní)	86 400 728,41 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	86 400 728,41 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	88 459 123,11 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	88 459 123,11 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:

Jméno a příjmení
