

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 04.07.2024
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) **Královéhradecký kraj**
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmánem Mgr. Martinem Červíčkem
bankovní spojení: ██████████
██
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

- (2) **EUROVIA CZ a.s.**
U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4
IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924
zastoupený Tomášem Kuncem, dle plné moci
zapsaný v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561
bankovní spojení: ██████████
██
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**II/295 Vrchlabí – odstranění nehodové lokality (km 15,550 - 15,950)**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve Smlouvě o dílo v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**II/295 Vrchlabí – odstranění nehodové lokality (km 15,550 - 15,950)**“, včetně změny č. 1 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **2.607.068,76 Kč vč. DPH** (slovy: dvěmilionyšestsetšedesátosm Korun českých sedmdesátšest haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c), se tedy tímto Dodatkem mění takto:

cena bez DPH	2.154.602,28 korun českých
DPH (21%)	452.466,48 korun českých
cena celkem	2.607.068,76 korun českých

Číslo stavby: 36703

3) Oceněný výkaz výměr U259 Vrchlabí ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr U259 Vrchlabí je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento Dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto Dodatku.

Tento Dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/193/2024 ze dne 05.02.2024.

V Hradci Králové dne 20-09-2024

V Kolíně _____

Objednatel
Mgr. Martin Červíček
hejtman

Zhotovitel
Tomáš Kunc
ředitel závodu Kolín

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

Číslo stavby :	36703
Registrační číslo projektu :	
Smlouva o dílo uzavřena dne :	04.07.2024

1

Název stavby :

II/295 Vrchlabí - odstranění nehodové lokality (km 15,550 - 15,950)

Název objektu :

Objednatel :

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

VDI PROJEKT s.r.o., K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10, IČO: 288 60 080

Zhotovitel :

EUROVIA CZ, a.s., U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 Praha 4, IČO: 452 74 924

Popis a zdůvodnění změny :

Jedná se o méněpráce na základě skutečně provedených prací, které byly zaměřeny při dokončení stavebních prací. Jedná se o práce, které odpovídají skutečným rozměrům na stavbě. Tyto méně práce nemají vliv na funkčnost a kvalitu díla. Změna nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejné zakázce.

Méněpráce -24 595,44 Kč; Vícepráce 0,00 Kč bez DPH.

Přílohy evidenčního listu :

1.	Tabulka rekapitulace změny č.1
2.	ZBV č.1 II/295 Vrchlabí
3.	Zaměření skutečného provedení stavby

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku č.1 (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 1:		Nová cena stavby po změně č. 1:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
		méněpráce	vícepráce		
2 636 829,24 Kč	2 607 068,76 Kč	29 760,48 Kč	0,00 Kč	2 607 068,76 Kč	-29 760,48 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.1:		29 760,48 Kč	0,00 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zhotovitel :	EUROVIA CZ, a.s.			
Projektant (autorský dozor) :	VDI PROJEKT s.r.o.			
Správce stavby :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
Hlavní inženýr :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
Technický dozor :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
Asistent technického dozora:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			

Rekapitulace ceny

OBJEKT	PODOBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		CENA CELKEM BEZ DPH
				vícepráce	méněpráce	
U259		Vrchlabí	2 179 197,72	0,00	24 595,44	2 154 602,28
DPH 21%			457 631,52	0,00	5 165,04	452 466,48
CENA CELKEM			2 636 829,24	0,000	29 760,480	2 607 068,760

Za zhotovitele:
EUROVIA CZ, a.s.

Za TDS
ÚDRŽBA SILNIC KHK a.s.

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **36703 - II/295 Vrchlabí - nehodová lokalita U259_EUROVIA**

Objekt: **U259 - Vrchlabí**

Rozpočet: **[U259] - Vrchlabí**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: -----

Celková cena: -----

DPH: -----

Cena s DPH: -----

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [U259] - Vrchlábí

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
U259 Vrchlábí						-----
0 Všeobecné konstrukce a práce						-----
1	02720.1	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY „ Položka zahrnuje montáž a demontáž vč. dílčích přesunů kompletního dopravně-inženýrského opatření pro stavbu dle projektové dokumentace vč.této dokumentace a aktuálních požadavků na provedení - TP, typových dopravně inženýrských opatření apod“. Cenová soustava Bez vazby na CS 1=1,000 [A] Celkem 1 = 1,000 Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,000	-----	-----
2	02720.2	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY „Nájemné dočasného dopravního značení.“ Cenová soustava Bez vazby na CS 1=1,000 [A] Celkem 1 = 1,000 Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,000	-----	-----
3	02720.3	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Zajištění dopravy během stavby osobami zhotovitele vč. dočasného dopr.značení. Cenová soustava Bez vazby na CS " Po dobu pracovní doby při realizaci stavby bude doprava řízena pracovníky stavby. Během technologické přestávky a v nočních hodinách bude provoz řízen světelnou signalizací. Pokud nastanou nepředvidatelné (kritické) dopravní situace během technologické přestávky (vč. mimopracovních dní), zhotovitel je povinen zajistit řízení provozu pracovníky stavby po dobu nezbytně nutnou. " 1=1,000 [A] Celkem 1 = 1,000 Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,000	-----	-----
4	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Vytyčení stavby a skutečné zaměření stavby Cenová soustava Bez vazby na CS Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	SOUBOR	1,000	-----	-----
5	02991	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Náklady na zřízení a dodání informačních tabulí s údaji o stavbě s textem dle vzoru SFDI vč.kotvení a podstavce. Po ukončení stavby odstranění. Cenová soustava Bez vazby na CS	KUS	2,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [U259] - Vrchlábí

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p>2=2,000 [A] Celkem 2 = 2,000 položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti</p>				
1 Zemní práce						-----
6	11372.R	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH zahrnuje veškerou manipulaci, přesuny a uložení sutí, zhotovitel v ceně zohlední zpětné využití vybouraného/recyklovaného materiálu Bez vazby na CS	M3	116,995	-----	-----
	Cenová soustava SOD			117,600		-----
	ZBV: 1	<p>oprava poruch vozovky frézováním v tl.10cm (prům. dl. x š. x tl.) 10% plochy: 400*9,8*0,10*0,1=39,200 [A] mikrokoberec :400*9,8*0,02=78,400 [B] Celkem: A+B=117,600 [C] Celkem 117,6 = 117,600</p>		-0,605		-----
	Specifikace	<p>oprava poruch vozovky frézováním v tl.10cm (prům. dl. x š. x tl.) plochy: 405,5*0,10 - 400*9,8*0,10*0,1=1.350 [A] mikrokoberec 400*9,56*0,02 - 400*9,8*0,02= - 1.955 [B] Celkem: A+B= - 0.605 [C] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>				
7	113767.R	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1000MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE 20x50 Bez vazby na CS	M	118,700	-----	-----
	Cenová soustava	<p>napojení na stáv.vozovku : 9,5+9,2=18,700 [B] poruchy - předpoklad : 100=100,000 [C] Celkem: B+C=118,700 [D] Celkem 118,7 = 118,700</p>				
	Specifikace	<p>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</p>				
5 Komunikace						-----
8	572213.A	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	392,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: **[U259] - Vrchlábí**

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	kationaktivní asfaltové emulze PS-E 0,3kg/m2 Bez vazby na CS oprava poruch vozovky 10% plochy: 400*9,8*0,10=392,000 [A] Celkem 392 = 392,000				
	Specifikace	- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
9	572213.B	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 kationaktivní asfaltové emulze PS-E 0,5kg/m2 Bez vazby na CS	M2	4 227,750	-----	-----
	Cenová soustava	oprava poruch vozovky 10% plochy: 400*9,8*0,10=392,000 [A] mikrokoberec : 400*9,8=3 920,000 [B] Celkem: A+B=4 312,000 [C] Celkem 4312 = 4 312,000		4 312,000		-----
	SOD					
	ZBV: 1	oprava poruch vozovky plochy: 67,75+26,33+84,39+144,69+82,34 - 400*9,8*0,10=13.500 [A] mikrokoberec : 400*9,56 - 400*9,8= - 97.750 [B] Celkem: A+B= - 84,25 [C]		-84,250		-----
	Specifikace	- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
10	572224.R	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 modifik. asfaltové emulze C 60 BP 5, 1,0 kg/m2 Bez vazby na CS	M2	117,600	-----	-----
	Cenová soustava	oprava poruch - 3% z celk.plochy : 400*9,8*0,03=117,600 [A] Celkem 117,6 = 117,600				
	Specifikace	- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
11	5732A.R	MIKROKOBEREK DVOUVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/8 + 0/8 EMULZNÍ MIKROKOBEREK DVOUVRSTVÝ EMK-DV 0/8 20 MM ČSN 736130 dále i v souladu s ČSN EN 12273 a TKP 27 Bez vazby na CS	M2	3 822,250	-----	-----
	Cenová soustava			3 920,000		-----
	SOD					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [U259] - Vrchlábí

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	ZBV: 1 Specifikace	<p>mikrokoberec : 400*9,8=3 920,000 [A] Celkem 3920 = 3 920,000</p> <p>mikrokoberec : 400*9,56 - 400*9,8= - 97.750 [A] Položka zahrnuje: - očištění povrchu podkladu, zakrytí poklopů, mříží a pod. - dodání veškerého potřebného materiálu (kamenivo předepsané frakce, emulze, přísady, voda) - pokládku dvou vrstev (tloušťka je dána frakcí použitého kameniva) - zhutnění (pokud je předepsáno zadávací dokumentací) Položka nezahrnuje odstranění vodorovného dopravního zančení a spojovací postřik</p>		-97,750		-----
12	57476.R Cenová soustava Specifikace	<p>VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU geotextílie s mřížkou za skalných vláken pevnost 100/100 kN dle TP115 Bez vazby na CS</p> <p>oprava poruch - 3% z celk.plochy : 400*9,8*0,03=117,600 [A] Celkem 117,6 = 117,600</p> <p>- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu</p>	M2	117,600	-----	-----
13	5774AE.R Cenová soustava Specifikace	<p>VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S nemodifikovaný ACO 11+ 50/70 v tl.40mm Bez vazby na CS</p> <p>oprava poruch vozovky 10% plochy: 400*9,8*0,04*0,1=15,680 [A] Celkem 15,68 = 15,680</p> <p>- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 1000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výpravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). -nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu</p>	M3	15,680	-----	-----
14	5774EG.R Cenová soustava	<p>VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16+, 16S nemodifikovaný ACP 16+ 50/70 v tl.60mm Bez vazby na CS</p>	M3	23,520	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [U259] - Vrchlábí

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p>oprava poruch vozovky 10% plochy: 400*9,8*0,06*0,1=23,520 [A]</p> <p>Celkem 23,52 = 23,520</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výpravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). - nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu 				
9 Ostatní konstrukce a práce -----						
15	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	4,000	-----	-----
	Cenová soustava	<p>bílé Z11</p> <p>Bez vazby na CS</p> <p>doplnění : 2+2=4,000 [A]</p> <p>Celkem 4 = 4,000</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie 				
	Specifikace					
16	912282	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ	KUS	4,000	-----	-----
	Cenová soustava	<p>Bez vazby na CS</p> <p>2+2=4,000 [A]</p> <p>Celkem 4 = 4,000</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - demontáž a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - očištění - nové odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie 				
	Specifikace					
17	91267	ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS	46,000	-----	-----
	Cenová soustava	<p>Bez vazby na CS</p> <p>do pásnic zábradelního svodidla: 46=46,000 [A]</p> <p>Celkem 46 = 46,000</p>				
	Specifikace	- kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [U259] - Vrchlábí

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
18	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ retroreflexní úprava pro sil.II třídy - RA2, základní velikost dle stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích Bez vazby na CS Z3 : 2*4=8,000 [A] B20a : 2+2=4,000 [B] IP22 : 2*2=4,000 [C] A1a : 1+1=2,000 [D] E6 : 1+1=2,000 [E] A8 : 1+1=2,000 [F] B26 : 1+1=2,000 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=24,000 [H] Celkem 24 = 24,000 <i>položka zahrnuje:</i> <i>- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení</i>	KUS	24,000	-----	-----
	Specifikace					
19	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ vč. naložení, odvozu a uložení na skládku Bez vazby na CS IP5 : 2=2,000 [A] Celkem 2 = 2,000 <i>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo</i>	KUS	2,000	-----	-----
	Specifikace					
20	914141	DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DODÁVKA A MONT zvýrazněné značky RA3 Bez vazby na CS A24 zvýrazněná : 2=2,000 [B] Celkem 2 = 2,000 <i>položka zahrnuje:</i> <i>- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení</i>	KUS	2,000	-----	-----
	Specifikace					
21	914231	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ retroreflexní úprava pro sil.II třídy - RA2, zvětšená velikost dle stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích Bez vazby na CS IP22 : 1+1=2,000 [A] Celkem 2 = 2,000 <i>položka zahrnuje:</i> <i>- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení</i>	KUS	2,000	-----	-----
	Specifikace					
22	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	16,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ


Objekt: [U259] - Vrchlábí

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	dle stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích + atyp pro umístění Z3 Bez vazby na CS Z3 : 4=4,000 [A] B20a : 2+2=4,000 [B] IP22 : 2*2=4,000 [C] B26 : 1+1=2,000 [G] A24 : 1+1=2,000 [H] Celkem: A+B+C+G+H=16,000 [I] Celkem 16 = 16,000				
	Specifikace	<i>položka zahrnuje:</i> - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)				
23	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA optická psychologická brzda s akustickým efektem V18 dle TP133, retroreflexní úprava pro sil.II třídy dle stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích	M2	14,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS V18 : (5*3,5*0,5+6*3,5*0,25)=14,000 [A] Celkem 14 = 14,000				
	Specifikace	<i>položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
24	915231	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA Obnova VDZ - plast strukturální nehlučný - bílá, retroreflexní úprava pro sil.II třídy, dle TP133 dle stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích	M2	304,500	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS nové VDZ : V1a : 400*0,125=50,000 [A] V4 : 450*2*0,25=225,000 [B] V2b + V9b : 2*100*0,7*0,125+2*5*1,2=29,500 [C] Celkem: A+B+C=304,500 [D] Celkem 304,5 = 304,500				
	Specifikace	<i>položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
25	915234	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - ODSTRANĚNÍ BROUŠENÍM Obnova VDZ - plast strukturální nehlučný - bílá, retroreflexní úprava pro sil.II třídy, dle TP133 dle stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích	M2	25,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS doplnění V2b + V9 : (100+100)*0,125=25,000 [A] Celkem 25 = 25,000				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [U259] - Vrchlábí

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	<i>Specifikace</i>	<i>zahrnuje odstranění značení předepsaným způsobem provedení a odklizení vzniklé suti</i>				
26	931327	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1000MM2 zalití spáry modifikovanou asf.zálivkou	M	118,700	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS napojení na stáv.vozovku : 9,5+9,2=18,700 [B] poruchy - předpoklad : 100=100,000 [C] Celkem: B+C=118,700 [D] Celkem 118,7 = 118,700				
	<i>Specifikace</i>	<i>položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil</i>				
27	93808.R	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM vč. naložení, odvozu a uložení na skládku	M2	4 227,750	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
	SOD	mikroberec : 400*9,8=3 920,000 [A] oprava poruch vozovky frézováním v tl.10cm (prům. dl. x š. x tl.) 10% plochy: 400*9,8*0,10=392,000 [B] Celkem: A+B=4 312,000 [C] Celkem 4312 = 4 312,000		4 312,000		-----
	ZBV: 1	mikroberec : 400*9,56 - 400*9,8= - 97.750 [A] oprava poruch vozovky frézováním v tl.10cm (prům. dl. x š. x tl.) plochy: 67,75+26,33+84,39+144,69+82,34 - 400*9,8*0,10=13.500 [B] Celkem: A+B= - 84,250 [C]		-84,250		-----
	<i>Specifikace</i>	<i>položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu</i>				

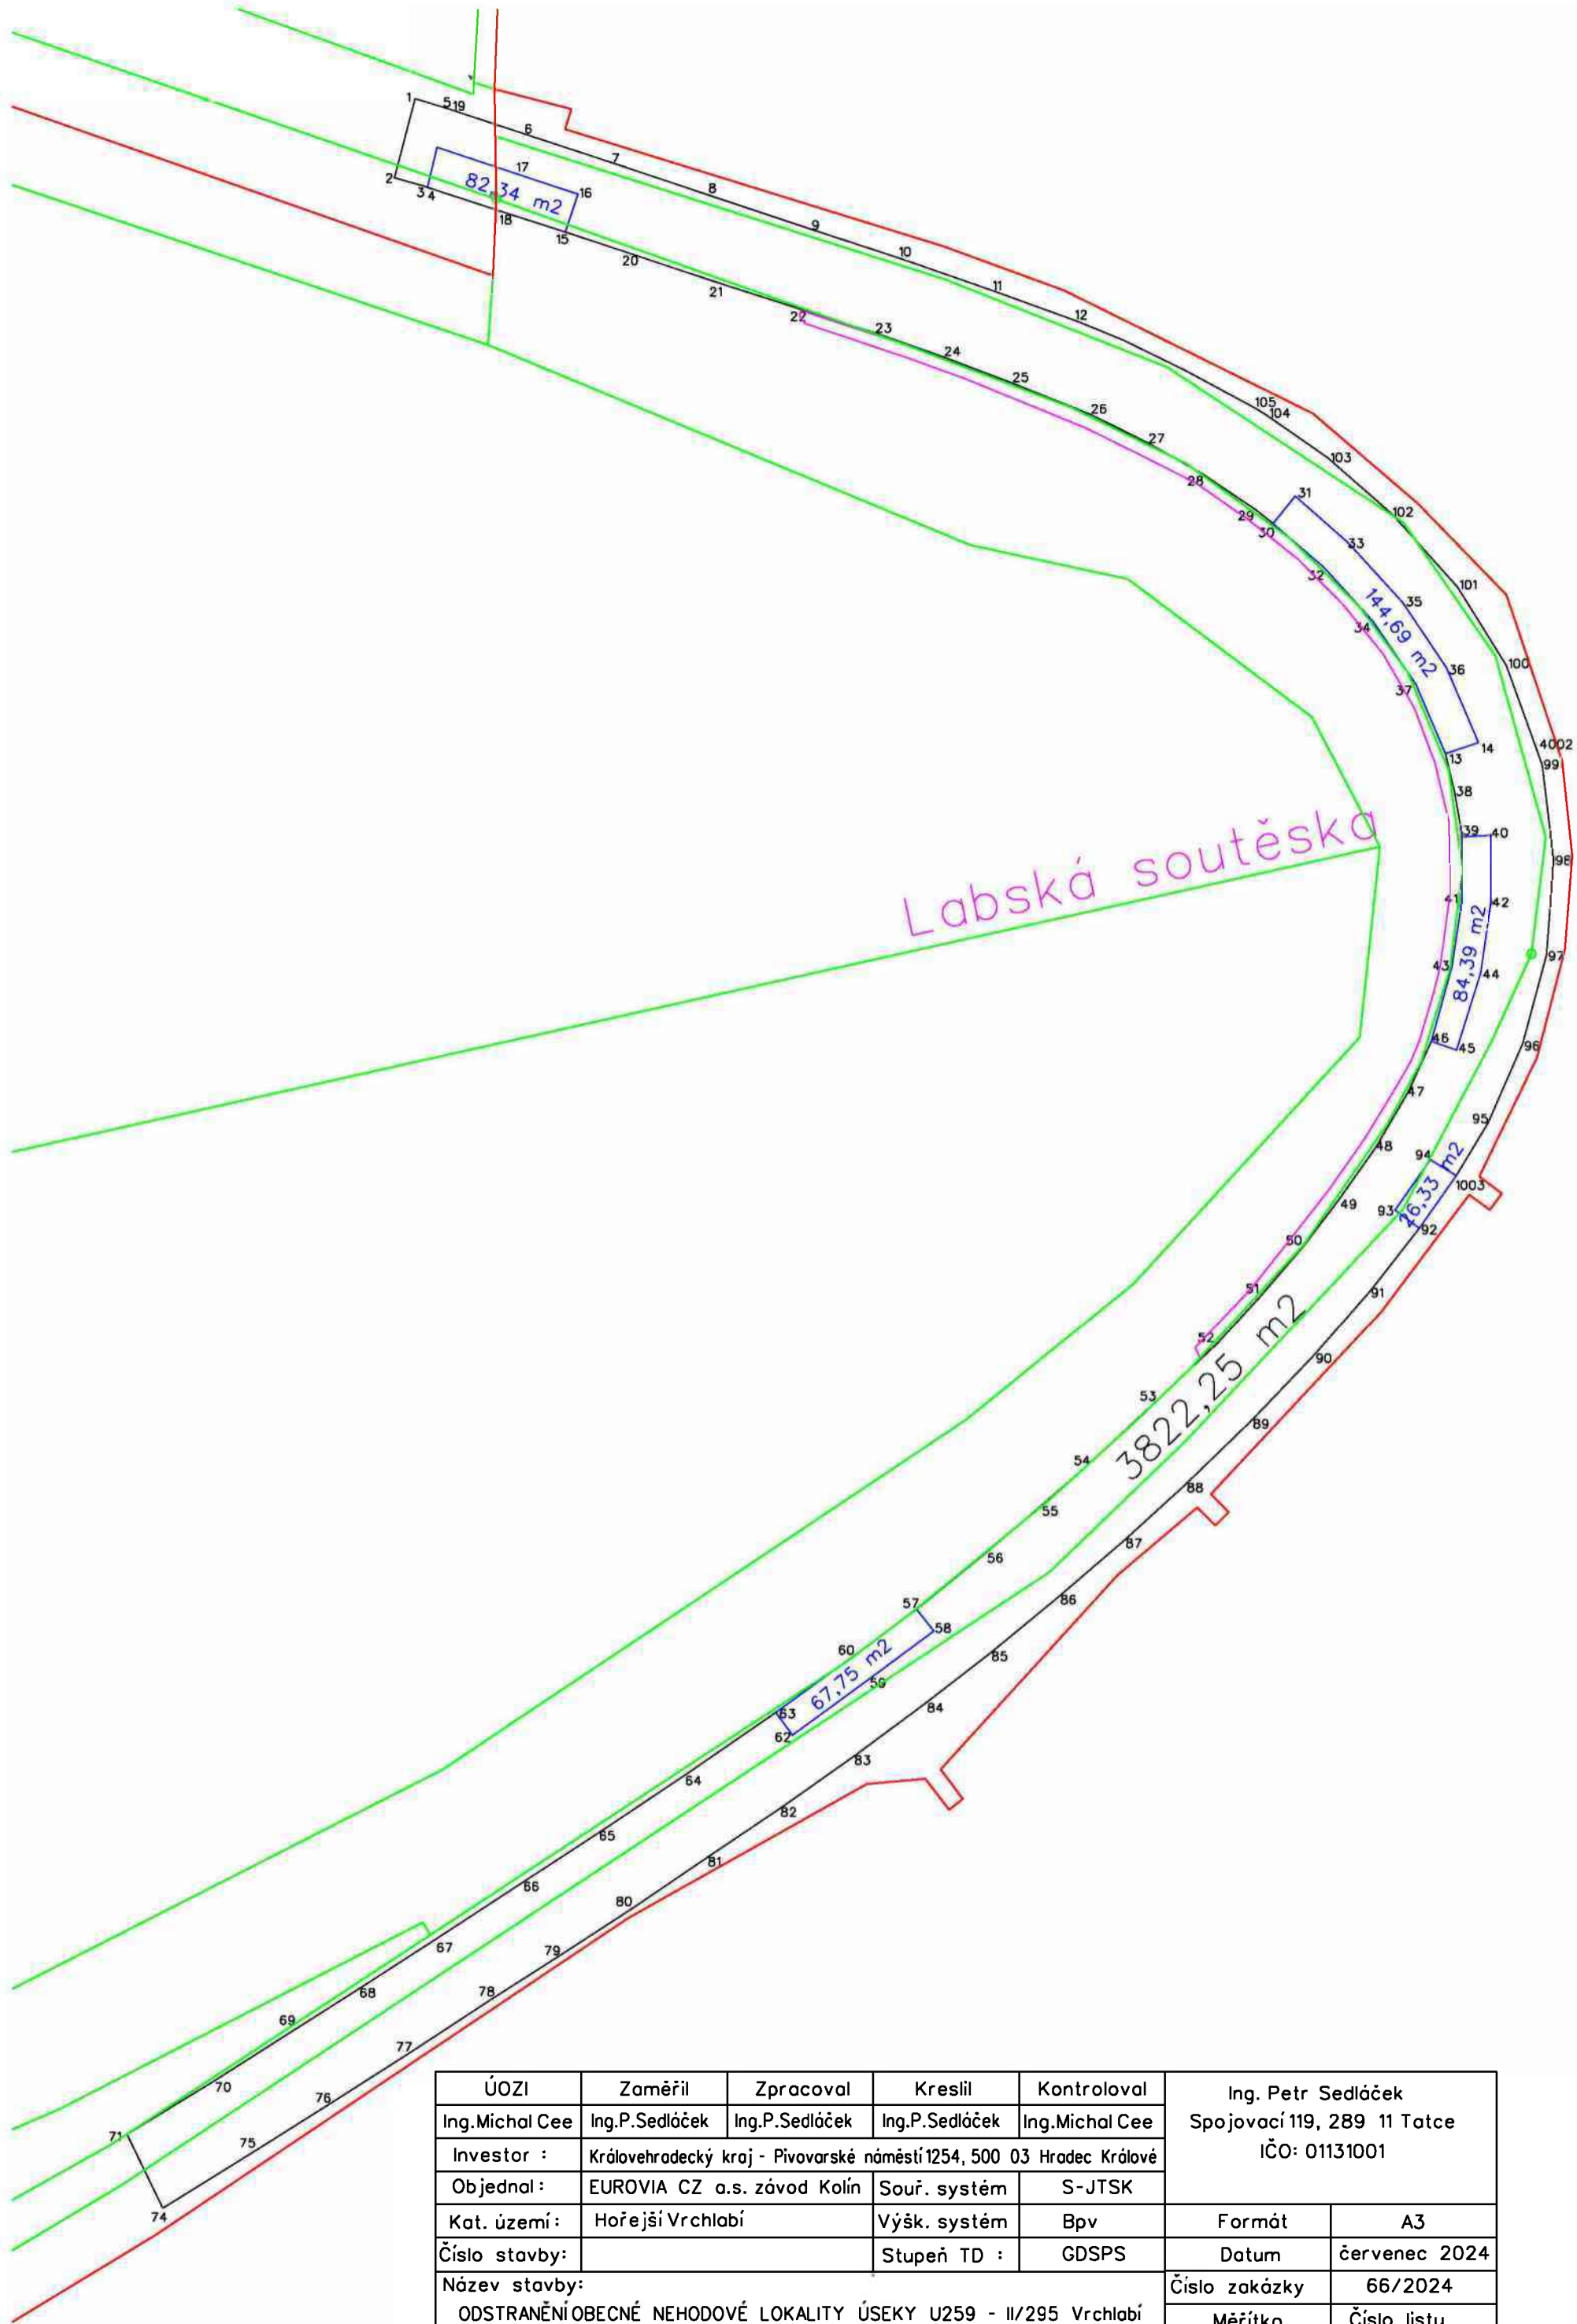

ÚOZI	Zaměřil	Zpracoval	Kreslil	Kontroloval	Ing. Petr Sedláček Spojovací 119, 289 11 Tatce IČO: 01131001	
Ing. Michal Cee	Ing. P. Sedláček	Ing. P. Sedláček	Ing. P. Sedláček	Ing. Michal Cee		
Investor :	Královehradecký kraj - Pivovarské náměstí 1254, 500 03 Hradec Králové					
Objednal :	EUROVIA CZ a.s. závod Kolín	Souř. systém	S-JTSK			
Kat. území :	Hořejší Vrchlabí	Výšk. systém	Bpv			
Číslo stavby :		Stupeň TD :	GDSPS			
Název stavby:					Číslo zakázky	66/2024
ODSTRANĚNÍ OBECNÉ NEHODOVÉ LOKALITY ÚSEKY U259 - II/295 Vrchlabí					Měřítko	Číslo listu
Název výkresu :					1:700	1
Dokumentace skutečného provedení stavby						

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

II/295 Vrchlabí – odstranění nehodové lokality (km 15,550 - 15,950)

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	2 179 197,72 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 24 595,44 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 24 595,44 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	24 595,44 Kč bez DPH		
a) (Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)	24 595 Kč < 135 348 000 Kč	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	1,13 % < 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	2 179 197,72 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	2 179 197,72 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Smluvní cena		2 179 197,72 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	0,00 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 0,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 24 595,44 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	-24 595,44 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní)	2 179 197,72 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	2 154 602,28 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	2 154 602,28 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: _____
