

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo **ze dne 30.10.2023**

Smluvní strany

Objednatel	Královéhradecký kraj
se sídlem:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
zástupce	Petr Koleta, hejtmán kraje
bankovní spojení:	████████████████████
č. účtu:	████████████████

dále jako „objednatel“

a

Zhotovitel	S T A K O společnost s ručením omezeným
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou C724	
se sídlem	Bieblova 782/7, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
IČO	422 28 468
DIČ	CZ422 28 468
zástupce	Ing. Petr Kulda, jednatel
bankovní spojení	████████████████████
číslo účtu	████████████████

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 4 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 30.10.2023, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky nazvané: „**Interna Nový Bydžov – požárně bezpečnostní řešení, úpravy objektu – stavební práce**“ (dále také „veřejná zakázka“).

I. Účel dodatku

1. Tento dodatek je dále uzavírán dle čl. odst. 16.4. původní smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon“ nebo „ZZVZ“) v souvislosti se vznikem dodatečných změn, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jsou specifikovány v přílohách tohoto dodatku.

2. Jedná se jednak o změnu závazku z původní smlouvy o dílo dle ust. §222 odst. 4 ZZVZ, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku.

Tato změna je specifikována v přílohách – změnových listech:

č. 33 – Duální čtečky karet

vícepráce: 441 465,18 Kč bez DPH

méněpráce: 352 793,36 Kč bez DPH

č. 34 – SDK opláštění – VZT potrubí 3. a 4. NP (WC)

vícepráce: 5 386,30 Kč bez DPH

méněpráce: ----

č. 41 – Doplnění zásuvek, kabeláže 230 V (měření teploty = akce ON Jc a.s.)

vícepráce: 69 695,39 Kč bez DPH

méněpráce: ----

č. 43 – SKIGRAFIE (přívody elektro = akce ON Jc a.s.)

vícepráce: 298 543,- Kč bez DPH

méněpráce: ----

V souvislosti se změnami dle ZL č. 43 se **prodlužuje termín plnění o 1 (jeden) kalendářní týden, tj. o 7 dní.**

č. 44 – Výtah V4

vícepráce: 32 593,05 Kč bez DPH

méněpráce: ----

č. 45 – Bypass do rackové skříně

vícepráce: 31 078,25 Kč bez DPH

méněpráce: ----

č. 46 – Výtah V4 – záložní zdroj

vícepráce: 44 699,04 Kč bez DPH

méněpráce: ----

Součet všech víceprací dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ je 923 460,21 Kč bez DPH.

Součet všech méněprací dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ je - 352 793,36 Kč bez DPH.

Celková hodnota změny závazku ze smlouvy o dílo dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ je tedy **570 666,85 Kč bez DPH.**

3. Dále se jedná o změnu závazku z původní smlouvy o dílo dle ust. §222 odst. 5 ZZVZ spočívající v dodatečných pracích, službách nebo dodávkách od Zhotovitele, které nebyly zahrnuty v původním závazku a jsou nezbytné, přičemž jsou splněny následující podmínky:

- Změna osoby Zhotovitele není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými Objednatel v původním zadávacím řízení a současně
- Změna osoby Zhotovitele by Objednateli způsobila značně obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.

Tato změna je specifikována v přílohách – změnových listech:

- č. 36 – Vybourání luxferů – hala m. č. 001

vícepráce: 20 453,24 Kč bez DPH

méněpráce: ----

- č. 37 – Změna provedení atiky vč. zateplení Objektu SO 01a

vícepráce: 113 413,06 Kč bez DPH

méněpráce: - 18 516,32 Kč bez DPH

- č. 38 – SDK oddělení šachet – Š1 VZT a šachty výtahu

vícepráce: 116 937,68 Kč bez DPH

méněpráce: ----

V souvislosti se změnami dle ZL č. 38 se **prodlužuje termín plnění o 5 (pět) kalendářních týdnů, tj. o 35 dní.**

- č. 42 – Odpočet omítek – šachta VZT a výtahová šachta

vícepráce: ----

méněpráce: - 71 723,89 Kč bez DPH

Součet všech víceprací dle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ je 250 803,98 bez DPH.

Součet všech méněprací dle ust. §222 odst. 5 ZZVZ je – 90 240,21 Kč bez DPH.

Celková hodnota změny závazku ze smlouvy o dílo dle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ je tedy **160 563,77 Kč bez DPH.**

4. Dále se také jedná o změnu závazku z původní smlouvy o dílo dle ust. §222 odst. 6 ZZVZ, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Tato změna je specifikována v přílohách – změnových listech:

- č. 32 – Optické kabely - přesun

vícepráce: 38 839,72 Kč bez DPH

méněpráce: ----

- č. 35 – Nové řešení podlah v hale m. č. 001 a chodbě m. č. 052, sanace podkladních betonů

vícepráce: 152 868,12 Kč bez DPH

méněpráce: - 20 805,80 Kč bez DPH

- č. 39 – Injektáž obvodového zdiva SO 01 1.PP – chodba m. č. 052

vícepráce: 14 924,33 Kč bez DPH

méněpráce: ----

- č. 40 – Kanalizace – doplnění

vícepráce: 33 770,55 Kč bez DPH

méněpráce: ----

Součet všech víceprací dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ je 240 402,72 Kč bez DPH.

Součet všech méněprací dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ je – 20 805,80 Kč bez DPH.

Celková hodnota změny závazku ze smlouvy o dílo dle ust. §222 odst. 6 ZZVZ je tedy **219 596,92 Kč bez DPH.**

5. Celkový cenový nárůst součtu cenových nárůstů všech změn podle ust. §222 odst. 5 ZZVZ a podle ust. §222 odst. 6 ZZVZ ze všech dodatků ke smlouvě o dílo činí částku **3 077 471,82 Kč bez DPH**, což je méně než 30% původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Je tak splněna podmínka stanovená v ust. §222 odst. 9 ZZVZ.
6. Celková cena za provedení díla bez DPH se tak navyšuje o částku **950 827,54 Kč bez DPH**. Termín plnění **se prodlužuje o celkem 6 kalendářních týdnů, tj. o 42 dní**.

II.

Vymezení rozsahu změn

1. **Čl. 6.2 původní smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:**

Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, činí

72 296 770,77 Kč bez DPH

(slovy: sedmdesát dva miliony dvě stě devadesát šest tisíc sedm set sedmdesát korun českých sedmdesát sedm haléřů)

DPH samostatně činí

15 182 321,86 Kč

(slovy: patnáct milionů sto osmdesát dva tisíce tři sta dvacet jedna koruna česká osmdesát šest haléřů)

Cena včetně DPH činí

87 479 092,63 Kč

(slovy: osmdesát sedm milionů čtyři sta sedmdesát devět tisíc devadesát dvě koruny české šedesát tři haléře).

2. **Čl. 5.3 původní smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:**

Termíny a místo plnění díla jsou stanoveny následovně:

1. **etapa:** do 67 týdnů od výzvy objednatele k plnění a k předání/převzetí staveniště. zahájení realizace provádění díla. – ukončení stavebních prací a vč. uvedení do předčasného užívání vč. zajištění dokladů k předčasnému užívání (**uzlový termín**)
2. **etapa:** do 99 týdnů od výzvy objednatele k plnění a k předání/převzetí staveniště – ukončení stavebních prací

Zkušební provoz: zahájení ihned po dokončení stavebních prací, délka 4 týdny

Zajištění kolaudace: do 105 týdnů od výzvy k předání/převzetí stanoviště

Termín dokončení:

- předání díla vč. veškeré dokumentace vzešlé mj. ze zkušebního provozu do 6 týdnů ode dne ukončení zkušebního provozu

Požadovaná doba trvání plnění zakázky:

- celkem do 111 týdnů od výzvy objednatele k plnění a předání/převzetí stanoviště a převzetí staveniště.

V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně zadavatele, nebude možné dodržet termíny zahájení plnění veřejné zakázky, posouvají se automaticky i termíny ukončení plnění veřejné zakázky.

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek je ve smyslu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 14.4.2025.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Seznam změnových listů

Příloha č. 2 – Změny závazků ze smlouvy

Příloha č. 3 – změnové listy č. 32, č. 33, č. 34, č. 35, č. 36, č. 37, č. 38, č. 39, č. 40, č. 41, č. 42, č. 43, č. 44, č. 45, č.

46

Objednatel:



Petr Koleta

hejtman Královéhradeckého kraje

Zhotovitel:



Ing. Petr Kulda, jednatel

S T A K O společnost s ručením omezeným

"Interna Nový Bvdžov - požární bezpečnostní řešení, úpravy objektu - stavební práce"; ZD/16/421

DODATEK č. 4

SoD 68 966 298,29 Kč
 Cena celková vč. Dodatek č. 1 : 69 977 038,35 Kč
 Cena celková vč. Dodatek č. 1 a č. 2 : 70 847 501,05 Kč
 Cena celková vč. Dodatek č. 1, č. 2 a č. 3: 71 345 943,23 Kč
 Cena celková vč. Dodatek č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4: 72 258 770,77 Kč

č. ZL	obsah změny	cena bez DPH dle STAKC	méně práce	více práce	odstavec dle § 222 ZZVZ	stavební objekt	poznámka
ZL č. 32	Opšické kabely - přesun	38 838,72 Kč	0,00 Kč	38 838,72 Kč	⑥	SO 01	
ZL č. 33	Duální šachty karet	88 671,82 Kč	352 763,36 Kč	441 465,18 Kč	④	SO 01	
ZL č. 34	SDK opláštění - VZT potrubí 3. a 4. NP (WC)	5 386,30 Kč	0,00 Kč	5 386,30 Kč	④	SO 01	
ZL č. 35	Nové řešení podlah v hale m.č. 001 a chodbě m.č. 052, sanace podkladních betónů	132 062,32 Kč	20 805,80 Kč	152 868,12 Kč	⑥	SO 01	
ZL č. 36	Vybourání kofertů - hala m.č. 001	20 453,24 Kč	0,00 Kč	20 453,24 Kč	⑤	SO 01	
ZL č. 37	Změna provedení sítě vč. zateplení objektu SO 01a	94 898,74 Kč	18 518,32 Kč	113 417,06 Kč	⑤	SO 01 a	
ZL č. 38	SDK oddělení šachet - Š1 VZT a šachty výstupu	116 637,68 Kč	0,00 Kč	116 637,68 Kč	⑤	SO 01 a	
ZL č. 39	Injektáž obvodového zdiva SO 01 1.PP - chodba m.č. 052	14 924,33 Kč	0,00 Kč	14 924,33 Kč	⑥	SO 01	
ZL č. 40	Kanalizace - doplnění	33 770,55 Kč	0,00 Kč	33 770,55 Kč	⑥	IO 03	
ZL č. 41	Doplnění zásuvek, kabeláže 230 V (měření teploty = akce ON Jc a.s.)	68 685,38 Kč	0,00 Kč	68 685,38 Kč	④	SO 01 + SO 04 = LDN B	
ZL č. 42	Odpčetí smílek - šachta VZT a výstupová šachta	-71 723,89 Kč	71 723,89 Kč	0,00 Kč	⑤	SO 01 a	
ZL č. 43	SKIAGRAFIE (převody elektro = akce ON Jc a.s.)	298 543,00 Kč	0,00 Kč	298 543,00 Kč	④	SO 01	
ZL č. 44	Výťah V4	32 593,05 Kč	0,00 Kč	32 593,05 Kč	④	SO 01	
ZL č. 45	Bypass do rackové skříně	31 078,25 Kč	0,00 Kč	31 078,25 Kč	④	SO 01	
ZL č. 46	Výťah V4 - záložní zdroj	44 689,04 Kč	0,00 Kč	44 689,04 Kč	④	SO 01	
	Celkem odst. 4		352 763,36 Kč	441 465,18 Kč			
	Celkem odst. 5		90 240,21 Kč	260 803,98 Kč			
	Celkem odst. 6		20 805,80 Kč	240 403,72 Kč			
	Celkem odst. 7		0,00 Kč	0,00 Kč			
	Cena celkem ZL = DODATEK č. 4	950 827,54 Kč	463 839,37 Kč	1 414 666,91 Kč			

kontrola 463 839,37 Kč 1 414 666,91 Kč 950 827,54 Kč

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

"Interna Nový Bydžov - požárně bezpečnostní řešení, úpravy objektu - stavební práce"
ZD/16/421

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	68 966 296,29 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 85 109,01 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 41 226,12 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 1 783,42 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 923 460,21 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 352 793,36 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 5	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 1 049 795,34 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	– 354 576,78 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	1 404 372,12 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) (Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)	1 404 372 Kč < 135 348 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	2,04 % < 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	68 966 296,29 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 1 398 916,25 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 949 544,61 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 359 609,50 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 123 656,83 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 393 138,98 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 109 235,31 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 250 803,98 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 90 240,21 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 2 402 468,71 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 1 272 676,96 Kč bez DPH		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	68 966 296,29 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 537 287,65 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 61 028,24 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 693 161,44 Kč bez DPH		

Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 58 649,41 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 998 936,36 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 381 624,65 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 442 215,90 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Vícepráce (k odst. 6)	+ 240 402,72 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 20 805,80 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 2 469 788,17 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 522 108,10 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 442 215,90 Kč bez DPH		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODSŤ. 5 A 6		
Smluvní cena		68 966 296,29 Kč bez DPH
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 2 402 468,71 Kč bez DPH
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 1 272 676,96 Kč bez DPH
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 2 469 788,17 Kč bez DPH
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 522 108,10 Kč bez DPH
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		3 077 471,82 Kč bez DPH
(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %		4,46 % ≤ 30,00 %

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	4
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 1 414 666,91 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	– 463 839,37 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	950 827,54 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: J. Brádllová

ZMĚNOVÝ LIST**ZL 32****věc: přesun optických kabelů - 1. PP m.č. 001**

Stavba:	Interna Nový Bydžov - požárně bezpečnostní řešení, úpravy objektu - stavební práce		
Objekt:	SO 01 objekt interny		
Předkládá:	STAKO společnost s ručením omezeným	Datum:	27.01.2025

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	3 listů
e-mailem		2) Projektové podklady	listů, výkresů
osobně	X	3) Fotodokumentace	listů

1 Technický popis změny:**1.1 Popis původního řešení:**

Nebylo součástí PD

1.2 Popis nového řešení:

Přeložení stávajících optických kabelů dle skutečnosti

2 Zdůvodnění změny:

Kolize stávajícího vedení optických kabelů s novými automatickými dveřmi

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO (uvést jaký dokument)	X	NE
--	-------------------------------------	----------	-----------

<zde uvést jaký dokument>

4 Dopad do smluvních termínů:	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE
--------------------------------------	---	----------	-----------

<zde uvést dopad>

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	6
--	--------------	----------

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	38 839,72 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		38 839,72 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za PDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Pavel Svořoboda	Ing. Jaroslav Řehula	Ing. Radek Myšák	Ing. Josef Kubíček	Jitka Brádllová

STAKO	Ing. Jaroslav Řehula	IRBOS s.r.o.	Oblastní nemocnice Jičín a.s.	Královéhradecký kraj

ROZPOČET

Stavba: Interna Nový Bydžov - požárně bezpečnostní řešení, úpravy objektu - stavební práce

Objekt: Dodatek 3

Část: Přesun optických kabelů

Objednatel: Královohradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: STAKO společnost s ručením omezeným

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval:

Datum: 27. 1. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

01 Přesun optických kabelů

37 537,18

1	21M 01	přesun optických kabelů - dle samostatného rozpočtu	soub	1,000	37 537,18	37 537,18	
---	--------	---	------	-------	-----------	-----------	--

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

1 302,54

2	090001001	Vedlejší náklady spojené se změnami stavby	%	375,371	3,47	1 302,54	
---	-----------	--	---	---------	------	----------	--

Celkem

38 839,72

Pol.	Nabídka uchazeče		Specifikace	Jednotka	Množství	Materiál		Montáž		Index ceny	Cenová soustava
	Výrobce	Typové číslo				Jednotková cena	Celkem bez DPH	Jednotková cena	Celkem bez DPH		
0.											
1.			Optický segment Interná Administrativa								
2.			Identifikace, kontrola stávajícího kabelu před odpojením, přípravné práce před odpojením optického kabelu, přestřihnutí kabelu, popozažení kabelu ze serverovny ve 2.NP, stážení kabelu do kolektoru pod internou.	komplet	1	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00		Cena zhotovitele
3.		OTHM-MIK-HDPE-12-8	Mikrotrubička HDPE zemní tlustostěnná 12/8mm, pro přímou pokládku do země, oranžová	m	25	11,50	287,50	28,00	700,00		Cena zhotovitele
4.		OTMP-UF12/8	Spojka mikrotrubiček přímá průhledná celoplast UF, pro vodotěsné spojení mikrotrubiček, pro trubičky 12/8mm	ks	2	32,00	64,00	68,50	137,00		Cena zhotovitele
5.		6004338	Příchytka Grip OBO 2031M/15	ks	25	43,30	1 082,50	14,00	350,00		Cena zhotovitele
6.		1205665	Krabice montážní GW44209 300 x220 x 120 D x V x H(mm), IP 65	ks	1	754,90	754,90	84,00	84,00		Cena zhotovitele
7.		1032805	Vývodka PG9 SCAME 805.3341	ks	2	7,20	14,40	14,30	28,60		Cena zhotovitele
8.			Optický kabel MM 62,5/125 4vl. stávající	m	0	0,00	0,00	0,00	0,00		Cena zhotovitele
9.			Optická kazeta pro 24 svárů, transparentní víčko, 2x výklopné držáky pro 12 svárů	ks	1	138,00	138,00	550,00	550,00	SOD	F1-S001-SLP-38
10.		SXOS-60	Trubička ochrany svárů / 60mm	ks	4	4,20	16,80	0,00	0,00	SOD	F1-S001-EPS -74
11.			Svar optického vlákna	ks	4	0,00	0,00	250,00	1 000,00	SOD	F1-S001-EPS -75
12.			Měření optického segmentu certifikačním měřicím přístrojem, měření útlumu přímou metodou, včetně měřicího protokolu	ks	4	0,00	0,00	104,30	417,20		Cena zhotovitele
13.			Optický segment LDN B Administrativa								
14.			Identifikace, kontrola stávajícího kabelu před odpojením, přípravné práce před odpojením optického kabelu, přestřihnutí kabelu, stážení kabelu do kolektoru pod internou	komplet	1	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00		Cena zhotovitele
15.		OTHM-MIK-HDPE-12-8	Mikrotrubička HDPE zemní tlustostěnná 12/8mm, pro přímou pokládku do země, oranžová	ks	10	11,50	115,00	26,00	260,00		Cena zhotovitele

16.		OTMP-UF12/8	Spojka mikrotrubiček přímá průhledná celoplast UF, pro vodotěsné spojení mikrotrubiček, pro trubičky 12/8mm	ks	2	32,00	64,00	68,50	137,00		Cena zhotovitele
17.		6004338	Příchytka Grip OBO 2031M/15	ks	10	43,30	433,00	14,00	140,00		Cena zhotovitele
18.		1205665	Krabice montážní GW44209 300 x220 x 120 D x V x H(mm), IP 65	ks	2	754,90	1 509,80	84,00	168,00		Cena zhotovitele
19.		1032805	Vývodka PG9 SCAME 805.3341	ks	4	7,20	28,80	14,30	57,20		Cena zhotovitele
20.		MOF-CA-OM1-24-BE02	Univerzální optický kabel CLT, 24 vláken OM1 62,5/125, FR-LSZH, BE02, 6,4mm, Eca, J/A-DQ(BN)H24G62,5/125	m	24	72,00	1 728,00	22,00	528,00		Cena zhotovitele
21.			Kazeta pro 12 smrštitelných ochrann svaru	ks	2	163,50	327,00	32,00	64,00		Cena zhotovitele
22.		SXOS-60	Trubička ochrany sváru / 60mm	ks	8	4,60	36,80	0,00	0,00		Cena zhotovitele
23.			Svar optického vlákna	ks	8	0,00	0,00	250,00	2 000,00	SOD	F1 SO01-SLP-51
24.			Měření optického segmentu certifikačním měřicím přístrojem, měření útlumu přímou metodou, včetně měřicího protokolu	ks	4	0,00	0,00	104,50	417,98		Cena zhotovitele
25.			Ostatní								
26.			Příplatek za práci v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu	hodina	8	0,00	0,00	526,40	4 211,20		Cena zhotovitele
27.			Podružný materiál	komplet	1	758,00	758,00	1 107,70	1 107,70		Cena zhotovitele
28.			Kompletace	komplet	1	0,00	0,00	1 232,00	1 232,00		Cena zhotovitele
29.			Spolupráce s ostatními profesemi stavby	hodina	2	0,00	0,00	526,40	1 052,80		Cena zhotovitele
30.			Úklid	komplet	1	0,00	0,00	336,00	336,00		Cena zhotovitele
31.			Vedlejší náklady - cestovné + dopravné	komplet	1	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00		Cena zhotovitele
32.			Inženýrská činnost	komplet	1	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00		Cena zhotovitele
						Celkem bez DPH		7 358,50	30 178,68		
						Celkem materiál + montáž bez DPH			37 537,18		

ZMĚNOVÝ LIST

věc: čtečky karet

ZL 33

Stavba:	Interna Nový Bydžov - požárně bezpečnostní řešení, úpravy objektu - stavební práce		
Objekt:	SO 01 objekt interny		
Předkládá:	STAKO společnost s ručením omezeným	Datum:	27.01.2025

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	3 listů
e-mailem		2) Projektové podklady	listů, výkresů
osobně	X	3) Fotodokumentace	listů

1 Technický popis změny:**1.1 Popis původního řešení:**

řešeno v PD - frekvence 125 kHz, PD zpracována v r. 2020 - 2021

1.2 Popis nového řešení:

technologie RFID čipů pracuje na frekvenci 125 kHz, jedná se dnes již o zastaralou technologii, požadavek uživatele, aby umožňovaly duální režim, tzn. aby kromě 125 kHz uměly pracovat i s technologií 13,56 MHz MIFARE

2 Zdůvodnění změny:

specifikace dodávky dle nového požadavku uživatele

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO (uvést jaký dokument)	X	NE
---	------------------------------	---	----

<zde uvést jaký dokument>

4 Dopad do smluvních termínů:	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE
-------------------------------	--	---	----

<zde uvést dopad>

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	6
---	-------	---

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	352 793,36 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	441 465,18 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		88 671,82 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Pavel Syoboda	Ing. Jaroslav Řehula	Ing. Radek Myšák	Ing. Josef Kubiček	Jitka Brádllová
STAKO	Ing. Jaroslav Řehula	IRBOS s.r.o.	Oblastní nemocnice Jičín a.s.	Královéhradecký kraj

ROZPOČET

Stavba: Interna Nový Bydžov - požárně bezpečnostní řešení, úpravy objektu - stavební práce

Objekt: Dodatek

Část: Slaboproud - čtečky karet

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: STAKO společnost s ručením omezeným

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval:

Datum: 28. 1. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

001

Čtečky karet

85 698,10

1	21M 02a	čtečky karet VCP - dle samostatného rozpočtu	soub	1,000	438 491,46	438 491,46	
2	21M 02b	čtečky karet MNP - dle samostatného rozpočtu	soub	1,000	-352 793,36	-352 793,36	

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

2 973,72

3	090001001	Vedlejší náklady spojené se změnami stavby	%	856,981	3,47	2 973,72	
---	-----------	--	---	---------	------	----------	--

Celkem

88 671,82

Pol.	Nabídka uchazeče		Specifikace	Jednotka	Množství	Materiál		Montáž		Index ceny	Cenná soustava
	Výrobce	Typové číslo				Jednotková cena	Celkem bez DPH	Jednotková cena	Celkem bez DPH		
IP ČTEČKY KARET											
TYP 2 - Interkom IP, 3 tlačítka, integrovaná čtečka karet 125kHz, montáž do zdi											
2N	ATEUS-91550941		Rozšiřující modul čtečky RFID karet 125kHz, podporované standardy: EM-41xx, HID Proximity, 1. Mifare Classic 1k a 4k, DESFire EV1, Mini, Plus S&X, Ultralight, Ultralight C, 1. CEPAS, HID ICLASS, 2. JIS X 6319, 3. Felica, 1. SmartPhone s podporou NFC/HCE, od systému Android verze 4.3, d. EMarine. Provozní teplota - 40°C až 60°C,	-1	ks	-10 221,12	-10 221,00	250,00	-250,00		SO01-BS, 6
2N	ATEUS-9155082		Rozšiřující modul čtečky RFID 13.56MHz+125kHz+NFC, podporované standardy: EM-41xx, HID Proximity, 1. Mifare Classic 1k a 4k, DESFire EV1, Mini, Plus S&X, Ultralight, Ultralight C, 1. CEPAS, HID ICLASS, 2. JIS X 6319, 3. Felica, 1. SmartPhone s podporou NFC/HCE, od systému Android verze 4.3, d. EMarine. Provozní teplota - 40°C až 60°C,	1	ks	14 787,06	14 787,06	250,00	250,00		Cena dodavatele
IP ČTEČKY KARET											
IP čtečka karet 125kHz, montáž do zdi, nikl											
2N	ATEUS-9160341US	ATEUS-9160341	Access Unit 2.0 RFID, autonomní IP čtečka 125kHz (EM4100, EM4102, HID Pro) bez krycího rámečku, podporované protokoly: DHCP opt. 66, SMTP, TFTP, HTTP, HTTPS, Syslog, Provozní teplota - 40°C až 60°C, krytí IP 54, napájení 12V±15%/1A DC nebo PoE, PoE 802.3af (Class 0 - 12.95W), LAN: 10/100BASE-TX s Auto-MDIX, RJ-45. Výstup spínáče NC/NO kontakty, max 30V / 1A AC/DC, aktivní výstup spínáče 8+12V DC/max 600mA, 2 vstupy v aktivním/pasivním režimu, bzučák 97 cBA, krytí IP54, IK08	-2	ks	16 117,92	-32 235,84	225,00	-450,00		SO01-BS,14
2N	ATEUS-9160344		Access Unit 2.0 125kHz, 13.56MHz, NFC, PIC	2	ks	12 869,00	25 738,00	313,00	626,00		Cena dodavatele
2N	ATEUS-9137420E		Externí PC čtečka RFID karet 125 kHz, USB	-1	ks	1 471,00	-1 471,00	195,00	-195,00		SO01-BS,17
2N	9137421E		Externí RFID čtečka 13.56MHz+125kHz, USB	1	ks	7 426,00	7 426,00	195,00	195,00		
						4 023,22			176,00		
						4 199,22					

Pol.	Nabídka uchazeče		Specifikace	Jednotka	Množství	Materiál		Montáž		Index ceny	Cenová soustava
	Výrobce	Typové číslo				Jednotková cena	Celkem bez DPH	Jednotková cena	Celkem bez DPH		
IP ČTEČKY KARET											
IP čtečka karet 125kHz, montáž do zdi, nikl											
	ATEUS-9160341		Access Unit 2.0 RFID, autonomní IP čtečka 125kHz (EM4100, EM4102, HID Pro), bez krycího rámečku, podporované protokoly: DHCP opt. 66, SMTP, TFTP, HTTP, HTTPS, Syslog; Provozní teplota - 40°C až 60°C, krytí IP 64, napájení 12V±5%/1A DC nebo PoE, PoE 802.3af (Class 0 - 12.95W), LAN: 10/100BASE-TX s Auto-MDIX, RJ-45. Výstup spínače NC/NO kontakty, max 30V / 1A AC/DC, aktivní výstup spínače 8÷12V DC/max 600mA, 2 vstupy v aktivním/pasivním režimu, bzučák 87 cBA, krytí IP54, IK08	-9	ks	16 117,92	-145 061,28	225,00	-2 025,00		F2S0018S
			Access Unit 2.0 125kHz, 13.56MHz, NFC, PIC	9	ks	18 450,00	166 050,00	225,00	2 025,00		Cena dodavatele
						20 988,72		0,00			
						20 988,72					

Pol.	Nabídka uchazeče		Specifikace	Jednotka	Množství	Materiál		Montáž		Index ceny	Cenová soustava
	Výrobce	Typová číslo				Jednotková cena	Celkem bez DPH	Jednotková cena	Celkem bez DPH		
Demontáže											
			Demontáž stávajících dveřních systémů v objektu interny, včetně tras a kabeláže.	10	ks	0,00	0,00	650,00	6 500,00		Cena dodavatele
DVEŘNÍ INTERKOMY											
TYP 1 - Interkom IP, 1 tlačítko, integrovaná čtečka karet 125kHz, montáž do zdi											
			Rozšiřující modul čtečky RFID karet 125kHz, podporované standardy: EM-41xx, HID Proximity, 1. Mileare Classic 1k a 4k, DESFire EV1, Mini, Plus S&X, Ultralight, Ultralight C, 1. CEPAS, HID iCLASS, 2. JIS X 6319, 3. Felica, 1. SmartPhone s podporou NFC/HCE, od systému Android verze 4,3, d. EMarine. Provozní teplota - 40°C až 60°C.	-5	ks	10 221,12	-51 105,60	250,00	-1 250,00		SO01 BS 2F 6
			Rozšiřující modul čtečky RFID 13.56MHz+125kHz+NFC, podporované standardy: EM-41xx, HID Proximity, 1. Mileare Classic 1k a 4k, DESFire EV1, Mini, Plus S&X, Ultralight, Ultralight C, 1. CEPAS, HID iCLASS, 2. JIS X 6319, 3. Felica, 1. SmartPhone s podporou NFC/HCE, od systému Android verze 4,3, d. EMarine. Provozní teplota - 40°C až 60°C.	5	ks	17 426,40	87 132,00	250,00	1 250,00		Cena dodavatele

			Access Unit 2.0 RFID, autonomní IP čtečka 125kHz (EM4100, EM4102, HID Pro), bez krycího rámečku, podporované protokoly: DHCP opt. 66, SMTP, TFTP, HTTP, HTTPS, Syslog; Provozní teplota - 40°C až 60°C, krytí IP 54, napájení 12V±15%/1A DC nebo PoE, PoE 802.3af (Class 0 - 12.95W); LAN: 10/100BASE-TX s Auto-MDIX, RJ-45. Výstup spínače NC/NO kontakty, max 30V / 1A AC/DC, aktivní výstup spínače B+12V DC/max 600mA, 2 vstupy v aktivním/pasivním režimu, bzučák 97 dBA, krytí IP54, IK08	-6	ks	16 117,92	-96 707,52	225,00	-1 350,00		SO01 BS 2F 14
			Access Unit 2.0 125kHz, 13.56MHz, NFC, PIC	6	ks	16 450,00	110 700,00	225,00	1 350,00		Cena dodavatele
							50 018,88		6 900,00		
							56 918,88				

Objekt SO 02 2F - Přístupový systém

Pol.	Nabídka uchazeče		Specifikace	Jednotka	Množství	Materiál		Montáž		Index ceny	Cenová soustava
	Výrobce	Typové číslo				Jednotková cena	Celkem bez DPH	Jednotková cena	Celkem bez DPH		
			DVEŘNÍ INTERKOMY								
			TYP 1 - Interkom IP, 1 tlačítko, integrovaná čtečka karet 125kHz, montáž do zdi								
			Rozšiřující modul čtečky RFID karet 125kHz, podporované standardy: EM-41xx, HID Proximity, 1. Mifare Classic 1k a 4k, DESFire EV1, Mini, Plus S&X, Ultralight, Ultralight C, 1. CEPAS, HID iCLASS, 2. JIS X 6319, 3. Felica, 1. SmartPhone s podporou NFC/HCE, od systému Android verze 4.3, d. EManne. Provozní teplota - 40°C až 60°C,	-1	ks	10 221,12	-10 221,12	250,00	-250,00		SO01 BS 2F 6
			Rozšiřující modul čtečky RFID 13.56MHz+125kHz+NFC, podporované standardy: EM-41xx, HID Proximity, 1. Mifare Classic 1k a 4k, DESFire EV1, Mini, Plus S&X, Ultralight, Ultralight C, 1. CEPAS, HID iCLASS, 2. JIS X 6319, 3. Felica, 1. SmartPhone s podporou NFC/HCE, od systému Android verze 4.3, d. EManne. Provozní teplota - 40°C až 60°C,	1	ks	13 812,40	13 812,40	250,00	250,00		Cena dodavatele
						3 591,28		0,00			
						3 591,28					

Celkem:

85 698,10

ZMĚNOVÝ LIST				ZL 34	
věc: SDK opláštění VZT potrubí 3. a 4. NP (WC)					
Stavba:		Interna Nový Bydžov - požární bezpečnostní řešení, úpravy objektu - stavební práce			
Objekt:		SO 01 objekt interny			
Předkládá:		STAKO společnost s ručením omezeným		Datum: 27.01.2025	
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1	listů	
e-mailem		2) Projektové podklady		listů, výkresů	
osobně	X	3) Fotodokumentace		listů	
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení: Nebylo předmětem PD					
1.2 Popis nového řešení: Dodávka a montáž SDK opláštění VZT potrubí 3. a 4. NP (WC)					
2 Zdůvodnění změny:					
rozvody VZT pro odvětrání WC zakryty SDK kastlíky z důvodu hygienického (úklid, hluk) a estetického na základě požadavku uživatele					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO (uvést jaký dokument)		X	NE
<zde uvést jaký dokument>					
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		X	NE
<zde uvést dopad>					
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst.	4
6 Náklady:		Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
		Cena víceprací (přípočet):	+	5 386,30 Kč	bez DPH
		Výsledná ceny změny:		5 386,30 Kč	bez DPH
7 Schválil:					
za zhotovitele:		za TBS:		za AD:	
Pavel Svoboda		Ing. Jaroslav Řehula		Ing. Radek Myšák	
				za uživatele:	
				Ing. Josef Kubíček	
				za objednatele:	
				Jitka Brádllová	
STAKO		Ing. Jaroslav Řehula		IRBOS s.r.o.	
				Oblastní nemocnice Jičín a.s.	
				Královéhradecký kraj	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Interna Nový Bydžov - požárně bezpečnostní řešení, úpravy objektu - stavební práce

Objekt: Dodatek 3

Část: SDK opláštění VZT potrubí 3. a 4. NP (WC)

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: STAKO společnost s ručením omezeným

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval:

Datum: 14. 1. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Index	Cenová soustava
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV 5 205,66

763 Konstrukce suché výstavby 5 205,66

3	763	763164541	SDK obklad kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xH2 12,5	m	8,320	625,68	5 205,66	0,79	URS, CS 2025/1
			"mč. 342"4,0		4,000				
			"mč 250"4,32		4,320				
			Součet		8,320				

vrn Vedlejší rozpočtové náklady 180,64

4	000	090001001	Vedlejší náklady spojené se změnami stavby	%	52,057	3,47	180,64		SOD, VRN
---	-----	-----------	--	---	--------	------	--------	--	----------

Celkem 5 386,30

ZMĚNOVÝ LIST

ZL 35**Podlahy 1.PP m.č. 001 a m.č. 052 - provedení dle skutečnosti**

Stavba:	Interna Nový Bydžov - požárně bezpečnostní řešení, úpravy objektu - stavební práce		
Objekt:	SO 01 objekt interny		
Předkládá:	STAKO společnost s ručením omezeným	Datum:	27.01.2025

Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů	
poštou		1) Položkový rozpočet změny	2 listů
e-mailem		2) Projektové podklady	listů, výkresů
osobně	X	3) Fotodokumentace	listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

V PD bylo předpokládáno se stejnou výškovou úrovní stávajících podlah a bylo uvažováno s odstraněním stávající podlahové krytiny - teracová dlažba a následné vyrovnaní podkladu s pokládkou nové keramické dlažby.

1.2 Popis nového řešení:

Úprava původního návrhu s ponecháním teracové podlahy z důvodu sondami odhalené nesoudržné betonové vrstvy a rozdílné tloušťky podloží pod teracem. Nově bude provedena sanace podkladních betonů, výprávka trhlin v podlaze sešitím a budou provedeny rychleschnoucí vyrovnávací vrstvy z důvodu větších nerovností a navázání na okolní místnosti pomocí vyrovnávacích ramp.

2 Zdůvodnění změny:

Vyrovnaní výškových rozdílů nové podlahy v hale m.č. 001 a výškových rozdílů navazujících místností. Provedení prací pro nové podlahy z PVC a dlažby vzhledem ke skutečnému stavu, provedení dle tohoto řešení nebude mít vliv na prodloužení uzavření provozu rehabilitace.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:

ANO

(uvést jaký dokument)

X**NE**

<zde uvést jaký dokument>

4 Dopad do smluvních termínů:

ANO

(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)

X**NE**

<zde uvést dopad>

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek

odst.

6

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	20 805,80 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	152 868,12 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		132 062,32 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Pavel Svoboda	Ing. Jaroslav Řehula	Ing. Radek Myšák	Ing. Josef Kubiček	Jitka Brádllová

STAKO	Ing. Jaroslav Řehula	IRBOS s.r.o.	Oblastní nemocnice Jičín a.s.	Královéhradecký kraj

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Interna Nový Bydžov - požárně bezpečnostní řešení, úpravy objektu - stavební práce

Objekt: Dodatek 3

Část: Nové řešení podlah SO 01 v hale m.č.001 a chodbě m.č. 052 + sanace podkladních betonu

Objednatel: Královéhradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: STAKO společnost s ručením omezeným

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval:

Datum: 15. 1. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Indexy	Cenová soustava
01 a chodbě m.č. 052 + sanace podkladních betonu					127 633,45				
1	013	965043331	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,202	4 661,00	941,52	0,79	URS, CU 2025/1
((1,56*1,2+1,8*1,2))*0,05					0,202				
2	013	977312111	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 50 mm	m	7,920	144,57	1 144,99	0,79	URS, CU 2025/1
(1,56+1,8)*2+1,2					7,920				
3	013	977311111	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 50 mm	m	3,200	101,91	326,11	0,79	URS, CU 2025/1
1,4+1,8					3,200				
4	005	985323111	Spojovací (adhezni) můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	7,050	380,78	2 684,50	0,79	URS, CU 2025/1
5	783	783902270	Provedení celoplošného vyrovnání betonové podlahy tloušťky do 3 mm	m2	7,050	59,17	417,15	0,79	URS, CU 2025/1
7,05					7,050				
6	MPI	MPI.223525	PLANITOP FAST 330 ŠEDÝ 25kg	kg	33,840	27,78	940,08	0,79	URS, CU 2025/1
7,05 * 4,8					33,840				
7	783	783902280	Příplatek k provedení celoplošného vyrovnání betonové podlahy ZKD 1 mm přes 3 mm	m2	331,350	16,99	5 629,64	0,79	URS, CU 2025/1
7,05					7,050				
8	MPI	MPI.223525	PLANITOP FAST 330 ŠEDÝ 25kg	kg	530,160	27,78	14 727,84	0,79	URS, CU 2025/1
7,05*47					331,350				
9	771	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	3,020	145,36	438,99	0,79	URS, CU 2025/1
1,8*1,9-0,4*1,0					3,020				
10	R	771574111	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2	m2	3,020	676,00	2 041,52		SOD, SO01a, 199
3,02					3,020				
11		59761011	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru do 9ks/m2	m2	3,775	559,52	2 112,19		SOD, SO01a, 200
3,02*1,25					3,775				
12	771	771595212	Roh kamenický dlažeb s klasickým stěpem maloformátových	m	1,400	664,39	930,15	0,79	URS, CU 2025/1
13	R	771574153	Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	4,030	842,40	3 394,87		SOD, SO01a, 201
4,03					4,030				
14		59761440R	dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru tl.10 mm	m2	4,635	426,40	1 976,36		SOD, SO01a, 202
4,03*1,15"Přepočtené koeficientem množství					4,635				
15	771	771595212	Roh kamenický dlažeb s klasickým stěpem maloformátových	m	4,260	664,39	2 830,30	0,79	URS, CU 2025/1
16	005	985323111	Spojovací (adhezni) můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	4,800	380,78	1 827,74	0,79	URS, CU 2025/1
2,4*2					4,800				
17	777	777131111	Penetrační epoxidový nátěr podlahy plněný pískem	m2	4,800	161,95	777,36	0,79	URS, CU 2025/1
2,4*2					4,800				
18	783	783902270	Provedení celoplošného vyrovnání betonové podlahy tloušťky do 3 mm	m2	4,800	59,17	284,02	0,79	URS, CU 2025/1
19	MPI	MPI.223525	PLANITOP FAST 330 ŠEDÝ 25kg	kg	23,040	27,78	640,05	0,79	URS, CU 2025/1
4,8*3*1,6					23,040				
20	783	783902280	Příplatek k provedení celoplošného vyrovnání betonové podlahy ZKD 1 mm přes 3 mm	m2	177,600	16,99	3 017,42	0,79	URS, CU 2025/1
4,8*37					177,600				
21	MPI	MPI.223525	PLANITOP FAST 330 ŠEDÝ 25kg	kg	284,160	27,78	7 893,96	0,79	URS, CU 2025/1
177,6					177,600				
22	014	632683112	Sešívání trhlín v betonových podlahách ocelovými sponkami ve vzdálenosti přes 10 do 15 cm	m	27,200	696,78	18 952,42	0,79	URS, CU 2025/1
"m.č. 001 Hala"8,4+1,6*2+1,3					12,900				
"rozvodna EPS"2*1,8+1*1					5,600				

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Indexy	Cenová soustava
"servovna"1,3+0,6+0,3					2,200				
"čekárna"2*2+1+1,5					6,500				
Součet					27,200				
23	011	634663111	Výplň dilatačních spar šířky do 10 mm v mazaninách polyuretanovou samonivelační hmotou	m	28,180	111,39	3 138,97	0,79	URS, CU 2025/1
24	013	977312111	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 50 mm	m	28,180	144,57	4 073,98	0,79	URS, CU 2025/1
28,18					28,180				
25	783	783901403	Vysátí dřevěných podlah před provedením nátěru	m2	5,636	8,14	45,88	0,79	URS, CU 2025/1
28,18*0,20					5,636				
26	R	771551810	Demontáž podlah z dlaždic teracových kladených do malty	m2	-66,470	124,80	-8 295,46		SOD, SO01, 15
-66,47					-66,470				
27	R	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	-73,400	20,80	-1 526,72		SOD, SO01-1, 70
-66,47-6,93					-73,400				
28	014	952902041	Čištění budov drhnutí hladkých podlah s chemickými prostředky	m2	73,400	21,65	1 589,11	0,79	URS, CU 2025/1
29	777	777131111	Penetrační epoxidový nátěr podlahy plněný pískem	m2	73,400	161,95	11 887,13	0,79	URS, CU 2025/1
30	783	783902270	Provedení celoplošného vyrovnání betonové podlahy tloušťky do 3 mm	m2	73,400	59,17	4 343,08	0,79	URS, CU 2025/1
73,4					73,400				
31	783	783902280	Příplatek k provedení celoplošného vyrovnání betonové podlahy ZKD 1 mm přes 3 mm	m2	767,750	16,99	13 044,07	0,79	URS, CU 2025/1
36,47*(10-3)					255,290				
30*(15-3)					360,000				
6,93*(25-3)					152,460				
Součet					767,750				
32		MPI.0124323	ULTRAPLAN RENOVATION 23 kg	kg	1 580,720	17,85	28 215,85	0,79	URS, CU 2025/1
73,4*3*1,6					352,320				
767,75*1,6					1 228,400				
Součet					1 580,720				
33	R	997013116	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s použitím mechanizace	t	-8,577	371,28	-3 184,47		SOD, SO01-1, 32
34	R	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-8,577	326,56	-2 800,91		SOD, SO01-1, 33
35	R	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-162,963	14,25	-2 322,22		SOD, SO01-1, 34
8,577*19 "Přepočtené koeficientem množství"					-162,963				
36	R	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	-8,577	312,00	-2 676,02		SOD, SO01-1, 35
37	R	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	17,008	480,48	8 172,00		SOD, SO01a, 107
VRN Vedlejší rozpočtové náklady					4 428,87				
38	000	090001001	Vedlejší náklady spojené se změnami stavby	%	1 276,330	3,47	4 428,87		SOD, VRN
Celkem					132 062,32				

ZMĚNOVÝ LIST				ZL 36	
věc: vybourání luxferů - 1.PP m.č. 001					
Stavba:		Interna Nový Bydžov - požárně bezpečnostní řešení, úpravy objektu - stavební práce			
Objekt:		SO 01 objekt interny			
Předkládá:		STAKO společnost s ručením omezeným		Datum: 27.01.2025	
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny		1	listů
e-mailem		2) Projektové podklady			listů, výkresů
osobně X		3) Fotodokumentace			listů
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení: Neřešeno v PD					
1.2 Popis nového řešení: Vybourání prosvětlovacího pásu ze skleněných tvárnic a zazdění včetně povrchové úpravy.					
2 Zdůvodnění změny: Zajištění požadované požární odolnosti dělící stěny dle PBR.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO (uvést jaký dokument)		X	NE
<zde uvést jaký dokument>					
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		X	NE
<zde uvést dopad>					
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst.	5
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč bez DPH		
	Cena víceprací (přípočet):	+	20 453,24 Kč bez DPH		
	Výsledná ceny změny:		20 453,24 Kč bez DPH		
7 Schválil:					
za zhotovitele:		za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Pavel Svoboda		Ing. Jaroslav Řehula	Ing. Radek Myšák	Ing. Josef Kubiček	Jitka Brádllová
STAKO		Ing. Jaroslav Řehula	IRBOS s.r.o.	Oblastní nemocnice Jičín a.s.	Královéhradecký kraj

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Interna Nový Bydžov - požární bezpečnostní řešení, úpravy objektu - stavební práce
 Objekt: Dodatek
 Část: Vybourání luxferů

Objednatel: Královéhradecký kraj, Hradec Králové
 Zhotovitel: STAKO společnost s ručením omezeným
 Místo: Nový Bydžov

Zpracoval:
 Datum: 14. 1. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Indexy	Cenová úroveň
01			Vybourání a zazdění prosvětlovacího skl.pásu obj. SO01 - hala m.č. 001						
1	014	340271025	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m ² tvářícemi pórcbetonovými tl 100 mm (2,10+6,05)*0,92	m ²	7,498	791,44	5 934,22		SOD, So01-1, 5
2	014	612325302	Vápencementová štuková omílka ostění nebo nadpraží (6,05+2,1+0,92)*2*0,05 Součet	m ²	0,907 0,907	581,68	527,58		SOD, So01-1, 13
3	R	612321141	Vápencementová omílka štuková dvoustvrť vnitřních stěn nanášená ručně (6,05+2,1)*0,92*2	m ²	14,996	374,41	5 614,65		SOD, So01-1, 14
4	014	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů (6,05+2,10+0,92)*2	m	18,140	221,52	4 018,37		SOD, So07, 4
5	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ² (2,1+6,05)*1,2	m ²	9,780	66,14	646,85		SOD, So01a, 102
6	013	962081131	Bourání plítek ze skleněných tváří tl do 100 mm (2,10+6,05)*0,92	m ²	7,498	161,96	1 214,30	0,79	URS, Cu 01/25
7	R	997013116	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s použitím mechanizace	t	0,750	371,28	278,46		SOD, So01, 7
8	R	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,750	326,56	244,92		SOD, So01, 8
9	R	997013509	Přilpatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 0,75*19 "Přepočtené koeficientem množství"	t	14,250 14,250	14,25	203,06		SOD, So01, 9
10	R	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kódu odpadu 17 09 04	t	0,750	312,00	234,00		SOD, So01, 10
11	R	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	0,799	1 064,96	850,90		SOD, So01, 16
VRN			Vedlejší rozpočtové náklady						
12	000	090001001	Vedlejší náklady spojené se změnami stavby	%	197,673	3,47	685,93		SOD VRN

Celkem

20 453,24

ZMĚNOVÝ LIST

ZL 37**věc: změna provedení atiky SO 01a**

Stavba:	Interna Nový Bydžov - požárně bezpečnostní řešení, úpravy objektu - stavební práce		
Objekt:	SO 01a zděná přístavba interny		
Předkládá:	STAKO společnost s ručením omezeným	Datum:	27.01.2025

Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů	
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem		2) Projektové podklady	2 listů, výkresů
osobně	X	3) Fotodokumentace	listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

Atikové zdivo nebylo ve výkazu výměr

1.2 Popis nového řešení:

Zpracován nový detail řešení atiky na stávající budovu SO 01 a doplnění souvisejících skladeb konstrukcí

2 Zdůvodnění změny:

Úprava atiky v návaznosti na stávající stav - viz. úprava PD projektantem

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:

ANO

(uvést jaký dokument)

X**NE**

<zde uvést jaký dokument>

4 Dopad do smluvních termínů:

ANO

(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)

X**NE**

<zde uvést dopad>

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek

odst.

5

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	18 516,32 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	113 413,06 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		94 896,74 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Pavel Svoboda	Ing. Jaroslav Řehula	Ing. Radek Myšák	Ing. Josef Kubíček	Jitka Brádllová



STAKO	Ing. Jaroslav Řehula	IRBOS s.r.o.	Oblastní nemocnice Jičín a.s.	Královéhradecký kraj
-------	----------------------	--------------	-------------------------------	----------------------

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Interná Nový Bydžov - požární bezpečnostní řešení, úpravy objektu - stavební práce

Objekt: Dodatek 3

Část: Změna provedení atiky vč. zateplení objektu SO01a

Objednatel: Královéhradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: STAKO společnost s ručením omezeným

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval:

Datum: 15. 1. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	M.J	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Index	Cenová soustava
----	-----	-------------	-------	-----	-----------------	-----------------	-------------	-------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

66 367,03

3 Svislé a kompletní konstrukce

21 072,54

1	011	311235141	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 240 mm (13,07*2+6,12*2)*0,5	m2	19,190	1 058,10	21 072,54	0,79	URS, CS 2025/1
---	-----	-----------	--	----	--------	----------	-----------	------	-------------------

4 Vodorovné konstrukce

45 294,49

2	011	417321515	Zlužující pásy a věnce ze ŽB tl. C 25/30 (13,07*2+6,12*2)*0,24*0,30	m3	2,763	4 203,06	11 613,05		SOD, SO01a.52
3	011	417351115	Zřízení bednění zlužujících věnců (13,07+6,12)*2*0,30*2	m2	23,028	748,80	17 243,37		SOD, SO01a.52
4	011	417351116	Odstírání bednění zlužujících věnců	m2	23,038	78,00	1 796,96		SOD, SO01a.54
5	011	417361821	Výsluž zlužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 (13,07+6,12)*2*4*0,888*0,001*1,10 (((13,07+6,12)*2)*0,2+4)*((0,25+0,3)*2)*0,399*0,001*1,10 Součet	t	0,245	36 545,60	8 953,67		SOD, SO01a.52
6	R	898011003	Přesun hmot pro budovy zděné v ples 12 do 24 m	t	11,837	480,48	5 687,44		SOD, SO01a.10

PSV Práce a dodávky PSV

28 529,71

713 Izolace tepelné

8 510,18

7	713	713131241	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek tl do 100mm (13,07+6,12)*2*0,52	m2	19,958	260,70	5 203,05	0,79	URS, CS 2025/1
8	283	28376404	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch $\lambda=0,033$ 19,958*0,08*1,05	m3	1,676	4 100,10	6 871,77	0,79	URS, CS 2025/1
9	713	713131241	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek tl do 100mm (12,57+5,9)*2*0,8	m2	29,552	260,70	7 704,21	0,79	URS, CS 2025/1
10	283	28375950	deska EPS 100 fasádní $\lambda=0,037$ tl 100mm 29,552 * 1,1	m2	32,507	157,21	5 110,43	0,79	URS, CS 2025/1
11	R	713141212	Montáž izolace tepelné střešních plochých lepením nízkoexpanzní (PUR) pěnou alikový klin	m	-36,662	83,20	-3 050,28		SOD, SO01a.14
12		28376141	klin izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový	m3	-1,009	1 315,60	-1 327,44		SOD, SO01a.14
13	R	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	-10,999	873,60	-9 608,73		SOD, SO01a.13
14		28376017	deska penmetrická fasádní soklová 150kPa $\lambda=0,035$ tl 100mm	m2	-12,099	374,40	-4 529,87		SOD, SO01a.13
15	R	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v ples 12 do 24 m	t	0,309	6 916,00	2 137,04		SOD, SO01a.14

762 Konstrukce tesařské

16 837,05

16	762	762361332	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (slíky) z vodorovné překližky tl 21 mm 25,3*0,52	m2	13,156	1 279,80	16 837,05	0,79	URS, CS 2025/1
----	-----	-----------	---	----	--------	----------	-----------	------	-------------------


VRN Vedlejší rozpočtové náklady

3 182,48


17	000	090001001	Vedlejší náklady spojené se změnami stavby	%	917,142	3,47	3 182,48		SOD, VRN
----	-----	-----------	--	---	---------	------	----------	--	----------

Celkem

94 896,74

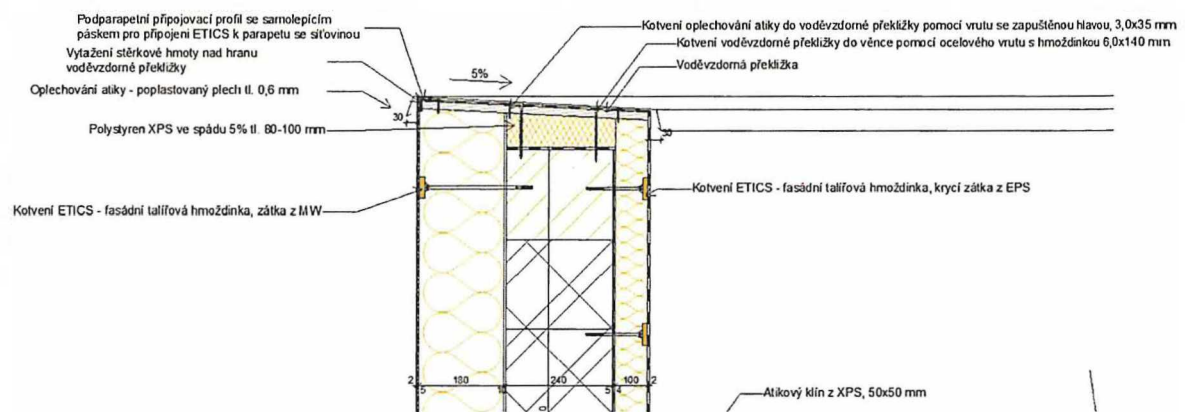

ALTERNATIVA TŘEŠENÍ ZVÍŠENÍ ATIK + DILATACE

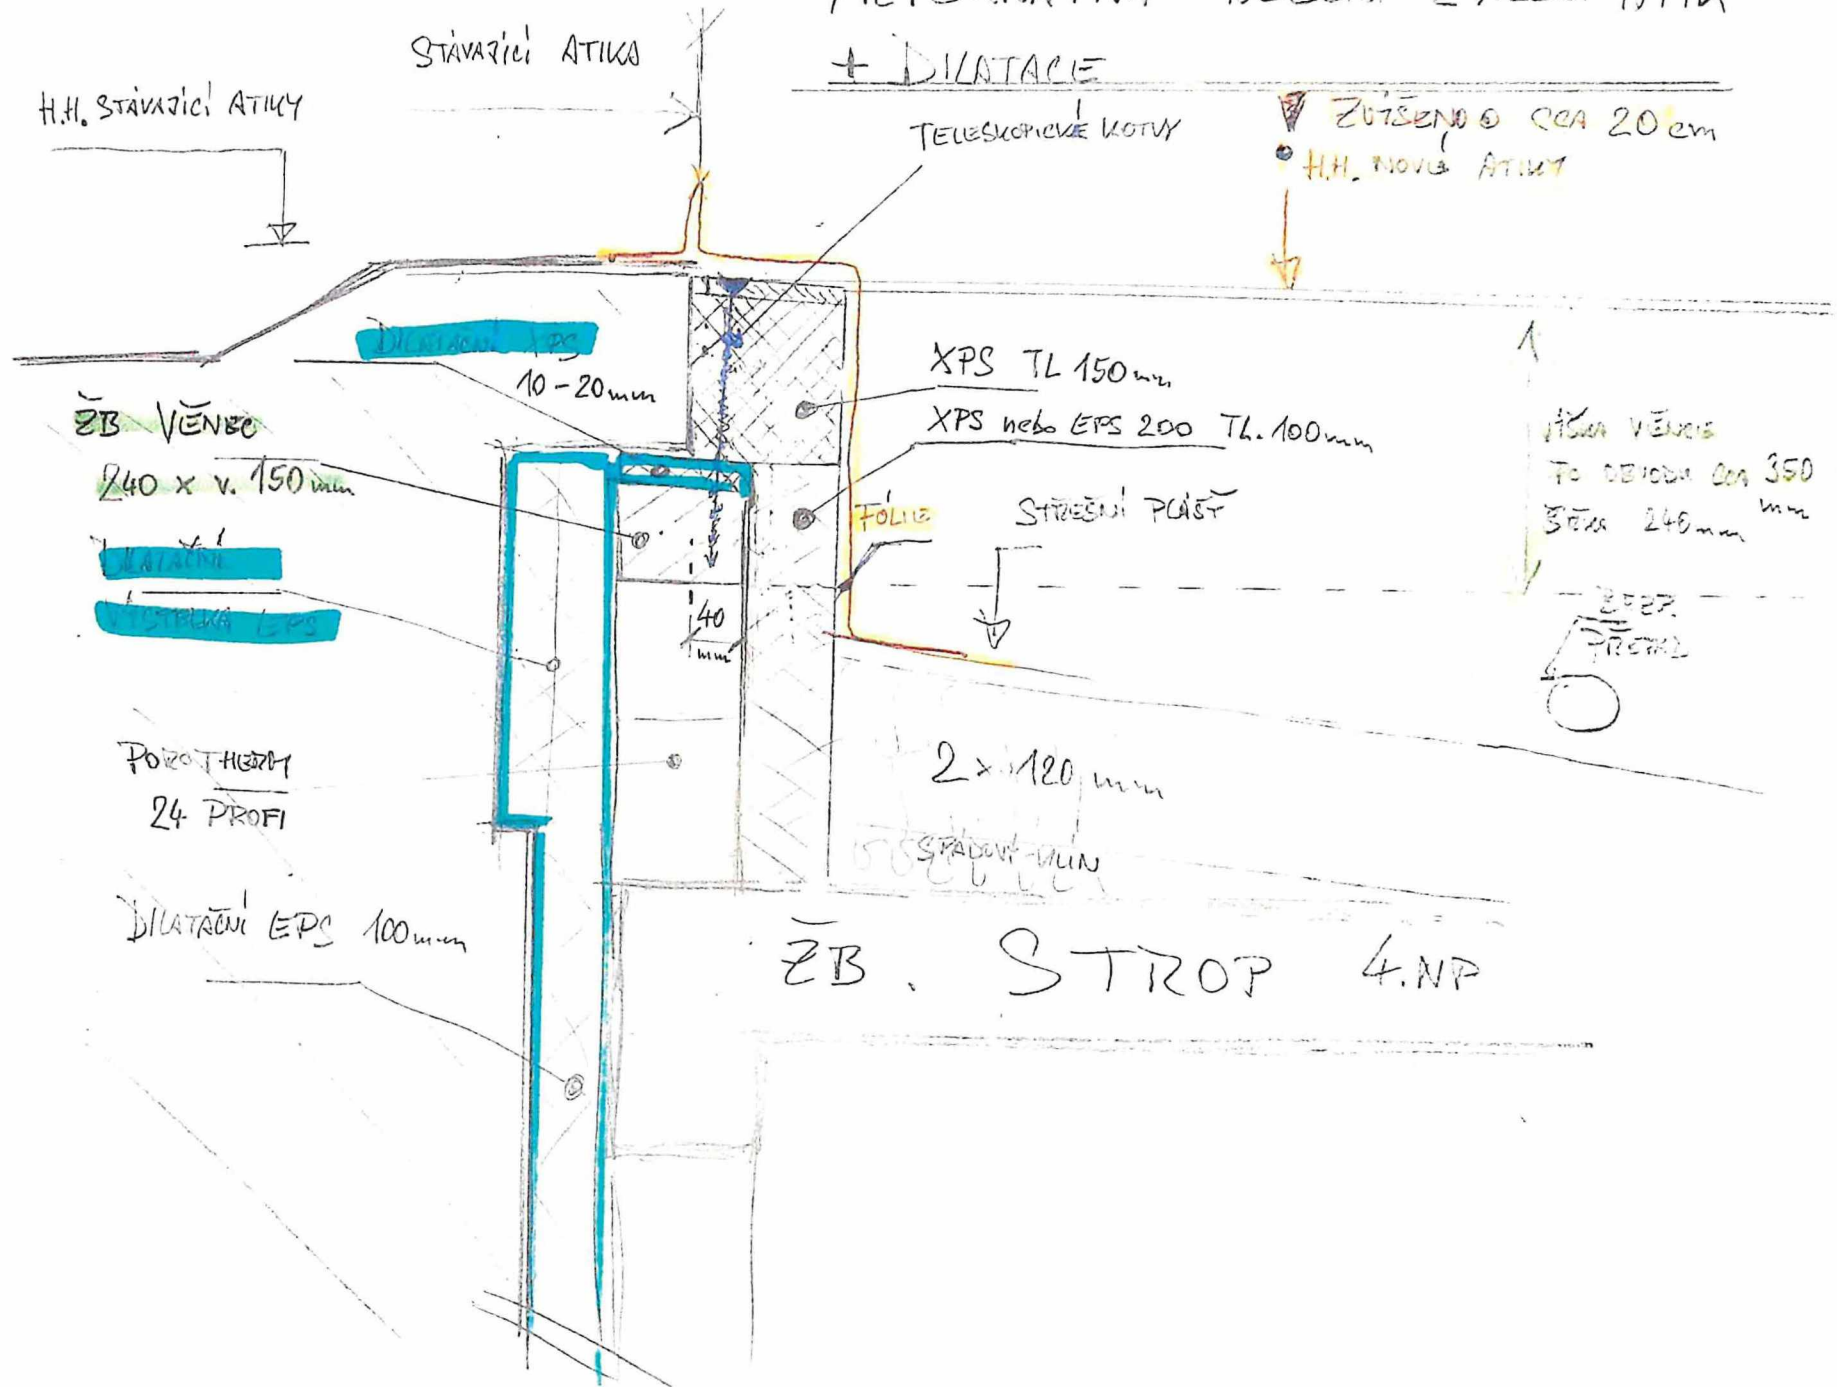

ZMĚNOVÝ LIST				ZL 38
věc: SDK-oddělení šachet - Š1 VZT a šachta výtahu - SO01a				
Stavba:	Interna Nový Bydžov - požárně bezpečnostní řešení, úpravy objektu - stavební práce			
Objekt:	SO 01a zděná přístavba interny			
Předkládá:	STAKO společnost s ručením omezeným	Datum:	27.01.2025	
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1	listů
e-mailem		2) Projektové podklady		listů, výkresů
osobně	X	3) Fotodokumentace		listů
1 Technický popis změny:				
1.1 Popis původního řešení: v PD nebylo neřešeno 1.2 Popis nového řešení: oddělení výtahové šachty sádkartonovou příčkou				
2 Zdůvodnění změny:				
provedení prací dle požadavku dodavatele výtahů na základě normy ČSN 81-20, šachta výtahu musí tvořit samostatný celek, musí být oddělena od šachty VZT				
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		X	ANO náskres montáže, materiálové řešení, technický list	X NE
<zde uvést jaký dokument>				
4 Dopad do smluvních termínů:		X	ANO pět kalenářních týdnů	X NE
<zde uvést dopad>				
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst. 5
6 Náklady:		Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč bez DPH
		Cena víceprací (přípočet):	+	116 937,68 Kč bez DPH
		Výsledná ceny změny:		116 937,68 Kč bez DPH
7 Schválil:				
za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Pavel Svoboda	Ing. Jaroslav Řehula	Ing. Radek Myšák	Ing. Josef Kubiček	Jitka Brádllová
STAKO	Ing. Jaroslav Řehula	IRBOS s.r.o.	Oblastní nemocnice Jičín a.s.	Královéhradecký kraj

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Interna Nový Bydžov - požárně bezpečnostní řešení, úpravy objektu - stavební práce

Objekt: Dodatek 3

Část: SDK oddělení šachet - Š1 VZT a šachty výtahu - SO01a

Objednatel: Královéhradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: STAKO společnost s ručením omezeným

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval:

Datum: 15. 1. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Indexy	Cenová soustava
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	--------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

37 584,09

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

37 584,09

1	R	949311113	Montáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v přes 20 do 30 m	m	19,000	1 071,20	20 352,80		SOD, SO01a, 103
---	---	-----------	--	---	--------	----------	-----------	--	-----------------

"v SOD 1x lešení v šachtě výtahu, vZL 1x lešení v šachtě VZT"19

19,000

2	R	949311211	Příplatek k lešení trubkovému do šachet do 6 m2 v přes 20 do 30 m za první a ZKD den použití	m	285,000	10,61	3 023,85		SOD, SO01a, 104
---	---	-----------	--	---	---------	-------	----------	--	-----------------

19*15

285,000

3	R	949311813	Demontáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v přes 20 do 30 m	m	19,000	747,76	14 207,44		SOD, SO01a, 105
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	--	-----------------

19

19,000

PSV Práce a dodávky PSV

79 353,59

763 Konstrukce suché výstavby

75 127,72

4	763	763231411	Montáž nosné konstrukce dvouvrstvé z profilů CD, UD zavěšené dvouvrstvě	m2	55,328	556,16	30 771,22	0,79	URS, 2025/01
---	-----	-----------	---	----	--------	--------	-----------	------	--------------

2,8*((0,5+1,55+1,75)+(1,75*3)+(1,75*2)+(1,75+1,16+0,4*2))

55,328

5	KNF	KNF.0017633 6	UD profil Knauf 28/27, 28 x 27 x 3000 mm	m	129,712	29,93	3 882,28	0,79	URS, 2025/01
---	-----	---------------	--	---	---------	-------	----------	------	--------------

(2,8+0,5)*2

6,600

(2,8+1,55)*2

8,700

(2,8+1,75)*2*9

81,900

(2,8+1,16)*2

7,920

(2,8+0,4)*2*2

12,800

Součet

117,920

6	KNF	KNF.0000329 2	CD profil Knauf 60/27, 60 x 27 x 2600 mm	m	130,416	41,51	5 413,57	0,79	URS, 2025/01
---	-----	---------------	--	---	---------	-------	----------	------	--------------

"(2,8/0,625)+1 - 6ks"

6*(0,5+1,55+1,75*9+1,16+0,4*2)

118,560

7	763	763231413	Montáž desek II 1x 12,5 mm sádrovláknitý podhled	m2	55,328	120,08	6 643,79	0,79	URS, 2025/01
---	-----	-----------	--	----	--------	--------	----------	------	--------------

8	RGS	RGS.KB20256 7	Rigidur H 12,5 x 1249 x 2000	m2	69,160	252,57	17 467,74	0,79	URS, 2025/01
---	-----	---------------	------------------------------	----	--------	--------	-----------	------	--------------

55,328

55,328

9	763	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	t	1,316	8 320,00	10 949,12		SOD, SO01a, 155
---	-----	-----------	---	---	-------	----------	-----------	--	-----------------

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

4 225,87

10	000	090001001	Vedlejší náklady spojené se změnami stavby	soub	1 217,830	3,47	4 225,87		SOD, VRN
----	-----	-----------	--	------	-----------	------	----------	--	----------

Celkem

116 937,68

ZMĚNOVÝ LIST				ZL 39
věc: injektáž obvodového zdiva SO 01 1.PP - chodba m.č. 052				
Stavba:	Interna Nový Bydžov - požárně bezpečnostní řešení, úpravy objektu - stavební práce			
Objekt:	SO 03 odstranění zatékání do spojovací chodby			
Předkládá:	STAKO společnost s ručením omezeným	Datum:	27.01.2025	
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1	listů
e-mailem		2) Projektové podklady		listů, výkresů
osobně	X	3) Fotodokumentace		listů
1 Technický popis změny:				
1.1 Popis původního řešení: nebylo předmětem PD, PD zpracována v r. 2020 - 2021, v této době nebyla degradace omítky zjevná				
1.2 Popis nového řešení: na základě požadavku uživatele doplnění vodorovné clony obvodového zdiva pomocí chemické injektáže				
2 Zdůvodnění změny:				
odstranění vlhkostní degradace omítky stěn na základě skutečného stavu zjištěné vlhkosti v době realizace				
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO (uvést jaký dokument)	X	NE
<zde uvést jaký dokument>				
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE
<zde uvést dopad>				
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst. 6
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	14 924,33 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		14 924,33 Kč	bez DPH
7 Schválil:				
za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Pavel Svoboda	Ing. Jaroslav Řehula	Ing. Radek Myšák	Ing. Josef Kubiček	Jitka Brádllová
STAKO	Ing. Jaroslav Řehula	IRBOS s.r.o.	Oblastní nemocnice Jičín a.s.	Královéhradecký kraj

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Interna Nový Bydžov - požárně bezpečnostní řešení, úpravy objektu - stavební práce

Objekt: Dodatek 3

Část: Injektáž obvodového zdiva 1.PP-u chodby m.č. 052

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: STAKO společnost s ručením omezeným

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval:

Datum: 15. 1. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Index	Cenová soustava
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-------	-----------------

3 Svislé a kompletní konstrukce

14 924,33

HSV

Práce a dodávky HSV

14 423,82

1	014	319202115	Dodatečná izolace zdiva tl přes 600 do 900 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m	3,400	4 242,30	14 423,82		SOD, ZL23
---	-----	-----------	---	---	-------	----------	-----------	--	-----------

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

500,51

2	000	090001001	Vedlejší náklady spojené se změnami stavby	soub	144,240	3,47	500,51		SOD VRN
---	-----	-----------	--	------	---------	------	--------	--	---------

Celkem

14 924,33

ZMĚNOVÝ LIST				ZL 40	
věc: doplnění kanalizace IO 03					
Stavba:		Interna Nový Bydžov - požárně bezpečnostní řešení, úpravy objektu - stavební práce			
Objekt:		IO 03 dešťová kanalizace			
Předkládá:		STAKO společnost s ručením omezeným		Datum:	27.01.2025
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny	2	listů	
e-mailem		2) Projektové podklady		listů, výkresů	
osobně	X	3) Fotodokumentace		listů	
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení:					
1) Kanalizace u přístavby SO 01a (v PD- VÝŘEZ 1) - dle PD do nové kanalizace měla být napojena stávající opravená kanalizace DN 200 pouze z technického kolektoru — 2) kanalizace u opěrné zdi (v PD-VÝŘEZ 2) - v PD nebylo řešeno osazení zpětné klapky a dopojení drenáží na kanalizační větev Š3-UV1					
1.2 Popis nového řešení:					
1) Do nové kanalizace bylo nutné napojit stávající kanalizace DN 125 od garáží a kuchyně 2) Osazení kanalizační zpětné klapky DN 200 na základě požadavku uživatele. Bylo provedeno nové napojení části drenáží SO 03 do nové přeložky kanalizace Š3-UV1.					
2 Zdůvodnění změny:					
1) Po odkopání stávající trasy kanalizačního potrubí byla objevena stávající odbočující větev kanalizace od garáží a kuchyně, bylo nezbytné napojení této větve do nové přeložky kanalizace Š1-Š2 2) Osazení zpětné klapky proti zamezení vtečení splaškových vod do dešťové kanalizace ústící do stejné kanalizační šachty vč. doplnění odboček pro napojení 2 ks drenážního potrubí					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO (uvést jaký dokument)		X	NE
<zde uvést jaký dokument>					
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		X	NE
<zde uvést dopad>					
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek					odst. 6
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):		-	0,00 Kč bez DPH	
	Cena víceprací (přípočet):		+	33 770,55 Kč bez DPH	
	Výsledná ceny změny:			33 770,55 Kč bez DPH	
7 Schválil:					
za zhotovitele:		za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Pavel Syoboda		Ing. Jaroslav Řehula	Ing. Radek Myšák	Ing. Josef Kubiček	Jitka Brádllová
STAKO		Ing. Jaroslav Řehula	IRBOS s.r.o.	Oblastní nemocnice Jičín a.s.	Královéhradecký kraj

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Interna Nový Bydžov - požární bezpečnostní řešení, úpravy objektu - stavební práce

Objekt: Dodatek 3

Část: Vícepráce kanalizace obj IO 03

Objednatel: Královéhradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: STAKO společnost s ručením omezeným

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval:

Datum: 15. 1. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	index	Cenová soustava
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-------	-----------------

01 Napojení odhalené kanalizace od garáží

33 770,55

1	R	129001101	Příplatek k cenám výkopávek za zřízení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	1,400	448,34	627,68		SOD, IO03, 7
2	R	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	3,360	494,21	1 660,55		SOD, IO03, 10
			3,36		3,360				
3	R	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	3,360	138,53	465,46		SOD, IO03, 19
4	R	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	2,040	41,86	85,39		SOD, IO03, 14
			2,04		2,040				
			Součet		2,040				
5		58333674	kamenivo těžené hrubé frakce 16/32	t	3,264	699,92	2 284,54		SOD, IO03, 20
			2,04*1,6		3,264				
			Součet		3,264				
6	R	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	m3	0,360	223,60	80,50		SOD, IO03, 22
			0,36		0,360				
			Součet		0,360				
7		58337308	štěrkopísek frakce 0/2	t	0,720	279,76	201,43		SOD, IO03, 21
			0,36*2 "Přepočtené koeficientem množství"		0,720				
			Součet		0,720				
8	R	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	0,240	1 141,92	274,06		SOD, IO03, 31
9	R	871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 125	m	3,180	291,20	926,02		SOD, IO03, 34
			3,180		3,180				
			Součet		3,180				
10	R	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160	m	2,120	517,92	1 097,99		SOD, IO03, 35
			2,120		2,120				
			Součet		2,120				
11	R	871365811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN přes 150 do 250	m	2,000	62,40	124,80		SOD, IO03, 38
12	R	877360420	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného odboček DN 250	kus	2,000	595,30	1 190,60		SOD, IO03, 39
13		28617361	odbočka kanalizace PP korugované pro KG 45° DN 250/160	kus	1,000	1 258,40	1 258,40		SOD, IO03, 40

02 Kanalizace - výsek 2

23 493,13

14	271	877350420	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 200	kus	3,000	476,37	1 429,11	0,79	SOD, CS 2025/1
15	286	28654535	odbočka kanalizace PP korugované 45° DN 200/150	kus	2,000	4 684,70	9 369,40	0,79	SOD, CS 2025/1
16	286	28617360	odbočka kanalizace PP korugované pro KG 45° DN 200/160	kus	1,000	1 453,60	1 453,60	0,79	SOD, CS 2025/1
17	271	871313121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 160	m	4,000	142,99	571,96	0,79	SOD, CS 2025/1
18	286	28611164	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8	m	4,120	340,49	1 402,82	0,79	SOD, CS 2025/1
			4 * 1,03		4,120			0,79	

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Index	Cenová soustava
19	271	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	3,000	238,58	715,74	0,79	SOD, CS 2025/1
20	OSM	OSM 777590	PPKGUSM přechodka PP/kam. DN160 SN16	kus	2,000	207,70	415,40	0,79	SOD, CS 2025/1
21	286	28651232	přesuvka kanalizační PVC-U plnostěnná DN 160	kus	1,000	268,60	268,60	0,79	SOD, CS 2025/1
22	271	891355321	Montáž zpětných klapek DN 200	kus	1,000	1 745,90	1 745,90	0,79	SOD, CS 2025/1
23		FRK 5587925 099	AquaPipe výtakový kus DN 200, 1 m dlouhý, s klapkou, sada	kus	1,000	4 988,06	4 988,06	0,79	SOD, CS 2025/1

vrn Vedlejší rozpočtové náklady 1 132,54

24	000	090001001	Vedlejší náklady spojené se změnami stavby	%	326,380	3,47	1 132,54		SOD, VRN
----	-----	-----------	--	---	---------	------	----------	--	----------

Celkem

33 770,55

ZMĚNOVÝ LIST

ZL 41

věc: doplnění zásuvek - měření teploty

Stavba:	Interna Nový Bydžov - požárně bezpečnostní řešení, úpravy objektu - stavební práce		
Objekt:	SO 01 objekt interny		
Předkládá:	STAKO společnost s ručením omezeným	Datum:	27.01.2025

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	4 listů
e-mailem		2) Projektové podklady	listů, výkresů
osobně	X	3) Fotodokumentace	listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:
Nebylo součástí PD

1.2 Popis nového řešení:
nový požadavek uživatele

2 Zdůvodnění změny:
provedení prací dle požadavku uživatele - tyto práce jsou pro akci "měření teploty", je nezbytné je zrealizovat při akci "Interna", tímto řešením odpadne další omezení provozu nemocnice

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO (uvést jaký dokument)	X	NE
<zde uvést jaký dokument>			
4 Dopad do smluvních termínů:	ANO	X	NE
<zde uvést dopad>			
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	4	

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	—	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	69 695,39 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		69 695,39 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Pavel Svoboda	Ing. Jaroslav Řehula	Ing. Radek Myšák	Ing. Josef Kubíček	Jitka Brádllová

STAKO	Ing. Jaroslav Řehula	IRBOS s.r.o.	Oblastní nemocnice Jičín a.s.	Královéhradecký kraj
-------	----------------------	--------------	-------------------------------	----------------------

ROZPOČET

Stavba: Interna Nový Bydžov - požárně bezpečnostní řešení, úpravy objektu - stavební práce

Objekt: Dodatek 3

Část: Silnoproud - doplnění zásuvek

Objednatel: Královohradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: STAKO společnost s ručením omezeným

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval:

Datum: 27. 1. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

21 M

Elektroinstalace

67 358,07

1	21-M1	Silnoproud - doplnění - dle samostatného rozpočtu	kus	1,000	67 358,07	67 358,07	
---	-------	---	-----	-------	-----------	-----------	--

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

2 337,32

2	090001001	Vedlejší náklady spojené se změnami stavby	%	673,580	3,47	2 337,32	
---	-----------	--	---	---------	------	----------	--

Celkem

69 695,39

REKAPITULACE		
1	Dodávky	39 242,90
2	Doprava dodávek 5,2%	
3	Nosný materiál	
4	Podružný materiál 5%	1 962,15
5	Montáže	23 191,80
6	Přesun dodávek 1%	392,43
7	PPV 6%	1 391,51
8	Zemní práce	
9	PPV 3%	1 177,29
10	Revize	
Celkem bez DPH		67 358,07

Nosný materiál a montáže				Cena	Cena celk	Cena	Cena celk		
			Jednotka	Materiál	Materiál	Montáž	Montáž	indexy	Cenová úroveň
A. objekt interny									
1.PP									
1 PP: a) v čekárně 017 (1x), b) v chodbě 002 (prostorově 1x mezi dveřmi 006 a 007), c) v chodbě 041 (prostorově 1x u dveří 044), d) v chodbě 037 - (1x, zde není pohled)doplnění rozvaděče RP02-16A/1N/03 2x,zásuvka praktik-4x,kabel-91m									
1.	Chránič s nadproudovou ochranou 16A/1N/0,03 A včetně propojovacího materiálu	2	ks	1575	3 150,00	138,60	277,20		cena dodavatele
2.	Zásuvka Praktik	4	ks	116,20	464,80	112,20	448,80		cena dodavatele
3.	Kabel PFD - (P30-R, PH120-R PS30 B2ca s1d0) 3x2,5	91	m	31,80	2 893,80	17,40	1 583,40		pol 146
4.	Kabelová příchytka pro kabelovou trasu na povrchu s funkcí ností P-60-R 8-14mm	50	ks	17,30	865,00	39,40	1 970,00		pol 160
5.	Ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2	6	ks	0,00	-	10,80	64,80		pol 40
6.	Lišta 20x20	20	m	22,80	456,00	36,00	720,00		cena dodavatele
7.	Montáž, materiál doplnění rozvaděče	1	kpl.	216,00	216,00	792,00	792,00		cena dodavatele
					8 045,60		5 856,20		
1.NP									
1 NP: a) v chodbě 120 (prostorově 1x u dveří 124, dále 1x u dveří 129), b) v čekárně 135 (prostorově 1x u dveří 149, dále 1x u dveří 145) doplnění rozvaděče R11-16A/1N/03 1x,zásuvka praktik-2x,kabel-18m, doplnění rozvaděče R12-16A/1N/03 1x,zásuvka praktik-2x,kabel-18m									
1.	Chránič s nadproudovou ochranou 16A/1N/0,03 A včetně propojovacího materiálu	2	ks	1 575,00	3 150,00	138,60	277,20		cena dodavatele
2.	Zásuvka Praktik	4	ks	116,20	464,80	112,20	448,80		cena dodavatele
3.	Kabel PFD - (P30-R, PH120-R PS30 B2ca s1d0) 3x2,5	36	m	31,80	1 144,80	17,40	626,40		pol 146
4.	Kabelová příchytka pro kabelovou trasu na povrchu s funkcí ností P-60-R 8-14mm	20	ks	17,30	346,00	39,40	788,00		pol 160
5.	Ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2	6	ks	-	-	10,80	64,80		pol 40
6.	Montáž, materiál doplnění rozvaděče	1	kpl.	216,00	216,00	726,00	792,00		cena dodavatele
					5 321,60		2 997,20		
2.NP									
2 NP: a) v chodbě 204, 219 (prostorově 1x u dveří 224, dále 1x u dveří 229), b) v chodbě 235 (prostorově 1x u dveří 236, dále 1x u dveří 244) doplnění rozvaděče R21-16A/1N/03 1x,zásuvka praktik-2x,kabel-18m, doplnění rozvaděče R22-16A/1N/03 1x,zásuvka praktik-2x,kabel-18m									
1.	Chránič s nadproudovou ochranou 16A/1N/0,03 A včetně propojovacího materiálu	ks	2	1 575,00	3 150,00	138,60	277,20		cena dodavatele
2.	Zásuvka Praktik	ks	4	116,20	464,80	112,20	448,80		cena dodavatele

3.	Kabel PFD - (P30-R, PH120-R PS30 B2ca s1d0) 3x2,5	m	36	31,80	1 144,80	17,40	626,40		pol 146
4.	Kabelová příchytka pro kabelovou trasu na povrchu s funkčností P-60-R 8-14mm	ks	20	17,30	346,00	39,40	788,00		pol 160
5.	Ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2	ks	6	-	-	10,80	64,80		pol 40
6.	Montáž, materiál doplnění rozváděče	kpl.	1	216,00	216,00	792,00	792,00		cena dodavatele
					5 321,60		2 997,20		
	3.NP								
	3 NP: a) v chodbě 304, 305 (prostorově 1x mezi dveřmi 322 a 323, dále 1x u dveří 328), b) v chodbě 341 (prostorově 1x u dveří 350, dále 1x u dveří 345) doplnění rozváděče R31-16A/1N/03 1x,zásuvka praktik-2x,kabel-18m, doplnění rozváděče R32-16A/1N/03 1x,zásuvka praktik-2x,kabel-18m								
1.	Chránič s nadproudovou ochranou 16A/1N/0,03 A včetně propojovacího materiálu	ks	2	1 575,00	3 150,00	138,60	277,20		cena dodavatele
2.	Zásuvka Praktik	ks	4	116,20	464,80	112,20	448,80		cena dodavatele
3.	Kabel PFD - (P30-R, PH120-R PS30 B2ca s1d0) 3x2,5	m	36	31,80	1 144,80	17,40	626,40		pol 146
4.	Kabelová příchytka pro kabelovou trasu na povrchu s funkčností P-60-R 8-14mm	ks	20	17,30	346,00	39,40	788,00		pol 160
5.	Ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2	ks	6	-	-	10,80	64,80		pol 40
6.	Montáž, materiál doplnění rozváděče	kpl.	1	216,00	216,00	726,00	792,00		cena dodavatele
					5 321,60		2 997,20		
	4.NP								
	4 NP: a) v chodbě 404 (prostorově 1x u dveří 420, dále 1x u dveří 425), b) v chodbě 433 (prostorově 1x u dveří 445, dále 1x mezi dveřmi 440 a 439) doplnění rozváděče R41-16A/1N/03 1x,zásuvka praktik-2x,kabel-18m, doplnění rozváděče R42-16A/1N/03 1x,zásuvka praktik-2x,kabel-18m								
1.	Chránič s nadproudovou ochranou 16A/1N/0,03 A včetně propojovacího materiálu	ks	2	1 575,00	3 150,00	138,60	277,20		cena dodavatele
2.	Zásuvka Praktik	ks	4	116,20	464,80	112,20	448,80		cena dodavatele
3.	Kabel PFD - (P30-R, PH120-R PS30 B2ca s1d0) 3x2,5	m	36	31,80	1 144,80	17,40	626,40		pol 146
4.	Kabelová příchytka pro kabelovou trasu na povrchu s funkčností P-60-R 8-14mm	ks	20	17,30	346,00	39,40	788,00		pol 160
5.	Ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2	ks	6	-	-	10,80	64,80		pol 40
6.	Montáž, materiál doplnění rozváděče	kpl.	1	216,00	216,00	792,00	792,00		cena dodavatele
					5 321,60		2 997,20		
	B. objekt LDN - B								
	1.NP								
	1 NP: a) v chodbě 123 (prostorově 1x u dveří 132, dále 1x u dveří 124), b) v chodbě 109 (prostorově 1x u dveří 120) doplnění rozváděče RP01-16A/1N/03 1x,zásuvka praktik-2x,kabel-17m, doplnění rozváděče RZ1-16A/1N/03 1x,zásuvka praktik-1x,kabel-18m								
1.	Chránič s nadproudovou ochranou 16A/1N/0,03 A včetně propojovacího materiálu	ks	2	1 575,00	3 150,00	138,60	277,20		cena dodavatele
2.	Zásuvka Praktik	ks	3	116,20	348,60	112,20	336,60		cena dodavatele
3.	Kabel PFD - (P30-R, PH120-R PS30 B2ca s1d0) 3x2,5	m	35	31,80	1 113,00	17,40	609,00		pol 146
4.	Kabelová příchytka pro kabelovou trasu na povrchu s funkčností P-60-R 8-14mm	ks	20	17,30	346,00	39,40	788,00		pol 160
5.	Ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2	ks	6	-	-	10,80	64,80		pol 40
6.	Montáž, materiál doplnění rozváděče	kpl.	1	216,00	216,00	792,00	792,00		cena dodavatele

					5 173,60		2 867,60		
	2.NP								
	2 NP: a) v chodbě 225 (prostorově 1x u dveří 228), b) v chodbě 203 (prostorově 1x u dveří 206, dále 1x u dveří 223 - stávající podhled) doplnění rozvaděče R02-16A/1N/03 1x,zásuvka praktik-1x,kabel-8m, doplnění rozvaděče RP02-16A/1N/03 1x,zásuvka praktik-2x,kabel-16m								
1.	Chráníč s nadproudovou ochranou 16A/1N/0,03 A včetně propojovacího materiálu	ks	2	1 575,00	3 150,00	138,60	277,20		cena dodavatele
2.	Zásuvka Praktik	ks	3	116,20	348,60	112,20	336,60		cena dodavatele
3.	Kabel PFD - (P30-R, PH120-R PS30 B2ca s1d0) 3x2,5	m	24	31,80	763,20	17,40	417,60		pol 146
4.	Kabelová přilchytka pro kabelovou trasu na povrchu s funkcí P-60-R 8-14mm	ks	15	17,30	259,50	39,40	591,00		pol 160
5.	Ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2	ks	6	-	-	10,80	64,80		pol 40
6.	Montáž, materiál doplnění rozvaděče	kpl.	1	216,00	216,00	792,00	792,00		cena dodavatele
					4 737,30		2 479,20		

ZMĚNOVÝ LIST				ZL 42	
věc: odpočet omítek SO 01a					
Stavba:		Interna Nový Bydžov - požárně bezpečnostní řešení, úpravy objektu - stavební práce			
Objekt:		SO 01a Zděná přístavba interny			
Předkládá:		STAKO společnost s ručením omezeným		Datum: 26.03.2025	
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1	listů	
e-mailem		2) Projektové podklady		listů, výkresů	
osobně	X	3) Fotodokumentace		listů	
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení: V PD nebyly omítky šachet navrženy, byly zahrnuty pouze v rozpočtu.					
1.2 Popis nového řešení: nebylo realizováno					
2 Zdůvodnění změny:					
nebylo realizováno					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO (uvést jaký dokument)		X	NE
<zde uvést jaký dokument>					
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		X	NE
<zde uvést dopad>					
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst.	5
6 Náklady:		Cena méněprací (odpočet):	-	71 723,89 Kč bez DPH	
		Cena víceprací (přípočet):	+	0,00 Kč bez DPH	
		Výsledná ceny změny:		-71 723,89 Kč bez DPH	
7 Schválil:					
za zhotovitele:		za TDS:		za AD:	
Pavel Svoboda		Ing. Jaroslav Řehula		Ing. Radek Myšák	
				za uživatele:	
				Ing. Josef Kubíček	
				za objednatele:	
				Jitka Brádllová	
STAKO		Ing. Jaroslav Řehula		IRBOS s.r.o.	
				Oblastní nemocnice Jičín a.s.	
				Královéhradecký kraj	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Interna Nový Bydžov - požárně bezpečnostní řešení, úpravy objektu - stavební práce

Objekt: Dodatek 4

Část: Odpočet omítek

Objednatel: Královéhradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: STAKO společnost s ručením omezeným

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval:

Datum: 25. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Indexy	Cenová soustava
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	--------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV -71 723,89

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -68 396,02

1	R	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	-438,436	156,00	-68 396,02		SOD, SO01-1, 11
---	---	-----------	---	----	----------	--------	------------	--	-----------------

998 Přesun hmot -922,52

2	R	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	-1,920	480,48	-922,52		SOD, SO01a, 107
---	---	-----------	--	---	--------	--------	---------	--	-----------------

VRN Vedlejší rozpočtové náklady -2 405,35

3	000	090001001	Vedlejší náklady spojené se změnami stavby	%	-693,185	3,47	-2 405,35		SOD, VRN
---	-----	-----------	--	---	----------	------	-----------	--	----------

Celkem -71 723,89

ZMĚNOVÝ LIST				ZL 43													
věc: Skigrafie-přívodní kabely pro RTG																	
Stavba:		Interna Nový Bydžov - požárně bezpečnostní řešení, úpravy objektu - stavební práce															
Objekt:		SO 01 objekt interny															
Předkládá:		STAKO společnost s ručením omezeným		Datum: 16.01.2025													
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů															
poštou		1) Položkový rozpočet změny		4	listů												
e-mailem		2) Projektové podklady			listů, výkresů												
osobně	X	3) Fotodokumentace			listů												
1 Technický popis změny:																	
1.1 Popis původního řešení: Nebylo součástí PD																	
1.2 Popis nového řešení: nové NN přívodní elektro rozvody pro skigrafii																	
2 Zdůvodnění změny:																	
nový požadavek uživatele - tyto práce pro akci "SKIAGRAFIE" je z hlediska provozu nemocnice ekonomicky výhodné zrealizovat při akci "INTERNA", tímto odpadne další omezení provozu vč. hluku a prašnosti																	
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO (uvést jaký dokument)		X	NE												
<zde uvést jaký dokument>																	
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO jeden kalendářní týden		X	NE												
<zde uvést dopad>																	
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst.	4												
6 Náklady:		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%; border-bottom: 1px solid black;">Cena méněprací (odpočet):</td> <td style="width: 10%; text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">-</td> <td style="width: 30%; text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">0,00 Kč</td> <td style="width: 20%; text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">bez DPH</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Cena víceprací (přípočet):</td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">+</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">298 543,00 Kč</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">bez DPH</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="border-bottom: 1px solid black;">Výsledná ceny změny:</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">298 543,00 Kč</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">bez DPH</td> </tr> </table>				Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH	Cena víceprací (přípočet):	+	298 543,00 Kč	bez DPH	Výsledná ceny změny:		298 543,00 Kč	bez DPH
Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH														
Cena víceprací (přípočet):	+	298 543,00 Kč	bez DPH														
Výsledná ceny změny:		298 543,00 Kč	bez DPH														
7 Schválil:																	
za zhotovitele:		za TDS:		za AD:													
Pavel Svoboda		Ing. Jaroslav Řehula		Ing. Radek Myšák													
				za uživatele:													
				Ing. Josef Kubiček													
				za objednatele:													
				Jitka Brádllová													
STAKO		Ing. Jaroslav Řehula		IRBOS s.r.o.													
				Oblastní nemocnice Jičín a.s.													
				Královéhradecký kraj													

STAKO společnost s ručením omezeným

10.12.2024

STAVBA: Stavební úpravy pro obměnu skiografického pracoviště v Novém Bydžově II.

INVESTOR: Oblastní nemocnice Jičín a.s.,

REKAPITULACE		materiál	montáž	celkem
D.1.4.3 - Zařízení silnop...		229 493,10	54 666,60	284 159,70
Mezisoučet		229 493,10	54 666,60	284 159,70
Podružný materiál	1,0%			2 294,93
PPV	6,0%			3 280,00
Doprava	3,6%			8 261,75
Ostatní	1,0%			546,67
HZS	hod.	0,00	0,00	0,00
Mezisoučet				14 383,34
CENA bez DPH				298 543
Daňový základ	15,0%	0		0
Daňový základ	21,0%	298 543		62 694
Daň celkem				62 694
CENA s DPH				361 237

Cenová nabídka vypracována dle výkazu výměr.

D.1.4.3 - Zařízení silnop...

NAZEV	MJ	JC mat.	JC mont.	materiál	montáž	JC celkem	Celkem	
D.1.4.3 - Zařízení silnop...				229 493 Kč	54 667 Kč		284 159,70	
Ostatní konstrukce a práce, bourání								
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 300 mm	kus	8,0	0,00	441,00	0,00	3528,00	441,00	3 528,00
Práce a dodávky PSV								
Elektromontáže - zkoušky a revize								
Celková prohlídka elektrického rozvodu do 0,5 milionu Kč vč. kontroly napojovacího bodu	kus	1,0	0,00	5724,00	0,00	5724,00	5724,00	5 724,00
Elektromontáže - rozvodný systém								
Úpravy napojovacího bodu	hod	10,0	0,00	520,00	0,00	5200,00	520,00	5 200,00
Materiál k úpravám napojovací bodu (jistič 3/125 "B", DINSCIENE, propojovací vodiče, svorky, průchodky označovací a pomocný materiál	set	1,0	6766,20	2279,00	6766,20	2279,00	9045,20	9 045,20
Koordinace s investorem	hod	5,0	0,00	520,00	0,00	2600,00	520,00	2 600,00
Elektromontáže - hrubá montáž								
Montáž trubka plastová korugovaná 50/41 mm uložena pevně	m	20,0	0,00	26,10	0,00	522,00	26,10	522,00
trubka elektroinstalační korugovaná 50/41 mm	m	20,0	18,60	0,00	372,00	0,00	18,60	372,00
Montáž trubka plastová korugovaná 100/91 mm uložena pevně	m	2,0	0,00	28,70	0,00	57,40	28,70	57,40
trubka elektroinstalační korugovaná 100/91 mm	m	2,0	47,60	0,00	95,20	0,00	47,60	95,20
Lišta vkladací 120x70mm	m	76,0	0,00	108,10	0,00	8215,60	108,10	8 215,60
Lišta vkladací 120x70mm	m	76,0	380,20	0,00	28895,20	0,00	380,20	28 895,20
Lišta vkladací 120x70mm- roh 90°/ spojovací díl	ks	22,0	0,00	57,20	0,00	1258,40	57,20	1 258,40
Lišta vkladací 120x70 mm - roh 90° / spojovací díl	ks	22,0	204,60	0,00	4501,20	0,00	204,60	4 501,20
Elektromontáže - rozvody vodičů měděných								

D.1.4.3 - Zařízení silnop...

NAZEV	MJ		JC mat.	JC mont.	materiál	montáž	JC celkem	Celkem
Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV nad 0,40 kg pod omítku stěn	m	105,0	0,00	48,20	0,00	5061,00	48,20	5 061,00
kabel bezhalogenový PRAFLADUR-J 3BX120+70mm2	m	50,0	2145,00	0,00	107250,00	0,00	2145,00	107 250,00
kabel bezhalogenový PRAFLADUR-J 3BX70+50mm2	m	55,0	1339,00	0,00	73645,00	0,00	1339,00	73 645,00
Elektromontáže - soubory pro vodiče								
OZNAC.STITEK C.1	ks	4,0	5,40	0,00	21,60	0,00	5,40	21,60
páska stahovací kabelová VPP 4/280	100 kus	40,0	116,20	0,00	4648,00	0,00	116,20	4 648,00
Ukončení vodič izolovaný do 120 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	16,0	0,00	240,40	0,00	3846,40	240,40	3 846,40
Montáž pospojení	kus	1,0	0,00	318,00	0,00	318,00	318,00	318,00
Sada hlavního pospojení	KS	1,0	922,70	0,00	922,70	0,00	922,70	922,70
Elektromontáže - kompletace rozvodů								
Podružný montážní materiál	viz.rekapitulace							
Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla								
Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce								
Podružný, spojovací, připojovací, kotevní a upevňovací materiál, svorky, závěsy, kabelová oka a - veškeré příslušenství k ochrannému pospojení	viz.rekapitulace		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vedlejší rozpočtové náklady								
Provozní vlivy								
práce ve výšce nad 3m	soubor	1,0	0,00	5088,00	0,00	5088,00	5088,00	5 088,00
Ostatní náklady								
Náklady na zkušební provoz	hod	4,0	0,00	520,00	0,00	2080,00	520,00	2 080,00
Montáž protipožární ucpávky / manžety vč. certifikace	ks	4,0	0,00	445,20	0,00	1780,80	445,20	1 780,80
Protipožární kabelová ucpávka /manžeta	ks	4,0	594,00	0,00	2376,00	0,00	594,00	2 376,00
Likvidace odpadů	kpl	1,0	0,00	1908,00	0,00	1908,00	1908,00	1 908,00

D.1.4.3 - Zařízení silnop...

NAZEV	MJ		JC mat.	JC mont.	materiál	montáž	JC celkem	Celkem
Stavební přípomocce vč. materiálu	hod	10,0	0,00	520,00	0,00	5200,00	520,00	5 200,00

ZMĚNOVÝ LIST				ZL 44	
věc: doplňky výtahu V4					
Stavba:		Interna Nový Bydžov - požárně bezpečnostní řešení, úpravy objektu - stavební práce			
Objekt:		SO 01 objekt interny			
Předkládá:		STAKO společnost s ručením omezeným		Datum:	06.02.2025
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1	listů	
e-mailem		2) Projektové podklady		listů, výkresů	
osobně	X	3) Fotodokumentace		listů	
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení:					
řešeno v PD					
1.2 Popis nového řešení:					
nový požadavek uživatele					
2 Zdůvodnění změny:					
doplnění vybavení výtahu dle požadavku uživatele - z důvodu životnosti a vizuálního sjednocení s výtahem V3 v přístupové hale budovy interny					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO (uvést jaký dokument)	X	NE	
<zde uvést jaký dokument>					
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE	
<zde uvést dopad>					
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst.	4
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH	
	Cena víceprací (přípočet):	+	32 593,05 Kč	bez DPH	
	Výsledná ceny změny:		32 593,05 Kč	bez DPH	
7 Schválil:					
za zhotovitele:		za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Pavel Svoboda		Ing. Jaroslav Řehula	Ing. Radek Myšák	Ing. Josef Kubíček	Jitka Brádllová
STAKO		Ing. Jaroslav Řehula	IRBOS s.r.o.	Oblastní nemocnice Jičín a.s.	Královéhradecký kraj

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Interna Nový Bydžov - požárně bezpečnostní řešení, úpravy objektu - stavební práce

Objekt: Dodatek 4

Část: VýtahV4 - doplnění nadstandardů

Objednatel: Královéhradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: STAKO společnost s ručením omezeným

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval:

Datum: 28. 1. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Index	Cenová soustava
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-------	-----------------

767 Konstrukce zámečnické

31 500,00

1	R	767R33a	Nerezové rámečky šachetních dveří	kus	5,000	2 340,00	11 700,00		Cena dodavatele
2	R	767R33b	Nerezová madla šachetních dveří	soub	5,000	2 160,00	10 800,00		Cena dodavatele
3	R	767R33c	Příplatková barva dveří	soub	5,000	1 800,00	9 000,00		Cena dodavatele

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

1 093,05

5	000	090001001	Vedlejší náklady spojené se změnami stavby	%	315,000	3,47	1 093,05		SOD, VRN
---	-----	-----------	--	---	---------	------	----------	--	----------

Celkem

32 593,05

ZMĚNOVÝ LIST				ZL 45	
věc: bypass do rackové skříně					
Stavba:		Interna Nový Bydžov - požárně bezpečnostní řešení, úpravy objektu - stavební práce			
Objekt:		SO 01 objekt interny			
Předkládá:		STAKO společnost s ručením omezeným		Datum: 28.01.2025	
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny		5	listů
e-mailem		2) Projektové podklady			listů, výkresů
osobně X		3) Fotodokumentace			listů
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení:					
V PD neřešeno					
1.2 Popis nového řešení:					
nový požadavek uživatele					
2 Zdůvodnění změny:					
rozšíření dodávky na základě požadavku uživatele - od doby realizace PD (cca 5 let) došlo v této oblasti k vývoji, proto je nyní nutné instalovat bypass do rackové skříně z důvodu zajištění nepřetržitého napájení. Bypass řeší výpadek UPS, umožňuje odstavit UPS a provést její údržbu či opravu, aniž by bylo nutné vypínat zdroj a tím způsobit výpadek všech aktivních prvků v rozvodné skříně a tím odstávku celé počítačové sítě a všech zařízení v této síti pracujících. Pokud by bypass nebyl instalován, při výpadku napájení dojde k výpadku provozu celého pavilonu a omezení poskytování zdravotní péče.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO (uvést jaký dokument)		X	NE
<zde uvést jaký dokument>					
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		X	NE
<zde uvést dopad>					
5 Číslo odstavce ve smyslu § 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst.	4
6 Náklady:		Cena méněprací (odpočet):		-	0,00 Kč bez DPH
		Cena víceprací (přípočet):		+	31 078,25 Kč bez DPH
		Výsledná ceny změny:			31 078,25 Kč bez DPH
7 Schválil:					
za zhotovitele:		za TDS:		za AD:	
Pavel Svoboda		Ing. Jaroslav Řehula		Ing. Radek Myšák	
				za uživatele:	
				Ing. Josef Kubiček	
				za objednatele:	
				Jitka Brádllová	
STAKO		Ing. Jaroslav Řehula		IRBOS s.r.o.	
				Oblastní nemocnice Jičín a.s.	
				Královéhradecký kraj	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Interna Nový Bydžov - požárně bezpečnostní řešení, úpravy objektu - stavební práce

Objekt: Dodatek 4

Část: Bypass

Objednatel: Královéhradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: STAKO společnost s ručením omezeným

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval:

Datum: 27. 1. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

001 Slaboproud - Aktivní prvky

30 036,00

1	R	21M 03	Bypass záložního zdroje - dle samostatného rozpočtu	soub	1,000	30 036,00	30 036,00
---	---	--------	---	------	-------	-----------	-----------

vrn Vedlejší rozpočtové náklady

1 042,25

2	000	090001001	Vedlejší náklady spojené se změnami stavby	%	300,360	3,47	1 042,25
---	-----	-----------	--	---	---------	------	----------

Celkem

31 078,25

Pol.	Nabídka uchazeče		Specifikace	Jednotka	Množství	Materiál		Montáž		Index ceny	Cenová soustava
	Výrobce	Typové číslo				Jednotková cena	Celkem bez DPH	Jednotková cena	Celkem bez DPH		
			SO 01 - Aktivní prvky								
			ZÁLOŽNÍ ZDROJ UPS								
1			CyberPower PDU24005 poskytuje výstup z jednotky UPS, generátoru nebo síťového napájení pro více připojených zařízení v infrastruktuře IT. Duální napájecí kabely lze zapojit do samostatných nezávislých zdrojů napájení a zajistit tak redundanci pro zařízení s jedním vstupním napájením. Pokud zvolený zdroj energie překročí požadované prahové hodnoty nebo selže, ATS PDU se automaticky přepne na druhý zdroj napájení, aby byl zajištěn nepřetržitý provoz.	komplet	1	14 400,00	14 400,00	618,00	618,00		Cena zhotovitele
14400									15 018,00		

			SO 04 - Aktivní prvky								
			ZÁLOŽNÍ ZDROJ UPS								
1			CyberPower PDU24005 poskytuje výstup z jednotky UPS, generátoru nebo síťového napájení pro více připojených zařízení v infrastruktuře IT. Duální napájecí kabely lze zapojit do samostatných nezávislých zdrojů napájení a zajistit tak redundanci pro zařízení s jedním vstupním napájením. Pokud zvolený zdroj energie překročí požadované prahové hodnoty nebo selže, ATS PDU se automaticky přepne na druhý zdroj napájení, aby byl zajištěn nepřetržitý provoz.	komplet	1	14 400,00	14 400,00	618,00	618,00		Cena zhotovitele
									15 018,00		

Celkem :

30 036,00

ZMĚNOVÝ LIST

ZL 46

věc: doplnění záložního zdroje výtahu V4

Stavba:	Interna Nový Bydžov - požárně bezpečnostní řešení, úpravy objektu - stavební práce		
Objekt:	SO 01 objekt interny		
Předkládá:	STAKO společnost s ručením omezeným	Datum:	06.02.2025

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem		2) Projektové podklady	listů, výkresů
osobně	X	3) Fotodokumentace	listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:
v PD řešeno bez záložního zdroje (baterie)

1.2 Popis nového řešení:
nový požadavek uživatele - doplnění záložního zdroje

2 Zdůvodnění změny:
doplnění záložního zdroje pro sjezd do nejbližší stanice ve směru váhové převahy - při výpadku elektrické energie

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO (uvést jaký dokument)	X	NE
<zde uvést jaký dokument>			
4 Dopad do smluvních termínů:	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE
<zde uvést dopad>			
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	4	

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	—	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	44 699,04 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		44 699,04 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Pavel Svoboda	Ing. Jaroslav Řehula	Ing. Radek Myšák	Ing. Josef Kubíček	Jitka Brádllová

STAKO	Ing. Jaroslav Řehula	IRBOS s.r.o.	Oblastní nemocnice Jičín a.s.	Královéhradecký kraj
-------	----------------------	--------------	-------------------------------	----------------------

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Interna Nový Bydžov - požárně bezpečnostní řešení, úpravy objektu - stavební práce

Objekt: Dodatek 4

Část: VýtahV4 - doplnění záložního zdroje

Objednatel: Královéhradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: STAKO společnost s ručením omezeným

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval:

Datum: 28. 1. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Index	Cenová soustava
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-------	-----------------

767 Konstrukce zámečnické

43 200,00

4	R	767R33d	Záložní zdroj pro nouzový sjezd do nejbližší stanice	soub	1,000	43 200,00	43 200,00		Cena dodavatele
---	---	---------	--	------	-------	-----------	-----------	--	-----------------

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

1 499,04

5	000	090001001	Vedlejší náklady spojené se změnami stavby	%	432,000	3,47	1 499,04		SOD, VRN
---	-----	-----------	--	---	---------	------	----------	--	----------

Celkem

44 699,04
