

Dodatek č. 9 ke Smlouvě o dílo

Smluvní strany

Objednatel	Královéhradecký kraj
se sídlem	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ70889546
zástupce	Petr Koleta, hejtman
bankovní spojení	
číslo účtu	

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel	VALC, s.r.o.
	společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C, 1677.
se sídlem	Pražská třída 13/84, 500 04 Hradec Králové
IČO	455 37 151
DIČ	CZ45537151
zástupce	Ing. Pavel Valc, jednatel společnosti
bankovní spojení	
číslo účtu	

dále též jako „zhotovitel“ nebo „dodavatel“

objednatel a zhotovitel jednotlivě také jako „smluvní strana“, společně jako „smluvní strany“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 9 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 12.07.2023, ve znění dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 6, č. 7 a č. 8, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky: „**Sportovní hala pro tělesnou výchovu – Nová Paka**“ (dále jen „veřejná zakázka“), zadané v otevřeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Veřejná zakázka byla oznámena ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2023-009554 (dále jen „veřejná zakázka“).

I.

Účel dodatku

1. Tento dodatek je dále uzavírán dle čl. 7 odst. 7.2 a čl. 17 odst. 17.2 původní smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále též jako „zákon“) v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací – víceprací, méněprací a nutných změn.

a) Jedná se o změny dle § 222 odst. 4 zákona, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné pro zhotovení díla – práce podle Změnových listů č. 70, 72, 75 a 77.

vícepráce: 178.070,63 Kč bez DPH

méněpráce: - 44.810,13 Kč bez DPH

b) Jedná se o změny dle ust. § 222 odst. 5, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné pro zhotovení díla, a dále změny, spočívající ve stavebních pracích a s nimi souvisejícími dodávkami a službami, které nebudou realizovány s ohledem na změny podle tohoto – práce podle Změnového listu č. 73.

vícepráce: 182.297,38 Kč bez DPH

méněpráce: - 82.566,40 Kč bez DPH

c) Jedná se o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, podle § 222 odst. 6 zákona, a dále změny, spočívající ve stavebních pracích a s nimi souvisejícími dodávkami a službami, které nebudou realizovány s ohledem na změny podle tohoto odstavce, a které proto zadavatel, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, podle § 222 odst. 6 zákona – práce podle Změnových listů č. 74, 76 a 79.

vícepráce: 226.890,88 Kč bez DPH

méněpráce: 0 Kč bez DPH

2. Cenový nárůst v souvislosti se změnami podle odst. 1 písm. b) a písm. c) tohoto článku nepřesáhne 30 % původní ceny závazku.
3. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou změnové listy č. 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77 a 79, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
4. Změny podle odst. 1 tohoto článku činí:
vícepráce: **587.258,89 Kč bez DPH**
méněpráce: **- 127.376,53 Kč bez DPH**
5. Celková smluvní cena se tedy **navyšuje o 459.882,36 Kč bez DPH.**
6. Tímto dodatkem se vzhledem k vícepracím dle změnového listu č. 72 prodlužuje termín realizace zakázky **o 3 týdny** dle čl. 6 odst. 6.2 původní smlouvy o dílo.

II.

Vymezení rozsahu změn

1. Čl. 6 odst. 6.2 původní smlouvy se nahrazuje textem následujícího znění:

6.2. *Termíny plnění díla jsou stanoveny následovně:*

<i>Zahájení plnění</i>	<i>na Výzvu objednatele k zahájení plnění dle bodu 6.1</i>
<i>Dokončení stavebních prací</i>	<i>nejdéle do 26 měsíců a 1 týden od doručení výzvy k zahájení plnění</i>
<i>Předání řádně dokončeného díla (stavby) včetně předání kolaudačního souhlasu nebo pravomocného kolaudačního rozhodnutí</i>	<i>nejdéle do 5 týdnů od dokončení stavebních prací</i>

2. Čl. 7 odst. 7.2 původní smlouvy se mění a nově zní takto:

Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí:

<i>Cena celkem v Kč bez DPH</i>	<i>101.102.882,36 Kč</i>
--	---------------------------------

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku v souladu s povinností stanovenou objednateli zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně dle dalších právních předpisů upravujících povinnost uveřejnění dokumentů vztahujících se k plnění díla.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřině společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl na základě usnesení Rady Královehradeckého kraje č. RK/10/664/2025 ze dne 14.4.2025 hejtman Královehradeckého kraje.

Přílohy tohoto dodatku:

- Příloha č. 1: Přehled změnových listů – dodatek č. 9
Příloha č. 2: Změnové listy č. 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77 a 79
Příloha č. 3: Změny závazků ze smlouvy

Za objednatele dne:



.....
Petr Koleta, hejtman
Královehradecký kraj

Za zhotovitele dne:



.....
Ing. Pavel Valc
jednatel společnosti VALC, s.r.o.

"Sportovní hala Nová Paka - stavební práce"**DODATEK č.9**

SoD
Cena celková vč. Dodatku č. 1, č.2, č.3, č.4, č.5, č.6, č.7 a č.8 :

86 635 365,10 Kč
100 643 000,00 Kč

Cena celková vč. Dodatku č. 1, č. 2, č.3, č.4. č.5, č.6, č.7, č.8 a č.9: 101 102 882,36 Kč

č.ZL	obsah změny	cena bez DPH (celkem)	méněpráce	vícepráce	odstavec dle § 222 ZZVZ	poznámka
ZL.č.70	Ochranná síť za basketbalovými koši	29 500,24 Kč	0,00 Kč	29 500,24 Kč	④	
ZL.č.72	Oplechování ochozu	105 408,67 Kč	0,00 Kč	105 408,67 Kč	④	
ZL.č.73	VZT aula- úprava trasy, potrubí, nátěr	99 730,98 Kč	82 566,40 Kč	182 297,38 Kč	⑤	
ZL.č.74	Vzduchotechnika - změny tras	45 450,93 Kč	0,00 Kč	45 450,93 Kč	⑥	chyba PD
ZL.č.75	Dopojení plynu do HUP školy	-24 212,35 Kč	24 212,35 Kč	0,00 Kč	④	
ZL.č.76	Doplnění XPS na torkretovou stěnu	5 881,23 Kč	0,00 Kč	5 881,23 Kč	⑥	chyba PD
ZL.č.77	Úprava EZS dle uživatele	22 563,94 Kč	20 597,78 Kč	43 161,72 Kč	④	
ZL.č.79	Čištění a proplach stávajících rozvodů	175 558,72 Kč	0,00 Kč	175 558,72 Kč	⑥	chyba PD
	Celkem odst. 4		44 810,13 Kč	178 070,63 Kč		
	Celkem odst. 5		82 566,40 Kč	182 297,38 Kč		
	Celkem odst. 6		0,00 Kč	226 890,88 Kč		
	Navýšení dodatkem č.9	459 882,36 Kč	127 376,53 Kč	587 258,89 Kč		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Sportovní hala pro tělesnou výchovu Nová Paka
Objekt: Vybavení tělocvična- síť za koš

Objednatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: VALC, s.r.o.
Místo: Nová Paka

Zpracoval: Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.
Datum: 7. 11. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV

Práce a dodávky PSV

29,500.24

766

Konstrukce truhlářské

29,500.24

	R	V/22a	Doplnění sítě za koš - D+M, kotevní materiál	m2	15.400	1,915.60	29,500.24	CN
			"síť PA 40/2, bílá" 7,7*2		15.400			
			Součet		15.400			

Celkem

29,500.24

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Sportovní hala pro tělesnou výchovu Nová Paka
Objekt: Ocelové konstrukce - ochoz

Objednatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: VALC, s.r.o.
Místo: Nová Paka

Zpracoval: Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.
Datum: 7. 11. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV

Práce a dodávky PSV

105,408.67

764


Konstrukce klempířské

105,408.67


	764	764214606	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm	m	83.400	1,179.00	98,328.60	URS 2025 02 * 0,9 (TOV počítá s tl 0,6mm - 982Kč/m2 cena upravena na na tl. 0,8mm - 1310Kč/m2)
41,7*2					83.400			
Součet					83.400			
317	R	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0.532	13,308.40	7,080.07	SOD

Celkem

105,408.67

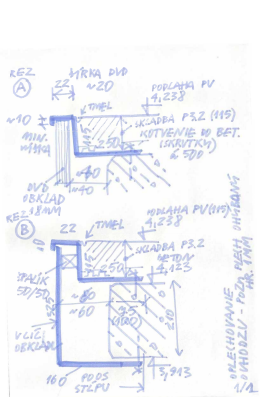

Oplech. ochodzu/250703

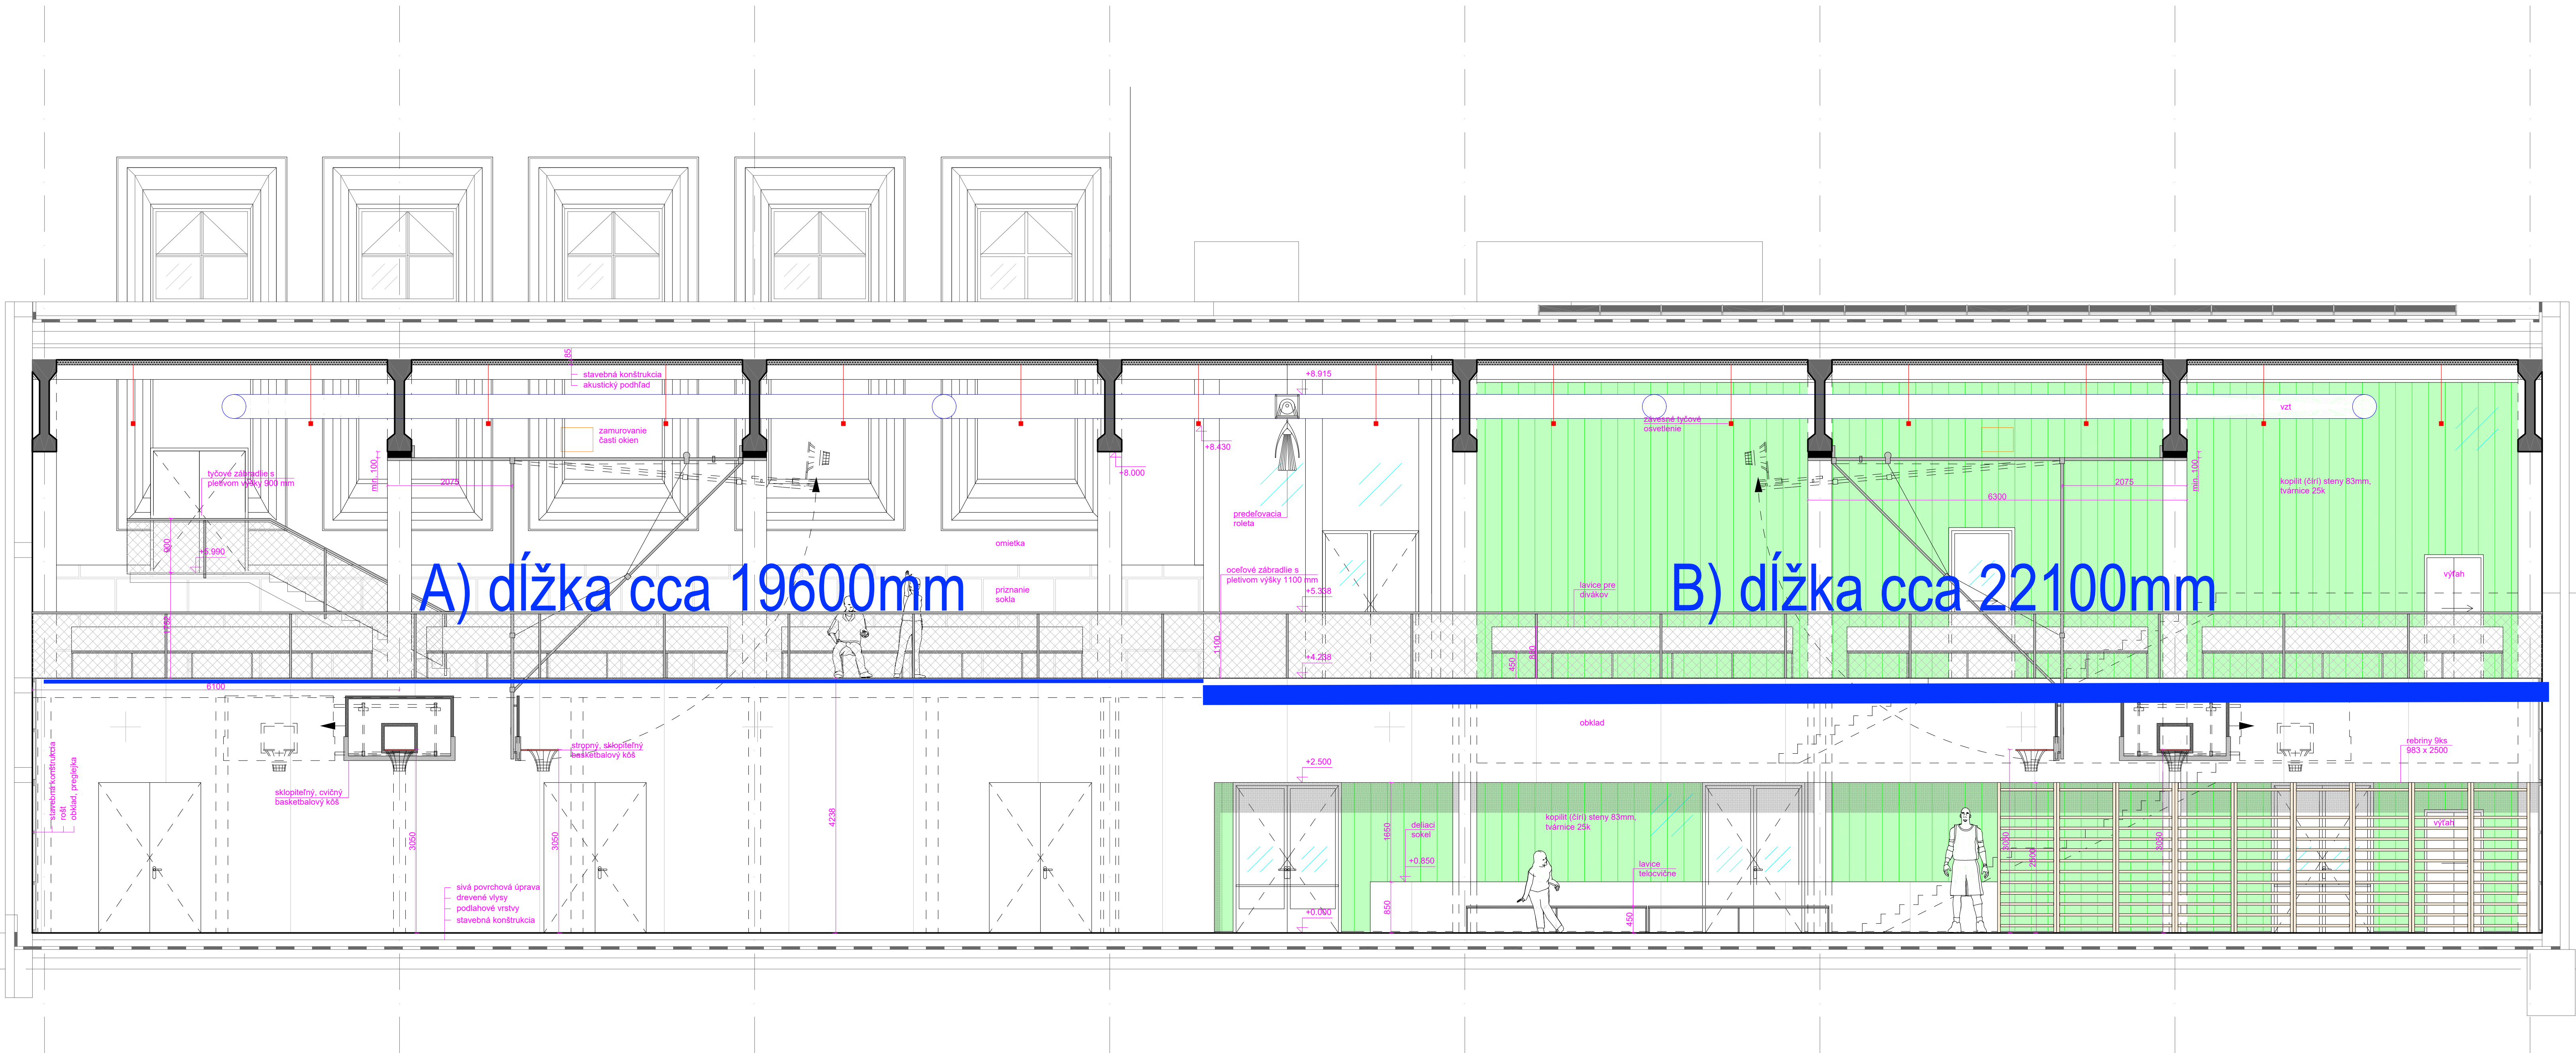


A) dĺžka cca 19600mm

B) dĺžka cca 22100mm

8%

M 1:100



±0,000 = 436,650 m n.m = úroveň podlahy stávající tělocvičny

Číslo revize	Datum revize	Popis revize	Vydal

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ, GENERÁLNÍ PROJEKTANT:
studenýarchitekti s.r.o.
Petrovská 33
811 03 Bratislava, SK
GSM: +421 965 916 803
E-mail: studeny@studenysk
www.studenysk

Ing. Ján Studený, akad. arch.
Ing. arch. Mariš Bábora

AUTORSKÁ SPOLUPRÁCE NA ARCH. ŘEŠENÍ:
Peter Štec Studio
Mag. arch. Peter Štec, A+D.

PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ SPOLEČNOST			INTER PLAN[®]		Pulchova 78a, 612 00 Česká Republika E-mail: info@interplan.cz tel.: +420 541 597 544 fax: +420 541 597 223
DESIGN AND ENGINEERING COMPANY					
ROLE / ROLE	JMÉNO / NAME	PODPIS / SIGNATURE	DATUM VÝVOJI VÝKRESU / DATE	10/2021	
VEDOUcí PROJEKTANT / APPROVED	Ing. Tomáš Gryc		FORMÁT / SIZE:	8,75x14	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / CHECKED	Ing. arch. Ján Studený		MĚŘÍTKO / SCALE:	1:50	
VYPRACOVÁVÁ / DRAWING	Ing. arch. A. Tundeková, Ing. arch. M. Bábora		ZAKÁZKOVÉ č. / CONTRACT NO.	2016725	
INVESTOR / INVESTOR	Královhradecký kraj, IČO 7088946		STAVEBNÍ ÚŘAD / BUILDING OFFICE	MÚ Nová Paka	
NÁZEV PROJEKTU Sportovní hala pro tělesnou výchovu NOVA PAKA			PROFESÍ:	X - INTERIÉRY A VNITŘNÍ ZARÁZENÍ	
PROJECT NAME			DISCIPLINE:		
SOFS			STUPEŇ:	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
UNIT			DESIGN PHASE:		
SOURČÍ / FILE:			rp..230221_1interior.3dm - rp..230221_1inter.dwg		
NÁZEV VÝKRESU: DRAWING NAME:			POŘ. / NO.	ARCHIVNÍ Č. / ARCHIVE NO.	REVIZE
ŘEZ 1			004	201672/5-6-S0002-X002/0	1

ZMĚNOVÝ LIST					ZL73	
VZT AULA - úprava trasy, potrubí a nátěr						
Stavba:		Sportovní hala pro tělesnou výchovu Nová Paka				
Objekt:						
Předkládá:		VALC, s.r.o.			Datum: 28.11.2025	
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů				
poštou		1) Položkový rozpočet změny			1	listů
e-mailem		2) Projektové podklady			0	listů, výkresů
osobně		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy			0	listů
1 Technický popis změny:						
1.1 Popis původního řešení: v PD navržena trasa a povrchová úprava pozink						
1.2 Popis nového řešení: Nová trasa a dimenze potrubí a základní nátěr						
2 Zdůvodnění změny:						
Původní PD navrhovala potrubí pr. 500mm, po zpracování výrobní PD bylo změněno na pr. 630mm. Na základě požadavku uživatele potrubí opatřeno základním nátěrem umožňujícím provedení povrchové úpravy sjednocené s výmalbou stěn (dále na náklad uživatele).						
Vazba na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek, par.222 změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: zařazeno do odst. 5						
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:			ANO		X	NE
4 Dopad do smluvních termínů:			ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		X	NE
5 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	-82 566,40 Kč		bez DPH	
	Cena víceprací (přípočet):	+	182 297,38 Kč		bez DPH	
	Výsledná ceny změny:		99 730,98 Kč		bez DPH	
6 Schválil:						
za zhotovitele:		za TDS:	za TDS - specialistu:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Sportovní hala pro tělesnou výchovu Nová Paka

Objekt: VZT aula kolena + nater

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Místo: Nová Paka

Zpracoval: Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

Datum: 7. 11. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV 99,730.98

D2 Větrání AULA 50,433.60

	R		Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu přívod/odvod - DN 500, běžné provedení, třída těsnosti A(I. A II.), 30% tvarovek	bm	-38.000	2,172.80	(82,566.40)	ZL49
	R	Pol63a	Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu přívod/odvod - DN 630, běžné provedení, třída těsnosti A(I. A II.), 30% tvarovek	bm	38.000	3,500.00	133,000.00	CN

783 Dokončovací práce - nátěry 49,297.38

	783	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	226.000	77.13	17,431.38	URS 2025 02 * 0,9
448	R	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	226.000	141.00	31,866.00	SOD

Celkem 99,730.98

ZMĚNOVÝ LIST					ZL74	
Vzduchotechnika - změny tras						
Stavba:		Sportovní hala pro tělesnou výchovu Nová Paka				
Objekt:						
Předkládá:		VALC, s.r.o.			Datum: 28.11.2025	
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů				
poštou		1) Položkový rozpočet změny			1	listů
e-mailem		2) Projektové podklady			0	listů, výkresů
osobně		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy			0	listů
1 Technický popis změny:						
1.1 Popis původního řešení: trasy dle PD						
1.2 Popis nového řešení: Změna provedených tras vzduchotechnického potrubí oproti projektové dokumentace.						
2 Zdůvodnění změny:						
Úprava provedených tras bude realizována na základě požadavku AD. Po demontáži potrubí bylo nutné realizovat v SDK příčkách nové prostupy pro instalaci potrubí v jiné trase, současně vyrobit nové odbočovací potrubí, zapravit původní prostupy stěnovými konstrukcemi a nově instalovat potrubí v jiné požadované trase, což zvýšilo mj. časovou náročnost realizace vzduchotechniky a současně oddálilo stavební dokončenost návazných profesí (SDK konstrukce, kazetové podhledy, skleněné příčky).						
Vazba na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek, par.222 změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: zařazeno do odst. 6						
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:			ANO		X	NE
4 Dopad do smluvních termínů:			ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		X	NE
5 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč		bez DPH	
	Cena víceprací (přípočet):	+	45 450,93 Kč		bez DPH	
	Výsledná ceny změny:		45 450,93 Kč		bez DPH	
6 Schválil:						
za zhotovitele:		za TDS:		za TDS - specialistu:		za AD:

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Sportovní hala pro tělesnou výchovu Nová Paka
Objekt: VZT změny poloh

Objednatel: Královéhradecký kraj
 Zhotovitel: VALC, s.r.o.
 Místo: Nová Paka

Zpracoval: Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.
 Datum: 7. 11. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV

45,450.93

41	R	AHU 01.705	Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu - DN 250 - běžné provedení, třída těsnosti A(I. A II.), 30% tvarovek	bm	4.500	858.41	3,862.85	SOD
----	---	------------	---	----	-------	--------	----------	-----

"7.10 - změna výšek v přízemí přes chodbu do nářadovny
 - 1.NP 1.17,1.18,1.15*4,5

4.500

Součet

4.500

48	R	AHU 01.801	Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu - ROVNÉ - skupina I - třída těsnosti A, tlakový stupeň (1+4) dle DIN 18 379, včetně regulačních a náběhových plechů	m2	24.040	942.10	22,648.08	SOD
----	---	------------	---	----	--------	--------	-----------	-----

"2.8 - 2.NP mč2.12+2.13, přesun trasy naproti stěně s instalacemi umyvadel" 6,78

6.780

"2.8 - 2.NP mč2.10/2.11 kolize s odvodněním střechy" 3,26

3.260

"3.NP změna rozvodů z důvodů copilitů - 2x" 10

10.000

"Kolize v kotelně kde kolidovala VZT s komínem" 4

4.000

Součet

24.040

449	R		Záměna tras po realizaci dle PD	hod	50.000	378.80	18,940.00	SOD
-----	---	--	---------------------------------	-----	--------	--------	-----------	-----

"2.8 - 2.NP mč2.12+2.13, přesun trasy naproti stěně s instalacemi umyvadel" 8

8.000

"2.8 - 2.NP mč2.10/2.11 kolize s odvodněním střechy" 7

7.000

"7.10 - změna výšek v přízemí přes chodbu do nářadovny
 - 1.NP 1.17,1.18,1.15*9

9.000

"3.NP změna rozvodů z důvodů copilitů - 2x" 20

20.000

"Kolize v kotelně kde kolidovala VZT s komínem" 6

6.000


Součet


50.000


Celkem

45,450.93



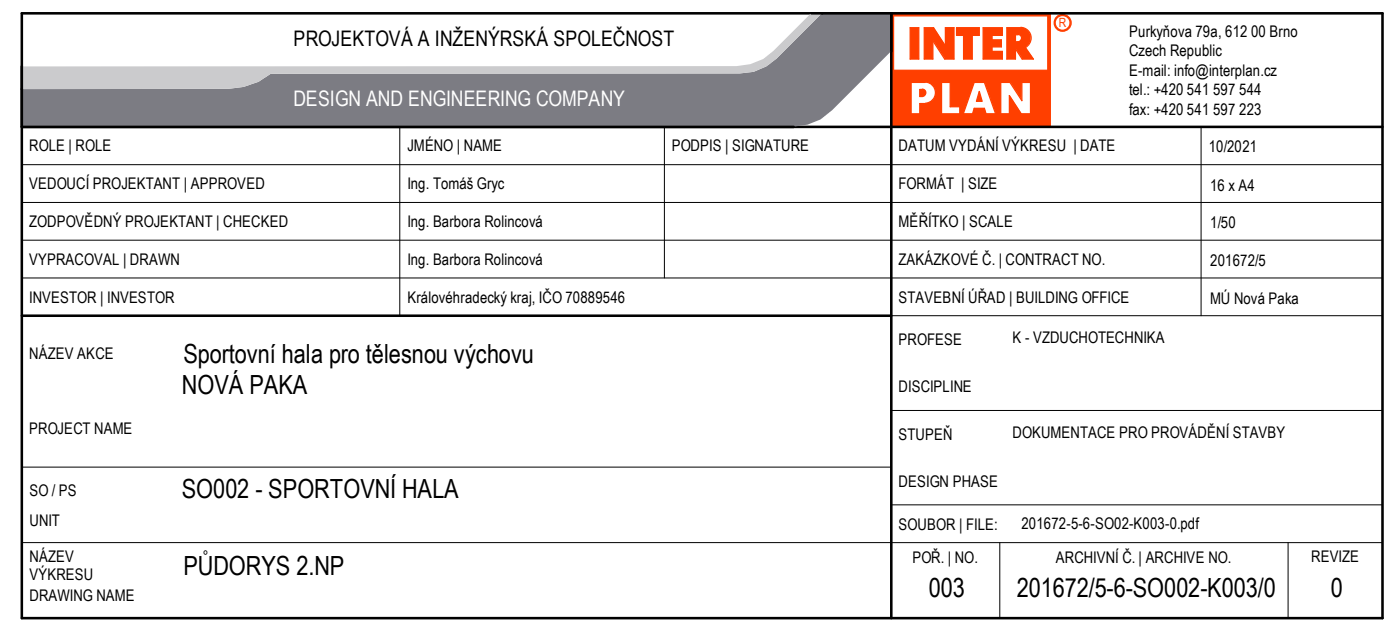

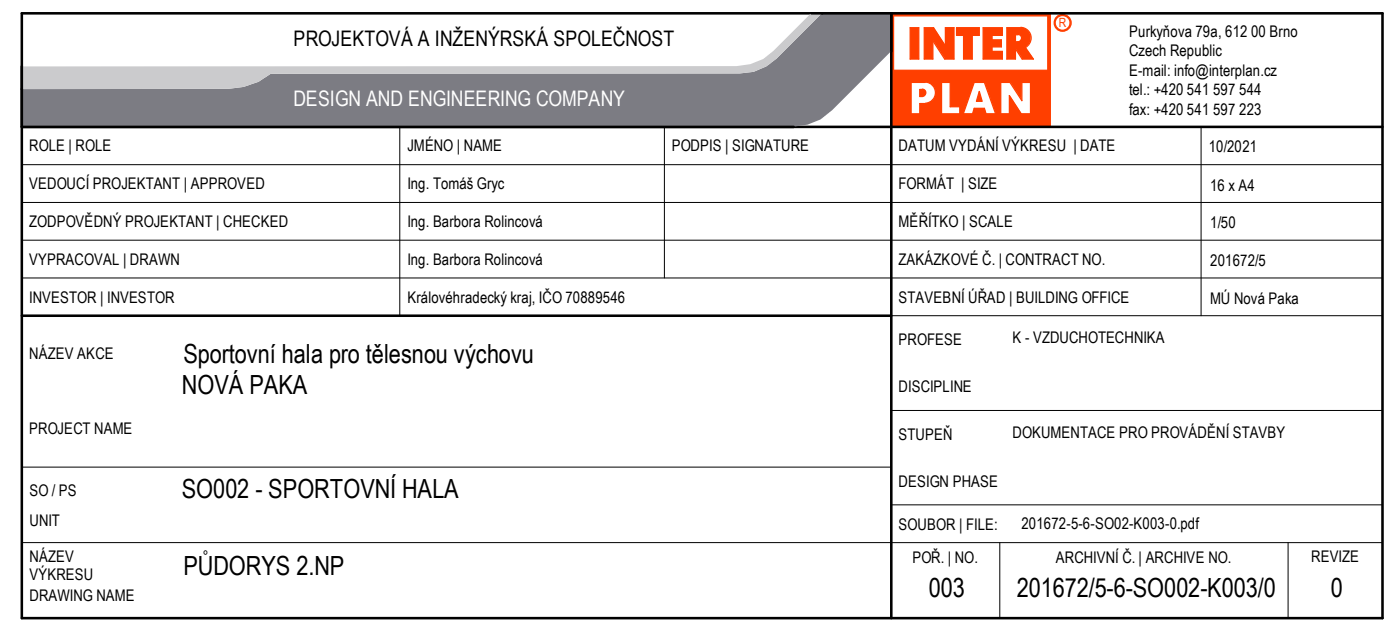

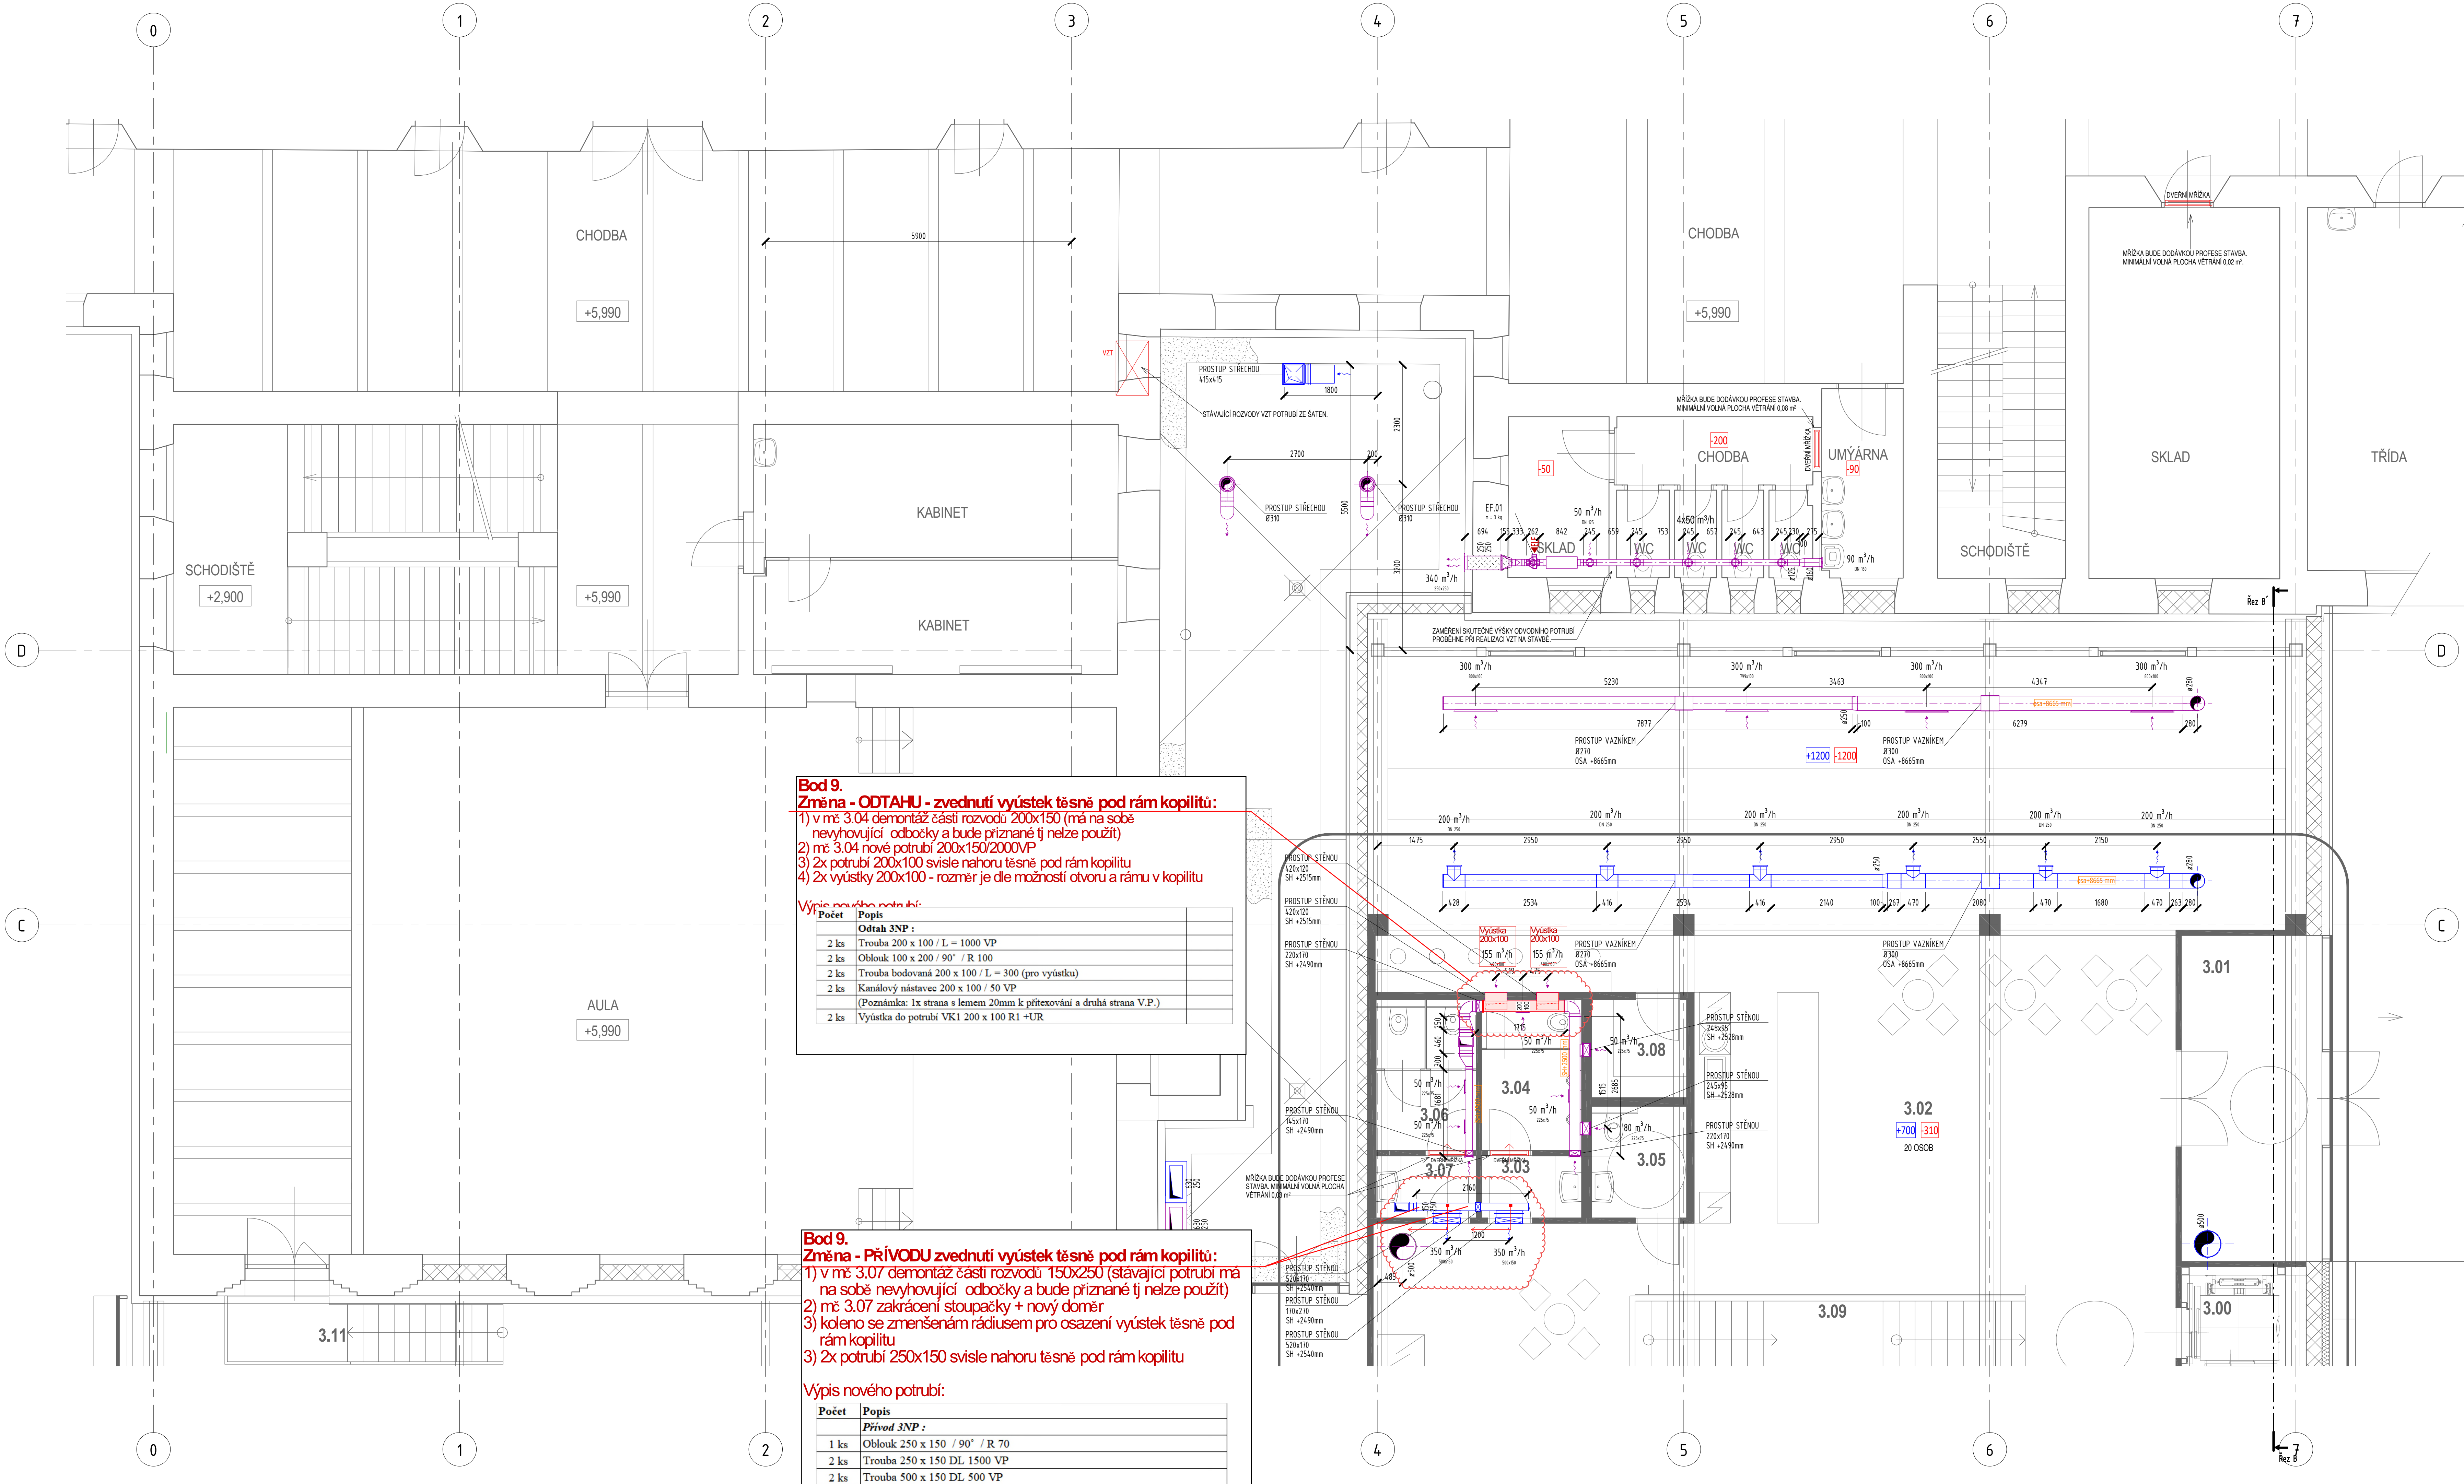


LEGENDA VZT POTRUBÍ / DUCT LEGEND



LEGENDA IZOLACÍ / INSULATION LEGEND



LEGENDA VZDUCHOTECHNIKY / VENTILATION LEGEND

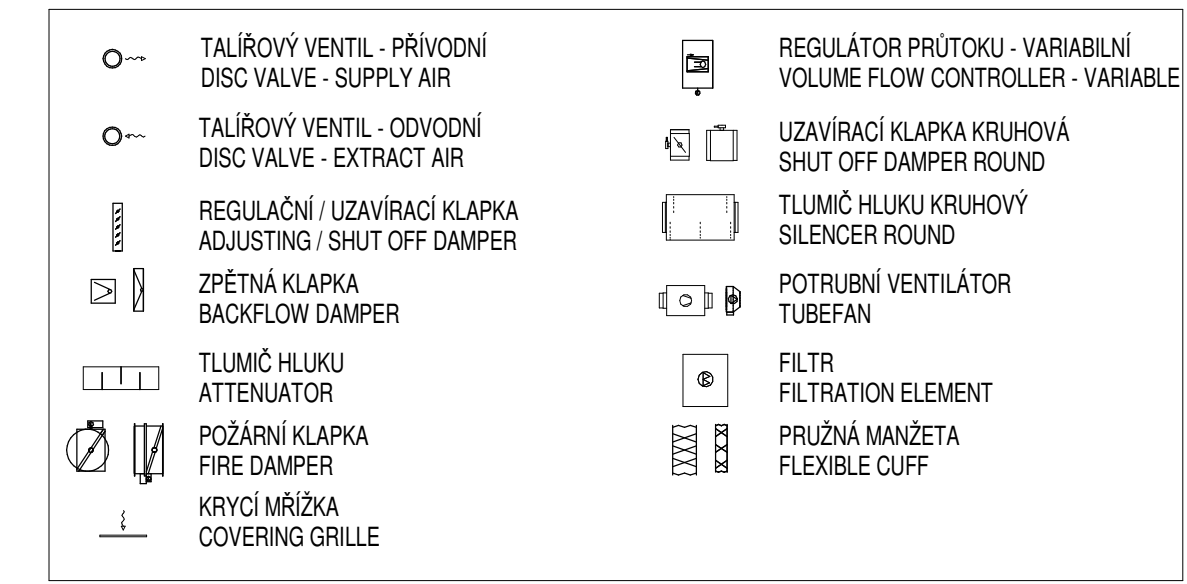


LEGENDA ZNAČENÍ / LABELING LEGEND

AHU	VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA / AIR HANDLING UNIT	ACC	KONDENZAČNÍ JEDNOTKA / OUTDOOR CONDENSING UNIT
EF	ODVODNÍ VENTILÁTOR / EXHAUST FAN	VAV	REGULÁTOR VAR. PRŮTOKU / VAV UNIT
SF	PŘÍVODNÍ VENTILÁTOR / SUPPLY FAN	FD	POŽÁRNÍ KLAPKA, STĚNOVÝ UZÁVĚR / FIRE DAMPER, WALL SHUTTER

POZNÁMKY / NOTES

- NEKOTOVANÉ ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ JE VE STANDARTNÍ DÉLCE 1500 mm
- FLEXIBILNÍ HADICE K VZT ELEMENTŮM NESMÍ MÍT DÉLKY VĚTŠÍ NEŽ 1 m
- TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ PROVEŠT PŘECIZNĚ S PAROTĚSNÝMI SPOJÍ A DOTÁHNOUT AŽ K PLÁŠTI ZAŘÍZENÍ
- VŠECHNY ODBOČKY A ROZBOČKY BUDOU VYBAVENY REGULAČNÍMI A NABĚHOVÝMI PLECHY
- VŠEKERÉ NÁPOJOVACÍ ROZMĚRY ELEMENTŮ VZT OVĚŘIT PŘED ZAPOČETÍM MONTÁŽI
- PŘI INSTALACI ZAŘÍZENÍ NUTNO DODRŽOVAT POŽADAVKY A MONTÁŽNÍ POKYNY VÝROBCE ZAŘÍZENÍ
- VŠEKERÉ ZMĚNY KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM VZT
- V DALŠÍ STUPNI PO BUDE PODROBNĚJI ŘEŠEN DETAIL OSAZENÁ REGULATORŮ PRŮTOKU NA STŘEŠE OBJEKTU (NUTNĚ OPLECHOVÁNÍ JAKO OCHRANA PROTI VNĚJŠÍM VLIVŮM)
- ROZSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ODPOVÍDÁ VÝHLÁŠCE O DOKUMENTACI STAVĚB 499/2006
- KOMPLETNÍ NÁVRH NOSNÉHO SYSTÉMU PRVKŮ VZT NA STŘEŠE VČETNĚ STATICKÉHO VÝPOČTU BUDE SOUČÁSTÍ DILENSKÉ DOKUMENTACE. TATO DOKUMENTACE NEOBSAHUJE PŘESNÝ NÁVRH STATICKÉHO POSOUZENÍ A NÁVRH NOSNÉHO SYSTÉMU.

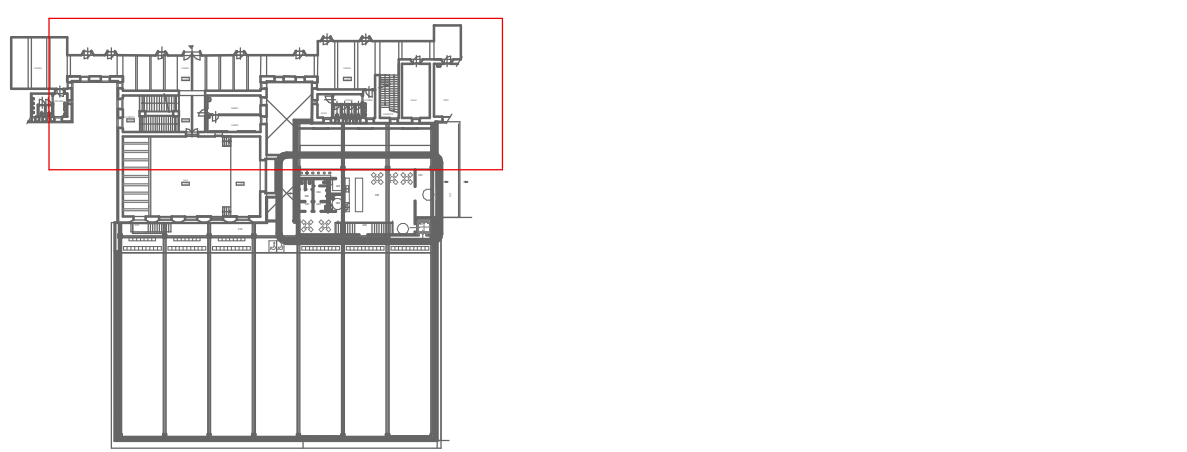

± 0,000 = 436,650 m n. m = úroveň podlahy stávající tělocvičny

Číslo	Datum	Popis	revis	revis	Vydal

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ, GENERÁLNÍ PROJEKTANT:
studenyarchitekti s.r.o.
Partnerská 33
612 00 Brno
IČ: 123456789
E-mail: studeny@studeny.cz
www.studenychy.cz

AUTOR:
Ing. Jan Studený, stp. arch.
Ing. arch. Marek Štěrba
AUTORSKÁ SPOLUPRÁCE NA ÚVODNÍM LÍSTKU
Předseda: Petr Štěrba
Měs. arch. Petr Štěrba, AED.

PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ SPOLEČNOST			INTER PLAN[®] Půlková 76b Čechy, Republika E-mail: info@interplan.cz Tel: +420 541 597 545 Fax: +420 541 597 220	
DESIGN AND ENGINEERING COMPANY				
ROLE / ROLE	MEČNO / NAME	POPS / SIGNATURE	DATUM VYDÁNÍ VÝKRESU / DATE	
VEDOUcí PROJEKTANT / APPROVED	Ing. Tomáš Gryc		FORMAT / SIZE	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / CHECKED	Ing. Barbora Holcová		MĚRITKO / SCALE	
VYPRACOVANÝ / DRAWN	Ing. Barbora Holcová		ZAKÁZKOVÉ Č. / CONTRACT NO.	
INVESTOR / INVESTOR	Kulturnímu úřadu, IČO 70885646		STAVĚBNÍ ÚŘAD / BUILDING OFFICE	
NÁZEV KACE	Sportovní hala pro tělesnou výchovu NOVÁ PAKA		PROJESE	
PROJECT NAME			DISCIPLINE	
SO / PS	S002 - SPORTOVNÍ HALA		STUPEŇ	
UNIT			DOKUMENTACE PRO PROVED	
NÁZEV VÝKRESU	PŮDORYS 3.NP, ČÁST A		DESIGN PHASE	
DRAWING NAME			SOUBOR / FILE:	
			2016725-6-S002-V004-0.gpt	
			FOR. / NO.	
			004	
			ARCHIVNÍ Č. / ARCHIVE NO.	
			2016725-6-S002-V004-0	
			REVIZE	
			0	

Bod 9.
Změna - ODTAHLU - zvednutí výustek těsně pod rám kopilitu:
1) v mč 3.04 demontáž části rozvodu 200x150 (má na sobě nevhovující odbočky a bude přiznané tj nelze použít)
2) mč 3.04 nové potrubí 200x150/2000VP
3) 2x potrubí 200x100 svise nahoru těsně pod rám kopilitu
4) 2x výustky 200x100 - rozměr je dle možností otvoru a rámu v kopilitu

Výpis nového potrubí:

Počet	Popis
Odtah 3NP :	
2 ks	Trouba 200 x 100 / L = 1000 VP
2 ks	Oblouk 100 x 200 / 90° / R 100
2 ks	Trouba bodovaná 200 x 100 / L = 300 (pro výustku)
2 ks	Kanálový nástavec 200 x 100 / 50 VP
(Poznámka: 1x strana s lemem 20mm k přitexování a druhá strana V.P.)	
2 ks	Výustka do potrubí VK1 200 x 100 R1 +UR

Bod 9.
Změna - PŘÍVODU zvednutí výustek těsně pod rám kopilitu:
1) v mč 3.07 demontáž části rozvodu 150x250 (stávající potrubí má na sobě nevhovující odbočky a bude přiznané tj nelze použít)
2) mč 3.07 zakřivení stoupačky + nový doměr
3) koleno se zmenšením rádiusem pro osazení výustek těsně pod rám kopilitu
4) 2x potrubí 250x150 svise nahoru těsně pod rám kopilitu

Výpis nového potrubí:

Počet	Popis
Přívod 3NP :	
1 ks	Oblouk 250 x 150 / 90° / R 70
2 ks	Trouba 250 x 150 DL 1500 VP
2 ks	Trouba 500 x 150 DL 500 VP



ZMĚNOVÝ LIST					ZL75	
Dopojení plynu du HUP školy						
Stavba:		Sportovní hala pro tělesnou výchovu Nová Paka				
Objekt:						
Předkládá:		VALC, s.r.o.			Datum: 01.12.2025	
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů				
poštou		1) Položkový rozpočet změny			1	listů
e-mailem		2) Projektové podklady			0	listů, výkresů
osobně		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy			0	listů
1 Technický popis změny:						
1.1 Popis původního řešení:						
1.2 Popis nového řešení:						
Dopojení plynu du HUP školy						
2 Zdůvodnění změny:						
Dopojení plynu du HUP školy						
Vazba na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek, par.222 změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: zařazeno do odst. 4						
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:			ANO		X	NE
4 Dopad do smluvních termínů:			ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		X	NE
5 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	-24 212,35 Kč		bez DPH	
	Cena víceprací (přípočet):	+	0,00 Kč		bez DPH	
	Výsledná ceny změny:		-24 212,35 Kč		bez DPH	
6 Schválil:						
za zhotovitele:		za TDS:	za TDS - specialistu:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Sportovní hala pro tělesnou výchovu Nová Paka
Objekt: Plynospol

Objednatel: Královéhradecký kraj
 Zhotovitel: VALC, s.r.o.
 Místo: Nová Paka

Zpracoval: Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.
 Datum: 7. 11. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV -6 719,72

12 Odkopávky a prokopávky -195,22

1	R	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	-0,392	498,00	-195,22	SOD
---	---	--------------	---	----	--------	--------	---------	-----

M23 Montáže potrubí -5 852,50

2	R	210150607LP	Revizní zpráva a protokoly	soubor	-1,000	2 000,00	-2 000,00	SOD
3	R	230180026R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 90 x 5,2	m	-10,000	147,60	-1 476,00	SOD
4	R	230180070R00	Montáž trubních dílů PE, PP, D 90 x 5,2	kus	-5,000	380,70	-1 903,50	SOD
5	R	230230032R00	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 2,5 MPa, DN 80	m	-12,000	15,50	-186,00	SOD
6	R	723190901R00	Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus	-2,000	39,40	-78,80	SOD
7	R	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	-10,000	20,82	-208,20	SOD

M46 Zemní práce při montážích -672,00

8	R	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm+Cu vodič	m	-10,000	12,20	-122,00	SOD
9	R	460921102LP	Geodetické zaměření nového potrubí doložené geometrickým plánem v tištěné a digitální podobě(dodávka, doprava, mzdy)	m	-10,000	55,00	-550,00	SOD

PSV Práce a dodávky PSV -17 492,63

D1 Ostatní materiál -7 049,96

10	R	28613049.M	Koleno 90° d 90 mm PE 100	kus	-2,000	405,67	-811,34	SOD
11	R	28613106.M	Elektrospojka d 90 mm SDR 11 PE 100	kus	-2,000	299,45	-598,90	SOD
12	R	28613617	Trubka SDR 17 90x5,4 mm plyn - návin	m	-10,000	148,03	-1 480,30	SOD
13	R	286543041LP	Přechodka ocel/plast PE DN80/dn90	kus	-1,000	2 130,00	-2 130,00	SOD
14	R	583312054	Kamenivo těžené frakce 0/4 B	t	-6,290	278,00	-1 748,62	SOD
15	R	83132657VD	Fólie výstražná žlutá "POZOR PLYN" + CYY 2,5 mm2 vodič	m	-13,000	21,60	-280,80	SOD

13 Hloubené vykopávky -2 509,20

16	R	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	-6,800	369,00	-2 509,20	SOD
----	---	--------------	--	----	--------	--------	-----------	-----

16 Přemístění výkopku -2 514,31

17	R	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	-4,250	305,00	-1 296,25	SOD
18	R	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	-42,500	23,53	-1 000,03	SOD
19	R	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	-4,250	51,30	-218,03	SOD

17 Konstrukce ze zemin -1 070,66

20	R	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-2,550	133,20	-339,66	SOD
21	R	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-3,400	215,00	-731,00	SOD

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní								
19							-1 122,00	
22	R	199000002LP	Poplatek za skládku horniny 1- 4	t	-6,800	165,00	-1 122,00	SOD
Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)								
45							-926,50	
23	R	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	-0,850	1 090,00	-926,50	SOD
H27 Vedení trubní dálková a přípojná								
H27							-2 300,00	
25	R	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	-1,000	2 300,00	-2 300,00	SOD
Celkem							-24 212,35	

ZMĚNOVÝ LIST					ZL76	
Dodání XPS na torkretovanou stěnu						
Stavba:		Sportovní hala pro tělesnou výchovu Nová Paka				
Objekt:						
Předkládá:		VALC, s.r.o.			Datum: 28.11.2025	
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů				
poštou		1) Položkový rozpočet změny			1	listů
e-mailem		2) Projektové podklady			0	listů, výkresů
osobně		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy			0	listů
1 Technický popis změny:						
1.1 Popis původního řešení: v PD nebylo řešeno						
1.2 Popis nového řešení: Dodání XPS na trokretovou stěnu jako ochranná funkce						
2 Zdůvodnění změny:						
v PD nebyla řešena izolace stávajících budovy, navržena stěna z torkretu (viz ZL 69) a jako ochranná funkce doplněn XPS na torkretovanou stěnu						
Vazba na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek, par.222 změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: zařazeno do odst. 6						
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:			ANO		X	NE
4 Dopad do smluvních termínů:			ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		X	NE
5 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	–	0,00 Kč		bez DPH	
	Cena víceprací (přípočet):	+	5 881,23 Kč		bez DPH	
	Výsledná ceny změny:		5 881,23 Kč		bez DPH	
6 Schválil:						
za zhotovitele:		za TDS:		za TDS - specialistu:		za AD:

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Sportovní hala pro tělesnou výchovu Nová Paka
Objekt: XPS před torkret

Objednatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: VALC, s.r.o.
Místo: Nová Paka

Zpracoval: Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.
Datum: 7. 11. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV

Práce a dodávky PSV

5,881.23

713

Izolace tepelné

5,881.23

267	R	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	15.520	210.00	3,259.20	SOD
	BCL	BCL.0001337 .URS	deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 300 SF 30mm	m2	17.848	141.18	2,519.78	URS 2025 02 * 0,9
290	R	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0.109	938.10	102.25	SOD


Celkem

5,881.23

ANGLICKÝ DVOREK

1:75

PŮDORYS

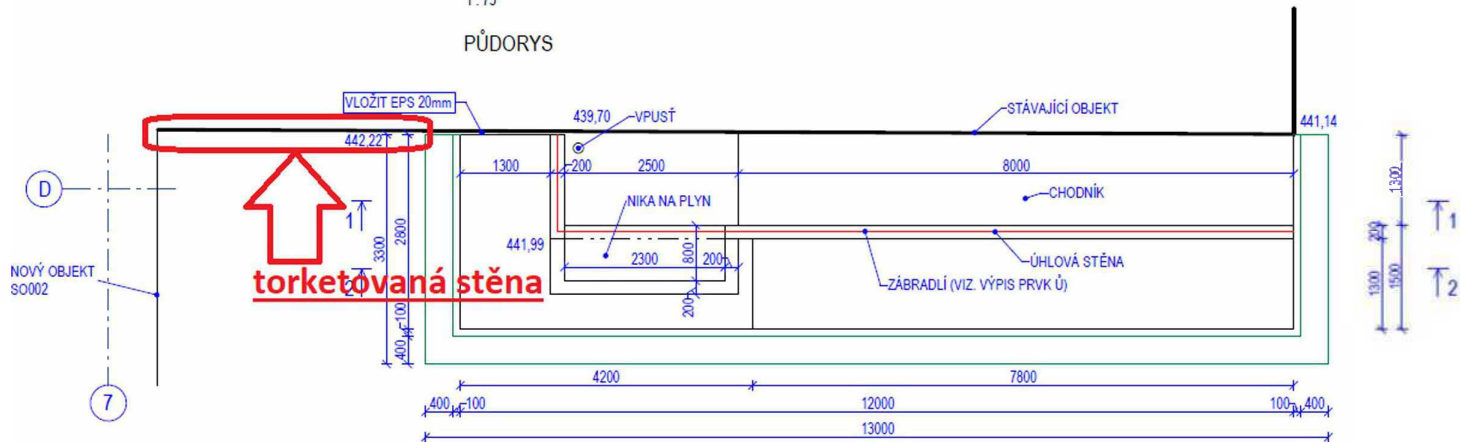

PODĚKOVÁNÍ

ZMĚNOVÝ LIST					ZL76	
Dodání XPS na torkretovanou stěnu						
Stavba:		Sportovní hala pro tělesnou výchovu Nová Paka				
Objekt:						
Předkládá:		VALC, s.r.o.			Datum: 28.11.2025	
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů				
poštou		1) Položkový rozpočet změny			1	listů
e-mailem		2) Projektové podklady			0	listů, výkresů
osobně		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy			0	listů
1 Technický popis změny:						
1.1 Popis původního řešení: v PD nebylo řešeno						
1.2 Popis nového řešení: Dodání XPS na trokretovou stěnu jako ochranná funkce						
2 Zdůvodnění změny:						
v PD nebyla řešena izolace stávajících budovy, navržena stěna z torkretu (viz ZL 69) a jako ochranná funkce doplněn XPS na torkretovanou stěnu						
Vazba na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek, par.222 změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: zařazeno do odst. 6						
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:			ANO		X	NE
4 Dopad do smluvních termínů:			ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		X	NE
5 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	–	0,00 Kč		bez DPH	
	Cena víceprací (přípočet):	+	5 881,23 Kč		bez DPH	
	Výsledná ceny změny:		5 881,23 Kč		bez DPH	
6 Schválil:						
za zhotovitele:		za TDS:	za TDS - specialistu:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Sportovní hala pro tělesnou výchovu Nová Paka
Objekt: XPS před torkret

Objednatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: VALC, s.r.o.
Místo: Nová Paka

Zpracoval: Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.
Datum: 7. 11. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV

Práce a dodávky PSV

5,881.23

713

Izolace tepelné

5,881.23

267	R	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	15.520	210.00	3,259.20	SOD
	BCL	BCL.0001337 .URS	deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 300 SF 30mm	m2	17.848	141.18	2,519.78	URS 2025 02 * 0,9
290	R	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0.109	938.10	102.25	SOD


Celkem

5,881.23

ANGLICKÝ DVOREK

1:75

PŮDORYS

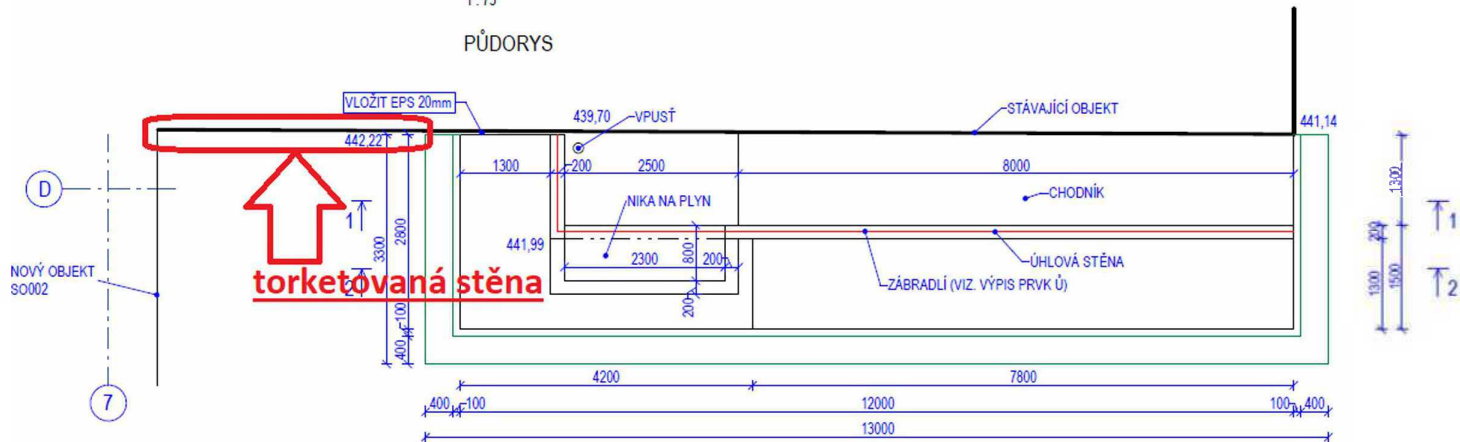

ZMĚNOVÝ LIST					ZL77	
Úprava EZS dle uživatele						
Stavba:		Sportovní hala pro tělesnou výchovu Nová Paka				
Objekt:						
Předkládá:		VALC, s.r.o.			Datum: 28.11.2025	
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů				
poštou		1) Položkový rozpočet změny			1	listů
e-mailem		2) Projektové podklady			0	listů, výkresů
osobně		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy			0	listů
1 Technický popis změny:						
1.1 Popis původního řešení: dle PD						
1.2 Popis nového řešení: Úprava EZS						
2 Zdůvodnění změny:						
Na kontrolním dnu č. 100 ve dne 24.11.2025 bylo rozhodnuto prostřednictvím objednatele na požadavek provozovatele gymnázia o změně instalací systému elektronického zabezpečovacího systému. Projektová dokumentace určuje dispoziční rozmístění EZS na jednotlivé vnitřní dveřní výplně a vstupy do objektu. Revizi projektu předmětného zhotovitel obdržel 27.11.2025 e-mailovou korespondencí od projektanta. Změna vyvolaná provozními požadavky provozovatele gymnázia spočívá ve přemístění EZS na jiné dveřní pozice, což dále vyvolává nutnost úprav dveří u subdodavatele a výrobce dveřních pozic dotčených změn - viz v rozsahu revize projektu přílohou tohoto protokolu. Změna umístění jednotlivých prvků upřesněná uživatelskými potřebami provozovatele, změnou řešení PBŘ (změna únikových cest).						
Vazba na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek, par.222 změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: zařazeno do odst. 4						
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:			ANO		X	NE
4 Dopad do smluvních termínů:			ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		X	NE
5 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	-20 597,78 Kč		bez DPH	
	Cena víceprací (přípočet):	+	43 161,72 Kč		bez DPH	
	Výsledná ceny změny:		22 563,94 Kč		bez DPH	
6 Schválil:						
za zhotovitele:		za TDS:		za TDS - specialistu:		za AD:

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Sportovní hala pro tělesnou výchovu Nová Paka
Objekt: EZS


Objednatel: Královéhradecký kraj
 Zhotovitel: VALC, s.r.o.
 Místo: Nová Paka

Zpracoval: Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.
 Datum: 7. 11. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
PSV			Práce a dodávky PSV	22,563.94				
D.3			Elektrická zabezpečovací signalizace EZS (PTZS)	22,563.94				
33	R	305	Magnetický detektor otevření křídla sběrníkový	ks	-29.000	337.82	(9,796.78)	SOD
			"SOD"-39		-39.000			
			"revize" 10		10.000			
			Součet		-29.000			
34	R	306	Montáž hlásiče	ks	-29.000	189.00	(5,481.00)	SOD
			"SOD"-39		-39.000			
			"revize" 10		10.000			
			Součet		-29.000			
	R	305a	Magnetický kontakt závrtný	ks	10.000	357.37	3,573.70	CN
			"AL dveře"10		10.000			
34	R	306a	Montáž hlásiče	ks	10.000	189.00	1,890.00	SOD
	R	305b	Modul sběrníkový pro připojení kontaktu	ks	5.000	1,409.98	7,049.90	CN
35	R	307	Klávesnice pro systém EZS	ks	2.000	2,074.46	4,148.92	SOD
36	R	308	Montáž drátové klávesnice	ks	2.000	336.00	672.00	SOD
37	R	309	UVEDENÍ HLÁSIČE DO PROVOZU (programování)	ks	-19.000	280.00	(5,320.00)	SOD
40	R	312	Bus kabel pro EZS – systémový JA typ CC01	m	155.000	17.16	2,659.80	SOD
41	R	313	Montáž bus kabelu do trubky	m	155.000	20.16	3,124.80	SOD
42	R	314	Krabice instalační pod omítku vč. vysekání lůžka	ks	10.000	109.20	1,092.00	SOD
43	R	315	Trubka instalační pod omítkou, 16-50 mm	ks	155.000	74.02	11,473.10	SOD
	R	001	Montážní krabička s ochranným kontaktem	ks	10.000	607.75	6,077.50	CN
45	R	317	Oživení, instalace SW, zaškolení, zkušební provoz	hod	2.000	700.00	1,400.00	SOD

Celkem


22,563.94

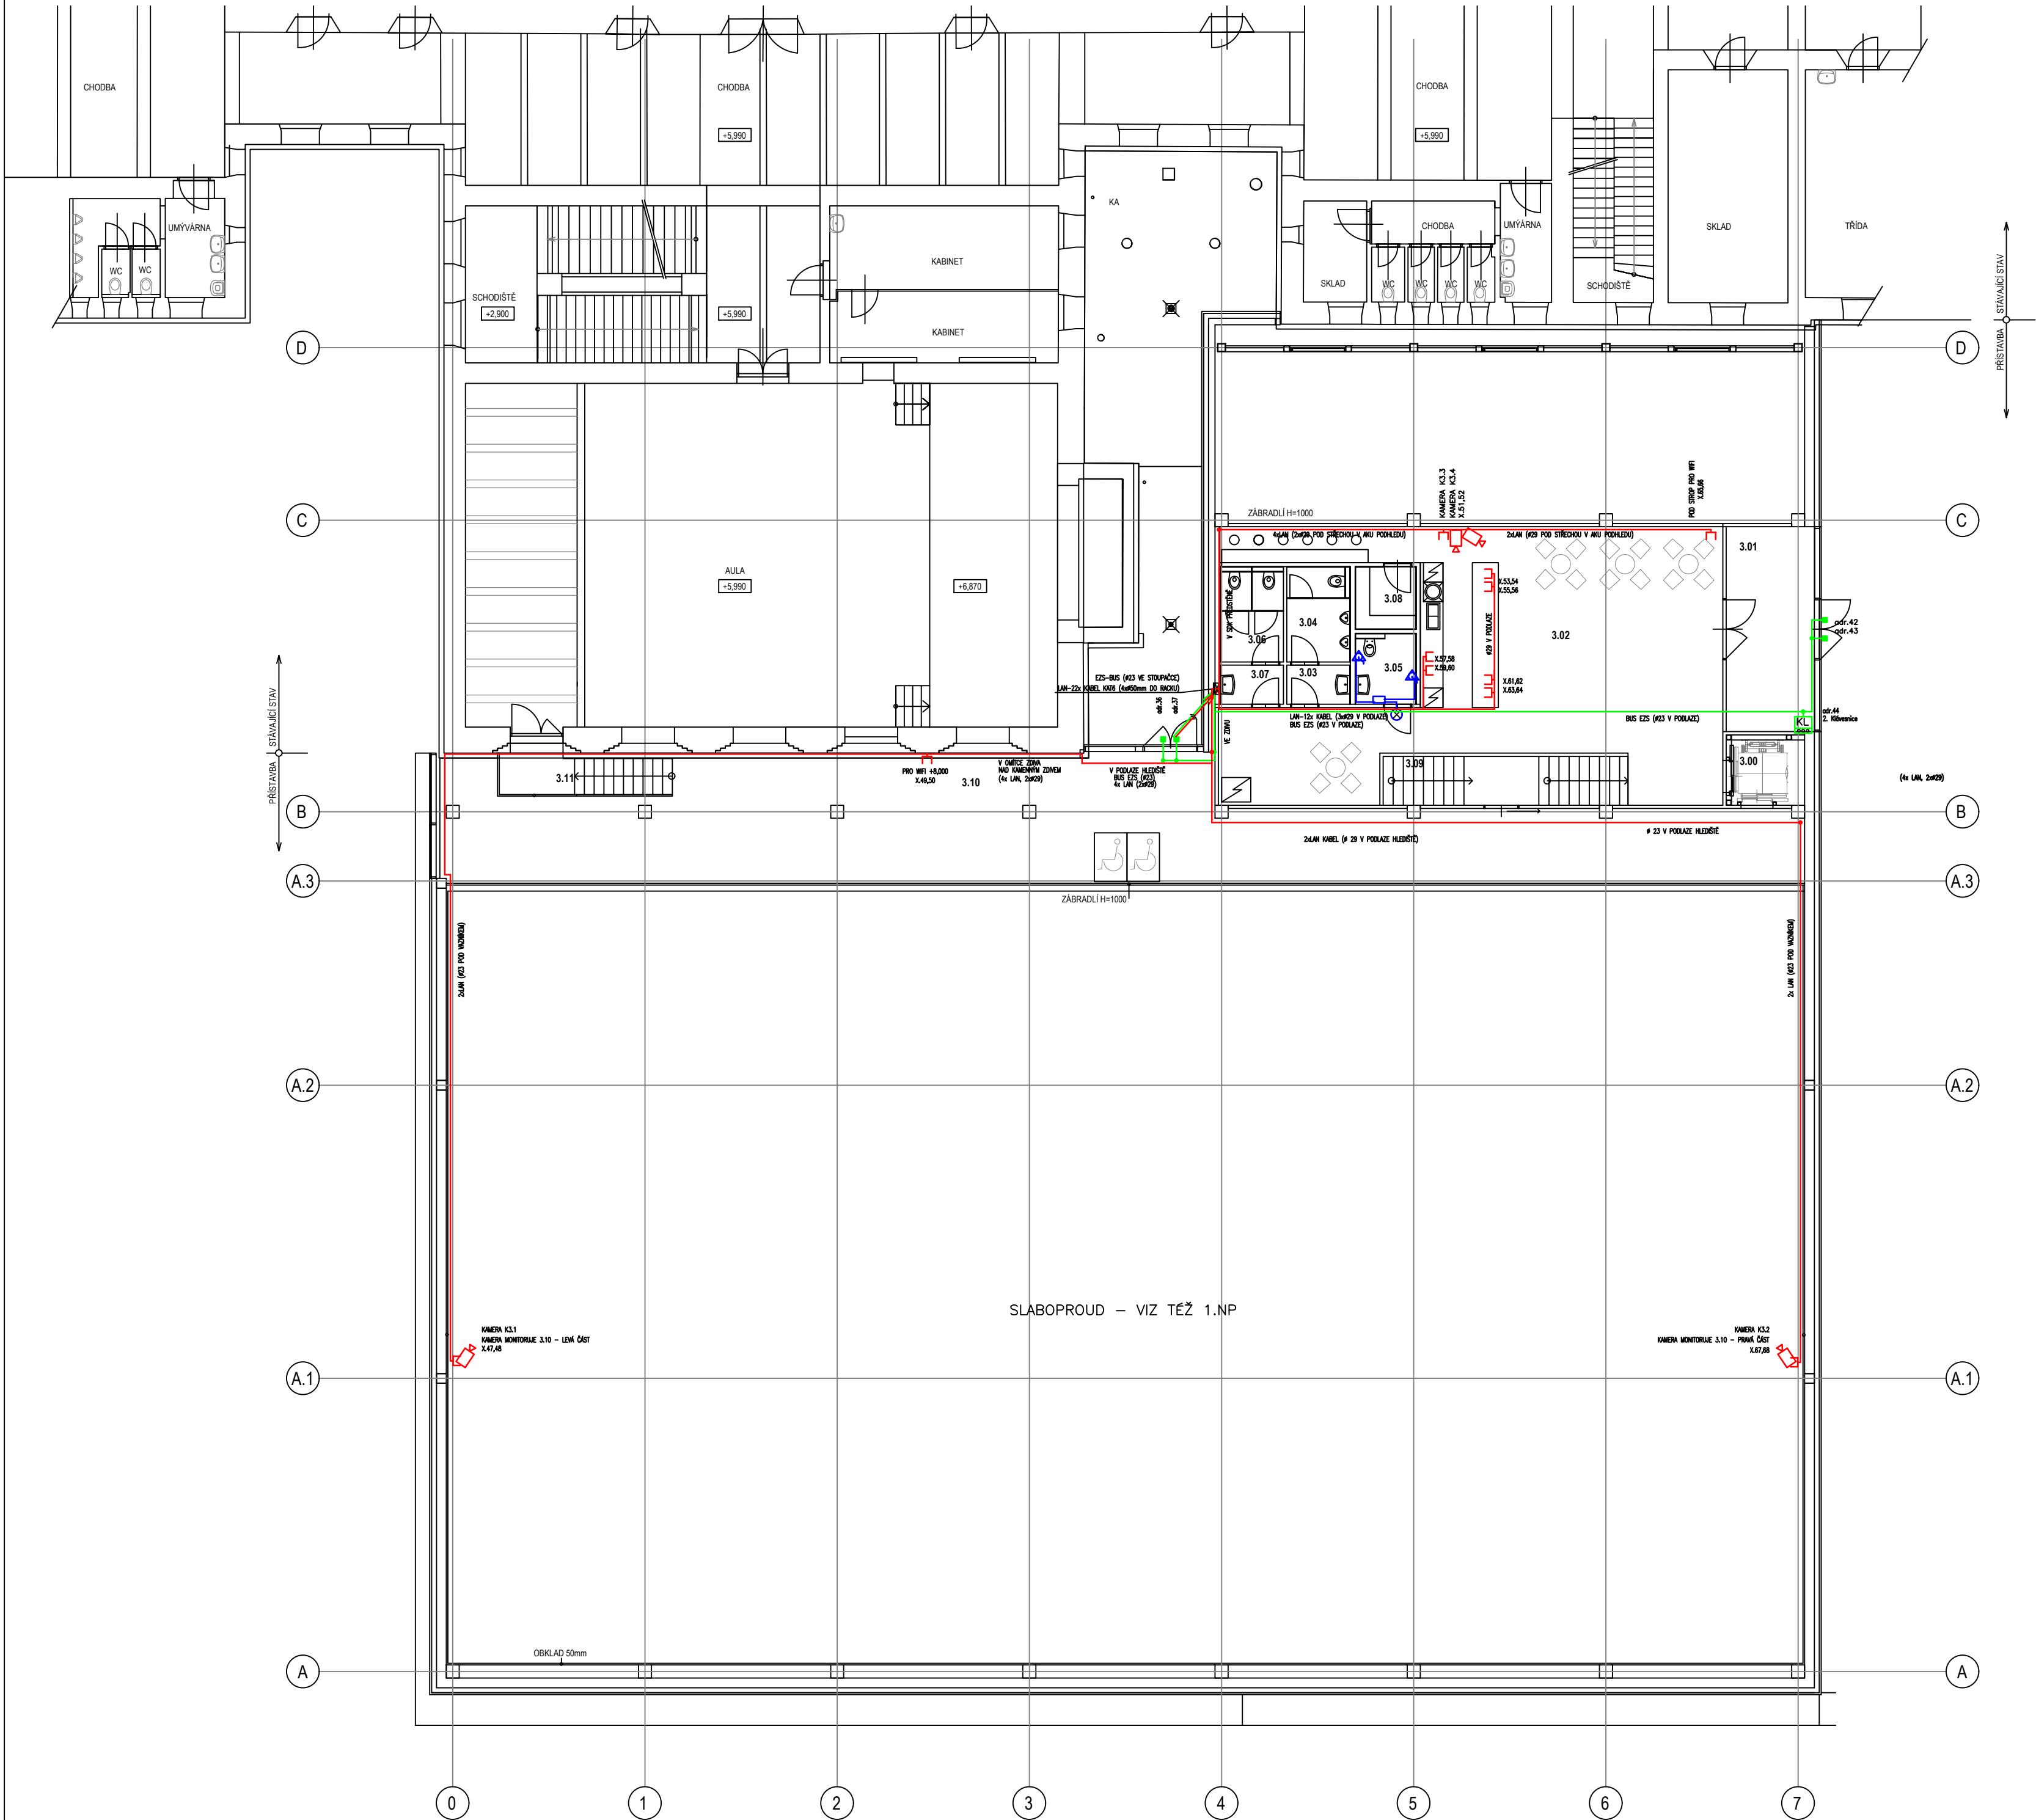

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 3.NP								
Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	SVĚTLÁ V. [mm]	OZN. PODLAHY	POVRCHOVÁ ÚPRAVA			POZNÁMKA
					PODLAHA	STROP	STĚNY	
3.00	VÝTAH	5.21	-	-	-	-	-	
3.01	ZÁDVEŘÍ	17.05	MIN. 3825	P3.2	LITÉ TERACO	DŘEVOCEMENT. DESKY		
3.02	VESTIBUL, BUFET	92.60	MIN. 3825	P3.1	LITÉ TERACO	DŘEVOCEMENT. DESKY		
3.03	WC MUŽI - PŘEDSÍŇ	2.34	MIN. 3825	P3.1	LITÉ TERACO	DŘEVOCEMENT. DESKY		
3.04	WC MUŽI	5.55	MIN. 3825	P3.1	LITÉ TERACO	DŘEVOCEMENT. DESKY		
3.05	WC ŽENY - BEZBARIÉROVÉ	3.93	MIN. 3825	P3.1	LITÉ TERACO	DŘEVOCEMENT. DESKY		
3.06	WC ŽENY	5.34	MIN. 3825	P3.1	LITÉ TERACO	DŘEVOCEMENT. DESKY		
3.07	WC ŽENY - PŘEDSÍŇ	2.32	MIN. 3825	P3.1	LITÉ TERACO	DŘEVOCEMENT. DESKY		
3.08	PŘÍRUČNÍ SKLAD	3.61	MIN. 3825	P3.1	LITÉ TERACO	DŘEVOCEMENT. DESKY		
3.09	SCHODIŠTĚ	10.89	-	P4	LITÉ TERACO	DŘEVOCEMENT. DESKY		
3.10	HLEDIŠTĚ	130.16	MIN. 5300	P3.2	LITÉ TERACO	DŘEVOCEMENT. DESKY		
3.11	UNIKOVÉ SCHODY	6.08	-	P4	LITÉ TERACO	DŘEVOCEMENT. DESKY		

LEGENDA ZNAČEK

-
- DVOUZASUVKA DATA – 2xRJ45opté
-
- AKTIVNÍ PRVKY NEBUDOU SOUČÁSTÍ TĚTO STAVBY. BUDOU DODÁNY KOMPATIBILNÍ SE STÁVAJÍCIMI
-
- ELEKTRICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE EZS
-
- MAGNETICKÝ KONTAKT PRO KŘÍDLO OKNA, DVEŘÍ
-
- ELEKTRICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE EZS
-
- POHYBOVÝ DETEKTOR
-
- ELEKTRICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE EZS
-
- KLÁVESNICE PRO OHLAŠOVÁNÍ SYSTÉMU
-
- LOTVY KAMEROVÝ SYSTÉM
-
- IP KAMERA, PoE
-
- AKTIVNÍ PRVKY NEBUDOU SOUČÁSTÍ TĚTO STAVBY. BUDOU DODÁNY KOMPATIBILNÍ SE STÁVAJÍCIMI
-
- PODLAHOVÁ KRABICE
-
- JE SOUČÁSTÍ DODÁNKY SILNOPROUDU, SLP. DODÁ POUZE ZASUVKY SLP
-
- SIGNALIZACE Z WC POSTIŽENÝCH
-
- TLAČÍTKO NOUZOVÉHO VOLÁNÍ
-
- SIGNALIZACE Z WC POSTIŽENÝCH
-
- SIGNALIZAČNÍ SVÍTIDLO VČETNĚ AKUSTIKY
-
- DVEŘNÍ KOMBINACE PRO RESET SYSTÉMU
-
- ŠKOLNÍ ZVONEK 75 V
-
- KABEL 2x1,5 V TRUBECE V BETONU
-
- JEDNOTNÝ ČAS – HODINOVÉ IMPULSY
-
- KABEL 3x1,5 V TRUBECE V BETONU
-
- ROZHLAS 100W, REPRODUKTOR EN54, ODOLNOST PROTI ÚDERU MČEM
-
- KABEL 4x1,5 V TRUBECE V BETONU
-
- NENÍ POŽÁDOVÁN "NOUZOÝ ZVUKOVÝ SYSTÉM" DO VŠECH PROSTOR TĚLOČVICHY




±0,000 = 436,650 m n.m = úroveň podlahy stávající tělocvičny

1	26.11.2025	Redukce rozsahu EZS, poloha klávesnic	ing. T. Gryc
Číslo revize	Datum revize	Popis revize	Vydal

ARCHITECTONICKÉ ŘEŠENÍ, GENERÁLNÍ PROJEKTANT:
studenyarchitekti s.r.o.
Pargalova 33
611 01 Brno, ČR
IČO: 261 51 853
E-mail: studeny@studeny.cz
www.studeny.cz

AUTORSKÁ SPOLUPRÁCE NA ARCH. ŘEŠENÍ:
Ing. arch. Petr Štec
Ing. arch. Petr Štec, A/D.

PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ SPOLEČNOST			INTER PLAN		Purkyňova 79a, 612 00 Brno Czech Republic E-mail: info@interplan.cz tel.: +420 541 597 544 fax: +420 541 597 223			
DESIGN AND ENGINEERING COMPANY								
ROLE / ROLE	JMENO / NAME	PODPIS / SIGNATURE	DATUM VYDÁNÍ VÝKRESU / DATE		10.2021			
VEDOUČÍ PROJEKTANT / APPROVED	Ing. Tomáš Gryc		FORMÁT / SIZE		A1			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / CHECKED	Ing. Karel Alena		MĚŘÍTKO / SCALE		1:100			
VYPRACOVÁNÍ / DRAWN	Ing. Karel Alena		ZAKÁZKOVÉ Č. / CONTRACT NO.		2016725			
INVESTOR / INVESTOR	Křesťanský ústav, I. Číslo 7088546		STAVEBNÍ ÚŘAD / BUILDING OFFICE		MÚ Nová Paka			
NÁZEV AKCE	Sportovní hala pro tělesnou výchovu NOVÁ PAKA		PROFESE		S - SLABOPROUD A TELEKOMUNIKACE			
PROJECT NAME			DISCIPLINE					
			STUPEŇ		DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY			
			DESIGN PHASE					
SO / PS			SO002 - SPORTOVNÍ HALA		SOUBOR / FILE		201672_5-6-S0002-A0011.pdf	
UNIT			PŮDORYS 3.NP		POR. / NO.		ARCHIVNÍ Č. / ARCHIVE NO.	
NÁZEV VÝKRESU / DRAWING NAME					004		201672/5-6-S0002-S004/ 1	
							REVIZE	
					1			

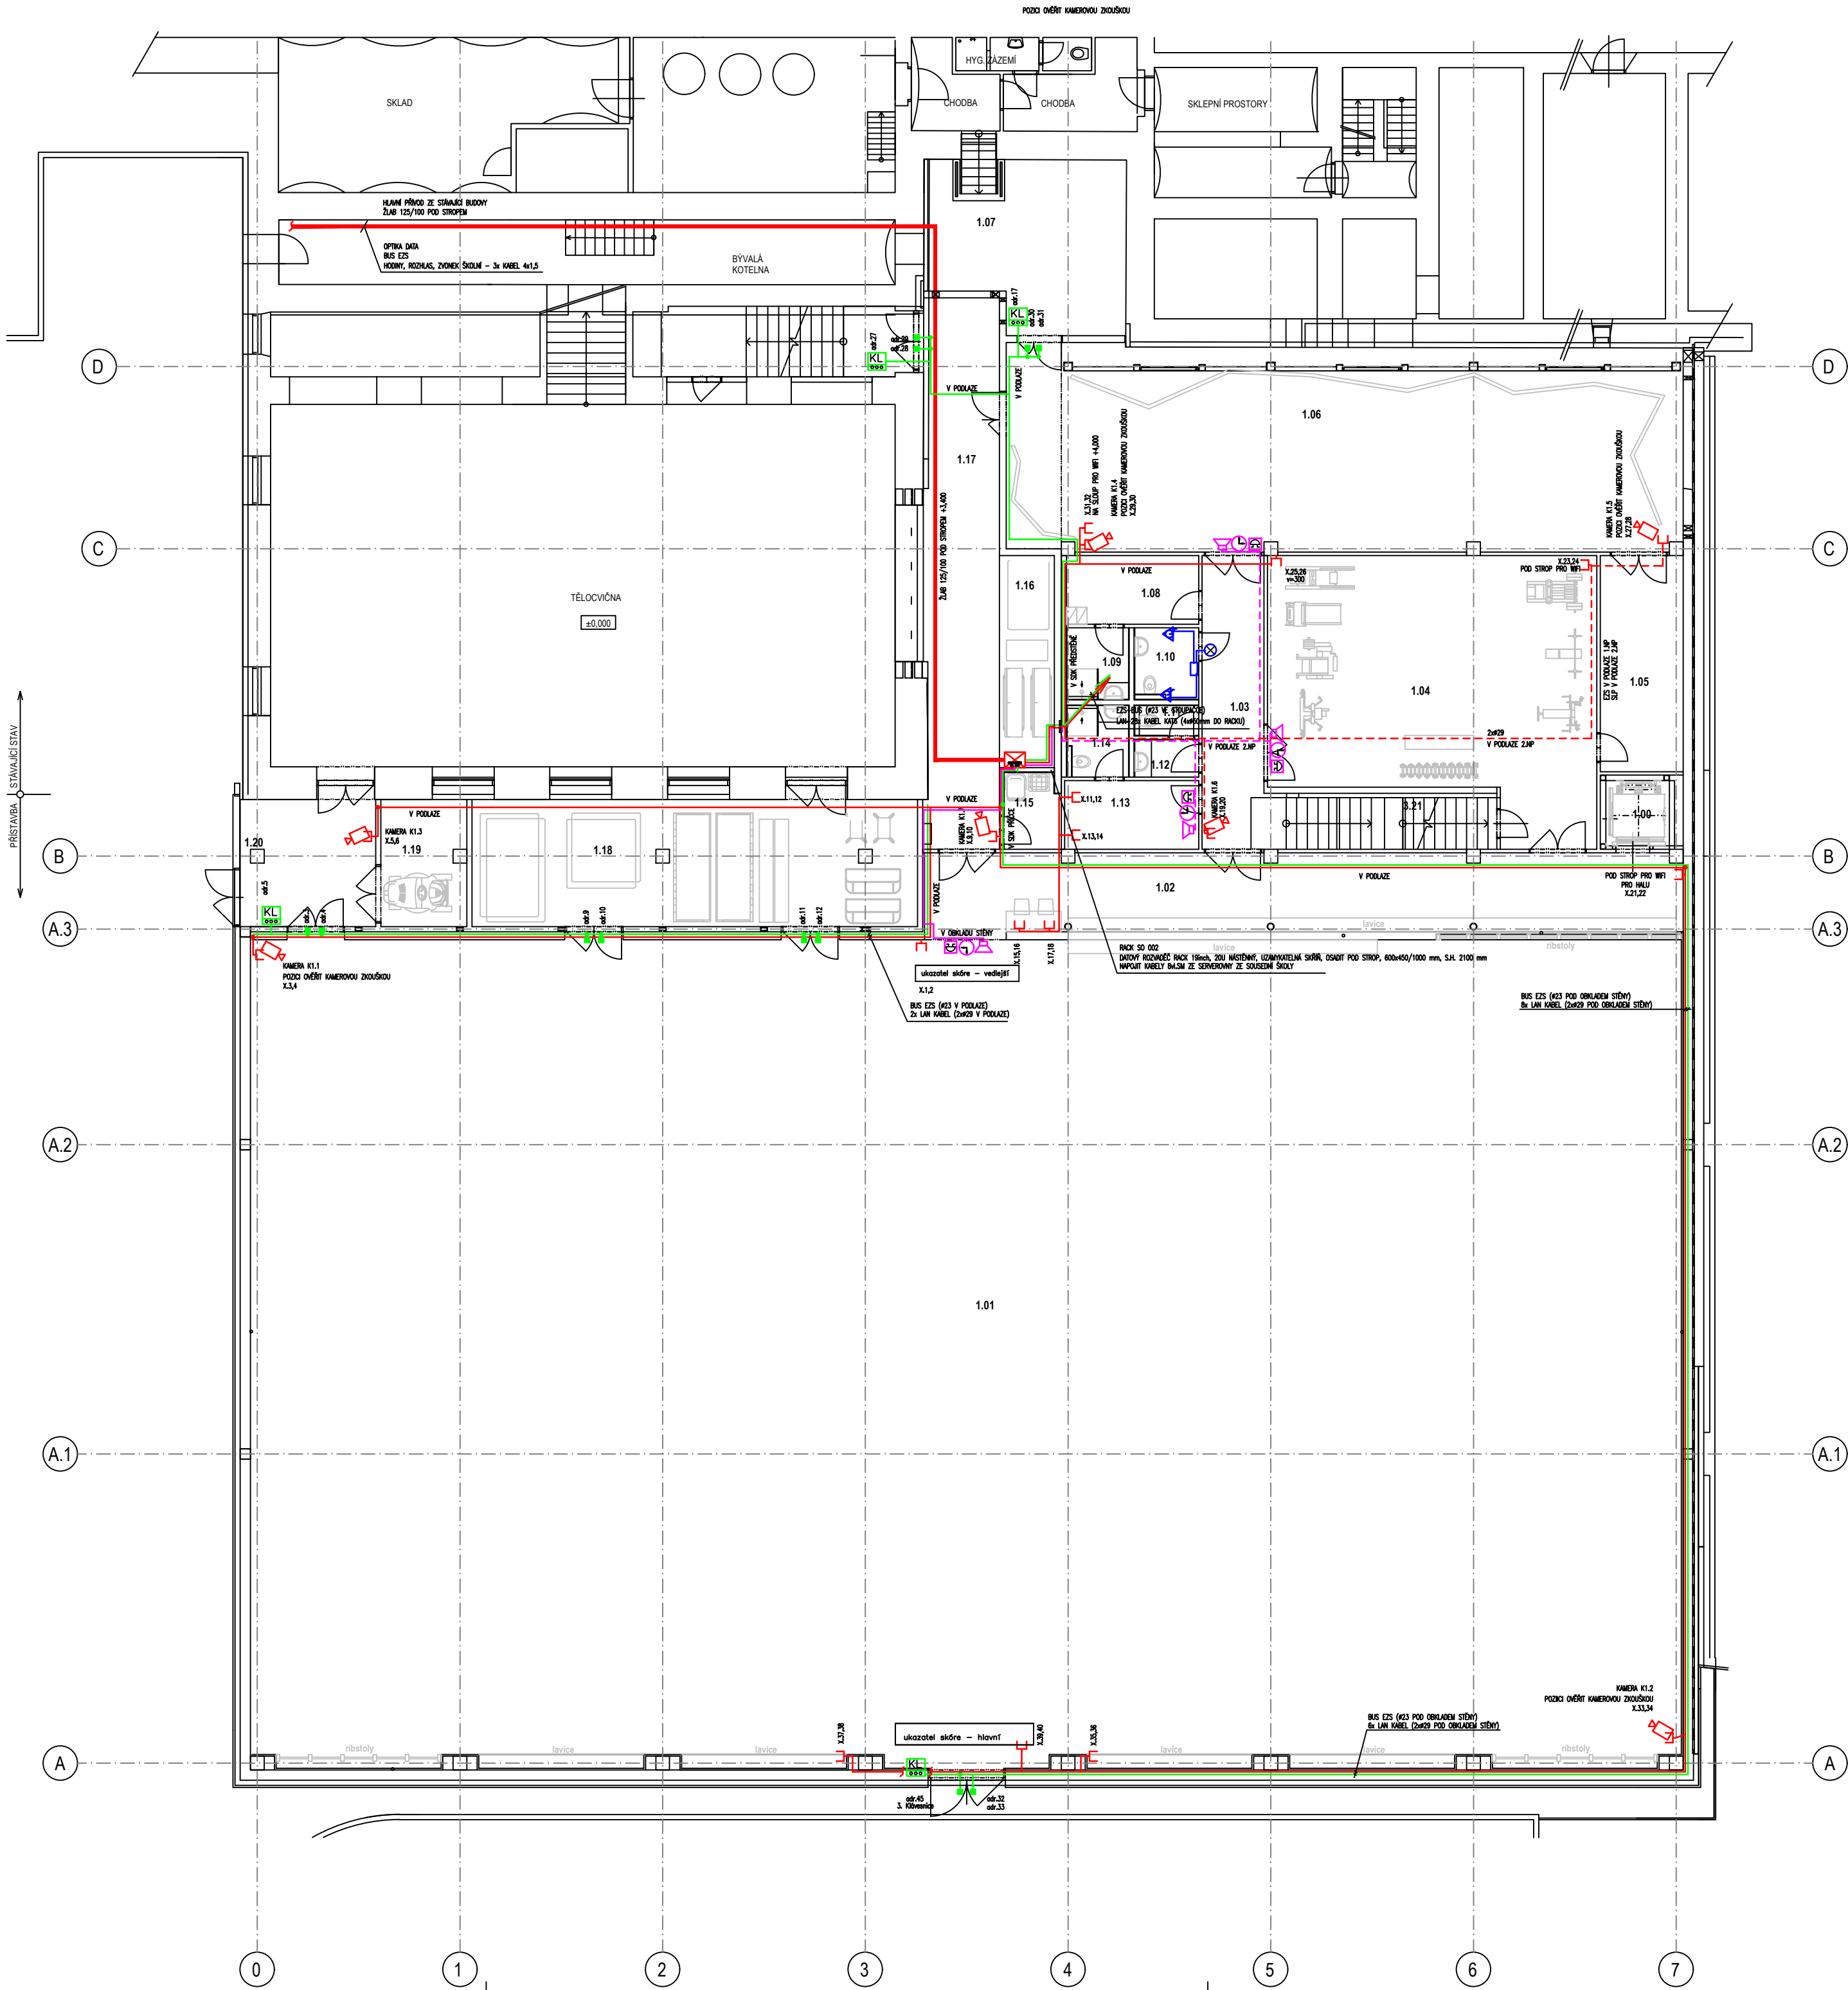


LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP						
Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	SVĚTLÁ V. [mm]	OZN. PODLAHY	POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODLAHA STŘEP STĚNY	POZNÁMKA
1.00	VÝTAH	5.21	9520			
1.01	TĚLOCVIČNA	1016.18	8000	P1.1	DŘEVOCEMENT. DESKY	PRUŽNÝ ROST
1.02	KOMUNIKAČNÍ KORIDOR	50.43	3910	P1.1	DŘEVO	POHLEDOVÝ BETON
1.03	CHODBA	15.39	2500	P1.2	LITÉ TERACO	POHLEDOVÝ BETON
1.04	POSILOVNA	69.72	2500	P1.3	LINOLEUM	POHLEDOVÝ BETON
1.05	SKLAD	15.16	2500	P1.2	LITÉ TERACO	POHLEDOVÝ BETON
1.06	HOROLEZECKÁ STĚNA, BOULDER	90.16	8000	P1.3	LINOLEUM	DŘEVOCEMENT. DESKY
1.07	KOTELNA III. KAT.	27.09	3900	P1.5*	SAMONIV. STĚRKA + NÁTER	POHLEDOVÝ BETON
1.08	ŠATNA	7.70	2500	P1.2	LITÉ TERACO	POHLEDOVÝ BETON
1.09	UMYVÁRNA	3.78	2500	P1.6*	KERAMICKÁ DLAŽBA	POHLEDOVÝ BETON
1.10	WC MUŽI - BEZBARIÉROVÉ	3.79	2500	P1.2	LITÉ TERACO	POHLEDOVÝ BETON
1.11	WC ŽENY	1.54	2500	P1.2	LITÉ TERACO	POHLEDOVÝ BETON
1.12	WC ŽENY - PŘEDSÍŇ	2.06	2500	P1.2	LITÉ TERACO	POHLEDOVÝ BETON
1.13	ŠATNA UČITELŮ	7.80	2500	P1.2	LITÉ TERACO	POHLEDOVÝ BETON
1.14	UMYVÁRNA S WC UČITELŮ	3.63	2500	P1.6*	KERAMICKÁ DLAŽBA	POHLEDOVÝ BETON
1.15	UKLADOVÁ KOMORA	3.63	3900	P1.2	LITÉ TERACO	POHLEDOVÝ BETON
1.16	NÁRAČOVNA (NIKA)	9.88	3900	P1.4	LITÉ TERACO	POHLEDOVÝ BETON
1.17	CHODBA	35.15	3560	P1.4	LITÉ TERACO	POHLEDOVÝ BETON
1.18	NÁRAČOVNA	47.67	3900	P1.4	LITÉ TERACO	POHLEDOVÝ BETON
1.19	SKLAD	9.09	3900	P1.4	LITÉ TERACO	POHLEDOVÝ BETON
1.20	ZÁDVEŘÍ	14.68	3900	P1.4	LITÉ TERACO	POHLEDOVÝ BETON
3.21	SKLAD	11.05	2500	P1.2	LITÉ TERACO	POHLEDOVÝ BETON

LEGENDA ZNAČEK

- DVOJZÁSUVKA DATA - 2xRJ45Sc86
- AKTIVNÍ PRVKY NEBUDOU SOUČÁSTÍ TĚTO STAVBY. BUDOU DODÁNY KOMPATIBILNÍ SE STÁVAJÍCÍMI
- ELEKTRICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE EZS
- MAGNETICKÝ KONTAKT PRO KŘÍDLO OKEN, DVEŘÍ
- ELEKTRICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE EZS
- POHYBOVÝ DETEKTOR
- ELEKTRICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE EZS
- KLÁVESNICE PRO OVLÁDÁNÍ SYSTÉMU
- CCTV KAMEROVÝ SYSTÉM
- IP KAMERA, PoI
- AKTIVNÍ PRVKY NEBUDOU SOUČÁSTÍ TĚTO STAVBY. BUDOU DODÁNY KOMPATIBILNÍ SE STÁVAJÍCÍMI
- PODLAHOVÁ KRABICE
- JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY SILNOPROUDU, SLP DODÁ POUZE ZÁSUVKY SLP
- SIGNALIZACE Z WC POSTIŽENÝCH
- Tlačítko nouzového volání
- SIGNALIZACE Z WC POSTIŽENÝCH
- SIGNALIZAČNÍ SVÍTIDLO VČETNĚ AKUSTIKY
- DVEŘNÍ KOMBINACE PRO RESET SYSTÉMU
- ŠKOLNÍ ZVONEK 75 V
- KABEL 2x1,5 V TRUBE V BETONU
- JEDNOTNÝ ČAS - HODINOVÉ IMPULSY
- KABEL 3x1,5 V TRUBE V BETONU
- ROZHLAS 100V, REPRODUKTOR EN54, ODOLNOST PROTI ODERU MČEM
- KABEL 4x1,5 V TRUBE V BETONU
- NENÍ POŽÁDOVÁN "NOUZOVÝ ZVUKOVÝ SYSTÉM" DO VŠECH PROSTOR TĚLOCVIČNY

M 1:100



±0,000 = 436,650 m n.m = úroveň podlahy stávající tělocvičny

1	26.11.2025	Redukce rozsahu EZS, poloha klávesnic	Ing. T. Gryc
Číslo	Datum	Popis	Vydal
revize	revize	revize	

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ, GENERÁLNÍ PROJEKTANT:
studenýarchitekti s.r.o.
Panská 33
611 03 Bratislava, SK
GSM: +421 905 918 863
E-mail: studeny@studenysk
www.studenysk

AUTOR:
Ing. Jan Studený, skad.arch.
Ing. arch. Marek Bábora

AUTORSKÁ SPOLUPRÁCE NA ARCH.ŘEŠENÍ:
Peter Štec Studio
Mag. arch. Peter Štec, A+D.

PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ SPOLEČNOST DESIGN AND ENGINEERING COMPANY				INTER PLAN		Purkyňova 78a, 612 00 Brno Česká Republika E-mail: info@interplan.cz tel.: +420 541 587 544 fax: +420 541 587 223	
ROLE / ROLE	JMENO / NAME	PODPIS / SIGNATURE	DATUM VYDÁNÍ VÝKRESU / DATE	FORMÁT / SIZE	A1		
VEDOUČÍ PROJEKTANT / APPROVED	Ing. Tomáš Gryc			MĚŘÍTKO / SCALE	1:100		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / CHECKED	Ing. Karel Alex			ZAKÁZKOVÉ Č. / CONTRACT NO.	2016725		
VYPRACOVÁVĚL / DRAWN	Ing. Karel Alex			STAVBYNÍ ÚŘAD / BUILDING OFFICE	MÚ Nava Pava		
INVESTOR / INVESTOR	Koblovětránský kraj, IČO 7088546			PROFES	S - SLABOPROUD A TELEKOMUNIKACE		
NÁZEV AKCE	Sportovní hala pro tělesnou výchovu NOVÁ PAKA			DISCIPLINE			
PROJECT NAME	S0002 - SPORTOVNÍ HALA			STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁZENÍ STAVBY		
SO / PS				DESIGN PHASE			
UNIT				SOURCE / FILE:	201672_5-6-S0002-00070.pdf		
NÁZEV VÝKRESU / DRAWING NAME	PŮDORYS 1.NP			POR. / NO	002	201672/5-6-S0002-S002/1	REVIZE
							1

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Sportovní hala pro tělesnou výchovu Nová Paka
Objekt: Proplach a čištění topení stáv budova

Objednatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: VALC, s.r.o.
Místo: Nová Paka

Zpracoval: Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.
Datum: 7. 11. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSVPráce a dodávky PSV175,558.72

900OSTATNÍ NÁKLADY175,558.72

19	R	A.907	Proplach otopných těles	ks	178.000	820.00	145,960.00	SOD
20	R	A.908	Proplach vodního systému vč. vyčištění filtrů po výplachu	bm	1,422.000	14.76	20,988.72	SOD
21	R	A.909	Napouštění, tlakování a odvzdušnění vodního systému	hod	30.000	287.00	8,610.00	SOD

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

"Sportovní hala pro tělesnou výchovu - Nová Paka"

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)		86 635 365,10 Kč bez DPH			
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?		NE			
Druh veřejné zakázky		stavební práce			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 0,00 Kč bez DPH		Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 0,00 Kč bez DPH		Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 0,00 Kč bez DPH		Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 17 159,69 Kč bez DPH		Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 3 655,75 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 1 997 893,27 Kč bez DPH		Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 1 232 492,30 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 2 097 869,49 Kč bez DPH		Dodatek č. 6	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 278 788,78 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 1 056 513,31 Kč bez DPH		Dodatek č. 7	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 817 876,36 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 554 316,70 Kč bez DPH		Dodatek č. 8	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 258 824,04 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 178 070,63 Kč bez DPH		Dodatek č. 9	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 44 810,13 Kč bez DPH			
				Dodatek č. 10	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)		+ 5 901 823,09 Kč bez DPH		POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)		– 2 636 447,36 Kč bez DPH			
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)		8 538 270,45 Kč bez DPH		Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a)	(Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)	8 538 270 Kč < 135 348 000 Kč			
b)	(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	9,86 % < 15,00 %			

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	86 635 365,10 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 1 937 419,27 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 10 588,32 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 315 319,69 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 354 241,14 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 1 210 379,66 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 35 753,61 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 195 987,05 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO

Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 6	ANO
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 7	ANO
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 8	ANO
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 9	ANO
Vícepráce (k odst. 5)	+ 182 297,38 Kč bez DPH		
Méněpráce (k odst. 5)	– 82 566,40 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 3 841 403,05 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 483 149,47 Kč bez DPH		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6			
Smluvní cena	86 635 365,10 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 40 166,38 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 2 283 189,25 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 540 332,44 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 1 530 407,70 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 189 741,87 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 95 000,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 7 626 467,87 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 4 283 226,63 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 219 713,05 Kč bez DPH	Dodatek č. 6	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 5 170,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 73 099,79 Kč bez DPH	Dodatek č. 7	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 577 940,23 Kč bez DPH	Dodatek č. 8	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 226 890,88 Kč bez DPH	Dodatek č. 9	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 12 767 617,02 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 4 923 729,07 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Smluvní cena		86 635 365,10 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 3 841 403,05 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 483 149,47 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 12 767 617,02 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 4 923 729,07 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		11 202 141,53 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	12,93 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	205 308,44 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	POSUDEK OK
Cena nových položek	205 308,44 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	205 308 Kč ≥ 205 308 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	291 605,80 Kč bez DPH	Dodatek č. 6	POSUDEK OK
Cena nových položek	291 605,80 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	291 606 Kč ≥ 291 606 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	66 082,50 Kč bez DPH	Dodatek č. 7	POSUDEK OK
Cena nových položek	66 082,50 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	66 083 Kč ≥ 66 083 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 8	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 9	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	9
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 587 258,89 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	– 127 376,53 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	459 882,36 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	86 635 365,10 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	88 602 362,43 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	90 345 219,24 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	91 836 705,49 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 4	93 119 577,35 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 5	97 424 206,61 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 6	99 457 830,37 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 7	99 769 567,11 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 8	100 643 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 9	101 102 882,36 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	101 102 882,36 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:

Ing. Jiří Strnad
