

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel	Královéhradecký kraj
se sídlem:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	70889546
DIČ	CZ 708 89 546
zástupce	Petr Koleta, hejtman kraje
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
číslo účtu	123-5588480297/0100

dále jen „objednatel“ a

Zhotovitel	STAVITELSTVÍ - TRUNEC s.r.o.
	společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 24274
se sídlem	Zimní 823, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto
IČO	27528545
DIČ	CZ27528545
zástupce	Ing. Petr Marhold, MBA, jednatel
bankovní spojení	Komerční banka a.s.
číslo účtu	43-954840297/0100

dále též jako „zhotovitel“ nebo „dodavatel“

dále jen „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 3. 2025 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky **„Zemědělská Akademie a Gymnázium Hořice - modernizace školního statku - stavební práce,“** uveřejněné ve věstníku veřejných zakázek pod číslem Z2024-050514, smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění pozdějších změn souhrnně jako „smlouva o dílo“ či „smlouva“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech (ZL) č. 1 - 6, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné vícepráce a méněpráce.
3. Změny závazku ze smlouvy dle změnových listů č. 3 a 5 nejsou podstatnými změnami závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona.
4. Změny závazku ze smlouvy dle změnových listů č. 1, 2, 4 a 6 nejsou podstatnými změnami závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona.
5. V návaznosti na změny dle ZL č. 1 dochází k přiměřenému prodloužení doby realizace díla, a to o 21 dnů, tj. 3 týdny.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že v souladu s čl. 16 odst. 6 smlouvy došlo z důvodu zpracování revize projektové dokumentace k přerušení realizace díla, a to v celkové délce 19 dní, přičemž po tuto dobu přerušení doby plnění neběžely.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla dle článku 4 a 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovými listy č. 1 a 2, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Ustanovení článku 6 odst. 2 smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:

Dokončení stavebních prací:	do 75 týdnů od předání a převzetí staveniště
Zkušební provoz	Zahájení a provádění zkušebního provozu ihned po dokončení stavebních prací, v délce 4 týdnů
Předání díla vč. veškeré dokumentace vzešlé mj. ze zkušebního provozu	do 4 týdnů ode dne ukončení zkušebního provozu
Předání řádně dokončeného díla (stavby) včetně předání kolaudačního souhlasu nebo pravomocného kolaudačního rozhodnutí či jiného opatření příslušného stavebního úřadu, na jehož základě bude možné trvale užívat dokončenou stavbu ve smyslu relevantních právních předpisů:	do 8 týdnů od dokončení stavebních prací

3. Cena díla dle článku 7 odst. 2 smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:

Celková cena dle původní smlouvy o dílo v Kč bez DPH	59.427.449,65
Vícepráce dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	3.337.920,19
Méněpráce dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	154.812,20
Celková cena dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	62.610.557,64


Závěrečná ustanovení

1. Otázky dodatkem výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Je-li uzavřen v listinné podobě, je tento dodatek vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě přečetly a že nebyl uzavřen v tísní nebo za jednostranně nevýhodných podmínek.

5. O uzavření dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/10/664/2025 ze dne 14. 4. 2025.

Za objednatele
V Hradci Králové

Za zhotovitele
Ve Vysokém Mýtě



Petr Koleta
hejtman Královéhradeckého kraje

Ing. Petr Marhold, MBA
jednatel

ZMĚNOVÝ LIST				ZL01	
Likvidace podlahy					
Stavba:		Zemědělská Akademie a Gymnázium Hořice - demolice ocelové haly			
Objekt:		SO 01 Vlastní objekt			
Předkládá:		STAVITELSTVÍ- TRUNEC s.r.o.		Datum:	26.06.2025
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny	X	listů	
e-mailem	X	2) Projektové podklady		listů, výkresů	
osobně		3) Fotodokumentace		listů	
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení: Dle projektové dokumentace je stávající podlaha mlátová.					
1.2 Popis nového řešení: Rozpor projektové dokumentace a skutečnosti. Bylo zjištěno, že podlaha je betonová, nikoliv mlátová. Vzhledem k tomu, že dle informací od uživatele objektu byla hala používána jako sklad hnojiv, bylo nutné odebrat vzorek podlahy a poslat do laboratoře na rozbor.					
2 Zdůvodnění změny:					
Vzhledem k tomu, že dle výsledků rozborů jsou ve vzorku obsaženy chloridy, sírany, C10-C40 ve větším množství než limitním, je nutné odvézt betonovou podlahu na skládku FCC Lodín, nelze beton použít na zpětný zásyp. Betonová podlaha byla odvezena na skládku (FCC Lodín). Výsledky rozborů jsou součástí tohoto změnového listu.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:			ANO (uvést jaký dokument)	X	NE
<zde uvést jaký dokument>					
4 Dopad do smluvních termínů:		X	ANO (posun 21 dní)		NE
21 dní					
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst.	6
		Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
6 Náklady:	Cena víceprací (přípočet):		+	745 098,16 Kč	bez DPH
		Výsledná ceny změny:		745 098,16 Kč	bez DPH
7 Schválil:					

REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTU ZL 01

Kód: 01_25_08
Stavba: Zemědělská Akademie a Gymnázium Hořice - modernizace školního statku



KSO:
Místo:

Zadavatel:
Královeská kraj

Zhotovitel:
STAVITELSTVI-TRUNEC s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
[Redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26.06.2025

IC:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			745 098,16
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 745 098,16	Výše daně 156 470,61
	12,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		901 568,77

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Kód: 01 25 08

Stavba: Zemědělská Akademie a Gymnázium Hořice - modernizace školního statku

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Místo:

Datum:

26.06.2025

Zadavatel: Královehradecká kraj

Projektant:

Zhotovitel: STAVITELSTVÍ-TRUNEC s.r.o.

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

745 098,16

901 568,77

ZL01

Likvidace betonové podlahy

745 098,16

901 568,77

KRYCÍ LIST ZMĚNUVEHU LIS 1U ĚLU1

Stavba: Zemědělská Akademie a Gymnázium Hořice - modernizace školního statku

Objekt: ZL01 - Likvidace betonové podlahy

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Královehradecká kraj

Zhotovitel:
STAVITELSTVI-TRUNEC s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26.06.2025

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:



Cena bez DPH			745 098,16
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	745 098,16	21,00%	156 470,61
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			901 568,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ ZMĚNOVÉHO LISTU ZL01

Stavba:

Zemědělská Akademie a Gymnázium Hořice - modernizace školního statku

Oblekt:

ZL01 - Likvidace betonové podlahy

Místo:

Zadavatel:

Královohradecká kraj

Zhotovitel:

STAVITELSTVI-TRUNEC s.r.o.

Datum:

26.06.2025

Projektant:

Zpracovatel:

Logo Vail firmy
zadajto
v nastaveních
programu

Kód dílu • Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

745 098,16

HSV - Práce a dodávky HSV

745 098,16

997 - Přesun sutě

745 098,16

ZMĚNOVÝ LIST ZL01

Stavba: Zemědělská Akademie a Gymnázium Hořice - modernizace školního statku
Objekt: ZL01 ■Likvidace betonové podlahy

Místo: Datum: 26.06.2025
Zadavatel: Královehradecká kraj Projektant:
Zhotovitel: STAVITELSTVI-TRUNEC s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 745 098,16

o HSV Práce a dodávky HSV 745 098,16

D 997 Přesun sutě 745 098,16

1	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	291,820	71,60	20 894,31	CENA DLE SOD
			16,68+17,32+16,72+16,50+15,96+18,30		101,480			
			16,62+15,98+17,14+15,40+15,16+17,98		98,280			
			16,46+13,70+15,48+15,92+12,40+18,10		92,060			
			Součet		291,820			

2	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4 960,940	12,59	62 458,23	CENA DLE SOD
			291,82*17		4 960,940			

9	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddálených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	291,820	2 081,20	607 335,78	CENA DLE URS 2025/01 x0,86 (KOEFCIENT DLE SOD)
			16,68+17,32+16,72+16,50+15,96+18,30		101,480			
			16,62+15,98+17,14+15,40+15,16+17,98		98,280			
			16,46+13,70+15,48+15,92+12,40+18,10		92,060			
			Součet		291,820			

7	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	291,820	186,45	54 409,84	CENA DLE SOD
			16,68+17,32+16,72+16,50+15,96+18,30		101,480			
			16,62+15,98+17,14+15,40+15,16+17,98		98,280			
			16,46+13,70+15,48+15,92+12,40+18,10		92,060			
			Součet		291,820			

**ORLICKÁ LABORATOŘ, s.r.o.**

ORLICKÁ LABORATOŘ - zkušební laboratoř č.1277 akreditovaná ČIA

Podle ČSN ENISO/IEC 17025:2018

Lhotka 219, 560 02 Česká Třebová, tel. [redacted] e-mail [redacted]



www.orlab.cz

strana/celkem stran: 1 / 2

Plán/protokol o odběru vzorku č. 4541/2025

Zadavatel: <i>kontakt</i>	Smart Roads s.r.o., Miličova 314, Vysoké Mýto, 56601
Název akce	-

INFORMACE O VZORKU

Materiál	odpad určený k zasypávání na povrchu
Místo odběru/označení vzorku	Hořice, podlaha
Předpokl. nebezpečné vlastnosti	Nejsou

ÚDAJE O ODBĚRU VZORKU

Datum a čas odběru	9.5.25 8:15 -9:00
Vzorkoval	[redacted] / Orlická laboratoř s.r.o.
Metoda vzorkování	VZ 07-Odběry vzorků odpadů a pevných látek (Akr.) ☒ 1 pravděpodobnostní ☐ tendenční
Vzorkovací zařízení	Ručně
Vzorkovnice	Plastový pytel (2)
Popis místa odběru	Demolice objektu v areálu školního statku
Popis odběru / počet dílčích vzorků	30
Hmotnost směs, vzorku (kg)	3
Smyslové posouzení	vybourány beton z podlahy
Úprava vzorku v terénu	ne
Klimatické podmínky	jasno, 16°C
Chlazení během dopravy	Ne
Poznámka:	-

DALŠÍ ÚDAJE

Identifikace laboratoře	Orlická laboratoř s.r.o., Lhotka 219, Česká Třebová
Číslo protokolu o zkoušce	4541/2025,4542/2025
Požadované vyšetření	odpad k zasypávání (tab. 5.1 a 5.3, sl. II vyhl. 273/2021 Sb.)


Podpis vzorkaře:

Při odběru přítomen:

V laboratoři přijal, datum a čas:
9.5.2025 13:00

Fotodokumentace

Mapa s místem odběru vzorku

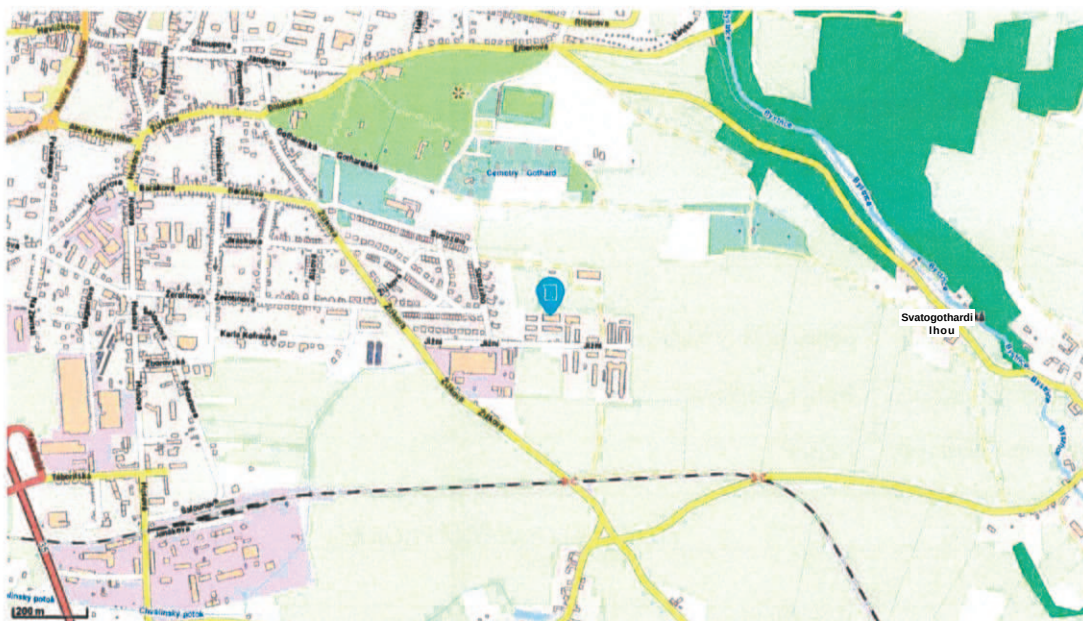

Konec protokolu



ORLICKÁ LABORATOŘ, s.r.o.

ORLICKÁ LABORATOŘ - zkušební laboratoř č.1277 akreditovaná ČIA
podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018
Lhotka 219, 560 02 Česká Třebová, tel. [redacted] e-mail [redacted]



www.orlab.cz

strana / celkem stran: 1 / 2

Protokol o zkoušce č. 4541/2025

Zadavatel: Smart Roads s.r.o., Miličova 314, Vysoké Mýto, 56601
Smlouva: Smlouva dílo č. 12/2025 ze dne 7.5.2025
Objednávka: email ze dne 2.5.2025
Materiál: odpad určený k zasypávání na povrchu
Místo odběru: Hoříce, podlaha
Rozsah vyšetření: dle vyhl. 273/2021 Sb., př. 5, tab. 5.1 a 5.3, sl. II
Vzorkoval: [redacted]
Metoda odběru: VZ 07-Odběry vzorků odpadů a pevných látek (Akr.)
Množství vzorku (kg): 3
Datum zahájení odběru: 9.5.2025 8:15 **Ukončení odběru:** 9.5.2025 9:00
Datum příjmu: 9.5.2025 13:00
Datum analýz: 9.5.2025 - 29.5.2025
Kontaktní osoba: Filip Sajdl

Výsledky

Parametr	Jednotka	Akr.	NM	Metoda	Výsledek	Limit
arsen	mg/kg suš.	A	25%	ZP 102b	7,8	30
kadmium	mg/kg suš.	A	25%	ZP 102b	0,924	2,5
chrom celkový	mg/kg suš.	A	25%	ZP 102b	33,3	200
rtuť	mg/kg suš.	A	11%	ZP 072	0,067	1
nikl	mg/kg suš.	A	25%	ZP 102b	9,2	80
olovo	mg/kg suš.	A	25%	ZP 102b	11,4	200
vanad	mg/kg suš.	A	25%	ZP 102b	27,1	180
měď	mg/kg suš.	A	25%	ZP 102b	25,5	170
zinek	mg/kg suš.	A	25%	ZP 102b	97,9	600
baryum	mg/kg suš.	A	25%	ZP 102b	120	600
beryllium	mg/kg suš.	A	25%	ZP 102b	0,43	5
C10-C40	mg/kg suš.	A	32%	ZP 074b	1530	300
benzen	mg/kg suš.	A		ZP 073b	<0,02	0,7
antracen	mg/kg suš.	A		ZP 075b	<0,025	-
benzo(a)antracen	mg/kg suš.	A	25%	ZP 075b	0,029	-
benzo(b)fluoranthén	mg/kg suš.	A	25%	ZP 075b	0,050	-
benzo(k)fluoranthén	mg/kg suš.	A		ZP 075b	<0,025	-
benzo(a)pyren	mg/kg suš.	A		ZP 075b	<0,025	-
benzo(g,h,i)perylene	mg/kg suš.	A	25%	ZP 075b	0,031	-
fenantren	mg/kg suš.	A		ZP 075b	<0,375	-
fluoranthén	mg/kg suš.	A	25%	ZP 075b	0,145	-
chrysen	mg/kg suš.	A	25%	ZP 075b	0,033	-
indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg suš.	A	25%	ZP 075b	0,029	-
naflalen	mg/kg suš.	A		ZP 075b	<1,25	-
pyren	mg/kg suš.	A	25%	ZP 075b	0,081	-
PAU (suma 12)	mg/kg suš.	A		ZP 075b dn	0,398	6
PCB 28	mg/kg suš.	EA		CZSOPD06 03 161	<0,00300	-
PCB 52	mg/kg suš.	EA		CZSOPD06 03 161	<0,00300	-
PCB 101	mg/kg suš.	EA		CZSOPD06 03 161	<0,00300	-
PCB 118	mg/kg suš.	EA		CZSOPD06 03 161	<0,00300	-
PCB 180	mg/kg suš.	EA		CZ SOP D06 03 161	<0,00300	-
PCB 7 suma	mg/kg suš.	EA		CZ SOPD06 03 161	<0,02100	0,2
PCB 138	mg/kg suš.	EA		CZSOPD06 03 161	<0,00300	-
PCB 153	mg/kg suš.	EA		CZSOP D06 03 161	<0,00300	-
EOX	mg/kg suš.	A	25%	ZP 077	0,82	2

Parametr	Jednotka	Akr.	NM	Metoda	Výsledek	Limit
sušina celková	% hm.	A	6%	ZP 061	93,1	-

Ekotoxikologické testy (Vyhl. 273/2021 Sb., př. 5, tab. 5.3, sl. II)

Parametr	Jednotka	Akr.	Metoda	Výsledek	Limit
Daphnia magna	%	EA	SOP OV 801	100,0	max.30
Scenedesmus (Desmodesmus) subspic	%	EA	SOP OV 802	9,9	max.30
Vibrio fischeri - inhibice 15 min	%	EA	SOP OV 805	25,0	max.25
Vibrio fischeri - inhibice 30 min	%	EA	SOP OV 805	16,0	max.25

Uvedená nejistota měření je rozšířená nejistota měření odpovídající 95% intervalu spolehlivosti s koeficientem rozšíření $k = 2$. U výsledků chemických zkoušek pod mezí stanovitelnosti se nejistota měření neuvádí. U mikrobiologických zkoušek, kde je výsledek < 10 KTJ nebo je výsledek vyjádřen jako více než ($>$), se nejistota měření neuvádí. Vysvětlení zkratk: NM-nejistota měření, NM nezahrnuje příspěvek vyplývající z odběru vzorku, MH-mezní hodnota, NMH-nejvyšší mezní hodnota, DH-doplněná hodnota, SH-směrná hodnota, KTJ-kolonie tvořící jednotku.. Akr-akreditace: A-zkouška v rozsahu akreditace, N-zkouška mimo rozsah akreditace, E-zkouška zajištěna externím dodavatelem, Parametr označený písmenem t/dp (u metody) prováděno v místě odběru vzorku/stanoven dpočtem. Plný název použité metody, včetně zdrojů, je k dispozici v příloze osvědčení o akreditaci (www.orlab.cz, www.cai.cz). Analýzy, s výjimkou externích služeb, byly provedeny na adrese laboratoře. Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených předmětů; bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se protokol nesmí reprodukovat jinak než celý. Výsledky rozboru vzorku se vztahují ke vzorku, jak byl přijat. Laboratoř neodpovídá za výsledky, které by mohly být ovlivněny nesprávně poskytnutými informacemi zadavatelem.

Výrok o shodě;

Vzorek ve stanovených parametrech **NEVYHOVUJE** požadavkům předpisu:
Vyhláška 273/2021 Sb., příloha 5, tab. 5.1., sl. II

Nejistota měření nebyla při hodnocení zohledněna.

Vzorek nevyhověl v těchto parametrech:
C10-C40, Daphnia magna

V České Třebové dne: 29.5.2025



Schválil:



ORLICKÁ LABORATOŘ, s.r.o.

ORLICKÁ LABORATOŘ - zkušební laboratoř č.1277 akreditovaná ČTA
podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018
Lhotka 219, 560 02 Česká Třebová, tel. [REDACTED] e-mail [REDACTED]



www.orlab.cz

strana / celkem stran: 1 / 2

Protokol o zkoušce č. 4542/2025

Zadavatel: Smart Roads s.r.o., Miličova 314, Vysoké Mýto, 56601
Smlouva: Smlouva dílo č. 12/2025 ze dne 7.5.2025
Objednávka: email ze dne 2.5.2025
Materiál: odpad určený k zasypávání (vodný výluh)
Místo odběru: Hořice, podlaha
Vzorkoval: [REDACTED]
Metoda odběru: VZ 07-Odběry vzorků odpadů a pevných látek (Akr.)
Datum odběru: 9.5.2025
Datum příjmu: 9.5.2025 13:00
Datum analýz: 9.5.2025 - 21.5.2025
Kontaktní osoba: Filip Sajdl

Výsledky

Parametr	Jednotka	Akr.	NM	Metoda	Výsledek	Limit
DOC (rozpuštěný organický uhlík)	mg/l	A	15%	ZP 094	48,7	50
fenoly	mg/l	A		ZP052	<0,005	0,1
chloridy	mg/l	A	10%	ZP 100	1130	80
fluoridy	mg/l	A		ZP 100	<0,10	1
síraný	mg/l	A	5%	ZP 100	369	100
arsen	mg/l	A	15%	ZP 102a	0,001	0,05
baryum	mg/l	A	15%	ZP 102a	0,15	2
kadmium	mg/l	A		ZP 102a	<0,0005	0,004
chrom celkový	mg/l	A	15%	ZP 102a	0,031	0,05
měď	mg/l	A	15%	ZP 102a	0,01	0,2
rtuť	mg/l	A		ZP 072	<0,0003	0,001
nikl	mg/l	A	15%	ZP 102a	0,001	0,04
olovo	mg/l	A		ZP 102a	<0,001	0,05
antimon	mg/l	A		ZP 102a	<0,0008	0,006
selen	mg/l	A		ZP 102a	<0,001	0,01
zinek	mg/l	A		ZP 102a	<0,005	0,4
molybden	mg/l	A		ZP 102a	<0,005	0,05
rozpuštěné látky	mg/l	A	15%	ZP 030	3770	400
sušina celková	% hm.	A	6%	ZP061	93,1	-

Uvedená nejistota měření je rozšířená nejistota měření odpovídající 95% intervalu spolehlivosti s koeficientem rozšíření $k = 2$. U výsledku chemických zkoušek pod mezí stanovitelnosti se nejistota měření neuvádí. U mikrobiologických zkoušek, kde je výsledek < 10 KTJ nebo je výsledek vyjádřen jako více než ($>$), se nejistota měření neuvádí. Vysvětlení zkratk: NM-nejistota měření, NM nezahrnuje příspěvek vyplývající z odběru vzorku, MH-mezní hodnota, NMH-nejvyšší mezní hodnota, DH-doporučená hodnota, SH-směšná hodnota, KTJ-kolonie tvořící jednotku.. Akr-akreditace: A-zkouška v rozsahu akreditace, N-zkouška mimo rozsah akreditace, E-zkouška zajištěna externím dodavatelem), Parametr označený písmenem t/dp (u metody>provedeno v místě odběru vzorku/stanoven dopočtem. Plný název použité metody, včetně zdrojů, je k dispozici v příloze osvědčení o akreditaci (www.orlab.cz, www.cai.cz). Analýzy, s výjimkou externích služeb, byly provedeny na adrese laboratoře. Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených předmětů; bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se protokol nesmí reprodukovat jinak než celý. Výsledky rozboru vzorku se vztahují ke vzorku, jak byl přijat. Laboratoř neodpovídá za výsledky, které by mohly být ovlivněny nesprávně poskytnutými informacemi zadavatelem.

Výrok o shodě:

Vzorek ve stanovených parametrech **NEVYHOVUJE** požadavkům předpisu:
Vyhláška 273/2021 Sb., příloha 5, tab. 5.2

Nejistota měření nebyla při hodnocení zohledněna.

Vzorek nevyhověl v těchto parametrech:

rozpuštěné látky, chloridy, sírany

V České Třebové dne: 29.5.2025



Schválil:



ZMĚNOVÝ LIST				ZL02	
Přeložka NN a VO					
Stavba:		Zemědělská Akademie a Gymnázium Hořice - demolice ocelové haly			
Objekt:		SO 01 Vlastní objekt			
Předkládá:		STAVITELSTVÍ - TRUNEC s.r.o.		Datum:	26.06.2025
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny	X	listů	
e-mailem	X	2) Projektové podklady		listů, výkresů	
osobně		3) Fotodokumentace		listů	
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení:					
lí projektové dokumentaci nebyla zakreslena žádná trasa NN a VO tudíž nebyla řešena přeložka. Nebylo uvedeno kudy kabel NN a VO skutečně jde. Dle vyjádření ČEZ distribuce se v zájmovém území nenacházejí žádné podzemní sítě.					
1.2 Popis nového řešení:					
Při realizaci demolice haly bylo zjištěno, že jde v těsné blízkosti haly a v místě nové haly. Nově bude kabel NN a VO přeložen, aby byl vymístěn mimo plochu nové haly.					
2 Zdůvodnění změny:					
Vzhledem k tomu, že kabel NN a VO jde v místě nově navržené haly, musejí být tyto kabely přeloženy mimo plochu nové haly.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:			X	ANO (uvést jaký dokument)	NE
Situační výkres a řez umístění přeložky NN a VO kabelů.					
4 Dopad do smluvních termínů:				ANO	X NE
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek					odst. 0
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):		-	0,00 Kč bez DPH	
	Cena víceprací (přípočet):		+	261 591,24 Kč bez DPH	
	Výsledná ceny změny:			261 591,24 Kč bez DPH	
7 Schválil:					

REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTU ZL 02

Kód: 01_25_08
Stavba: Zemědělská Akademie a Gymnázium Hořice - modernizace školního statku

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Královehradecká kraj

Zhotovitel:
STAVITELSTVI-TRUNEC s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26.06.2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			261 591,24
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 261 591,24	Výše daně 54 934,16
	12,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		316 525,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Kód:01 25 08

Stavba:Zemědělská Akademie a Gymnázium Hořice - modernizace školního statku

Místo:

Datum:26.06.2025

Zadavatel:Královehradecká kraj

Projektant:

Zhotovitel:STAVITELSTVI-TRUNEC s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		261 591,24	316 525,40
ZL2	Přeložka VO a NN	261 591,24	316 525,40

KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU ZL02

Stavba:
Zemědělská Akademie a Gymnázium Hořice - modernizace Školního statku
Objekt:
ZL02 - Přeložka VO a NN

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Královohradecká kraj

Zhotovitel:
STAVITELSTVI-TRUNEC s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26.06.2025

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

Cena bez DPH			261 591,24
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	261 591,24	21,00%	54 934,16
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			316 525,40
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ ZMĚNOVÉHO LISTU ZL02

Stavba: Zemědělská Akademie a Gymnázium Hořice - modernizace školního statku

Objekt: ZL02 - Přeložka VO a NN

Místo:
Zadavatel: Královéhradecká kraj
Zhotovitel: STAVITELSTVI-TRUNEC s.r.o.

Datum: 26.06.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu práci	261 591,24
HSV - Práce a dodávky HSV	5 041,75
1 - Zemní práce	3 225,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 374,92
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	441,83
M - Práce a dodávky M	142 183,53
21-M - Elektromontáže	142 183,53

ZMĚNOVÝ LIST ZL02

Stavba:

Zemědělská Akademie a Gymnázium Hořice - modernizace Školního statku

Objekt:

ZL02 . Přeložka VO a NN

Místo:

Datum: 26.06.2025

Zadavatel:

Královehradecká kraj

Projektant:

Zhotovitel:


STAVITELSTVI-TRUNEC s.r.o.


Zpracovatel:

pč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem (CZK)
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 261 591,24

1	K	1	Výchozí revize NN	ks	1,000	6 206,40	6 206,40	CENA DLE SOD
3	K	13	Likvidace a odvoz odpadu, úklid pracoviště	ks	1,000	7 562,00	7 562,00	VLASTNÍ (CENA DLE SOD UPRAVENA POMĚROVĚ NA MNOŽSTVÍ)
11	K	2	Geodetické zaměření sítě, projekt skutečných stavů, 6x paré + 1x CD	ks	1,000	12 587,00	12 587,00	VLASTNÍ (CENA DLE SOD UPRAVENA POMĚROVĚ NA MNOŽSTVÍ)
8	K	210100002RQO	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	1,000	27,60	27,60	CENA DLE SOD
9	K	210100009R0Q	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 120 mm2	kus	1,000	97,98	97,98	CENA DLE SOD
10	K	210100012RQO	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 240 mm2	kus	2,000	146,28	292,56	CENA DLE SOD
7	K	210950101RT1	Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku 6035-2k	kus	4,000	65,21	260,84	CENA DLE SOD
2	K	3	Mimostaveništní doprava, přesun hmot	ks	1,000	2 312,00	2 312,00	VLASTNÍ (CENA DLE SOD UPRAVENA POMĚROVĚ NA MNOŽSTVÍ)
12	K	460010022RT3	Vytýčení kabelové trasy podél silnice, délka trasy do 1000 m	km	0,500	1 230,00	615,00	CENA DLE SOD
13	K	460200683RT2	Výkop kabelové rýhy 65/120 cm hor.3, ruční výkop rvhv	m	104,000	523,00	54 392,00	CENA DLE SOD
w								
15	K	460420022RT3	Přízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, 104	m	104,000	112,00	11 648,00	CENA DLE SOD
w								
16	K	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC. šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	m	104,000	17,42	1 811,68	CENA DLE SOD
w								
18	K	[460570533R00	Zához rýhy 65/120 cm, hornina tř. 3, se zhutněním	m	104,000	134,00	13 936,00	CENA DLE SOD
w								
19	K	[460600001RT8	uložení 8 o dv 2 Zeminy , o dv 02 na vzdálenost 1 104	m3	21,450	122,00	2 616,90	CENA DLE SOD
w								
o								
HSV							5 041,75	
D 1							3 225,00	
Zemní práce								
41	K	113107031	Odstranění podkladu z betonu prostého II přes 100 do 1150 mm pB překopechručně 6*0.5	m2	3,000	1 075,00	3 225,00	CENA DLE URS x 0,86 (KOEFCIENT DLE SOD)
w								
D 3							1 374,92	
Svislé a kompletní konstrukce								
31	K	[310219811	Zazdívka otvorů ve zdělnadzákladovém kamenem pO přes 11.20 do 4 m2 1.5*1.5*0.15	m3	0.338	4067.80	1 374,92	CENA OLE URS x 0.84 (KOEFCIENTOLE 800)
w								
D 9							441,83	
Ostatní konstrukce a práce, bourání								
29	K	[962032111	Bourá izdlva z keramických děrovaných cihel na MVC 1.5*1.5*0.15	m3	0.338	1 307.20	441,83	CENA OLE URS » 0,30 (KOEFCIENT OLE SOO)
w								
D M							142 183,53	
Práce a dodávky M								
D 21-M							142 183,53	
Elektromontáže								
35	K	210101207	Propojení kabelů ceíoplastových spojkou do 1 kV venkovní páskovou SVp 1 až 5 žily do 1x240 a 3x120 mm2	kus	2,000	4 343,00	8 686,00	CENA DLE URS x 0,86 (KOEFCIENT DLE SOD)
40	M	35436032	spojka kabelová smršťovaná přímá do 1kV 91ahsc-185 3-42x120-185mm	kus	2,000	2 924,00	5 848,00	CENA DLE URS x 0,86 (KOEFCIENT DLE SOD)
34	K	210101205	Propojení kabelu ceíoplastových spojkou do 1 kV venkovní páskovou SVp 1 až 5 žily do 3x10 a 4x10 mm2	kus	1,000	2 743,40	2 743,40	CENA DLE URS x 0,86 (KOEFCIENT DLE SOD)
38	M	35436021	spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-21s 4x6-25mm	kus	1,000	414,52	414,52	CENA DLE URS x 0,86 (KOEFCIENT DLE SOD)
36	K	210101229	Propojení kabelů ceíoplastových spojkou do 1 kV venkovní páskovou SPE 1 až 5 žily do 4x16 až 50 mm2	kus	1,000	2 055,40	2 055,40	CENA DLE URS x 0,86 (KOEFCIENT DLE SOD)
39	M	35436023	spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-22s to1M0mm	kus	1,000	423,98	423,98	CENA DLE URS x 0,86 (KOEFCIENT DLE SOD)
27	K	210812033	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žily 4x6 až 10 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	104,000	28,72	2 986,88	CENA DLE URS x 0,86 (KOEFCIENT DLE SOD)
w								
28	M	34111076	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2	m	119,600	113,52	13 576,99	CENA DLE URS x 0,86 (KOEFCIENT DLE SOD)
w								
32	K	210902011	Montáž kabelu Al do 1 kV plného nebo laněného kulatého žily 4x16 mm2 (např. AYKY) bez ukončení uloženého volně	m	104,000	24,17	2 513,68	CENA DLE URS x 0,86 (KOEFCIENT DLE SOD)
33	M	34112316	kabel instalační jádro Al plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (AYKY) 4x16mm2	m	119,600	60,11	7 189,16	CENA DLE URS x 0,86 (KOEFCIENT DLE SOD)
w								
24	K	210902107	Montáž kabelu Al do 1 kV plného nebo laněného kulatého žily 3x150 mm2 (např. AYKY) bez ukončení uloženého pevně	m	208,000	89,44	18 603,52	CENA DLE URS x 0,86 (KOEFCIENT DLE SOD)
w								
26	M	34113229	kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC » G/1kV H* [AYKY] 3x150*70mm2	m	239,200	322,50	77 142,00	CENA DLE URS x 0,86 (KOEFCIENT DLE SOD)
w								

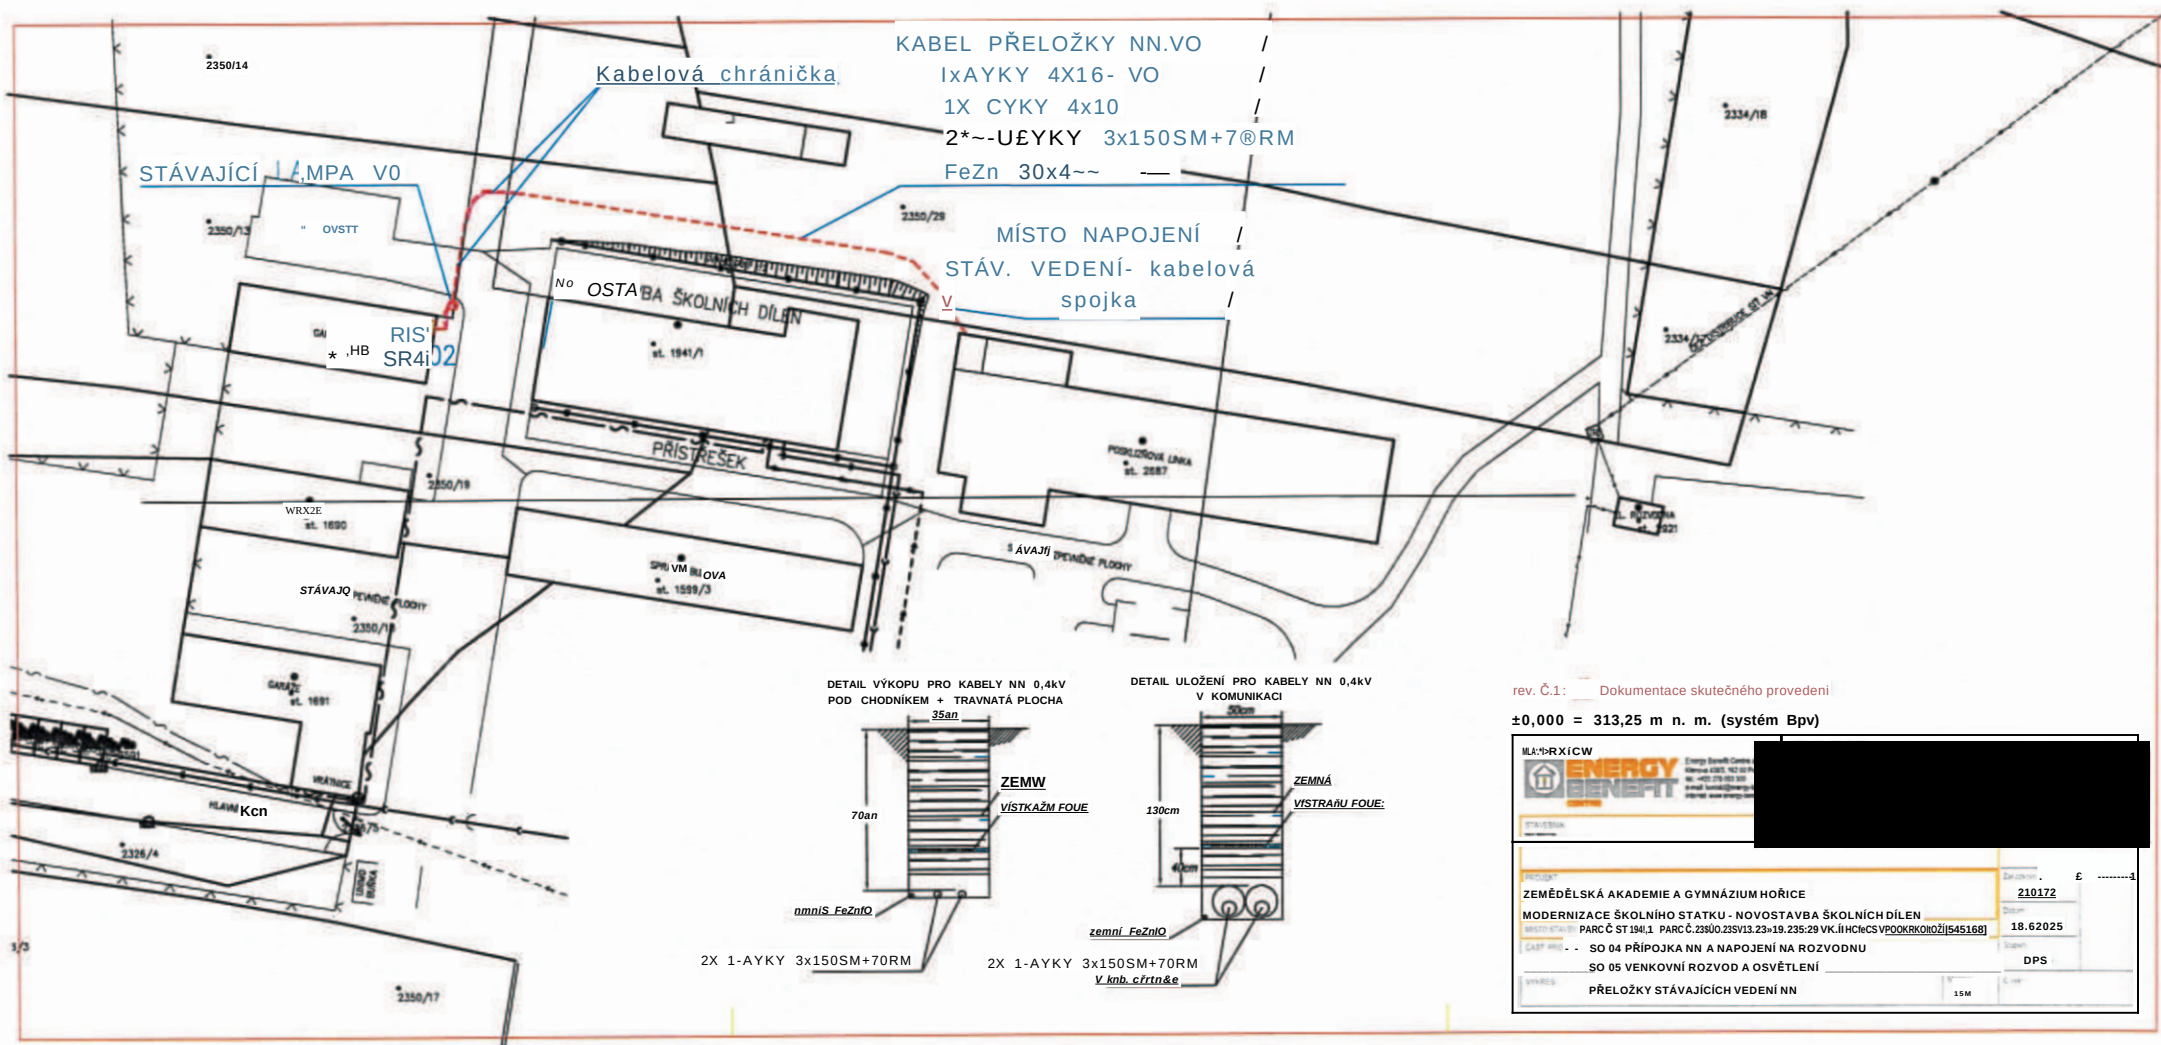

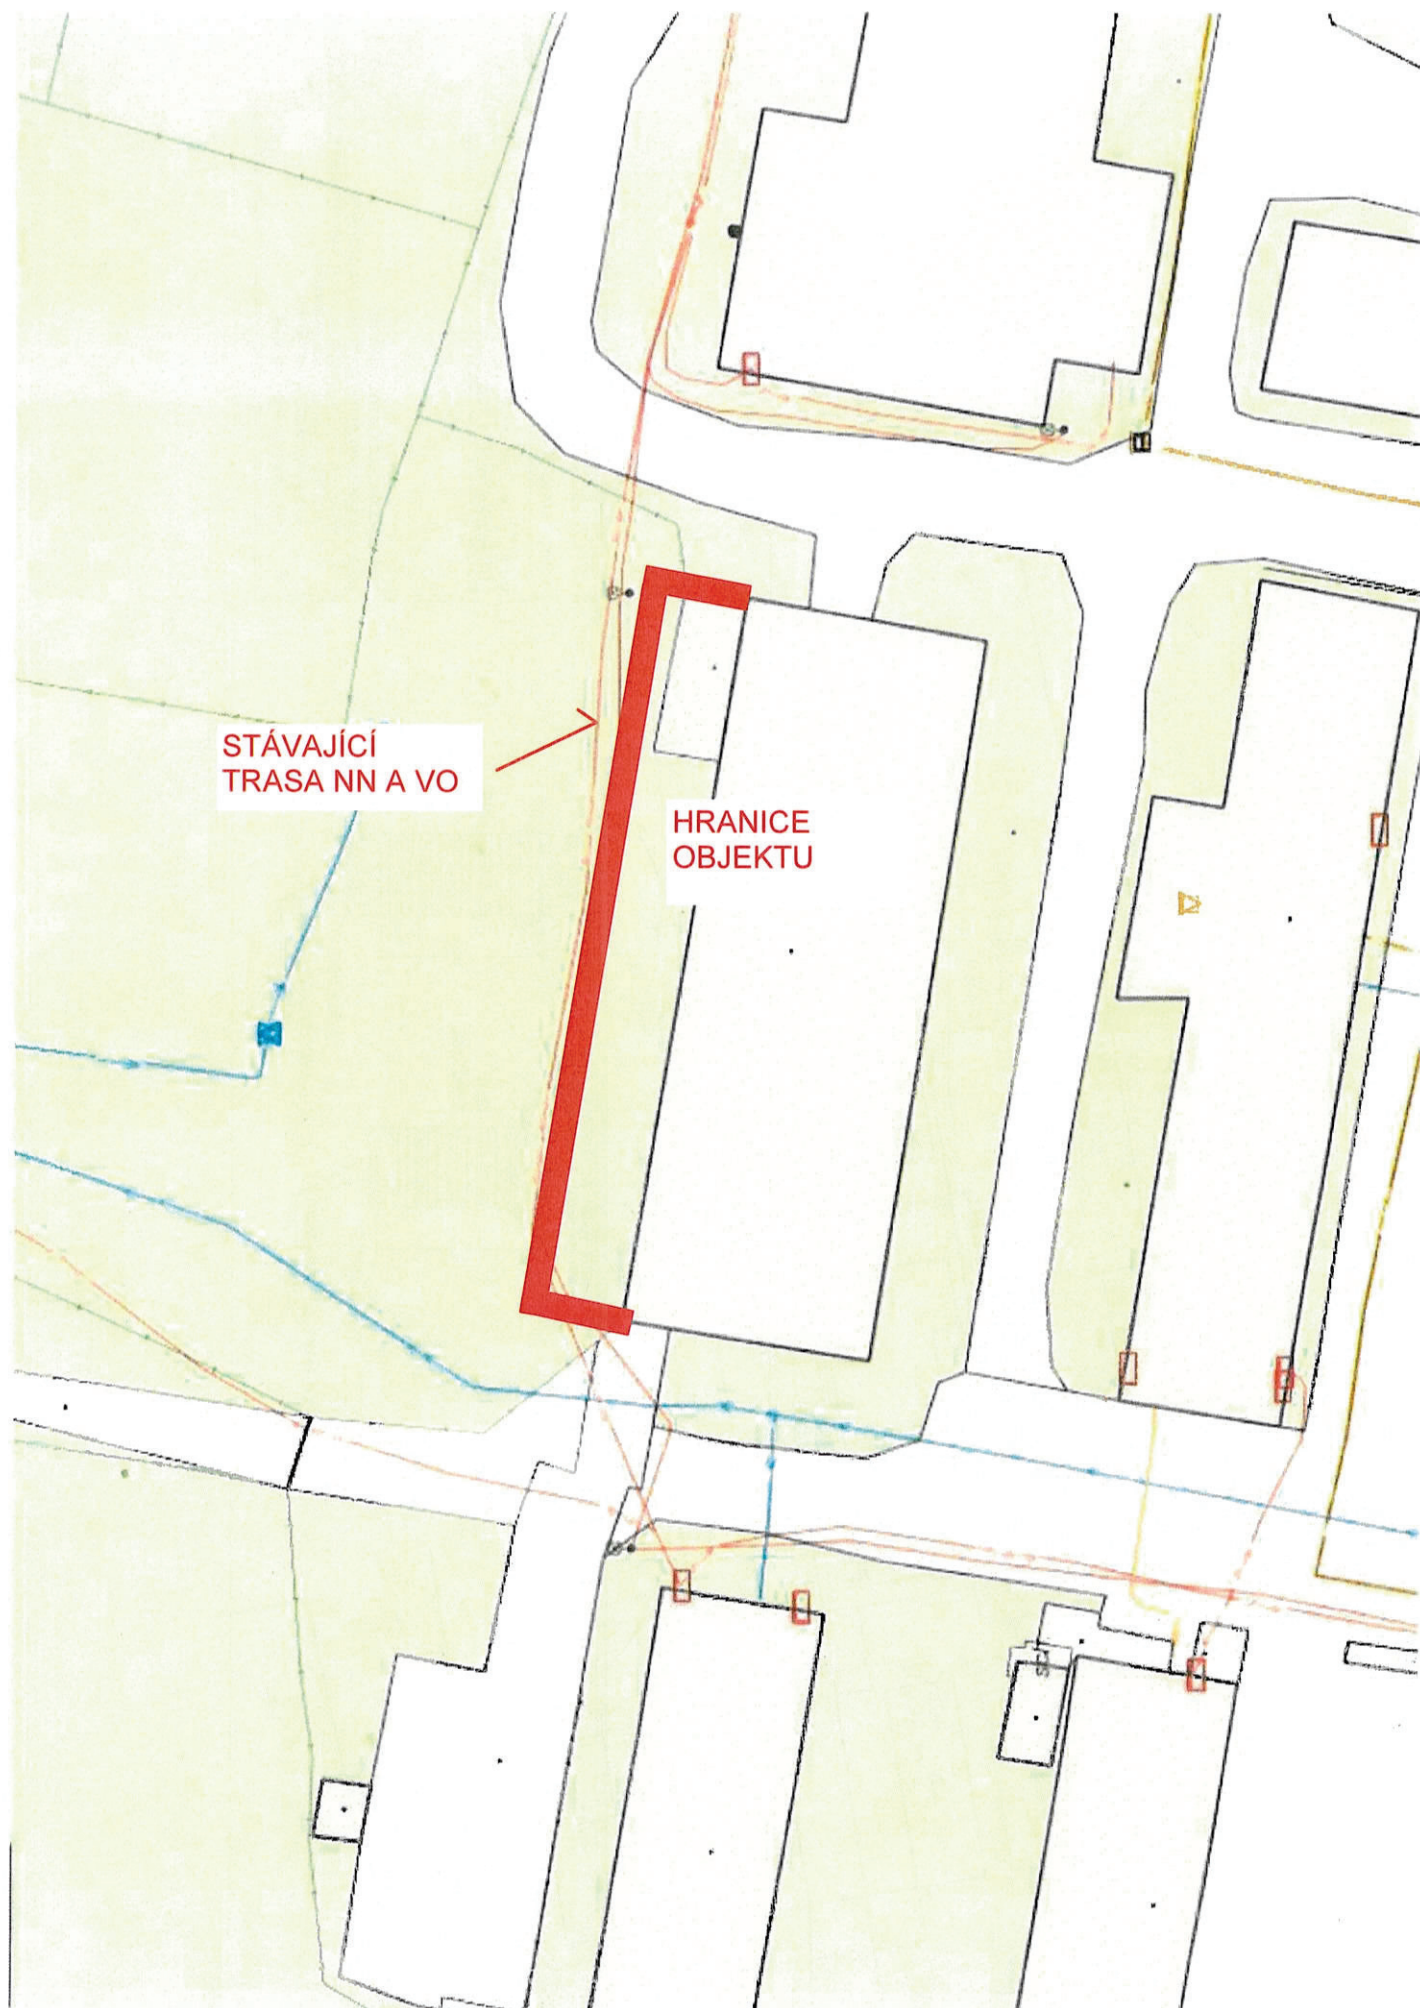

ZMĚNOVÝ LIST

ZL03

Terénní úpravy silážních jam

Stavba:	Zemědělská Akademie a Gymnázium Hořice - demolice ocelové haly			
Objekt:	SO 01 Vlastní objekt			
Předkládá:	STAVITELSTVÍ - TRUNEC s.r.o.		Datum:	26.06.2025
Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny	X	listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady		listů, výkresů
osobně		3) Fotodokumentace		listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

Projektová dokumentace předpokládala uložení zeminy do silážních jam.

1.2 Popis nového řešení:

Silážní jámy budou zaveženy a terén urovnán a upraven dle zpracované projektové dokumentace: "Terénní úpravy silážních jam, zpracovaná 06/2025, Ing. Jiří Špicar".

2 Zdůvodnění změny:

Nové využití protoru stávajících silážních jam.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:

v

ANO

(uvést jaký dokument)

NE

PD "Terénní úpravy silážních jam"

4 Dopad do smluvních termínů:

ANO

X

NE

<zde uvést dopad>

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek

odst.

4

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	—	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	1354 464,41 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		1 354 464,41 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:

za TDS:

za AD:

za uživatele:

za objednatele:

REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTU ZL03

Kód: 01 25 08

Stavba: Zemědělská Akademie a Gymnázium Hořice - modernizace školního statku

Místo:

Datum:

26.06.2025

Zadavatel: Královohradecká kraj

Projektant:

Zhotovitel: STAVITELSTVI-TRUNEC s.r.o.

Zpracovatel:

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Kód	Popis	Cena bez DPH (CZK)	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 354 464,41	1 638 901,94
ZL03	Terénní úpravy silážních jam	1 354 464,41	1 638 901,94

Stavba:

Zemědělská Akademie a Gymnázium Hořice - modernizace školního statku

Objekt:

ZL03 - Terénní úpravy silážních jam

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26.06.2025

Zadavatel:

Královohradecká kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAVITELSTV1-TRUNEC s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 354 464,41

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 354 464,41	21,00%	284 437,53
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 638 901,94

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:


Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ ZMĚNOVÉHO LISTU ZL03

Stavba: Zemědělská Akademie a Gymnázium Hořice - modernizace školního statku
Objekt: ZL03 - Terénní úpravy silážních jam

Místo:
Zadavatel: Královehradecká kraj
Zhotovitel: STAVITELSTVI-TRUNEC s.r.o.

Datum: 26.06.2025
Projektant:
Zpracovatel:



Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		1 354 464,41
HSV - Práce a dodávky HSV		1 354 464,41
1 - Zemní práce		356 745,15
5 - Komunikace pozemní		281 288,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		397 542,91
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot		318 887,55

ZMĚNOVÝ LIST ZL03 A SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zemědělská Akademie a Gymnázium Hořice - modernizace školního statku

Objekt: ZL03 - Terénní úpravy silážních jam

Místo: Zadavatel: Královehradecká kraj
Zhotovitel: STAVITELSTVI-TRUNEC s.r.o.

Datum: 26.06.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Logo VaSI firmy
zadejte
v nastaveních
programu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem							1 354 464,41	
o HSV Práce a dodávky HSV							1 354 464,41	
D 1 Zemní práce							356 745,15	
2	K	113106192	Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami zalitými cementovou maltou strojné pl do 50 m2	m2	780,490	270,90	211 434,74	URS*0,86
	W		"prostor mezi jámami" 3,6*51,421		185,116			
	W		"plocha prostrou přilehlého ke žlabům" 3,5*51,421		179,974			
	W		"plocha svislá 2.žlab" ((33,45+10)*2)*2+8,4*2		190,600			
	W		"stěny svislé 1.žlab"(((33.45+8,0+10)*2)*2)+(9,5*2)		224,800			
	W		Součet		780,490			
12	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	925,544	157,00	145 310,41	CENA DLE SOD
	W		51,421*9,527		489,888			
	W		52*8,378		435,656			
	W		Součet		925,544			
D 5 Komunikace pozemní							281 288,80	
8	K	564950313	Podklad z betonového recyklátu plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	1 924,000	146,20	281 288,80	URS*0,86
	w		52*37		1 924,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							397 542,91	
11	K	961043111	Bourání základů z betonu proloženého kamenem	m3	177,792	2 236,00	397 542,91	URS*0,86
	W		"plocha 1.silážního vjezdu" (43,38*7,965+(8,378*8,62))*0,2		83,548			
	W		"plocha 2.silážního vjezdu" (9.164*51,421)*0,2		94,244			
	W		Součet		177,792			
D 997 Doprava suti a vybouraných hmot							318 887,55	
10	K	997006002	Strojové třídění stavebního odpadu	t	995,000	150,50	149 747,50	URS*0,86
4	K	997006007	Drcení stavebního odpadu ze zdívá z betonu železového s dopravou do 100 m a naložením	t	995,000	124,93	124 305,35	CENA DLE SOD
9	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	995,000	45,06	44 834,70	URS*0,86

ZMĚNOVÝ LIST				ZL04	
Betonářská výztuž					
Stavba:		Zemědělská Akademie a Gymnázium Hořice - novostavba školních dílen			
Objekt:		SO 01 Vlastní objekt			
Předkládá:		STAVITELSTVÍ - TRUNEC s.r.o.		Datum:	26.08.2025
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny	X	listů	
e-mailem	~X~	2) Projektové podklady		listů, výkresů	
osobně		3) Fotodokumentace		listů	

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

V projektové dokumentaci a v soupisu prací (rozpočtu stavby), konkrétně v části B02 Výkres výztuže monolitických patek, nebylo ve výkazu výztuže uvedeno celkem 23 patek. Dále ve výkazu výztuže bylo chybně uvedeno množství výztuže u pol. č. 79, množství bylo 0. Tato výztuž byla také doplněna. Ve smluvním rozpočtu bylo chybně napočítáno množství betonu na základové patky.

1.2 Popis nového řešení:

Výkaz výztuže byl AD doplněn. V rámci méněprací je odečteno 19,1 m3 betonu základových patek.

2 Zdůvodnění změny:

Chyba projektu. Byl doplněn výkres "revize 1 - základy 08/08_2025", kde byl uveden výkaz výztuže pro chybějící patky v PD.


3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		X	ANO		NE
Revize 1 - základy 08/08_2025					
4 Dopad do smluvních termínů:			ANO	X	NE
<zde uvést dopad>					
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek					odst. 6
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	—	73 382,20 Kč	bez DPH	
	Cena víceprací (přípočet):	+	292 835,20 Kč	bez DPH	
	Výsledná ceny změny:		219 453,00 Kč	bez DPH	

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
-----------------	---------	--------	---------------	-----------------

REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTU ZL 04

Kód: 01_25_08
Stavba: Zemědělská Akademie a Gymnázium Hořice - modernizace školního statku



KSO:
Místo:

Zadavatel:
Královehradecká kraj

Zhotovitel:
STAVITELSTVÍ-TRUNEC s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
[Redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26.08.2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			219 453,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	219 453,00	46 085,13
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			265 538,13

Projektant

Zpracovatel

[Redacted]

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTU ZL 04

Kód: 01 25 08

Stavba: Zemědělská Akademie a Gymnázium Hořice - modernizace školního statku

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Místo:

Datum:

26.08.2025

Zadavatel: Královehradecká kraj

Projektant:

Zhotovitel: STAVITELSTVÍ-TRUNEC s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

219 453,00

265 538,13

ZL04

Betonářská výztuž

219 453,00

265 538,13

KRÁLOVSTVÍ ZMĚNOVÉHO LISTU: ZL04

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

Zemědělská Akademie a Gymnázium Hořice - modernizace školního statku

Objekt:

ZL04 - Betonářská výztuž

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Královohradecká kraj

Zhotovitel:

STAVITELSTVI-TRUNEC s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26.08.2025

IC:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IC:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		219 453,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	219 453,00	21,00%	46 085,13
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	265 538,13

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ ZMĚNOVÉHO LISTU ZL04

Stavba:

Zemědělská Akademie a Gymnázium Hořice - modernizace školního statku

Objekt:

ZL04 - Betonářská výztuž

Místo:

Datum: 26.08.2025

Zadavatel:

Královehradecká kraj

Projektant:

Zhotovitel:

STAVITELSTVI-TRUNEC s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu práci

219 453,00

HSV - Práce a dodávky HSV

219 453,00

2 - Zakládání

219 453,00

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu


ZMĚNOVÝ LIST ZL04

Stavba: Zemědělská Akademie a Gymnázium Hořice - modernizace školního statku

Objekt: ZL04 - Betonářská výztuž

Místo: Zadavatel: Královéhradecká kraj
Zhotovitel: STAVITELSTVI-TRUNEC s.r.o.

Datum: 26.08.2025
Projektant:
Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem (CZK)
Náklady soupisu celkem							219 453,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				219 453,00
D	2		Zakládání				219 453,00
3	K	275322511	Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	-19,100	3 842,00	-73 382,20
	W		"monolitické patky v.500mm dle tabulky na výkresu statiky B01"-187,4 "odečet smluvní rozpočet"		-187,400		
	W		"monolitické patky v.750mm dle tabulky na výkresu statiky B01"-31,1 "odečet smluvní rozpočet"		-31,100		
	W		"monolitické patky v.500mm dle tabulky na výkresu statiky B01"-187,4		187,400		
	W		"monolitické patky v.750mm dle tabulky na výkresu statiky B01"-12,0		12,000		
	W		Součet		-19,100		
1	K	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	6,152	47 600,00	292 835,20
	W		"patky Č.110-120 " (74,46*11)/1000		0,819		
	W		"pol.č.79" (117,997)/1000		0,118		
	W		"patky č.2,4,6,8,10,12,23,25,17,28,98,100 " (349,2*12)/1000		4,190		
	W		Mezisoučet		5,127		
	W		"doplňková výztuž" 0,2*5,127		1,025		
	W		Součet		6,152		



CENA DLE SOD

CENA DLE SOD


VÝKAZ VÝZTUŽE PRO 1 ks patky -...						
L	*	Dřekl 1-3	fts Cřta	CMkřl 1 I-J	Výt*	Cdkvřta. lkal
5	10 M	2640	8	21120	811.1 2420 JS	13.0
10 M 4			8	21120		13.0
1	14 ca	3200	34	108800	51 2420 S	131.5
2	14 ea	3175	34	107950	11 2420 J8	130.4
3	14 aa	3500	8	28300		33.8
4	14 ca	3375	8	27000		32.6
14 na 6			84	271750		328.4
Celkový součet »			92	292830		341.4

t poi	# (nr)	Delta M	Poř. (ba)	O»X3		*
4	14	326	34	■	14	*
-	14	324	34		110.84	
-	*4	363	-		111.1	
-	14	3.5	-		28	
5	*·	2,68	■	2144	-	
CefataOěika				21.44	zra04	
SoecckanmoCias:				1010		
Hmřncs:(kg)				9.24		
Hmřncs:celter.				34	20CCXCCC	8m


VÝKAZ VÝZTUŽE PRO 1 ks patky 110-120						
#	#	Délka [mm]	Př. celkem	CMkovid. [mm]	Výřeh [mm]	CMkřsvta [kg]
1	10 mm	1240	8	9920		6,1
10 mm 4			8	9920		6,1
3	14 mm	2275	12	27300		33,8
4	14 mm	2300	17	27600		33,8
14 mm 6			24	54900		64,3
Celkový součet		8	32	64820		72,5
Č. poi	# (mm)	Délka (mm)	Počet (ks)	Delta		
1	10	1.24	8	10.24	14	
3	14	2.24	12	22.08	33.8	
4	14	2.30	12	22.32	33.8	
Celková Delta				10.24	64.3	
Současná hmotnost				8.6125	1.2284	
Hmotnost (kg)				6.31	68.15	
Hmotnost celkem		14		46.0000000000		



PATKY = 2.4.6.8.10.12.23.25.17,28,98.100

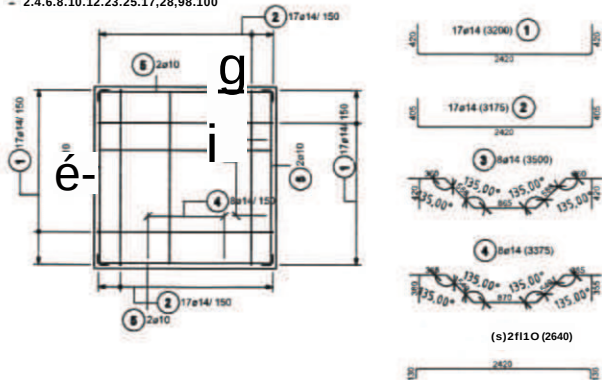

PATKY - 110-120



KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ		1420 0 00773	
PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245. 500 03 HRADECKRÁLOVĚ		210172	
ZEMĚDĚLSKÁ AKADEMIE A GYMNÁZIUM HOŘICE		04/2022	
MODERNIZACE ŠKOLNÍHO STATKU - NOVOSTAVBA ŠKOLNÍCH DÍLEN		DPS	
PARCC STWIL PARCC »SÚS IASII 2JSGIS I O RnXU HORICEVPOWRXOLOI IWSI6S1		DPS	
I CASTIWTcS		DPS	
revize 1- základy 08/08.2025		DPS	

ZMĚNOVÝ LIST Zařízení staveniště				ZL 05	
Stavba:		Zemědělská Akademie a Gymnázium Hořice - novostavba školních dílen			
Objekt:		SO 01 Vlastní objekt			
Předkládá:		STAVITELSTVÍ- TRUNEC s.r.o.		Datum:	
		19.08.2025			
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny		X	listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady			listů, výkresů
osobně		3) Fotodokumentace			listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

Původní vybavení zařízení staveniště dle SOD: 1x „dvojbuňka“ pro provoz objednatele - bude vybavena barevnou multifunkční tiskárnou formát A3 (s kopírkou a scannerem), 4 x pracovní stůl, 6x židle, min 1x skříň na výkresy (cca 1 x 2 m), 2x uzamykatelná skříň s policemi, 1x věšák na kabáty, odpadkový koš, 1x „dvojbuňka“ pro provoz TDS, koordinátora BOZP a AD - bude vybavena - 4 x pracovní stůl, 6x židle, min 1x skříň na výkresy (cca 1 x 2 m), 2x uzamykatelná skříň s policemi, 1x věšák na kabáty, odpadkový koš, 1x „trojbuňka“ pro zasedací místnost - bude vybavena 1x stůl pro min. 12 osob, 16x židle, 1x věšák na kabáty, 1x malý konferenční stolek a odpadkový koš, dataprojektor s plátnem. Každá buňka bude vybavena elektřinou, vytápěním a chlazením (ne mobilní klimatizace), osvětlením, připojením k internetu - zajištění i připojení na síť KUKHK přes router. 1 buňka pro kuchyňku - bude vybavena kávovarem, rychlovarnou konvicí, lednicí, myčkou, mikrovlnná troubou, nádobím - min. hrnky, sklenice, malé a velké talíře, misky a lžičky, lžičky a příbory v počtu min. pro 12 osob, odpadkový koš, buňka bude vybavena elektřinou a vytápěním. Samostatné sanitární buňky (1x pro ženy, 1x pro muže), buňky budou vybaveny elektřinou a vytápěním.

1.2 Popis nového řešení:

Nově se zařízení staveniště skládá z: 1x buňka pro TDS - vybavena kávovarem, rychlovarnou konvicí, tiskárnou, lednicí, uzamykatelnou skříň, internet (wifi připojení), 2x stůl s osmi židlemi, 1x buňka pro ZH, 1x skladová buňka pro ZH. Buňky jsou vybaveny topením a elektřinou a jsou uzamykatelné. 2x mobilní WC, v případě potřeby je možné využít toalety v prostoru školního statku.

2 Zdůvodnění změny:

Na kontrolní dni 19.8.2025 bylo rozhodnuto o předložení změnového listu, který by zohlednil vybudování zařízení staveniště v omezeném rozsahu dle dohody na KD.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:

ANO

X

NE

4 Dopad do smluvních termínů:

ANO

X

NE

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek

odst.

4

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	—	81 430,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	41 430,00 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		-40 000,00 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:

za TDS:

za AD:

za uživatele:

za objednatele:

REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTU ZL 05

Kód: 01_25_08

Stavba: Zemědělská Akademie a Gymnázium Hořice - modernizace školního statku

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 19.08.2025

Zadavatel:

Královohradecká kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAVITELSTVI-TRUNEC s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-40 000,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně -40 000,00	Výše daně -8 400,00
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-48 400,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTU ZL 05

Kód: 01 25 08

Stavba: Zemědělská Akademie a Gymnázium Hořice - modernizace školního statku

Místo: Datum: 19.08.2025

Zadavatel: Královohradecká kraj

Projektant:

Zhotovitel: STAVITELSTVÍ-TRUNEC s.r.o.

Zpracovatel:

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-40 000,00	-48 400,00
ZL05	Zařízení staveniště	-40 000,00	-48 400,00

KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU ZL 05

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

Zemědělská Akademie a Gymnázium Hořice - modernizace školního statku

Objekt:

ZL05 - Zařízení staveniště

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 19.08.2025

Zadavatel:

Královehradecká kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAVITELSTVI-TRUNEC s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-40 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-40 000,00	21,00%	-8 400,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			-48 400,00
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ ZMĚNOVÉHO LISTU ZL 05

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

Zemědělská Akademie a Gymnázium Hořice - modernizace školního statku

Objekt:

ZL05 - Zařízení staveniště

Místo:

Datum: 19.08.2025

Zadavatel:

Královohradecká kraj

Projektant:

Zhotovitel:

STAVITELSTVI-TRUNEC s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-40 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

-40 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

-40 000,00

SOUPIS PRACÍ ZMĚNOVÉHO LISTU ZL 05

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: Zemědělská Akademie a Gymnázium Hořice - modernizace školního statku

Objekt: **ZL05 - Zařízení staveniště**

Místo: Datum: 19.08.2025

Zadavatel: Královehradecká kraj Projektant:
Zhotovitel: STAVITELSTVI-TRUNEC s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem							-40 000,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							-40 000,00	
D VRN3 Zařízení staveniště							-40 000,00	
1	K	032002000	Vybavení staveniště-mobilní WC,sklad,kancelář,zdvihací mechanizmy - podrobně viz poznámka	soubor	1,000	-60 580,00	-60 580,00	SOD
5	K	032002000R	Vybavení staveniště-mobilní WC,sklad,kancelář,zdvihací mechanizmy - podrobně viz poznámka	soubor	1,000	30 580,00	30 580,00	VLASTNI
4	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	soubor	1,000	-20 850,00	-20 850,00	SOD
6	K	039002000R	Zrušení zařízení staveniště	soubor	1,000	10 850,00	10 850,00	VLASTNI

ZMĚNOVÝ LIST		ZL06
HEB ve stropě		

Stavba:	Zemědělská Akademie a Gymnázium Hořice - novostavba školních dílen		
Objekt:	SO 01 Vlastní objekt		
Předkládá:	STAVITELSTVÍ- TRUNEC s.r.o.	Datum:	22.08.2025

Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů	
poštou		1) Položkový rozpočet změny	X listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady	listů, výkresů
osobně		3) Fotodokumentace	listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

V projektové dokumentaci je strop ze stropních panelů spiroll. Místnosti jsou tvořeny zděnými příčkami.

1.2 Popis nového řešení:

Při statickém posouzení bylo dodavatelem prefabrikovaného skeletu haly upozorněno na nedostatečnou únosnost stropních panelů v místech umístění zděných příček. V těchto místech bylo dodavatelem navrženo vložení HEB nosníků, které v těchto místech zvýší únosnost. Bylo doplněno 5 ks HEB dl. 8,45 m.

2 Zdůvodnění změny:

Chyba PD, doplnění nosníků bylo odsouhlaseno AD. Z důvodu zvýšení únosnosti stropní konstrukce bylo nutné mezi stropní panely v místě příček vložit dodatečně válcované profily HEB 400.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO	X	NE
---	-----	---	----

TSS ■ tvar skladby stropu - výrobní dokumentace VCES a.s.

4 Dopad do smluvních termínů:	ANO	X	NE
-------------------------------	-----	---	----

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst. 6
---	---------

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	—	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	642 501,18 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		642 501,18 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
-----------------	---------	--------	---------------	-----------------

REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTU ZL06

Kód: 01_25_08

Stavba: Zemědělská Akademie a Gymnázium Hořice - modernizace školního statku

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Královohradecká kraj

Zhotovitel:

STAVITELSTVI-TRUNEC s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22.08.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

642 501,18

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	642 501,18	134 925,25
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

777 426,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTU ZL 06

Kód: 01 25 08

Stavba: Zemědělská Akademie a Gymnázium Hořice - modernizace školního statku

Místo:

Datum:

22.08.2025

Zadavatel: Královehradecká kraj

Projektant:

Zhotovitel: STAVITELSTVÍ-TRUNEC s.r.o.

Zpracovatel:

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

642 501,18

777 426,43

ZL06

HEB

642 501,18

777 426,43

KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU ZL06



Stavba:

Zemědělská Akademie a Gymnázium Hořice - modernizace školního statku

Objekt:

ZL06 - HEB

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

22.08.2025

Zadavatel:

Královohradecká kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAVITELSTVÍ-TRUNEC s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

642 501,18

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	642 501,18	21,00%	134 925,25
	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

777 426,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ ZMĚNOVÉHO LISTU ZL06

Stavba:

Zemědělská Akademie a Gymnázium Hořice - modernizace školního statku

Objekt:

ZL06 - HEB

Místo:

Zadavatel:

Královehradecká kraj

Zhotovitel:

STAVITELSTVI-TRUNEC s.r.o.

Datum:

22.08.2025

Projektant:

Zpracovatel:

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

642 501,18

HSV - Práce a dodávky HSV	594 394,83
4 - Vodorovné konstrukce	49 217,13
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	545 177,70
PSV - Práce a dodávky PSV	48 106,35
767 - Konstrukce zámečnické	35 775,21
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	12 331,14

ZMĚNOVÝ LIST ZL06 - SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zemědělská Akademie a Gymnázium Hořice - modernizace školního statku

Objekt:

ZL06 ■HEB

Místo:

Datum: 22.08.2025

Zadavatel:

Královehradecká kraj

Projektant:

Zhotovitel:

STAVITELSTVÍ-TRUNEC s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

642 501,18

□ HSV

Práce a dodávky HSV

594 394,83

D 4

Vodorovné konstrukce

49 217,13

6	I	K	I411323434R	Dobetonávka ze ŽB tř. C 25/30	m3	j	6,800	4 940,00	33 592,00	CENA DLE SOD
---	---	---	-------------	-------------------------------	----	---	-------	----------	-----------	--------------

W

(0,210,4*8,5r2*5

6,800

3	I	K	411301021	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 25 do 50 cm bez podpěrné kce	m2		21,250	583,94	12 408,73	URS*0,86
---	---	---	-----------	---	----	--	--------	--------	-----------	----------

W

8,5*0,6*5

21,250

4	I	K	41100102Z	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 25 do 50 cm bez podpěrné kce	m2		21,250	151,36	3 216,40	URS*0,86
---	---	---	-----------	--	----	--	--------	--------	----------	----------

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

545 177,70

15	K		953946132	Montáž atypických ocelových kčí hmotnosti přes 1 do 2,5 t z profilů hmotnosti přes 30 kg/m	t		6,549	22 360,00	146 435,64	URS*0,86
----	---	--	-----------	--	---	--	-------	-----------	------------	----------

W

<(8,4S-155)*5)/1000

6,549

2	M		13011011	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 400	t		7,440	30 444,00	226 503,36	URS*0,86
---	---	--	----------	--	---	--	-------	-----------	------------	----------

W

((8,45*155)*5)/1000

6,549

W

5,75*155/1000 "prořez"

0,891

W

Součet

7,440

16	K		953946132R	Výroba atypických ocelových kčí hmotnosti přes 1 do 2,5 t z profilů hmotnosti přes 30 kg/m	t		6,549	26 300,00	172 238,70	VLASTNÍ
----	---	--	------------	--	---	--	-------	-----------	------------	---------

W

((8,45*155)*5)/1000

6,549

o PSV

Práce a dodávky PSV

48 106,35

□ 767

Konstrukce zámečnické

35 775,21

12	K		998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t		6,549	1 530,80	10 025,21	URS*0,86
----	---	--	-----------	--	---	--	-------	----------	-----------	----------

10	K		R1	Návrh a statické posouzení	ks		1,000	15 500,00	15 500,00	VLASTNÍ
----	---	--	----	----------------------------	----	--	-------	-----------	-----------	---------

13	K		R2	Doprava na stavbu	ks		1,000	10 250,00	10 250,00	VLASTNÍ
----	---	--	----	-------------------	----	--	-------	-----------	-----------	---------

W

9,75609756097561E-05*10250 "Přepočtené koeficientem množství

1,000

W

W

W

D 789

Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

12 331,14

8	K		789321110	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I jednosložkového základního tl do 40 pm	m2		81,543	106,64	8 695,75	URS*0,06
---	---	--	-----------	--	----	--	--------	--------	----------	----------

W

1,93*8,45*5



81,543

9	M		24629024	hmota nátěrová syntetická základní na ocelové konstrukce	*g		33,025	110,08	3 635,39	URS*0,86
---	---	--	----------	--	----	--	--------	--------	----------	----------


W

81,543*0,405 "Přepočtené koeficientem množství


33,025

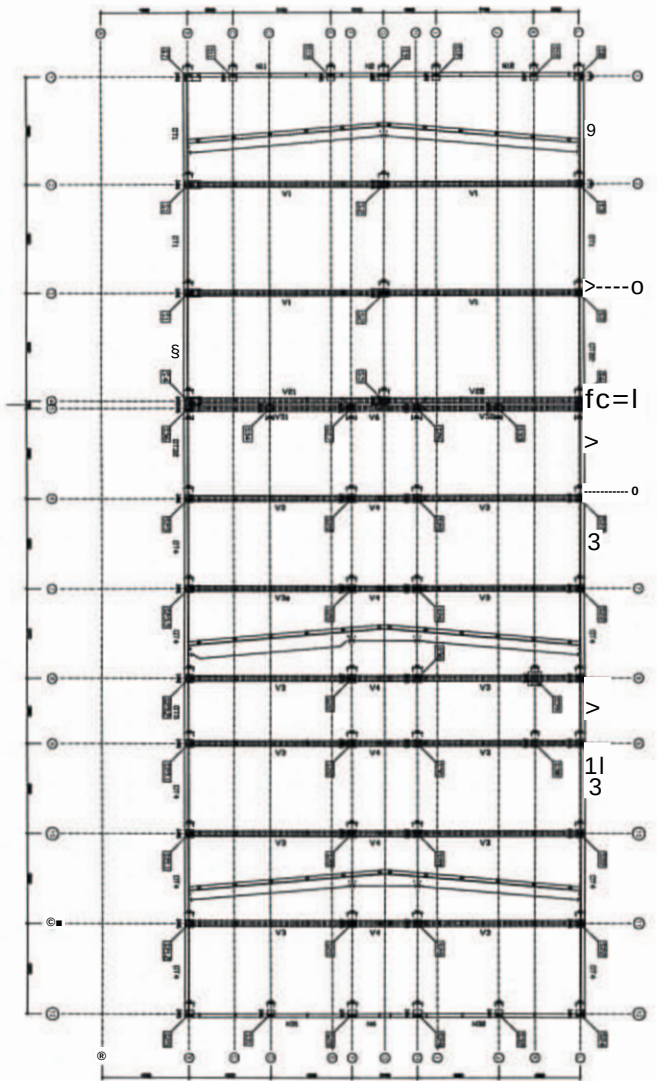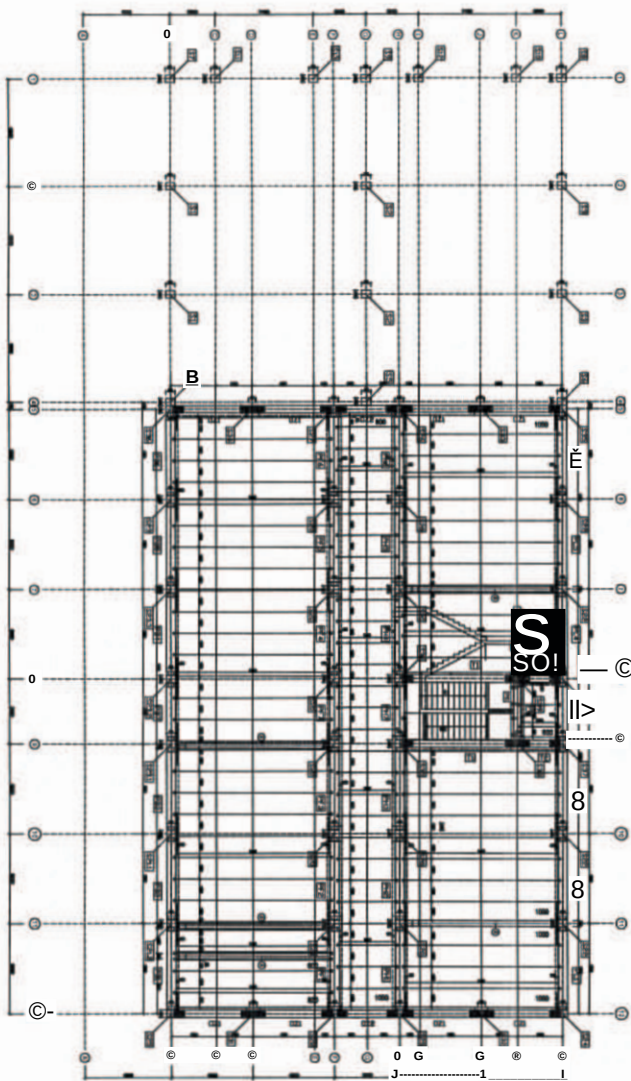



POHLED NA OSU 7



ifómiíifHig
&
ifi




POHLED NA OSU 9




g[W*íS*33333?98W* B]


POHLED NA OSU 2



POHLED NA OSU 11



POHLED NA OSU 4-5



NOVÉ ZEMSKÉ STAVBY	NOVÉ ZEMSKÉ STAVBY	NOVÉ ZEMSKÉ STAVBY	NOVÉ ZEMSKÉ STAVBY
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32
33	34	35	36
37	38	39	40
41	42	43	44
45	46	47	48
49	50	51	52
53	54	55	56
57	58	59	60
61	62	63	64
65	66	67	68
69	70	71	72
73	74	75	76
77	78	79	80
81	82	83	84
85	86	87	88
89	90	91	92
93	94	95	96
97	98	99	100

KONTAKT: SOLETT
ZALIVY BRIDGEX S TRIVY
KOTON CES/27

