

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 30. 3. 2017
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmánem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.

bankovní spojení: ČNB

č. účtu: 2006-813511/0710

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) M - SILNICE a.s.

Sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice

Korespondenční adresa: M - SILNICE a.s., oblastní závod SEVER,
Hradecká 415, 506 01 Jičín

IČO: 421 96 868

DIČ: CZ42196868

zastoupený Ing. Zdeňkem Babkou, výkonným ředitelem – na základě plné moci
zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Hradec Králové, oddíl B,
vložka 430

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Hradec Králové,

č. účtu: 1080015329/0800

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve
znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**II/300 Dvůr Králové nad Labem – Lipnice**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou
a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní
strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku I. Základní ustanovení odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení stavby „**II/300 Dvůr Králové nad Labem - Lipnice**“, včetně změny č. 1 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **5 758 289,73 Kč vč. DPH** (slovy pět milionů sedm set padesát tisíc dvě set osmdesát devět Korun českých sedmdesát tři haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	4 758 917,13 korun českých
DPH (21%)	999 372,60 korun českých
Cena celkem	5 758 289,73 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 101 Rekonstrukce komunikace, ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 101 Rekonstrukce komunikace, je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 7 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 5 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá účinnosti a předmětná smlouva se mění dnem podpisu tohoto dodatku druhou podepisující stranou.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne 29-06-2017

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
3

Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtmán

Zhotovitel
Ing. Zdeněk Babka
výkonný ředitel – na základě plné moci
M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČ: 421 96 868 • DIČ: CZ421 96 868
ředitelství
Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

Název stavby:
" II/300 Dvůr Králové nad Labem - Lipnice"

Rekapitulace ceny po změně č. 1

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	
SO 001	Vedlejší a ostatní náklady	213 880,00	0,00	0,00	213 880,00
SO 101	Rekonstrukce komunikace	4 265 533,13	279 504,00	0,00	4 545 037,13
CENA CELKEM bez DPH		4 479 413,13	279 504,00	0,00	4 758 917,13
DPH 21 %		940 676,76	58 695,84	0,00	999 372,60
CENA CELKEM		5 420 089,89	338 199,84	0,00	5 758 289,73

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Hlavoče 11687
100 437/00 283
oblastní síť, 6. 5. 2017
Hradec Králové, 1. 6. 2017

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

Číslo stavby :	36533
Registrační číslo projektu :	
Smlouva o dílo uzavřena dne :	30.3.2017
Název stavby :	

1

„II/300 Dvůr Králové nad Labem - Lipnice“

Název objektu :

SO 001 Vedlejší a ostatní náklady, SO 101 Rekonstrukce komunikace

Objednatel :

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

AF-CITYPLAN s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4, IČ 47307218

Zhotovitel :

M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČ 42196868

Popis a zdůvodnění změny :

Na základě inženýrskogeologického průzkumu projekt předpokládal nevyhovující základové poměry. Proto předepisoval výměnu stávajícího materiálu v aktivní zóně vozovky materiálem novým, vhodným do aktivní zóny. Během stavebních prací se skutečnosti předpokládané v projektu potvrdily, s tím, že základové poměry se ukázaly být komplikovanější (větší vlhkost podloží), a proto bylo nutné přistoupit ke kombinaci výměny materiálu v aktivní zóně vozovky a zlepšení parametrů stávajícího materiálu v úrovni paraplané dle parametrů plynoucích z inženýrskogeologického průzkumu. Výše uvedená změna nemá vliv na termín dokončení stavebních prací. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky.


Přílohy evidenčního listu :

1.	Rozpočet
2.	Průkazní zkouška na úpravu pojivy
3.	Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny
4.	
5.	
5.	

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č.1:		Nová cena stavby po změně č. 1:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
		méněpráce	vícepráce		
5 420 090,-	5 420 089,89 Kč	0,00 Kč	338 199,84 Kč	5 758 289,73 Kč	338 199,84 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.1:		0,00 Kč	338 199,84 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zhotovitel :	M-SILNICE a.s.	Ing. Ondřej Koza		
Projektant :	AF-CITYPLAN s.r.o.	Ing. Jakub Vyháček		
Správce stavby :	SÚS Královéhradeckého kraje a.s.			
Hlavní inženýr :	SÚS Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Martin Jelinek		
Technický dozor :	SÚS Královéhradeckého kraje a.s.	Jiří Kříž		
Supervize :				

**M.I.S.****M.I.S. a.s., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
Centrální silniční laboratoř****Zkušební laboratoř č. 1197 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005
pracoviště Hradec Králové, Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové**

Strana č.: 1/2

Počet příloh: 1

PROTOKOL O ZKOUŠCE

č.: 773/17/CSL/HK

**Stanovení objemové hmotnosti a míry zhutnění – Proctor standard podle ČSN EN 13286-2,
poměru únosnosti (IBI) podle ČSN EN 13286-47,
vlhkosti dle ČSN EN 1097-5****Zákazník:** M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, OZ SEVER
Objednávka: smlouva o provádění zkoušek
Akce: II/300 Dvůr Králové - Lipnice**Předmět zkoušky:**
Jílovitá zemina**lokalita*:**
paraplán**lab.č.vz.:**
1290/17**Návrh úpravy zeminy do parapláně.**

* Údaje poskytnuté zákazníkem

Zkušební vzorek
datum odběru : 20. 6. 2017
datum přijetí do lab. : 20. 6. 2017
odebral : Ing. Dočkal
místo odběru : km 0,395**Výsledky zkoušek****Proctorova zkouška – standard****Hlavní použité zařízení:** mozdíř, hutnicí zařízení a příslušenství, váhy, sterilizátor, síta

	3% vápna
Max. objemová hmotnost $p_{d,max}$ v $kg.m^{-3}$	1757
Optimální vlhkost w_{opt} v % hm.	17,4

Stanovení hodnoty IBI**Hlavní použité zařízení:** hmoždíř CBR + příslušenství, váhy, lis + přidavné zařízení, sterilizátor, lázeň, Proctorův stloukač (pěch)

	3% vápna
vlhkost w před IBI (% hm.)	17,4
vlhkost w po IBI (% hm.)	17,2
Výsledná hodnota IBI v %	19,8

Vzorky připravil a zkoušky provedl: Müller, Ing. Dočkal

Dne: 21. 6. – 23. 6. 2017



M.I.S. a.s., Resslova 956/13, Hradec Králové

Strana č.: 2/2

Centrální silniční laboratoř

Protokol č.: 773/17/CSL/HK

Prohlášení: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkušebního vzorku. Bez písemného souhlasu Centrální silniční laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Upozornění: Stížnost nebo námitku proti výsledkům zkoušek lze podat řediteli Centrální silniční laboratoře, který je povinen stížnost okamžitě potvrdit a do 30 kalendářních dnů sdělit výsledek reklamace.

V Hradci Králové dne: 23. 6. 2017


Ing. Petr Dočkal
vedoucí pracoviště
Hradec Králové



Konec protokolu


Luděk Müller
odborný garant

Proctorova zkouška - standard + 3% vápna


zk. provedena: 21. - 22.6. 2017

zk. provedl: Muller, Dočkal

podíl nadsítného m_0/m_1	m	0
objemová hmotnost nadsítných zrn kameniva	ρ_{ssD}	0
vlhkost nadsítného v procentech (%)	w_0	0

Číslo mozdíře: A6 Váha mozdíře: m 1 = 5694 g Objem mozdíře: V = 942 cm³

Vlhkost v % odhadem	Váha mozdíře s vlhk. zemi- nou (g)	Označení misky	Váha misky (g)	Váha vlhk. zeminy s miskou (g)	Váha suché zem. s miskou (g)	Váha vody v zem. (g)	Váha suché zem. (g)	Vlhk. v % váhy suché zem.	Objem. hm. vlhké směsi (kg/m ³)	Obj. hm. zhuštěné suché sm. (kg/m ³)	korigovaná vlhkost celého vzorku v%	korigovaná suchá obj. hm. celého vz. v kg/m ³
c	m 2		g	h	i	j = h-i	k = i-g	w	ρ	ρ_d	w'	ρ_d'
12	7494	10	1230,9	2936,6	2756,2	180,4	1525	11,8	1911	1709	-	-
14	7555	95	1451,2	3211,5	2993,8	217,7	1543	14,1	1976	1732	-	-
16	7611	5	1492,1	3312,7	3058,6	254,1	1567	16,2	2035	1751	-	-
18	7643	47	1114,6	2951,5	2673,0	278,5	1558	17,9	2069	1755	-	-
20	7647	99	1219,4	3061,1	2758,3	302,8	1539	19,7	2073	1732	-	-

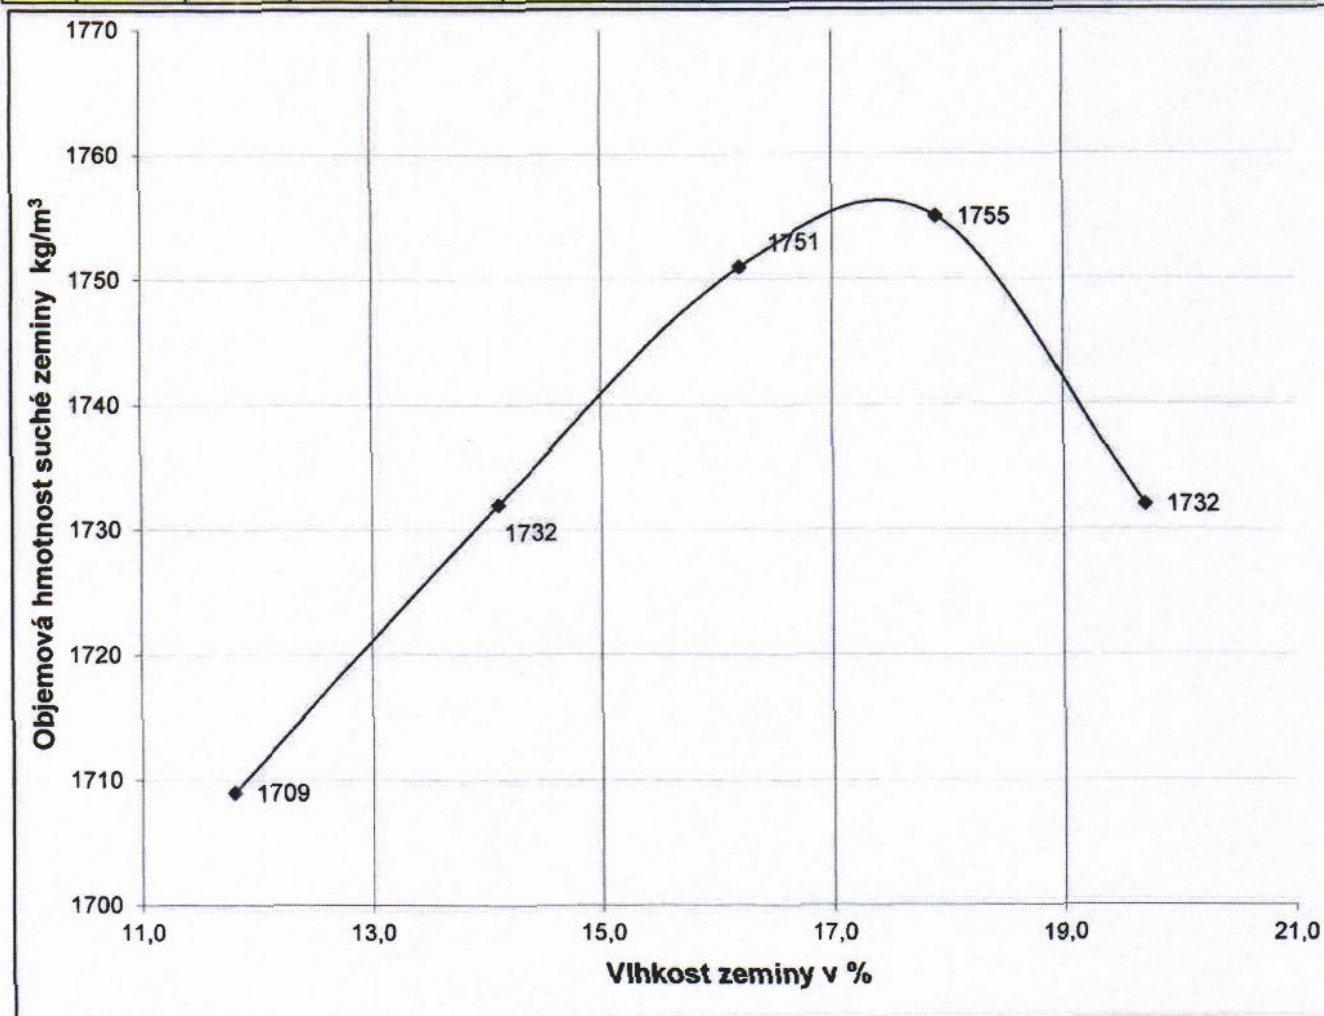

Max.obj.hmotnost = 1757 kg/m³

Optimální vlhkost = 17,4 %



M.I.S. a.s.
Resslova 956/13
500 02 Hradec Králové

Č.j.: -

Vyřizuje: Müller
Telefon: 495 844 258

E-mail: info@mishk.cz

Dne: 23. 6. 2017
Hradec Králové

Věc: Vyjádření CSL k protokolu o zkoušce č.: 773/17/CSL/HK

Laboratorní číslo vzorku:

Posouzení:

Technický předpis:

1290/17

Zemina upravená 3 % vápna vyhovuje pro použití do násypu.

ČSN 73 6133 min. 10 %

Luděk Müller
odborný garant

M.I.S. a.s.
Resslova 956
500 02 Hradec Králové
IČ: 421 95 683 • DIČ: CZ 421 95 683

12

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Název akce:

II/300 Dvůr Králové nad Labem - Lipnice

Tabulka k odst. 4, bodu b)

Původní smluvní cena (vstupní)	4 479 413,13 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	4 479 413,13 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy - kontrolní (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	0,00 % < 15,00 %	

Tabulka k odst. 5, bodu c)

Původní smluvní cena (vstupní)	4 479 413,13 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 5	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 5	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)	4 479 413,13 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 6, bodu c)

Původní smluvní cena (vstupní)	4 479 413,13 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 6	+ 279 504,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 6	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)	4 758 917,13 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	279 504,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	6,24 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 7, bodu b)

Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	odečítají se (zahrnou se do "navýšení")
Méněpráce zařazené k odst. 7 nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7

Původní smluvní cena (vstupní)	4 479 413,13 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 (vícepráce po odečtení méněprací)	279 504,00 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	6,24 % < 30,00 %	

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 279 504,00 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 0,00 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU	279 504,00 Kč bez DPH

Předchozí dodatek č. 1

		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 2		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 3		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 4		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 5		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 6		

		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 7		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

ZÁVĚREČNÁ POSOUZENÍ		
Změna závazku ze smlouvy - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	4 479 413,13 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	4 479 413,13 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	0,00 % < 15,00 %	

Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	4 479 413,13 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení se zahrnutím víceprací z předchozích dodatků	279 504,00 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	6,24 % < 30,00 %	

SOUHRNNÁ TABULKA SE Zahrnutím VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)	
PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)	4 479 413,13 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 279 504,00 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 0,00 Kč bez DPH
SOUČASNÁ CENA	4 758 917,13 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Kateřina Vlková
