

## Dodatek č. 2

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

### Smluvní strany

**Objednatel** **Střední odborné učiliště, Lázně Bělohrad, Zámecká 478**  
se sídlem: Zámecká 478, 507 81 Lázně Bělohrad  
IČO 000 87 726  
zástupce Mgr. Pavel Petr, ředitel

dále jako „objednatel“ a

**Zhotovitel** **ASJ s.r.o.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou oddíl C, 12651

se sídlem Světí 8, 503 12 Světí  
IČO 252 81 861  
DIČ CZ25281861  
zastoupený Jiřím Švubem, jednatelem

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 1. 2018 na základě výsledku podlimitního řízení veřejné zakázky s názvem „Snížení energetické náročnosti budovy školy a tělocvičny SOU Lázně Bělohrad – stavební práce“, smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 18. 4. 2018 (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 1 až 10 včetně oznámení změn, které jsou přílohou č. 1 této smlouvy, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 odst. 6 a odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“). Změna spočívá ve změně rozsahu díla o vícepráce a méněpráce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

### Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovým listem č. 1 až 10 včetně oznámení změn, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
2. Článek 7 odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:
  1. *Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu a výkazu výměr – ocenění prostředků povinné publicity, jejichž úplnost je zaručena, činí:*

**celková cena 17 398 789 Kč bez DPH (slovy: sedmnáct milionů tři sta devadesát osm tisíc sedm set osmdesát devět korun českých);**  
**celková výše DPH 3 653 745,69 Kč (slovy: tři miliony šest set padesát tři tisíc sedm set čtyřicet pět korun českých a šedesát devět haléřů);**



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

**celková cena 21 052 534,69 Kč s DPH** (slovy: dvacet jedna milionů padesát dva tisíc pět set třicet čtyři korun českých a šedesát devět haléřů).

Celková cena za provedení díla je v návaznosti na jednotlivé dílčí části díla – následovně:

a) **dílo dle čl. 5 odst. 2 této smlouvy**, tedy stavební práce činí:

celková cena 17 397 789 Kč bez DPH (slovy: sedmnáct milionů tři sta devadesát sedm tisíc sedm set osmdesát devět korun českých);

celková výše DPH 3 653 535,69 Kč (slovy: tři miliony šest set padesát tři tisíc pět set třicet pět korun českých a šedesát devět haléřů);

celková cena 21 051 324,69 Kč s DPH (slovy: dvacet jedna milionů padesát jedna tisíc tři sta dvacet čtyři korun českých a šedesát devět haléřů).

b) **dílo dle čl. 5 odst. 3 této smlouvy**, tedy ocenění prostředků povinné publicity činí:

celková cena 1 000,00 Kč bez DPH (slovy: tisíc korun českých);

celková výše DPH 210,00 Kč (slovy: dvě stě deset korun českých);

celková cena 1 210,00 Kč s DPH (slovy: tisíc dvě stě deset korun českých);

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po podpisu dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
- Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

#### Přílohy

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 – 10

V Lázních Bělohrad dne 14.06.2018

za objednatele



Mgr. Pavel Petr

ředitel SOU Lázně Bělohrad

za zhotovitele



Jiří Švub

jednatel společnosti ASJ s.r.o.

**asj**  
stavební firma


ASJ s.r.o.  
Světí 8, 503 12  
tel.: +420 495 407 008  
e-mail: asj@asj.cz  
www.asj.cz  
IČ: 528 1861, DIČ: CZ25281861

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ  
LÁZNĚ BĚLOHRAD  
Zámecká 478  
-1-




EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

5 tisíc pět



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
OP Životní prostředí

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		<b>číslo OZ: 01</b>	
Zhotovitel:	ASJ s.r.o., 503 12 Světí 8, IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861		
Investor:	Střední odborné učiliště, Lázně Bělohrad, Zámecká 478	Datum: 27. 04. 2018	
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy školy a tělocvičny SOU Lázně Bělohrad			
Způsob odeslání / předání datum: 27. 04. 2018	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
<b>Odkazy na</b>	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
<b>Předmět změny: Vchodové dveře, okna</b>			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>			
<p>Při prohlídce stávajících oken v budově C bylo zjištěno, že dva kusy oken nejsou uvedeny v PD, jejich technické parametry neodpovídají současným požadovaným parametrům. Z tohoto důvodu musí být okna vyměněna.</p> <p>V budově školy je zavedený bezpečnostní čipový systém. Z tohoto důvodu je nutné doplnit vchodové dveře elektrozámky a panikovými kováními. Informaci že škola má čipový systém PD neobsahuje.</p>			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>		chyba v PD <input checked="" type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			
.....			



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
OP Životní prostředí

**Stanovisko technického dozoru stavby:**

SOUHLASÍM


SL

**Stanovisko projektanta stavby:**

SOUHLASÍM

Am

Příloha:



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
OP Životní prostředí

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<b>číslo ZL: 01</b>
Zhotovitel:	ASJ s.r.o., 503 12 Světí 8, IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861	
Změnový list vystavil:	Jiří Švub	
Datum:	27.04.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Vchodové dveře, okna</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Při prohlídce stávajících oken v budově C bylo zjištěno, že dva kusy oken nejsou uvedeny v PD, jejich technické parametry neodpovídají současným požadovaným parametrům. Z tohoto důvodu musí být okna vyměněna.</p> <p>V budově školy je zavedený bezpečnostní čipový systém. Z tohoto důvodu je nutné doplnit vchodové dveře elektrozámkou a panikovými kováními. Informaci že škola má čipový systém PD neobsahuje.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
,- Kč	<b>41 979,- Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>41 979,- Kč</b>	Nemění se	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 27.04.2018	Datum: <span style="float: right;">IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861</span>	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**asj.**  
stavební firma

Název stavby	Snížení energetické náročnosti budovy školy a tělocvičny SOU Lázně Bělohrad	JKSO	
Název objektu	ZL č.1 Vchodové dveře	EČO	
		Místo	Lázně Bělohrad
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel	ASJ s.r.o.	25281861	CZ25281861
Zpracoval	Ing. Otakar Kubeška		
	Rozpočet číslo	Dne	
		27.04.2018	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky	1 203,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	4 476,00	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	33 408,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	2 892,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Jiné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	41 979,00	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

**D Celkem bez DPH 41 979,00**

**asj.**  
stavební firma

ASJ s.r.o.  
Světlá 8, 503 12  
tel.: +420 495 407 008  
e-mail: asj@asj.cz  
www.asj.cz  
IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861



DPH	%	Základ daně	DPH celkem
Režim přenesení daňové povinnosti:			
snížená	15,0	0,00	
základní	21,0	41 979,00	
Daň odvede zákazník.			

**Cena s DPH 41 979,00**

E	Přípočty a odpočty	
	Dodá zadavatel	0,00
	Klouzavá doložka	0,00
	Zvňhodnění	0,00

# ROZPOČET

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy školy a tělocvičny SOU Lázně Bělohrad

Objekt: ZL č.1 Vchodové dveře

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Ing. Otakar Kubeška

Datum: 27. 4. 2018

Objednatel:

Zhotovitel: ASJ s.r.o.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 5 679,00

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 870,00

1	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	2,520	423,75	1 068,00
2	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	8,400	101,60	853,00
3	622252002	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení	m	25,200	45,90	1 157,00
4	590514840	lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	8,400	14,22	119,00
5	590514750	profil okenní začišťovací s tkaninou - 6 mm/2,4 m	m	16,800	26,46	445,00
6	62913510	Vyrovnávací vrstva pod parapety z MC š do 400 mm	m	2,400	95,00	228,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 364,00

7	968062376	Vybourání dřevěných ráků oken zdvojených včetně křidel pl do 4 m2	m2	3,780	305,28	1 154,00
8	978013191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 %	m2	2,520	58,32	147,00
9	978059641	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2	m2	0,720	87,48	63,00

997 Přesun suť 405,00

10	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,321	488,70	157,00
11	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,321	8,21	3,00
12	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t	0,430	570,00	245,00

998 Přesun hmot 40,00

13	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	0,104	382,20	40,00
----	-----------	---	---	-------	--------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 36 300,00

764 Konstrukce klempířské 931,00

14	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	2,400	37,87	91,00
15	764216643	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	2,400	350,10	840,00

766 Konstrukce truhlářské 12 509,00

16	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	1,000	28,83	29,00
17	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	1,000	46,23	46,00
18	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdíva	m2	1,080	626,53	677,00
19	611400230	okno plastové jednokřídlé vyklápěcí 120 x 90 cm	kus	1,000	3 519,82	3 520,00
20	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdíva	m2	2,700	378,00	1 021,00
21	61140019	okno plastové jednokřídlé otevíravé a vykl. 150 x 180 cm- ozn.OK 11	kus	1,000	4 573,00	4 573,00
22	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - páska	m	11,100	117,33	1 302,00
23	766694121	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,0 m	kus	1,000	146,66	147,00
24	607941050	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,4 x 1 m	m	1,000	410,65	411,00
25	766694122	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,6 m	kus	1,000	146,66	147,00

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

26	607941050	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,4 x 1 m	m	1,000	410,65	411,00
27	607941210	koncovka PVC k parapetním deskám	kus	4,000	46,93	188,00
28	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,037	990,24	37,00

**767 Konstrukce zámečnické**

**22 860,00**

29	76764022	Montáž ocelových stěn s vchodovými dvoukřídlovými dveřmi s pevným bočním dílem a nadsvětlíkem	m2	0,000	0,00	0,00
30	55303	Vhod.dveře DV 1 b - doplnění panikové klíky a el. vrátňý	kus	1,000	7 620,00	7 620,00
31	55304	Vhod.dveře ozn DV 6 - doplnění panikové klíky a el. vrátňý	kus	1,000	7 620,00	7 620,00
32	55305	Vhod.dveře ozn DV 6 b -dopnění panikové klíky a el. vrátňý	kus	1,000	7 620,00	7 620,00

Celkem

41 979,00





EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
OP Životní prostředí


OP Životní prostředí  
číslo OZ: 02

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		<b>číslo OZ: 02</b>			
Zhotovitel:	ASJ s.r.o., 503 12 Světí 8, IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861				
Investor:	Střední odborné učiliště Lázně Bělohrad, Zámecká 478	Datum: 27.04.2018			
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy školy a tělocvičny SOU Lázně Bělohrad					
Způsob odeslání / předání datum: 27.04.2018		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
<b>Odkazy na</b>	specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:				
	na jinou část smlouvy:				
<b>Předmět změny: Záchytný systém</b>					
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
Při vytvoření výrobní dokumentace a po konzultaci s výrobcem záchytného systému došlo k úpravě jednotlivých prvků. Navržené řešení je doplněno o nutné položky a složeno z jiného počtu prvků. Bezpečnost a požadovaná kvalita záchytného systému je zachována, výsledná cena je levnější.					
Počet připojených listů specifikací:					
Důvod vícepráce / méněpráce:					
záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/>		chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:					
.....					



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
OP Životní prostředí

<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b> SOUHLASÍM	SL -
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b> SOUHLASÍM	Am
<b>Příloha:</b>	



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
OP Životní prostředí

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<b>číslo ZL: 02</b>
Zhotovitel:	ASJ s.r.o., 503 12 Světí 8, IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861	
Změnový list vystavil:	Jiří Švub	
Datum:	27.04.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Záchytný systém</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Při vytvoření výrobní dokumentace a po konzultaci s výrobcem záchytného systému došlo k úpravě jednotlivých prvků. Navržené řešení je doplněno o nutné položky a složeno z jiného počtu prvků. Bezpečnost a požadovaná kvalita záchytného systému je zachována, výsledná cena je levnější.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>-45 638,00Kč</b>	<b>36.173,00Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>-9 465,- Kč</b>	Nemění se	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
	  ASJ s.r.o. Světí 8, 503 12 420 495 407 008 email: asj@asj.cz www.asj.cz IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861	
Datum: 27.04.2018	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Název stavby

Snížení energetické náročnosti budovy školy a tělocvičny SOU Lázně Bělohrad

JKSO

Název objektu

ZL č.2 Záchytný systém

EČO

Místo

Lázně Bělohrad

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

ASJ s.r.o.  
Ing. Otakar Kubeška

IČ

DIČ

25281861	CZ25281861

Rozpočet číslo

Dne

27.04.2018

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky	-18 524,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	-4 167,00	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	20 921,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	-7 695,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Jiné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	-9 465,00	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

**D Celkem bez DPH**

**-9 465,00**

**ASJ**  
stavební firma  
ASJ s.r.o.  
Světí 8, 503 12  
tel.: +420 495 407 008  
e-mail: asj@asj.cz  
www.asj.cz  
IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
Režim přenesení daňové povinnosti:			
snížená	15,0	0,00	
základní	21,0	-9 465,00	
Daň odvede zákazník.			

**Cena s DPH**

**-9 465,00**

**E Přípočty a odpočty**

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

# ROZPOČET

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy školy a tělocvičny SOU Lázně Bělohrad  
 Objekt: ZL č.2 Záchytný systém

JKSO:  
 EČO:  
 Zpracoval: Ing. Otakar Kubeška  
 Datum: 27. 4. 2018

Objednatel:  
 Zhotovitel: ASJ s.r.o.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

**HSV Práce a dodávky HSV -21 078,00**

**111 Budova A -21 078,00**

1	953943113	Osazování výrobků do 15 kg/kus do vysekaných kapes zdiva bez jejich dodání	kus	-8,000	350,00	-2 800,00
2	548001	kotvy záchytného systému	kus	-8,000	1 850,00	-14 800,00
3	953961113	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	-32,000	52,83	-1 691,00
4	953965121	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm	kus	-32,000	74,43	-2 382,00
5	76788116	Montáž lana do nástavců v záchytném systému poddajného kotvicího vedení	kus	-8,000	1 850,00	-14 800,00
6	314521090	lano ocelové šestipramenné pozink 6 x 19 drátů D 14,0 mm	m	-0,295	160,00	-47,00
7	311970151	TSL-NAP 6	kus	2,000	4 807,00	9 614,00
8	311970152	TSL-KP 6	kus	2,000	1 222,00	2 444,00
9	311970153	TSL-šiftek	kus	2,000	442,00	884,00
10	311970154	Revizní zpráva a návod k užívání	kus	1,000	2 500,00	2 500,00

**PSV Práce a dodávky PSV 11 613,00**

**711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 4 655,00**

11	711747067	Izolace proti vodě oprávnění trubních prostupu pod objímkou do 300 mm přitavením NAIP	kus	19,000	245,00	4 655,00
----	-----------	---	-----	--------	--------	----------

**112 Budova B 6 958,00**

12	953961113	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	-8,000	52,83	-423,00
13	953965121	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm	kus	-8,000	74,43	-595,00
14	76788112-01	Montáž sloupků záchytného systému	kus	-2,000	350,00	-700,00
15	548001	kotvy záchytného systému	kus	-2,000	1 850,00	-3 700,00
16	76788116	Montáž lana do nástavců v záchytném systému poddajného kotvicího vedení	kus	-2,000	1 850,00	-3 700,00
17	314521090	lano ocelové šestipramenné pozink 6 x 19 drátů D 14,0 mm	m	0,000	160,00	0,00
18	311970151	TSL-NAP 6	kus	1,000	4 807,00	4 807,00
19	311970152	TSL-KP 6	kus	1,000	1 222,00	1 222,00
20	311970153	TSL-šiftek	kus	1,000	442,00	442,00
21	311970154	Revizní zpráva a návod k užívání	kus	1,000	2 500,00	2 500,00

**711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 7 105,00**

22	711747067	Izolace proti vodě oprávnění trubních prostupu pod objímkou do 300 mm přitavením NAIP	kus	29,000	245,00	7 105,00
----	-----------	---	-----	--------	--------	----------

**Celkem -9 465,00**



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
OP Životní prostředí

Ministry of Education, Youth and Sports  
Department of Education  
Czech Republic

<b>. OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		<b>číslo OZ: 03</b>	
Zhotovitel:	ASJ s.r.o., 503 12 Světí 8, IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861		
Investor:	Střední odborné učiliště Lázně Bělohrad, Zámecká 478	Datum: 27.04.2018	
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy školy a tělocvičny SOU Lázně Bělohrad			
Způsob odeslání / předání datum: 27.04.2018	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
<b>Předmět změny: ÚT</b>			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>			
Při prohlídce stavby a při přípravě odvětrávacích otvorů pro vzduchotechnické jednotky bylo zjištěno, že v místě otvorů vedou rozvody ÚT. Jediná možnost je přesunout vedení ÚT a otopná tělesa.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>		chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			
.....			



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
OP Životní prostředí

**Stanovisko technického dozoru stavby:**

SOUHLASÍM

SL —

**Stanovisko projektanta stavby:**

SOUHLASÍM

Am

Příloha:



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
OP Životní prostředí

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<b>číslo ZL: 03</b>
Zhotovitel:	ASJ s.r.o., 503 12 Světi 8, IČ: 25281861, DIČ:CZ25281861	
Změnový list vystavil:	Jiří Švub	
Datum:	27.04.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: ÚT</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Při prohlídce stavby a při přípravě odvětrávacích otvorů pro vzduchotechnické jednotky bylo zjištěno, že v místě otvorů vedou rozvody ÚT. Jediná možnost je přesunout vedení ÚT a otopná tělesa.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>0, Kč</b>	<b>11 092,00Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>11 092,00- Kč</b>	<b>Nemění se</b>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
	  ASJ s.r.o. Světi 8, 503 12 tel: +420 495 407 008 e-mail: asj@asj.cz www.asj.cz IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861	
Datum: 27.04.2018	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**asj.**  
stavební firma

Název stavby	Snížení energetické náročnosti budovy školy a tělocvičny SOU Lázně Bělohrad	JKSO	
Název objektu	ZL č.03 Úpravy UT	EČO	
		Místo	Lázně Bělohrad
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	ASJ s.r.o.	25281861	CZ25281861
Zpracoval	Ing. Otakar Kubeška		
	Rozpočet číslo	Dne	
		27.04.2018	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	3 490,94	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	7 601,06	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		11 092,00	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



ASJ s.r.o.  
Světí 8, 503 12  
tel.: +420 495 407 008  
e-mail: asj@asj.cz  
www.asj.cz  
IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861

**D Celkem bez DPH 11 092,00**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
-----	---	-------------	------------

Režim přenesení daňové povinnosti:

snížená	15,0	0,00	
základní	21,0	11 092,00	

Daň odvede zákazník.

**Cena s DPH 11 092,00**

**E Přípočty a odpočty**

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

# ROZPOČET

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy školy a tělocvičny SOU Lázně Bělohrad

Objekt: ZL č.03 Úpravy UT

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Ing. Otakar Kubeška

Datum: 27. 4. 2018

Objednatel:

Zhotovitel: ASJ s.r.o.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

**PSV** Práce a dodávky PSV **11 092,00**

**735** Ústřední vytápění - otopná tělesa **11 092,00**

1	735120999.1	Úpravy topného systému pro montáž jednotek VZD, vypuštění a doplnění systému,	kus	1,000	11 092,00	11 092,00
---	-------------	---	-----	-------	-----------	-----------

Celkem **11 092,00**



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
OP Životní prostředí

Průběh práce

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		<b>číslo OZ: 04</b>	
Zhotovitel:	ASJ s.r.o., 503 12 Světí 8, IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861		
Investor:	Střední odborné učiliště Lázně Bělohrad, Zámecká 478	Datum: 27.04.2018	
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy školy a tělocvičny SOU Lázně Bělohrad			
Způsob odeslání / předání datum: 27.04.2018	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
<b>Odkazy na</b>	specifikaci:		
	na výkresy:	Detail č.2, detail č. 3	
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
<b>Předmět změny: ATIKA</b>			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>			
Po prohlídce střechy a zjištění skutečného stavu atiky, byly provedeny úpravy detailů. V PD nebyl detail prodloužení atiky, v rozpočtu bylo nastavení žb věncem což se ukázalo jako nadbytečné a výškově chybné. Detail u okapu v PD chyběl. Atika na budově A nebyla ukončena pevnou deskou, která umožňuje spojení s asfaltovým pásem.			
Počet připojených listů specifikací: 2			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>		chyba v PD <input checked="" type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			
.....			



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
OP Životní prostředí

**Stanovisko technického dozoru stavby:**

SOUHLASÍM

S I \_

**Stanovisko projektanta stavby:**

SOUHLASÍM

am

Příloha: detail č. 2, detail č. 3




EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
OP Životní prostředí

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<b>číslo ZL: 04</b>
Zhotovitel:	ASJ s.r.o., 503 12 Světí 8, IČ: 25281861, DIČ:CZ25281861	
Změnový list vystavil:	Jiří Švub	
Datum:	27.04.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: ATIKA</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Po prohlídce střechy a zjištění skutečného stavu atiky, byla provedena úpravy detailu. V PD nebyl detail prodloužení atiky, v rozpočtu bylo nastavení žb věncem což se ukázalo jako nadbytečné a výškově chybné. Detail u okapu v PD chyběl. Atika na budově A nebyla ukončena pevnou deskou která umožňuje spojení s asfaltovým pásem.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>-156 393, Kč</b>	<b>136 225,-Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>-20 168,- Kč</b>	Nemění se	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
	  ASJ s.r.o. Světí 8, 503 12 tel.: +420 495 407 008 e-mail: asj@asj.cz www.asj.cz IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861	
Datum: 27.04.2018	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

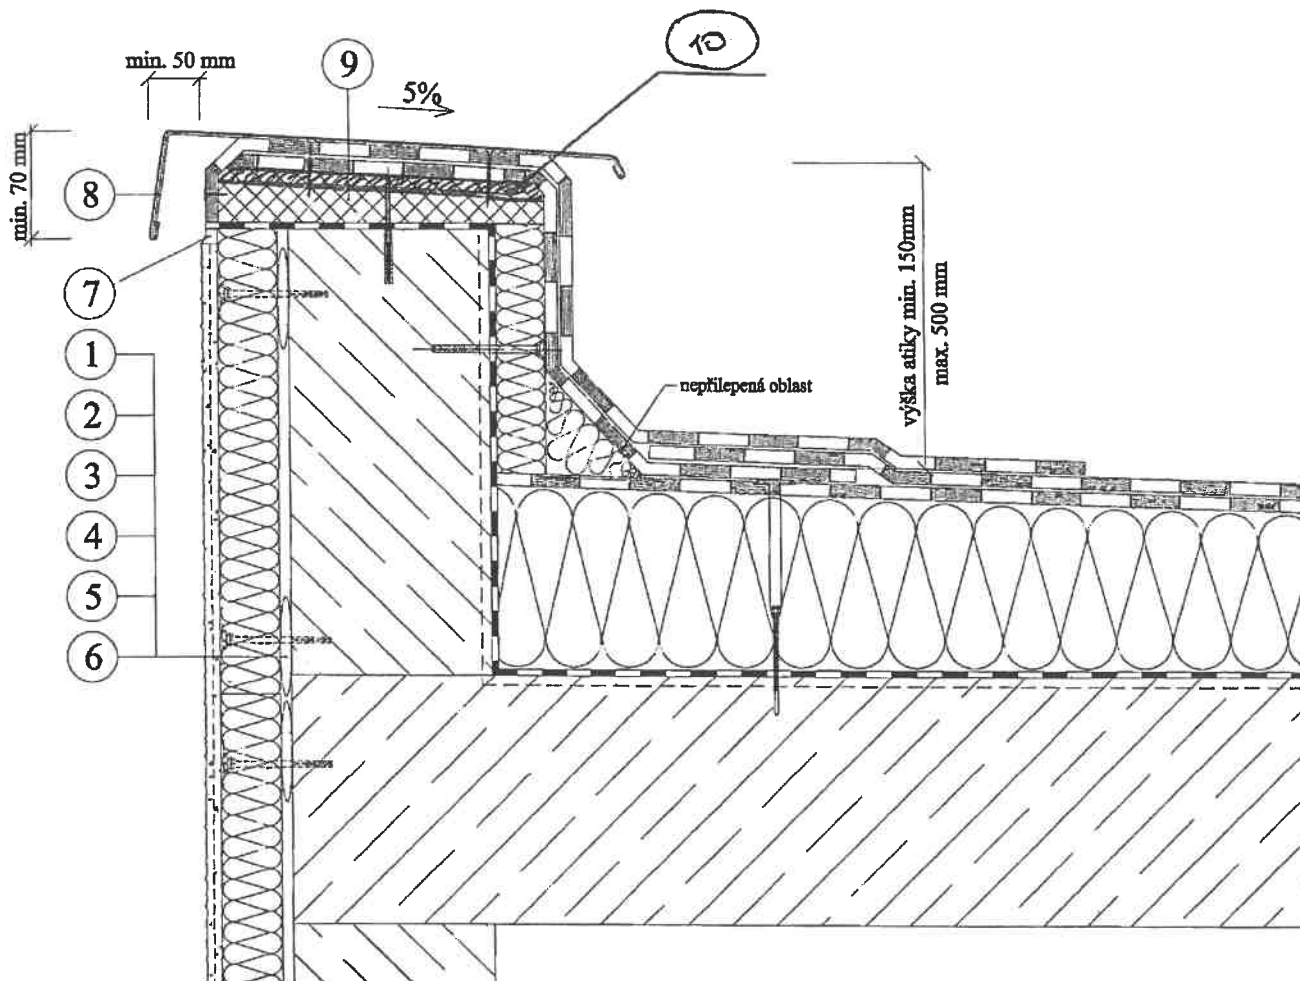


- 1-LÉPÍČÍ STĚRKA
- 2-TEPELNÁ IZOLACE EPS 70F, tl. 150mm
- 3-SKLOTEXILNÍ SÍŤOVINA
- 4-LÉPÍČÍ STĚRKA
- 5-TÓNOVANÝ ZÁKLAD
- 6-SILIKONOVÁ OMÍTKA
- 7-SILIKONOVÝ TMEĽ
- 8-OPLECHOVÁNÍ ATIKY
- 9-PŘEKRYVKA ATIKY


10 - OSB deska tl. 18mm

ODP. PROJEKTANT Ing. Milan Pour	VYPRACOVAL Ing. David Pour	KRESLIL	KONTROLOVAL	Ing. Milan Pour Haklova 1317 508 01 Hořice v Podkrkonoší tel. 605 531 718 IČO 16742613		
KRAJ Královéhradecký		OBEC Lázně Bělohrad				
INVESTOR Střední odborné učiliště, Lázně Bělohrad, Zámecká 478						
LÁZŇĚ BĚLOHRAD - Zámecká 478 Snížení energetické náročnosti budovy školy a tělocvičny SOU				ZAK. ČÍSLO	006-2016	
				ARCHIVNÍ Č.		
				FORMÁT	A4	
				DATUM	03/2016	
DETAIL D2				STUPEŇ	MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
				DPS		D.1.1.c.3

# DETAIL OKAPOVÁ HRANA (BUDOVA C)

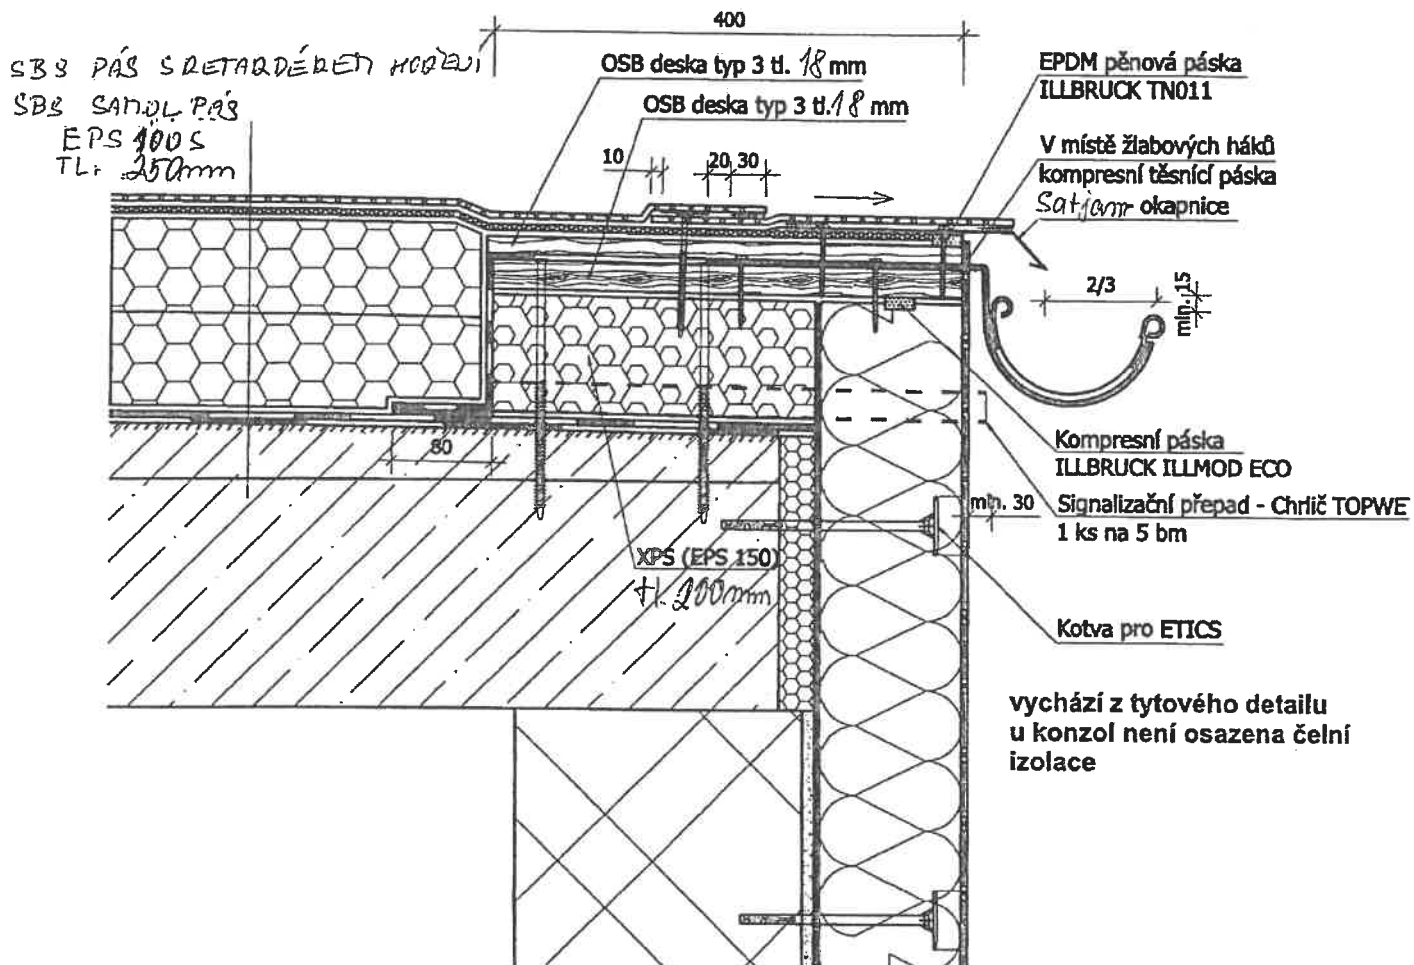


Profily z poplastovaného plechu



Ukončení u okapu - D3

# DETAIL ATILKA (BUDOVA C)

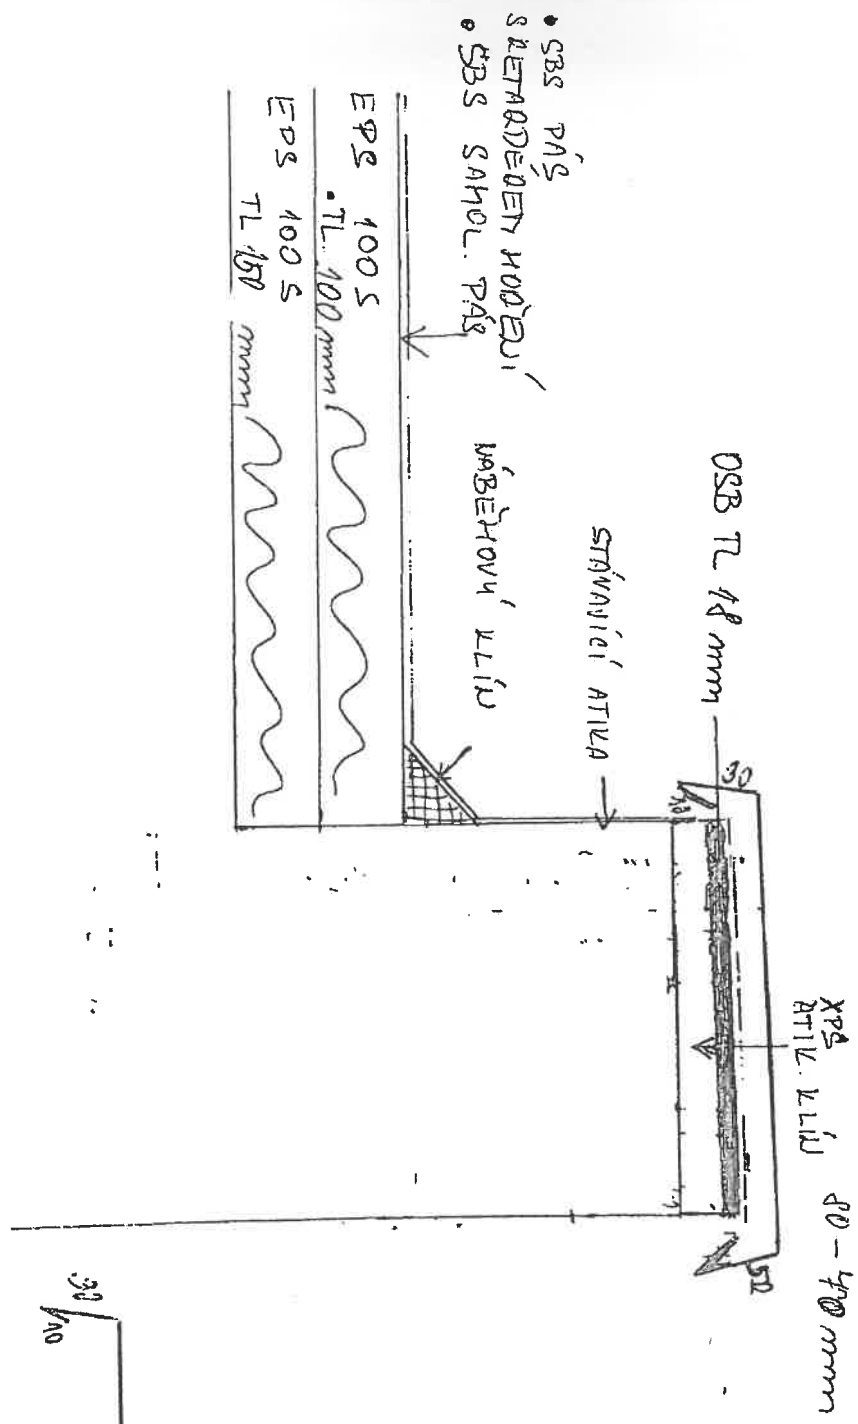



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**ASJ.**  
stavební firma

Název stavby

Snižení energetické náročnosti budovy školy a tělocvičny SOU  
Lázně Bělohrad

JKSO

Název objektu

ZL č.04 Atiky

EČO

Místo

Lázně Bělohrad

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

ASJ s.r.o.

Zpracoval

Ing. Otakar Kubeška

iČ

DIČ

25281861

CZ25281861

Rozpočet číslo

Dne

27.04.2018

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	-117 931,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	-23 011,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	80 979,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	39 795,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř.)		-20 168,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

**D Celkem bez DPH -20 168,00**

**ASJ.**  
stavební firma

ASJ s.r.o.  
Světí 8, 503 12  
tel.: +420 495 407 008  
e-mail: asj@asj.cz  
www.asj.cz  
IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
Režim přenesení daňové povinnosti:			
snížená	15,0	0,00	
základní	21,0	-20 168,00	
Daň odvede zákazník.			

**Cena s DPH -20 168,00**

**E Přípočty a odpočty**

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

# ROZPOČET

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy školy a tělocvičny SOU Lázně Bělohrad  
 Objekt: ZL č.04 Atiky

JKSO:  
 EČO:  
 Zpracoval: Ing. Otakar Kubeška  
 Datum: 27. 4. 2018

Objednatel:  
 Zhotovitel: ASJ s.r.o.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV -140 942,00

3 Svislé a kompletní konstrukce 15 451,00

1	311272231.X LA	Zdlvo z tvárnice Ytong P4-500 300 PD tl zdlva 300 mm	m2	12,113	1 275,55	15 451,00
---	-------------------	--	----	--------	----------	-----------

4 Vodorovné konstrukce -156 393,00


2	417321313	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20	m3	-10,513	2 232,00	-23 465,00
3	417352411	Ztracené bednění věnců z pórabetonových U-profilů na zdech tl 375 mm	m	-212,810	494,40	-105 213,00
4	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	-1,053	26 320,00	-27 715,00

PSV Práce a dodávky PSV 120 774,00

762 Konstrukce tesařské 120 774,00


5	7623410.1	Uprava u okapu - detail č. 3	bm	25,400	765,00	19 431,00
6	7623410.2	Uprava u atiky - detail č. 2 doplnění OSB, kotvení	bm	201,715	386,00	77 862,00
7	7623410.3	Uprava u atiky - detail č. 2 doplnění OSB desky vč. kotvení š.800 mm	bm	50,496	465,00	23 481,00

Celkem -20 168,00



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
OP Životní prostředí

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		<i>číslo OZ: 05</i>			
Zhotovitel:	ASJ s.r.o., 503 12 Světí 8, IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861				
Investor:	Střední odborné učiliště Lázně Bělohrad, Zámecká 478	Datum: 27. 04. 2018			
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy školy a tělocvičny SOU Lázně Bělohrad					
Způsob odeslání / předání datum: 27. 04. 2018		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
<b>Odkazy na</b>	specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:				
	na jinou část smlouvy:				
<b>Předmět změny: VÝLEZ NA STŘECHU</b>					
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
Při prohlídce prostoru pro umístění výlezu na střechu se skládacím ocel. žebříkem bylo zjištěno, že nelze výlez se stahovacími schody do tohoto prostoru umístit. Šachta je menšího rozměru než udává v požadavcích výrobce výlezu. Bylo rozhodnuto ponechat stávající ocelový žebřík.					
Počet připojených listů specifikací:					
Důvod vícepráce / méněpráce:					
záměr objednatele <input type="checkbox"/>		chyba v PD <input checked="" type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:					
.....					



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
OP Životní prostředí

**Stanovisko technického dozoru stavby:**

SOUHLASÍM

SL —

**Stanovisko projektanta stavby:**

SOUHLASÍM

Am

Příloha:



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
OP Životní prostředí

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<b>číslo ZL: 05</b>
Zhotovitel:	ASJ s.r.o., 503 12 Světí 8, IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861	
Změnový list vystavil:	Jiří Švub	
Datum:	27.04.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: VÝLEZ NA STŘECHU</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Při prohlídce prostoru pro umístění výlezu na střechnu se skládacím ocel. žebříkem bylo zjištěno, že nelze výlez se stahovacími schody do tohoto prostoru umístit. Šachta je menšího rozměru než udává v požadavcích výrobce výlezu. Bylo rozhodnuto ponechat stávající ocelový žebřík.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>-97 560, Kč</b>	<b>88.800,-Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>-8 760,- Kč</b>	<b>Nemění se</b>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
	 ASJ s.r.o. Světí 8, 503 12 tel.: +420 495 407 100 e-mail: asj@asj.cz www.asj.cz 	
Datum: 27.04.2018	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Název stavby	Snížení energetické náročnosti budovy školy a tělocvičny SOU Lázně Bělohrad	JKSO	
Název objektu	ZL č. 05 Výlez na střechu	EČO	
		Místo	Lázně Bělohrad
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel	ASJ s.r.o.	25281861	CZ25281861
Zpracoval	Ing. Otakar Kubeška		
	Rozpočet číslo	Dne	
		27.04.2018	

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C						
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby						
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00	
3	PSV	Dodávky	-7 960,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00	
4		Montáž	-800,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		-8 760,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00	
Projektant, Zhotovitel, Objednatel							D	Celkem bez DPH		-8 760,00
 ASJ s.r.o. Světi 8, 503 12 tel.: +420 495 407 008 e-mail: asj@asj.cz www.asj.cz IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861							DPH	%	Základ daně	DPH celkem
							Režim přenesení daňové povinnosti:			
							snížená	15,0	0,00	
							základní	21,0	-8 760,00	
							Daň odvede zákazník.			
							Cena s DPH		-8 760,00	
							E	Přípočty a odpočty		
							Dodá zadavatel		0,00	
							Klouzavá doložka		0,00	
							Zvýhodnění		0,00	

# ROZPOČET

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy školy a tělocvičny SOU Lázně Bělohrad

Objekt: ZL č. 05 Výlez na střechech

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Ing. Otakar Kubeška

Datum: 27. 4. 2018

Objednatel:

Zhotovitel: ASJ s.r.o.

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV HSV -8 760,00

11 Budova B -4 380,00

1	76731121-01	Montáž výlezu na střechech ,s pož odolností a zateplený s ocelovým žebříkem dle vykr.č. D.1.1.b.4	ks	-1,000	2 600,00	-2 600,00
2	7673112.1	Montáž výlezu na střechech ,s pož odolností a zateplený dle vykr.č. D.1.1.b.4	ks	1,000	2 200,00	2 200,00
3	61233174	Výlez na střechech ,protipožární uzávěr-vlko s protipožární,protihlukovou a zateplovací vložkou vč. ocel žebříku dle výkr.č. D.1.1.b.4	s	-1,000	46 180,00	-46 180,00
4	61233185	Výlez na střechech ,protipožární uzávěr-vlko s protipožární,protihlukovou a zateplovací vložkou dle výkr.č. D.1.1.b.4	s	1,000	42 200,00	42 200,00

PSV Budova A -4 380,00

5	76731121	Montáž výlezu na střechech ,s pož odolností a zateplený s ocelovým žebříkem dle vykr.č. D.1.1.b.4	ks	-1,000	2 600,00	-2 600,00
6	76731121-02	Montáž výlezu na střechech ,s pož odolností a zateplený dle vykr.č. D.1.1.b.4	ks	1,000	2 200,00	2 200,00
7	61233174	Výlez na střechech ,protipožární uzávěr-vlko s protipožární,protihlukovou a zateplovací vložkou vč. ocel žebříku dle výkr.č. D.1.1.b.4	s	-1,000	46 180,00	-46 180,00
8	61233185	Výlez na střechech ,protipožární uzávěr-vlko s protipožární,protihlukovou a zateplovací vložkou dle výkr.č. D.1.1.b.4	s	1,000	42 200,00	42 200,00


Celkem -8 760,00



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
OP Životní prostředí

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		<b>číslo OZ: 06</b>	
Zhotovitel:	ASJ s.r.o., 503 12 Světí 8, IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861		
Investor:	Střední odborné učiliště Lázně Bělohrad, Zámecká 478	Datum: 30.04.2018	
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy školy a tělocvičny SOU Lázně Bělohrad			
Způsob odeslání / předání datum: 30.04.2018	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
<b>Odkazy na</b>	specifikaci:		
	na výkresy:		
na rozpočtové podklady:	<input checked="" type="checkbox"/>		
na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny: Sanační omítky, chemická izolace, sítě</b>			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>			
Po provedeném měření stávající vlhkosti zdiva v budově C bylo zjištěno, že naměřené hodnoty se pohybují v rozmezí 4,2 – 4,7 % a sanační omítky nejsou potřeba. Z důvodu bezpečnosti a technologických předpisů při opravě fasády je nutno doplnit práce na lešení o pronájem sítí. Pronájem sítí PD neobsahovala.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>		chyba v PD <input checked="" type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			
.....			





EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
OP Životní prostředí

**Stanovisko technického dozoru stavby:**

SOUHLASÍM

SL

**Stanovisko projektanta stavby:**

SOUHLASÍM

Am

Příloha:



<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<b>číslo ZL: 06</b>
Zhotovitel:	ASJ s.r.o., 503 12 Světí 8, IČ: 25281861, DIČ:CZ25281861	
Změnový list vystavil:	Jiří Švub	
Datum:	30.04.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Sanační omítky, chemická izolace, sítě</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Po provedeném měření stávající vlhkosti zdiva v budově C bylo zjištěno, že naměřené hodnoty se pohybují v rozmezí 4,2 – 4,7 % a sanační omítky nejsou potřeba.</p> <p>Z důvodu bezpečnosti a technologických předpisů při opravě fasády je nutno doplnit práce na lešení o pronájem sítí. Pronájem sítí PD neobsahovala.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>-78 592, Kč</b>	<b>121 750,-Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>43 158,- Kč</b>	Nemění se	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 30.04.2018	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

## Vyjádření dodavatele KZS

**Objekt: SOU Lázně Bělohrad  
Zámecká 478  
Lázně Bělohrad**

Věc:  
Měření vlhkosti a návrh případných opatření.

Dne 11.4.2018 jsem na žádost firmy ASJ provedl měření vlhkosti na zatepované budově SOU Lázně Bělohrad.

Provedl jsem měření příložným vlhkoměrem HYGRO METR D-87629 uvnitř a vně budovy s tímto výsledkem:

### prostory šaten a sprch.

- Naměřené hodnoty 4,2% - 4,7% (na povrchu)
- v těchto prostorách nejsou žádné projevy vlhkosti.
- Zde není nutné provádět žádné opatření ve smyslu odvodu vlhkosti ze zdiva.

### Prostory toalet (směrem do dvora)

- provedena sonda v místech kde vykazuje omítka degradaci.
- Naměřená vlhkost omítky 5,4- 6% - omítka je vlhká
- naměřené hodnoty zdiva 4,1% - zdivo je suché
- degradace omítky může být způsobena nevhodně provedeným detailem soklík/dlažba. Domnívám se, že při mytí podlahy voda zatéká touto spárou.
- Doporučuji opravit omítku běžným způsobem a zajistit spáru trvale pružným tmelem.

### Venkovní protistrana toalet (ze dvora)

- Naměřené hodnoty jsou ve velkém rozpětí 6,9% vyšoký stupeň zavlhčení až po 11,7% což je velmi vysoké zavlhčení.
- Jsou patrné projevy solí
- Zde doporučuji provést hydrofobizaci zdiva která bude zároveň plnit funkci vodorovné hydroizolace. Provést chemickou clonu pomocí vrtů a chemické injektáže tak jak je navrženo v PD.

V Hradci Králové 20.4.2018

**Ladislav Hájek**

technik


**Saint-Gobain Weber Terranova, a.s.**

mobil: +420 724 345 078


e-mail: [ladislav.hajek@weber-terranova.cz](mailto:ladislav.hajek@weber-terranova.cz)

fotodokumentace k vyjádření



Sprchy:

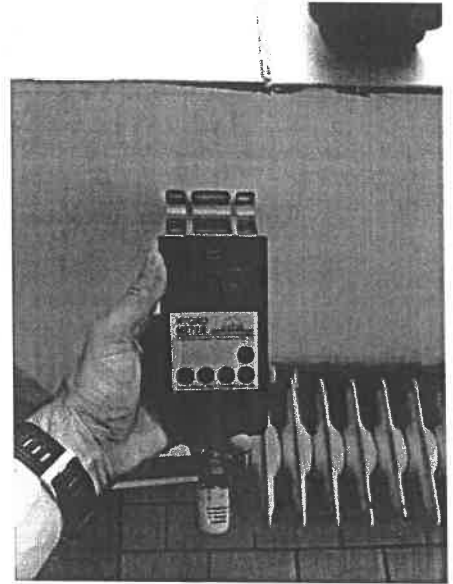

Toalety uvnitř:

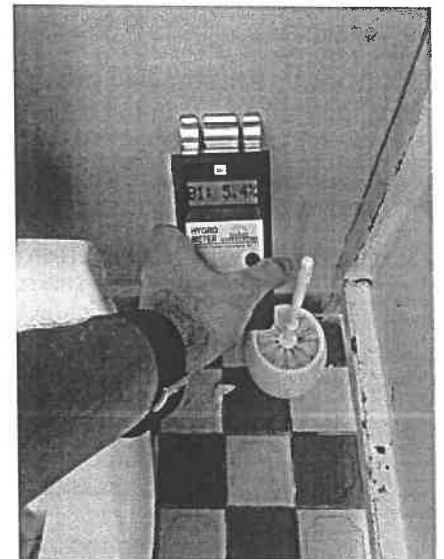

Venkovní strana:

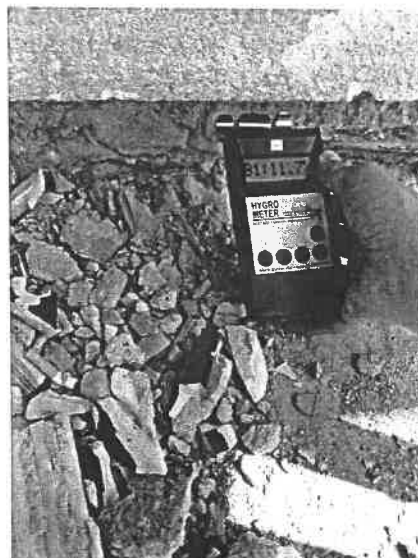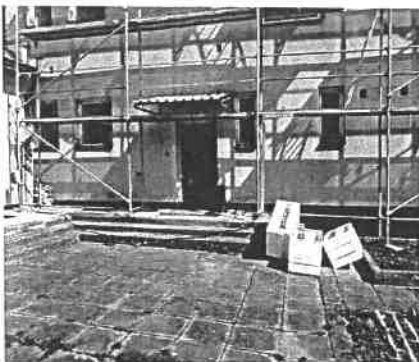

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**ASJ.**  
stavební firma

Název stavby

Snižování energetické náročnosti budovy školy a tělocvičny SOU Lázně Bělohrad

JKSO

Název objektu

ZL č. 06 sanační omítky, chemická izolace

EČO

Místo

Lázně Bělohrad

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

ASJ s.r.o.

Zpracoval

Ing. Otakar Kubeška

IČ

DIČ

25281861

CZ25281861

Rozpočet číslo

Dne

27.04.2018

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	55 265,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	-8 385,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	-2 033,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	-1 689,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		43 158,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

**D Celkem bez DPH**

**43 158,00**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
Režim přenesení daňové povinnosti:			
snížená	15,0	0,00	
základní	21,0	43 158,00	
Daň odvede zákazník.			

**Cena s DPH**


**43 158,00**

**E Přípočty a odpočty**

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

**ASJ.**  
stavební firma

ASJ s.r.o.  
Světí 8, 503 12  
tel.: +420 495 407 008  
e-mail: asj@asj.cz  
www.asj.cz  
IČ: 25281861




# ROZPOČET

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy školy a tělocvičny SOU Lázně Bělohrad  
 Objekt: ZL č. 06 sanační omítky, chemická izolace

JKSO:  
 EČO:  
 Zpracoval: Ing. Otakar Kubeška  
 Datum: 27. 4. 2018


Objednatel:  
 Zhotovitel: ASJ s.r.o.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>46 880,00</b>
<b>3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>19 853,00</b>
1	319202213	Dodatečná izolace zdíva tl 450 mm beztlakovou injektáží silikonovou mlkroemulzí	m	-23.600	1 647,00	-38 869,00
2	319202215	Dodatečná izolace zdíva tl do 900 mm beztlakovou injektáží silikonovou mikroemulzí	m	23.600	2 488,20	58 722,00
<b>6</b>		<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				<b>-30 816,00</b>
3	612821001	Vnitřní sanační zatřená omítka pro vlhké zdivo prov. ručně -pod obklad	m2	-6.700	385,20	-2 581,00
4	612821012	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m2	-37.990	609,30	-23 147,00
5	612821031	Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně	m2	-22,345	227,70	-5 088,00
<b>9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>60 362,00</b>
6	629991011	M+ demontáž ochranné a stínící sítě fasády na lešení AB	m2	1 837,410	0,00	0,00
7	629991011	M+ demontáž ochranné a stínící sítě fasády na lešení	m2	1 664,132	0,00	0,00
8	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	210 092,520	0,30	63 028,00
9	978013191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 %	m2	-37.990	58,32	-2 216,00
10	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	-6,700	67,23	-450,00
<b>997</b>		<b>Přesun sutě</b>				<b>-2 519,00</b>
11	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	-2.203	325,80	-718,00
12	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-2.203	126,00	-278,00
13	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-2.203	7,30	-16,00
14	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládku (skládkovně)	t	-2.203	684,00	-1 507,00
<b>PSV</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>-3 722,00</b>
<b>781</b>		<b>Dokončovací práce - obklady</b>				<b>-3 722,00</b>
15	781474117	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	-6.700	327,60	-2 195,00
16	597612550	obkládačky keramické	m2	-7,370	201,60	-1 486,00
17	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	-0,096	423,00	-41,00
<b>Celkem</b>						<b>43 158,00</b>



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
OP Životní prostředí

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		<i>číslo OZ: 07</i>	
Zhotovitel:	ASJ s.r.o., 503 12 Světí 8, IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861		
Investor:	Střední odborné učiliště Lázně Bělohrad, Zámecká 478	Datum: 30.04.2018	
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy školy a tělocvičny SOU Lázně Bělohrad			
Způsob odeslání / předání datum: 30.04.2018	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
<b>Odkazy na</b>	specifikaci:		
	na výkresy:		
na rozpočtové podklady:	<b>x</b>		
na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny: Mřížky</b>			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>			
Při prohlídce fasády byl zjištěn havarijní stav ventilačních mřížek a dvířek HUP, nutno vyměnit za nové.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			
.....			



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
OP Životní prostředí

**Stanovisko technického dozoru stavby:**

SOUHLASÍM

SL —


**Stanovisko projektanta stavby:**

SOUHLASÍM

Am

Příloha:





EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
OP Životní prostředí

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<b>číslo ZL: 07</b>
Zhotovitel:	ASJ s.r.o., 503 12 Světí 8, IČ: 25281861, DIČ:CZ25281861	
Změnový list vystavil:	Jiří Švub	
Datum:	30.04.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Mřížky</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Při prohlídce fasády byl zjištěn havarijný stav ventilačních mřížek a dvířek HUP, nutno vyměnit za nové.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>0</b>	<b>10 920,-Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>10 920,- Kč</b>	<b>Nemění se</b>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
	 ASJ s.r.o. Světí 8, 503 12 tel.: +420 495 407 008 e-mail: asj@asj.cz www.asj.cz IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861 	
Datum: 30.04.2018	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Název stavby	Snižení energetické náročnosti budovy školy a tělocvičny SOU Lázně Bělohrad	JKSO	
Název objektu	ZL č 07 mřížky	EČO	
		Místo	Lázně Bělohrad
		IČ	DiČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel	ASJ s.r.o.	25281861	CZ25281861
Zpracoval	Ing. Otakar Kubeška		
	Rozpočet číslo	Dne	
		27.04.2018	

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	9 628,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveníště		0,00
2		Montáž	1 292,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		10 920,00	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

**D Celkem bez DPH 10 920,00**

**ASJ.**  
 stavební firma  
 ASJ s.r.o.  
 Světi 8, 503 12  
 tel.: +420 495 407 008  
 e-mail: asj@asj.cz  
 www.asj.cz  
 IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
Režim přenesení daňové povinnosti:			
snížená	15,0	0,00	
základní	21,0	10 920,00	
Daň odvede zákazník.			

**Cena s DPH 10 920,00**

**E Přípočty a odpočty**

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

# ROZPOČET

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy školy a tělocvičny SOU Lázně Bělohrad

Objekt: ZL č 07 mřížky

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Ing. Otakar Kubeška

Datum: 27. 4. 2018

Objednatel:

Zhotovitel: ASJ s.r.o.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 10 920,00

3 Svislé a kompletní konstrukce 3 576,00

1	34827394.1	Revizní kovová dvířka 700x850 mm osazená do fasády zateplovacího systému	kus	1,000	3 576,00	3 576,00
---	------------	--	-----	-------	----------	----------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7 344,00

2	644941112.1	Osazování ventilačních mřížek velikostí do 400 x 400 mm se zhotovením otvoru v tepelné izolaci	kus	4,000	297,00	1 188,00
---	-------------	--	-----	-------	--------	----------


3	56245601.1	mřížka větrací hranatá kovová a povrch. úpravou a žaluzií 400x400 se síťovinou	kus	4,000	1 539,00	6 156,00
---	------------	--	-----	-------	----------	----------

Celkem 10 920,00



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
OP Životní prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 08	
Zhotovitel:	ASJ s.r.o., 503 12 Světí 8, IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861		
Investor:	Střední odborné učiliště Lázně Bělohrad, Zámecká 478	Datum: 30.04.2018	
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy školy a tělocvičny SOU Lázně Bělohrad			
Způsob odeslání / předání datum: 30.04.2018	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	x		
na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny: Zádveří</b>			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>			
Po prohlídce ocelového zádveří u hlavního vstupu bylo zjištěno, že nelze provést jeho opravu. Stávající zádveří je tvořeno z pevně zasklených polí do ocel. profilů, které se již nevyrábějí, a stávající skleněné tabule nejde dělit. Z tohoto důvodu je nutné vyrobit nové zádveří.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			
.....			



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
OP Životní prostředí

**Stanovisko technického dozoru stavby:**

SOUHLASÍ

SL

**Stanovisko projektanta stavby:**

SOUHLASÍM

Am

Příloha:



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
OP Životní prostředí

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<b>číslo ZL: 08</b>
Zhotovitel:	ASJ s.r.o., 503 12 Světí 8, IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861	
Změnový list vystavil:	Jiří Švub	
Datum:	30.04.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: zádveří</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Po prohlídce ocelového zádveří u hlavního vstupu bylo zjištěno, že nelze provést jeho opravu. Stávající zádveří je tvořeno z pevně zasklených polí do ocel. profilů, které se již nevyrábějí, a stávající skleněné tabule nejde dělit. Z tohoto důvodu je nutné vyrobit nové zádveří.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>-6.500, Kč</b>	<b>47 280,-Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>40 780,- Kč</b>	<b>Nemění se</b>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
	 ASJ. stavební firma ASJ s.r.o. Světí 8, 503 12 tel.: +420 495 407 008 e-mail: asj@asj.cz www.asj.cz IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861	
Datum: 30.04.2018	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Název stavby	Snížení energetické náročnosti budovy školy a tělocvičny SOU Lázně Bělohrad	JKSO	
Název objektu	ZL č.08 Zadveří	EČO	
		Místo	Lázně Bělohrad
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel	ASJ s.r.o.	25281861	CZ25281861
Zpracoval	Ing. Otakar Kubeška		
	Rozpočet číslo		Dne
			27.04.2018

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 371,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 1 414,00	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 42 706,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž -3 711,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 40 780,00	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



ASJ s.r.o.  
Světí 8, 503 12  
tel.: +420 495 407 008  
e-mail: asj@asj.cz  
www.asj.cz

IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861

**D Celkem bez DPH 40 780,00**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
-----	---	-------------	------------

Režim přenesení daňové povinnosti:

snížená	15,0	0,00
základní	21,0	40 780,00

Daň odvede zákazník.

**Cena s DPH 40 780,00**

**E Přípočty a odpočty**

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

# ROZPOČET

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy školy a tělocvičny SOU Lázně Bělohrad

Objekt: ZL č.08 Zadveří

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Ing. Otakar Kubeška

Datum: 27. 4. 2018

Objednatel:

Zhotovitel: ASJ s.r.o.


P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
	<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>1 785,00</b>
	<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>1 414,00</b>
1	968072641	Vybourání kovových stěn kromě výkladních	m2	5,700	248,10	1 414,00
	<b>997</b>	<b>Přesun sutě</b>				<b>371,00</b>
2	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,650	570,00	371,00
	<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>38 995,00</b>
	<b>764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>700,00</b>
3	764216643	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	2,000	350,10	700,00
	<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>38 295,00</b>
4	767610117	Montáž oken kovových jednoduchých pevných do zdiva plochy do 2,5 m2	m2	5,700	488,07	2 782,00
5	55341563	okno Al s fixním zasklením 2850x2000mm	kus	1,000	42 013,00	42 013,00
6	7679919	Oprava a úprava ocel. stěny u vstupu	s	-1,000	6 500,00	-6 500,00
	<b>Celkem</b>					<b>40 780,00</b>





EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
OP Životní prostředí

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		<b>číslo OZ: 09</b>	
Zhotovitel:	ASJ s.r.o., 503 12 Světí 8, IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861		
Investor:	Střední odborné učiliště Lázně Bělohrad, Zámecká 478	Datum: 30.04.2018	
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy školy a tělocvičny SOU Lázně Bělohrad			
Způsob odeslání / předání datum: 30.04.2018	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
<b>Odkazy na</b>	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
<b>Předmět změny: Změna umístění VZD jednotek</b>			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>			
Z předloženého posudku statika vyplynulo, že VZD jednotky z důvodu hmotnosti jednotek a nosnosti střešní konstrukce nelze umístit na střechu. Nadstřešní jednotky byly nahrazeny jednou jednotkou stejného výkonu na terén za halu. Rozvod vzduchu byl proveden vzduchotechnickým potrubím.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>		chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			
.....			



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
OP Životní prostředí

**Stanovisko technického dozoru stavby:**

SOUHLASÍM


SL

**Stanovisko projektanta stavby:**

SOUHLASÍM

pm

Příloha: č. 1 – Posouzení stávající konstrukce



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
OP Životní prostředí

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<b>číslo ZL: 09</b>
Zhotovitel:	ASJ s.r.o., 503 12 Světí 8, IČ: 25281861, DIČ:CZ25281861	
Změnový list vystavil:	Jiří Švub	
Datum:	30.04.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Změna umístění VZD jednotek</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Z předloženého posudku statika vyplynulo, že VZD jednotky z důvodu hmotnosti jednotek a nosnosti střešní konstrukce nelze umístit na střechu. Nadstřešní jednotky byly nahrazeny jednou jednotkou stejného výkonu na terén za halu. Rozvod vzduchu byl proveden vzduchotechnickým potrubím.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>1 602 961, Kč</b>	<b>1 693 792 ,-Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>90 831- Kč</b>	Nemění se	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
	 ASJ s.r.o. Světí 8, 503 12 tel.: +420 495 407 008 e-mail: asj@asj.cz www.asj.cz IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861 	
Datum: 30.04.2018	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**asj.**  
stavební firma

Název stavby

Snížení energetické náročnosti budovy školy a tělocvičny SOU  
Lázně Bělohrad

JKSO

Název objektu

ZL č.09 VZD jednotky tělocvičny

EČO

Místo

Lázně Bělohrad

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

ASJ s.r.o.

Ing. Otakar Kubeška

IČ

DIČ

25281861

CZ25281861

Rozpočet číslo

Dne

27.04.2018

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby			
1	HSV Dodávky	21 113,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	16 399,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	-1 534 477,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4	Montáž	1 587 796,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6	Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-8)	90 831,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

**D Celkem bez DPH 90 831,00**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
Režim přenesení daňové povinnosti:			
snižovaná	15,0	0,00	
základní	21,0	90 831,00	
Daň odvede zákazník.			


**Cena s DPH 90 831,00**

## E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

**asj.**  
stavební firma

ASJ s.r.o.  
Světi 8, 503 12  
tel.: +420 495 407 008  
e-mail: asj@asj.cz  
www.asj.cz  
IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861



# ROZPOČET

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy školy a tělocvičny SOU Lázně Bělohrad

Objekt: ZL č.09 VZD jednotky tělocvičny

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Ing. Otakar Kubeška

Datum: 27. 4. 2018

Objednatel:

Zhotovitel: ASJ s.r.o.

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

**HSV Práce a dodávky HSV- základ pod VZD jednotku 37 512,00**

**1 Zemní práce 12 902,00**

1	121112111	Sejmutí ornice tl vrstvy do 150 mm ručně s vodorovným přemístěním do 50 m	m3	2,260	401,94	908,00
2	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneu nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	11,298	584,64	6 605,00
3	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	11,298	75,69	855,00
4	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	11,298	68,99	779,00
5	162701104	Vodorovné přemístění do 9000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	11,298	185,31	2 094,00
6	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	11,298	147,03	1 661,00

**2 Zakládání 24 610,00**

7	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	22,596	5,20	117,00
8	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	4,519	2 340,30	10 576,00
9	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	5,144	637,67	3 280,00
10	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	5,144	82,56	425,00
11	273362021	Výtuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,138	27 318,00	3 715,00
12	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	2,940	2 209,80	6 497,00

**PSV Práce a dodávky PSV 53 319,00**

**751 Vzduchotechnika 161 273,00**

13	75101	Montáž rekuperační jednotky	s	-2,000	17 500,00	-35 000,00
14	99901	Dodávka rekuperační jednotky	s	-2,000	730 003,55	-1 460 007,00
15	75172112.1	Montáž a dodávka klimatizační jednotky venkovní s trojfázovým napájením	kus	1,000	793 600,00	793 600,00
16	75172112.2	Tlumič hluku	kus	1,000	60 000,00	60 000,00
17	75172112.3	VZD potrubí čtyřhranné	kus	1,000	143 040,00	143 040,00
18	75172112.4	Textilní potrubí pro přívod vzduchu	kpl	1,000	178 500,00	178 500,00
19	75172112.5	Venkovní provedení tepelné izolace - plech	kpl	1,000	297 500,00	297 500,00
20	75172112.6	Doprava, jeřáb, plošiny pro montáž, pomocná kce	kpl	1,000	95 200,00	95 200,00
21	75172112.7	Uvedení do provozu, vyregulování, kabeláž pro MaR	kpl	1,000	71 400,00	71 400,00
22	75172112.8	Provedení prostupu obvodovým pláštěm haly	ks	2,000	8 520,00	17 040,00

**767 Konstrukce zámečnické -100 954,00**

23	767995114	Montáž atypických zámečnických konstr. hmoti do 50 kg-pro rekuper.jednotky	kg	-1 100,000	30,00	-33 000,00
24	99902	Dodávka ocel konstrukce - rekuper.jednotky	kg	-1 100,000	60,00	-66 000,00
25	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	-2,200	888,00	-1 954,00

**783 Dokončovací práce - nátěry -7 000,00**

26	78301	Pozinkování nosné ocel konstrukce rekuper.jednotek	s	-1,000	7 000,00	-7 000,00
----	-------	--	---	--------	----------	-----------

**Celkem**

**90 831,00**

## **D.1.2.2 POSOUZENÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE SPORTOVNÍ HALY**

### **D.1.2.2 Identifikační údaje**

#### **D.1.2.2.1 Údaje o stavbě**

D.1.2.2.1a) Název akce : LÁZNĚ BĚLOHRAD - Střední odborné učiliště  
Zámecká č.p.478  
Snížení energetické náročnosti budovy školy a tělocvičny  
SOU Lázně Bělohrad  
Projektová dokumentace

D.1.2.2.1b) Místo stavby : Kraj: Královéhradecký  
Okres: Jičín  
Obec: Lázně Bělohrad  
Katastr.území: Lázně Bělohrad  
Parcelní číslo: st.606,st.661

D.1.2.2.1.c) Předmět projektové  
dokumentace : Snížení energetické náročnosti budovy školy a tělocvičny  
SOU Lázně Bělohrad  
Projektová dokumentace – posouzení stávající konstrukce

#### **D.1.2.2.2 Údaje o stavebníkovi :**

D.1.2.2.2.a) Vlastník: Královéhradecký kraj  
Pivovarské náměstí 1245/2  
500 03 Hradec Králové

D.1.2.2.2.b) Provozovatel : Střední odborné učiliště, Lázně Bělohrad  
Zámecká č.p.478, 507 81 Lázně Bělohrad  
IČO : 00087726

D.1.2.2.2.c) Odpovědný zástupce: Mgr.Pavel Petr, ředitel  
tel.: + 420 493 792 381-2  
E-mail: soulboulb.cz

#### **D.1.2.2.3 Údaje o zpracovateli dokumentace :**

D.1.2.2.3.a) Hlavní projektant a zhotovitel dokumentace :

ING.MILAN POUR  
PROJEKTOVÝ ARELIER  
Haklova 1317, 50801 Hořice v P.  
tel.605 531718, e-mail : milanpour@seznam.cz  
IČ : 16742613, DIČ : CZ 521020172  
autorizovaný inženýr ČKAIT – 0600056

#### D.1.2.2.3.c) Stavebně konstrukční část :

Ing.Milan Pour  
Haklova 1317, 50801 Hořice v P.  
tel.605 531718, e-mail : milanpour@seznam.cz  
IČ : 16742613, DIČ : CZ 521020172  
autorizovaný inženýr ČKAIT – 0600056

Ing.Marek Festa  
Pod invalidovnou 1934  
50801 Hořice v P.  
tel.737106687, e-mail : [marek.festa@centrum.cz](mailto:marek.festa@centrum.cz)  
IČO 71880305

autorizoval:  
Ing.Martin Škoda  
autorizovaný inženýr v oboru statika a dynamika staveb  
ČKAIT – 0007777

#### **D.1.2.2.4 Seznam vstupních podkladů**

- Projektová dokumentace PP – Výstavba areálu školy SOU L.Bělohrad – Školní budova – 1.etapa ( SPŠ stavební Náchod, evid.č.1/76,1976 )
- Projektová dokumentace PP - Výstavba zemědělského OU L.Bělohrad – II.etapa ( SPŠ stavební Náchod, evid.č.2/78, 01/1978 )
- Projektová dokumentace JP-PD – SOU Lázně Bělohrad – Technické zařízení školy ( Zemědělské stavební sdružení, s.z.p.v Jičíně se sídlem ve Valdicích, zak.č.153/79, 10/1980
- Projektová dokumentace JP-PD – Zastřešení sportoviště halou PJ 24-10,2 ( Zemědělské stavební sdružení, s.z.p.v Jičíně se sídlem ve Valdicích, zak.č.16/81, 03/1981)
- Energetický posudek, štítek energetické náročnosti, průkaz energetické náročnosti  
Předmět energetického posudku: Školní budova SOU na adrese Zámecká 478, včetně sportovního zázemí a tělocvičny  
( Zhotovitel Ing.David Knill, č.o.265, spolupráce Ing.Radek Matoušek, 01/2016 )
- Projektová dokumentace – Snížení energetické náročnosti budovy školy a tělocvičny SOU Lázně Bělohrad ( Ing. Milan Pour, 03/2016)
- Vlastní prohlídka stávajícího stavu, fotodokumentace  
( Ing.Milan Pour, Ing. David Pour, Haklova 1317, Hořice, 04/2018 )
- Jednání, konzultace s přízvaným statikem Ing. Markem Festou.

#### **D.1.2.2.5 Vlastní posouzení**

Předmětem řešení je posoudit stávající nosnou konstrukci montované ocelové sportovní haly SOU Lázně Bělohrad. Objekt je postaven dle dříve platných norem a předpisů. S největší pravděpodobností se jedná o typizovaný objekt výrobce RD Jeseník, typu Hard v nestandardní šířce 24,0m. Délkový modul je 6,0m. Systémová výška je 11,0m a objekt je zastřešen sedlovou střechou.

K objektu se nedochovala žádná dostupná dokumentace z doby výstavby.

V rámci projektu se počítá s výměnou obvodového pláště a zlepšením jeho tepelně technických parametrů. Z hlediska zatížení nosné konstrukce má tato navržená úprava zanedbatelný vliv. Stávající opláštění je tvořeno lakovaným plechem a ocelovými krycími lištami. Vnitřní povrch není ošetřen, stěny jsou obloženy vrstvou polystyrenu.

V době zhotovení projektu nebylo možné zpřístupnit podstřešní prostor vzhledem k výškové úrovni zavěšeného podhledu a proto se vycházelo z předpokladů o skutečném provedení konstrukcí.

V průběhu realizace byla provedena sonda do podstřešního prostoru a dle přiložených fotografií byly zjištěny následující nedostatky, které nedovolují realizaci zateplení zavěšeného podhledu – předpokládaného v energetickém posudku (zadáním pro vypracování projektové dokumentace).

Dále bylo zjištěno, že objekt postrádá příčné ztužení, které by bylo zapotřebí při přetížení konstrukce od účinků větru, v případě, že by se instalovaly nástřešních vzduchotechnické jednotky.



Obr. č.1 zachycující systém zavěšení podhledu

Stávající podhled ve sportovní hale má být zachován. Je tvořen ocelovými trapézovými plechy, které jsou kotveny do zavěšených ocelových trubek na drátěném závěsu. Taková konstrukce není dimenzována pro montážní zatížení při aplikaci tepelné izolace.





Obr. č. 2 zachycující systém nosných ocelových rámu a vaznic (paždíků)

Stávající střešní krytina je kotvena do ocelových vaznic, kterou jsou ovšem tvořeny tenkým válcovaným U profilem. U profil je kotvený do svařovaných nosných rámu šroubovými spoji. Konstrukce nedovoluje osazení vzt jednotek a dodatečné ztužení v příčném směru, kvůli absenci středové vaznice.

Z provedené sondy je patrná koroze střešní krytiny v místě upevnění.

#### **D.1.2.2.6 Závěr a návrh změny opatření**

Z výše uvedených důvodů nedoporučuji realizaci zateplení v úrovni zavěšeného podhledu. Navrhuji změnu opatření vedoucího ke snížení energetické náročnosti objektu ze zateplení stropu na zateplení a výměnu střešní krytiny. Při takové změně považuji za přínosné, řešit instalaci vzduchotechnické jednotky mimo rovinu střechy. Nezanedbatelný přínos vidím hlavně v přístupu k jednotce z hlediska servisních zásahů, revize apod. Návrhy změn jsou přílohou tohoto zhodnocení.



V Hořicích, 05/2018

Vypracoval : Ing. Milan Pour



Ing. Marek Festa  
Autorizoval : Ing. Martin Škoda



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
OP Životní prostředí

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		<b>číslo OZ: 10</b>			
Zhotovitel:	ASJ s.r.o., 503 12 Světí 8, IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861				
Investor:	Střední odborné učiliště Lázně Bělohrad, Zámecká 478	Datum: 30.04.2018			
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy školy a tělocvičny SOU Lázně Bělohrad					
Způsob odeslání / předání datum: 30.04.2018		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
<b>Odkazy na</b>	specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:				
	na jinou část smlouvy:				
<b>Předmět změny: Změna umístění VZD jednotek</b>					
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
Projektová dokumentace neobsahovala elektro připojení nových vnitřních vzd jednotek. Bylo potřeba zesílit jištění jednotlivých okruhů a nový přívod k jednotkám zrevidovat.					
Počet připojených listů specifikací:					
Důvod vícepráce / méněpráce:					
záměr objednatele <input type="checkbox"/>		chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává:					
.....					



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
OP Životní prostředí

**Stanovisko technického dozoru stavby:**

SOUHLASÍM


SL

**Stanovisko projektanta stavby:**

SOUHLASÍM

am

Příloha:



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
OP Životní prostředí

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<b>číslo ZL: 10</b>
Zhotovitel:	ASJ s.r.o., 503 12 Světí 8, IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861	
Změnový list vystavil:	Jiří Švub	
Datum:	30.04.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Změna umístění VZD jednotek</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Projektová dokumentace neobsahovala elektro připojení nových vnitřních vzd jednotek. Bylo potřeba zesílit jištění jednotlivých okruhů a nový přívod k jednotkám zrevidovat.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>0</b>	<b>14 460 ,-Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>14 460- Kč</b>	<b>Nemění se</b>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
	 ASJ s.r.o. Světí 8, 503 12 tel.: +420 495 407 008 e-mail: asj@asj.cz www.asj.cz IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861	
Datum: 30.04.2018	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**asj.**  
stavební firma

Název stavby

Snížení energetické náročnosti budovy školy a tělocvičny SOU Lázně Bělohrad

JKSO

Název objektu

ZL č.10 elektro přívod k jednotkám VZD

EČO

Místo

Lázně Bělohrad

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

ASJ s.r.o.

Zpracoval

Ing. Otakar Kubeška

IČ

DIČ

25281861

CZ25281861

Rozpočet číslo

Dne

27.04.2018

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	7 626,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	6 834,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		14 460,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

**D** Celkem bez DPH

14 460,00

**asj.**  
stavební firma

ASJ s.r.o.  
Světí 8, 503 12  
tel.: +420 495 407 008  
e-mail: asj@asj.cz  
www.asj.cz  
IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861

DPH % Základ daně DPH celkem

Režim přenesení daňové povinnosti:

snížená 15,0 0,00

základní 21,0 14 460,00

Daň odvede zákazník.

**Cena s DPH**

14 460,00

**E** Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

# ROZPOČET

**Stavba:** Snížení energetické náročnosti budovy školy a tělocvičny SOU Lázně Bělohrad  
**Objekt:** ZL č.10 elektro přívod k jednotkám VZD

**Objednatel:**  
**Zhotovitel:** ASJ s.r.o.

**JKSO:**  
**EČO:**  
**Zpracoval:** Ing. Otakar Kubeška  
**Datum:** 27. 4. 2018



P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

**PSV Práce a dodávky PSV 14 460,00**

**741 Elektroinstalace - silnoproud 14 460,00**

1	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený do lišty plný kulatý 3x2,5 až 6 mm <sup>2</sup> (CYKY)	m	100,000	24,97	2 497,00
2	34111036	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm <sup>2</sup>	m	100,000	17,84	1 784,00
3	34571010	lišta elektroinstalační vkládací 18 x 13	m	90,000	13,57	1 221,00
4	34536700	rámeček pro spínače a zásuvky jednonásobný TG	kus	12,000	16,70	200,00
5	35811257	zásuvka nástěnná 16 A, 250 V, 4pólová	kus	12,000	207,93	2 495,00
6	3457151.1	krabice přístrojová instalační TG do lišt	kus	12,000	22,80	274,00
7	741320101	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A bez krytu	kus	14,000	59,80	837,00
8	35822111	jistič 1pólový-charakteristika B 16A	kus	14,000	118,00	1 652,00
9	741320199.1	Revizní zpráva	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00

**Celkem 14 460,00**
