

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo

uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel **Královéhradecký kraj**
se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ 708 89 546
zástupce: Mgr. Martin Červíček, hejtmán kraje
bankovní spojení: ██████████
č. účtu: ██████████

dále též „objednatel“ a

Zhotovitel **VALC, s.r.o.**
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C1677
se sídlem: Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové
IČO: 45537151
DIČ: CZ45537151
Zastoupený: Ing. Pavlem Valcem, jednatelem společnosti
bankovní spojení: ██████████
číslo účtu: ██████████

dále též „zhotovitel“ nebo „dodavatel“;

objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 4 (dále též jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 1. 9. 2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. 10. 2020, dodatku č. 2 ze dne 29. 1. 2021 a dodatku č. 3 ze dne 6. 5. 2021, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky nazvané: „**Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 na st.p.č.453 v areálu nemocnice Opočno**“. Veřejná zakázka byla oznámena ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2020-008327 (dále jen „veřejná zakázka“).

I. Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 7 odst. 6, 7, 8 a čl. 16 odst. 2 původní smlouvy o dílo a ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“), v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací tzv. víceprací, dále tzv. méněprací – tedy stavebních prací, které nebudou

realizovány a nutných změn z důvodů uvedených ve změnových listech č. 10 až č. 16, které jsou přílohou tohoto dodatku:

a) Jedná se o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, dle ustanovení § 222 odst. 4 písm. b) ZZVZ; práce dle Změnových listů č. 11, č. 12 a č. 15.

vícepráce: 243 476,82 Kč bez DPH

méněpráce: - 56 700,00 Kč bez DPH

b) Jedná se o změny, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné pro zhotovení díla a dále změny, spočívající ve stavebních pracích a s nimi souvisejícími dodávkami a službami a jejichž hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku, podle ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ; práce dle Změnového listu č. 13.

vícepráce: 189 295,02 Kč bez DPH

méněpráce: 0,00 Kč bez DPH

c) Jedná se o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku, podle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ; , a dále změny, spočívající ve stavebních pracích a s nimi souvisejícími dodávkami a službami, které nebudou realizovány s ohledem na změny podle tohoto odstavce, a které proto zadavatel, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní ceny veřejné zakázky, podle § 222 odst. 6 ZZVZ; práce dle Změnových listů č. 10, č. 14 a č. 16.

vícepráce: 1 312 727,37 Kč bez DPH

méněpráce: - 219 627,80 Kč bez DPH

2. Celkový cenový nárůst v souvislosti se změnami podle odst. 1 písm. b) a c) tohoto článku nepřesáhne 30 % původní ceny závazku.
3. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou Změnové listy č. 10 až č. 16. Přehled veškerých změnových listů, obsahující stručný popis změny a vliv na cenu díla, je nedílnou součástí a přílohou tohoto dodatku.
4. Celkové změny podle odst. 1 tohoto článku činí:

vícepráce: **1 745 499,21 Kč bez DPH**

méněpráce: **- 276 327,80 Kč bez DPH**

5. Celková smluvní cena se tedy **navyšuje o částku: 1 469 171,41 Kč bez DPH.**

II.

Vymezení rozsahu změn

Článek 7 odst. 2 původní smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí:

celková cena 85 478 147,90 Kč bez DPH (slovy: osmdesát pět milionů čtyři sta sedmdesát osm tisíc jedno sto čtyřicet sedm korun českých devadesát haléřů);

výše DPH (15%) 12 437 615,70 Kč (slovy: dvanáct milionů čtyři sta třicet sedm tisíc šest set patnáct korun českých sedmdesát haléřů);

výše DPH (21%) 537 749,09 Kč (slovy: pět set třicet sedm tisíc sedm set čtyřicet devět korun českých devět haléřů);

celková cena 98 453 512,69 Kč s DPH (slovy: devadesát osm milionů čtyři sta padesát tři tisíc pět set dvanáct korun českých šedesát devět haléřů).

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami (až podpisem druhé ze smluvních stran), účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku zajistí objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek je v souladu s § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/35/1966/2020 hejtman Královéhradeckého kraje.

Přílohy tohoto dodatku:

Příloha č. 1: Změnové listy č. 10 až č. 16


Příloha č. 2: Změny závazků ze smlouvy

Za objednatele:



Mgr. Martin Červíček
hejtman Královéhradeckého kraje

Za zhotovitele:



Ing. Pavel Valc
jednatel společnosti



EVROPSKA UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 10

Název projektu:	Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 areálu nemocnice Opočno
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové
Objednatel:	Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové
Změnový list vystavil:	Iveta Vohralíková
Datum:	27.05.2021

Předmět změny: Zemní práce 1.PP




Popis a zdůvodnění změny:

Při provádění výkopových prací v 1. PP pro odvětrání podloží, vnitřní dešťové a splaškové kanalizace byl zjištěn nepředpokládaný skalní masiv. Firmou ALGEO TEST byl vyhotoven posudek třídy těžitelnosti hornin, kde uvádí třídu těžitelnosti 5 až 7. (viz příloha). ZL řeší vyčíslení změny třídy těžitelnosti.

Přílohy změnového listu: rozpočet, posudek

Cena méněprací bez DPH: -219 627,80 Kč	Cena víceprací bez DPH: 1 170 560,31 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 950 932,51 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: -

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:

Za objednatele:  Datum: 1.6.2021	Za zhotovitele:  Datum: 1.6.2021
Za autorský dozor: v.z. HINDRICH PAVLÍK  Datum: 1.6.2021	Za technický dozor:  Datum: 1.6.2021

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Pobytové služby pro seniory v areálu nemocnice Opočno -
Dodatek č.4

JKSO

Název objektu

ZL10 - Zemní práce 1.PP

EČO

Místo

č.p. 431, areál nemocnice Opočno

IČO

DIČ

Objednatel

KÚ Královohradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245

Projektant

Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

Zhotovitel

VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

27.05.2021

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	950 932,51	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		950 932,51	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH

950 932,51

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	950 932,51	142 639,88
základní	21,0	0,00	0,00

Cena s DPH

1 093 572,39

Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pobytové služby pro seniory v areálu nemocnice Opočno - Dodatek č.4

Objekt: ZL10 - Zemní práce 1.PP

Objednatel: KÚ Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245

Zhotovitel: VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, hradec Králové

Místo: č.p. 431, areál nemocnice Opočno

Zpracoval:

Datum: 27. 5. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

950 932,51

1

Zemní práce

950 932,51

1	R	132212101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	-171,920	1 150,00	-197 708,00	SOD
2	R	132212109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	-171,920	10,00	-1 719,20	SOD
3	001	139811101	Výkopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 5 až 7	m3	171,920	4 226,40	726 602,69	URS x 0,72
4	001	138601201	Dolamování hloubených výkopávek rýh ve vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 7	m3	42,980	4 716,00	202 693,68	URS x 0,72
5	R	161101102	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	-171,920	7,50	-1 289,40	SOD
6	001	161101551	Svislé přemístění výkopku svisle do v 3 m v hornině tř. 5 až 7	m3	171,920	986,40	169 581,89	URS x 0,72
7	R	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	-171,920	29,00	-4 985,68	SOD
8	001	162201251	Vodorovné přemístění do 10 m výkopku z horniny tř. 5 až 7	m3	171,920	222,48	38 248,76	URS x 0,72
9	R	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	-1 203,440	6,00	-7 220,64	SOD
10	001	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 203,440	18,72	22 528,40	URS x 0,72
171,92*7					1 203,440			
Součet					1 203,440			
11	R	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	-171,920	39,00	-6 704,88	SOD
12	001	167101152	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3	m3	171,920	63,43	10 904,89	URS x 0,72

Celkem


950 932,51

Akce: Pobytové služby pro seniory v objektu č.p. 431 areálu nemocnice Opocno
Věc: Posouzení těžitelnosti hornin základové spáry

Výkopové práce jsou prováděny v suterénu rekonstruovaného objektu.

Z geologického hlediska náleží území oblasti svrchní křídý (turon) a je tvořeno zejména písčitými slínovci a prokřemenělými opukami.

Obr.1 – Geologická mapa zájmového území

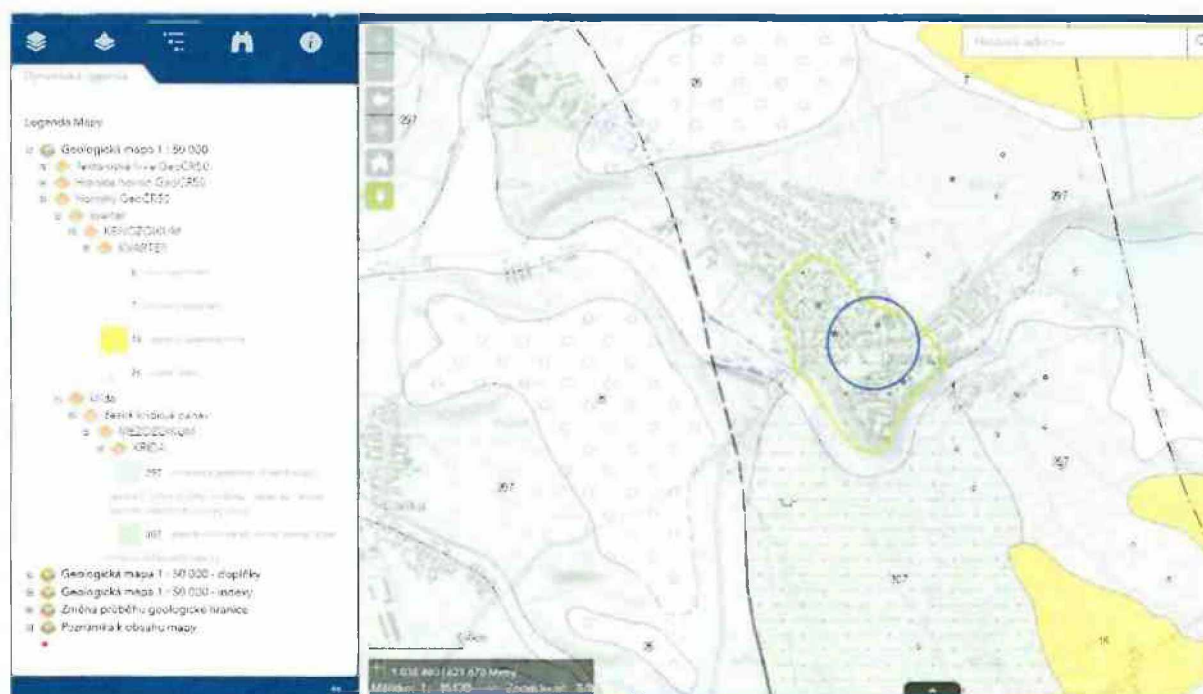


Výkopovými pracemi v místě zpětných zásypů původních inženýrských sítí byl zjištěn materiál charakteru kamenité sypaniny z původní rostlé horniny. Maximální velikost zrn dosahuje až 300 mm, převládající velikost se pohybuje v rozmezí 100 – 250 mm (nad 50% objemu). Zrna jsou převážně plochého a podlouhlého tvaru. Z hlediska těžitelnosti řadíme tuto vrstvu do **třídy těžitelnosti 5** podle ČSN 73 3050, resp. do třídy II dle ČSN 73 6133, tj. lehce trhatelné, rozpojitelné rozrývačem nebo klínem, rýpadlem.

Ve výkopech mimo původní trasy inženýrských sítí byly ověřeny výskyty zdravých nebo slabě navětralých prokřemenělých opuk. Na viditelných místech nebyly u jednotlivých balvanů zjištěny poruchy a vrstevnatost, které by umožňovaly snadnější rozpojování v průběhu těžby. Horniny se vyznačují vysokou pevností, nelze je rozbít kladivem ani rýpadlem. Rozpojování probíhá velmi obtížně ručními sbíjecími kladivy. Maximální zjištěné velikosti balvanů přesahují v jednom rozměru 1 m, průměrná velikost balvanu dosahuje velikosti 0,40 – 0,60 cm.

S ohledem na lokalitu a rozsah výkopu (malé rozměry rýhy, nepřístupnost těžké mechanizace) lze zastižené polohy granodioritů zařadit do třídy **těžitelnosti 6 až 7** podle ČSN 73 3050, resp. do **třídy III** dle ČSN 73 6133, tj. horniny velmi těžko trhatelné, rozpojitelné těžkým rozrývačem nebo trhavinami.

Osamělé balvany s objemem přes 0,1 m³ jsou z hlediska těžitelnosti zařazovány podle charakteristik platných pro konkrétní třídu (v tomto případě třída 6 až 7).

Celkový rozsah hornin v třídě těžitelnosti 6 až 7 dosahuje cca 25% celkové kubatury vytěžených hornin.



Mgr. Aleš Jírovec, geolog

Příloha č. 1

FOTODOKUMENTACE

Obr. 2 – celkový pohled na prostor provádění výkopů



Obr. 3 – kamenitá sypanina původních zásypů



Obr. 3 – fragmentace výkopku – kamenitá sypanina



Obr. 4 – fragmentace výkopku



Obr.5 – poloha prokřemenělé opuky



Obr. 6 – maximální velikost balvanů





EVROPSKA UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 11
Název projektu:	Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 areálu nemocnice Opočno	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové	
Objednatel:	Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	Iveta Vohralíková	
Datum:	27.05.2021	
Předmět změny: ZTI - Gastro		
Popis a zdůvodnění změny: Dne 26.04.2021 byla generálnímu dodavateli prostřednictvím investora předána dokumentace změn dispozic kuchyňských linek a gastro zařízení. Z dokumentace vyplývá navýšení počtu zařizovacích předmětů, výustek energií, dřezových baterií a zejména změn v jejich umístění, což vyvolává nutnost doplnění potrubí kanalizačních stoupaček. Změnový list řeší dodatečné vyčíslení daných změn dodávky a montáže z projektové dokumentace gastro – viz položkový rozpočet.		
Přílohy změnového listu: rozpočet, CN		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0 Kč	142 784,82 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
142 784,82 Kč	-	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za ob		
Datum		
Za au		
Datum		

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Pobytové služby pro seniory v areálu nemocnice Opočno - Dodatek č.4	JKSO	
Název objektu	ZL11 - ZTI	ECO	
		Místo	
Objednatel	KÚ Královohradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245	IČO	DIČ
Projektant	Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek		
Zhotovitel	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové		
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	
		27.05.2021	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	142 784,82	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		142 784,82	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 142 784,82

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	142 784,82	21 417,72
základní	21,0	0,00	0,00

Cena s DPH 164 202,54

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pobytové služby pro seniory v areálu nemocnice Opočno - Dodatek č.4

Objekt: ZL11 - ZTI

Objednatel: KÚ Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245

Zhotovitel: VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, hradec Králové

Místo: č.p. 431, areál nemocnice Opočno

Zpracoval:

Datum: 27. 5. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
PSV		Práce a dodávky PSV					142 784,82
721		Zdravotechnika					142 784,82
23	R	001	Zdravotechnika viz. samostatný rozpočet	kpl	1,000	142 784,82	142 784,82
		Celkem					142 784,82

Poř.	Typ	Kod	Popis	MJ	Jedn. cena	Cena
------	-----	-----	-------	----	------------	------

SO_01: Zdravotní instalace
721.1: Vnitřní kanalizace - splašková
142 784,82
66 047,61

1.	SP	521In6000-00	Potrubí PVC, KG Systém, rozměry 110	m	12,0	280,00	3 360,00
2.	SP	521In6002-00	Potrubí odpadní hrdlové zvukově izolující - DN 50	m	48,0	360,00	17 280,00
3.	SP	521In6002-02	Potrubí odpadní hrdlové zvukově izolující - DN 100	m	29,0	720,00	20 880,00
4.	H	X4576244	Zvuková izolace kanalizačního potrubí DN 75	m	29,0	71,00	2 059,00
5.	H	h1.1139	vpust podlahová 310 NPR	kus	4,0	2 760,00	11 040,00
6.	SP	521In6020-004	izolační souprava pro stěrkové izolace	kus	4,0	1 320,00	5 280,00
7.	SP	521In6020-006	Zřízení přípojek na potrubí, vyvedení a upevnění odpadních výpustek - Dxt 50x1,8 mm	kus	9,0	400,00	3 600,00
8.	SP	521lw4010-002	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech - podle ČSN 73 6760 - vodou, do DN 125	m	118,0	12,00	1 416,00
9.	SP	521Az0030-006	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace - výška do 24 m	%	615,55	1,84	1 132,61

722: Vnitřní vodovod							
10.	SP	531In6170-004	Potrubí z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) - D 20x3,4	m	94,0	148,00	13 912,00
11.	SP	531lw4010-006	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí - potrubí závitové, do DN 50	m	94,0	15,00	1 410,00
12.	SP	531lw4020-002	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí - do DN 80	m	94,0	16,00	1 504,00
13.	SP	539Xn6002-002	Vývedení a upevnění výpustek - do DN 25	kus	15,0	150,00	2 250,00
14.	SP	531Az0030-006	Přesun hmot pro vnitřní vodovod - výška do 24 m	%	190,76	1,12	213,65

725: Zařizovací předměty							
15.	SP	742Xa0012-004	Montáž umyvadel - na šrouby do zdiva	soubor	1,0	550,00	550,00
16.	H	8.1438.2.000.109.1	Umyvadlo š. 550 mm, bílé	kus	1,0	970,00	970,00
17.	H	8.1939.1.000.000.1	Kryt na sifon bílý	kus	1,0	920,00	920,00
18.	H	X457624	Umyvadlový sifon plastový bílý	kus	1,0	176,00	176,00
19.	H	X457625	Automatická zátká "click-c-ack"	kus	1,0	368,00	368,00
20.	SP	745Xh0100-002	Montáž baterie umyvadlové stojánkové - G 1/2	soubor	1,0	180,00	180,00
21.	SP	745NOVA001-01	Baterie umyvadlová stojánková bez výpustí	kus	1,0	960,00	960,00
22.	SP	535Xh0210-010	Montáž ventilů - rohový, bez přípojovací trubičky, G 1/2 "	soubor	2,0	40,00	80,00
23.	SP	535Xh0211-00	Ventil rohový	kus	2,0	85,00	170,00
24.	SP	535Xh0211-02	Ventil rohový - Připojovací hadička	kus	2,0	120,00	240,00
25.	SP	745Xh0184-002	Montáž baterie dřezové nástěnné - pákové nebo klasické	kus	9,0	180,00	1 620,00
26.	H	X457637	Baterie dřezová nástěnná	kus	9,0	1 200,00	10 800,00
27.	SP	535Xh0211-01	Ventil rohový - k myčce	kus	3,0	156,00	468,00
28.	H	X457635	Příplatek za rohový sprchový žlábek s nerezovou mřížkou	kus	22,0	1 800,00	39 600,00
29.	SP	535Az0030-006	Přesun hmot pro zařizovací předměty - výška do 24 m	%	1 439,84	0,24	345,56



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 12
Název projektu:	Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 areálu nemocnice Opočno	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové	
Objednatel:	Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	Iveta Vohralíková	
Datum:	02.06.2021	
Předmět změny: SDK zástěny		
Popis a zdůvodnění změny: Dne 25.05.2021 byla generálnímu dodavateli prostřednictvím investora předána revize projektové dokumentace změn doplnění SDK zástěn pro dispozice skříní v klientských pokojích. Změnový list řeší dodatečné vyčíslení daných změn navýšením dodávky a montáže SDK konstrukcí – viz položkový rozpočet.		
Přílohy změnového listu: rozpočet, CN, PD		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0 Kč	58 904,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
58 904,00 Kč	-	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Datum:		
Za aut:		
Datum:		

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Pobytové služby pro seniory v areálu nemocnice Opočno -
Dodatek č.4

JKSO

Název objektu

ZL12 - SDK zástěny

EČO

Místo

č.p. 431, areál nemocnice Opočno

IČO

DIČ

Objednatel

KÚ Královohradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245

Projektant

Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

Zhotovitel

VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

02.06.2021

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště			0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce			0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy			0,00
4		Montáž	58 904,00	11		0,00	16	Provozní vlivy			0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN			0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu			0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		58 904,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)			0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady			0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 58 904,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	58 904,00	8 835,60
základní	21,0	0,00	0,00

Cena s DPH 67 739,60

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pobytové služby pro seniory v areálu nemocnice Opocno - Dodatek č.4

Objekt: ZL12 - SDK zástěny

Objednatel: KÚ Královehradeckého kraje, Pivovarské nám 1245

Zhotovitel: VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, hradec Králově

Zpracoval:

Místo: č.p. 431, areál nemocnice Opočno

Datum: 2. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV

Práce a dodávky PSV

58 904,00

763

Konstrukce suché výstavby

58 904,00

1	R	7639R001	D+M SDK interiérové niky na vestavu tl. 130 mm opláštěné deskou DF 15 mm z každé strany + ukončení vnějšího líce rohovou lištou	m	37,000	1 526,00	56 462,00
			"1.NP" 5*3,7		18,500		
			"2.NP" 5*3,7		18,500		
			Součet		37,000		

2	R	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	1	1,221	2 000,00	2 442,00	SOD
---	---	-----------	--	---	-------	----------	----------	-----

Celkem

58 904,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Opočno_02R-Stavební úpravy

Objekt: SDK zástěny 1.NP a 2.NP

Objednatel: VALC s.r.o.

Zhotovitel:

Místo: Opočno

Zpracoval: UNI-GIPS s.r.o.

Datum: 31. 5. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV

Práce a dodávky PSV


56 462,00


763

Konstrukce suché výstavby

56 462,00

1	R	7639R001	D+M SDK interiérové niky na vestavbu tl. 130 mm opláštěné deskou DF 15 mm z každé strany + ukončení vnějšího líce rohovou lištou	m	37,000	1 526,00	56 462,00
			"1.NP" 5*3,700		18,500		
			"2.NP" 5*3,700		18,500		
			Mezisoučet		37,000		
			Součet		37,000		

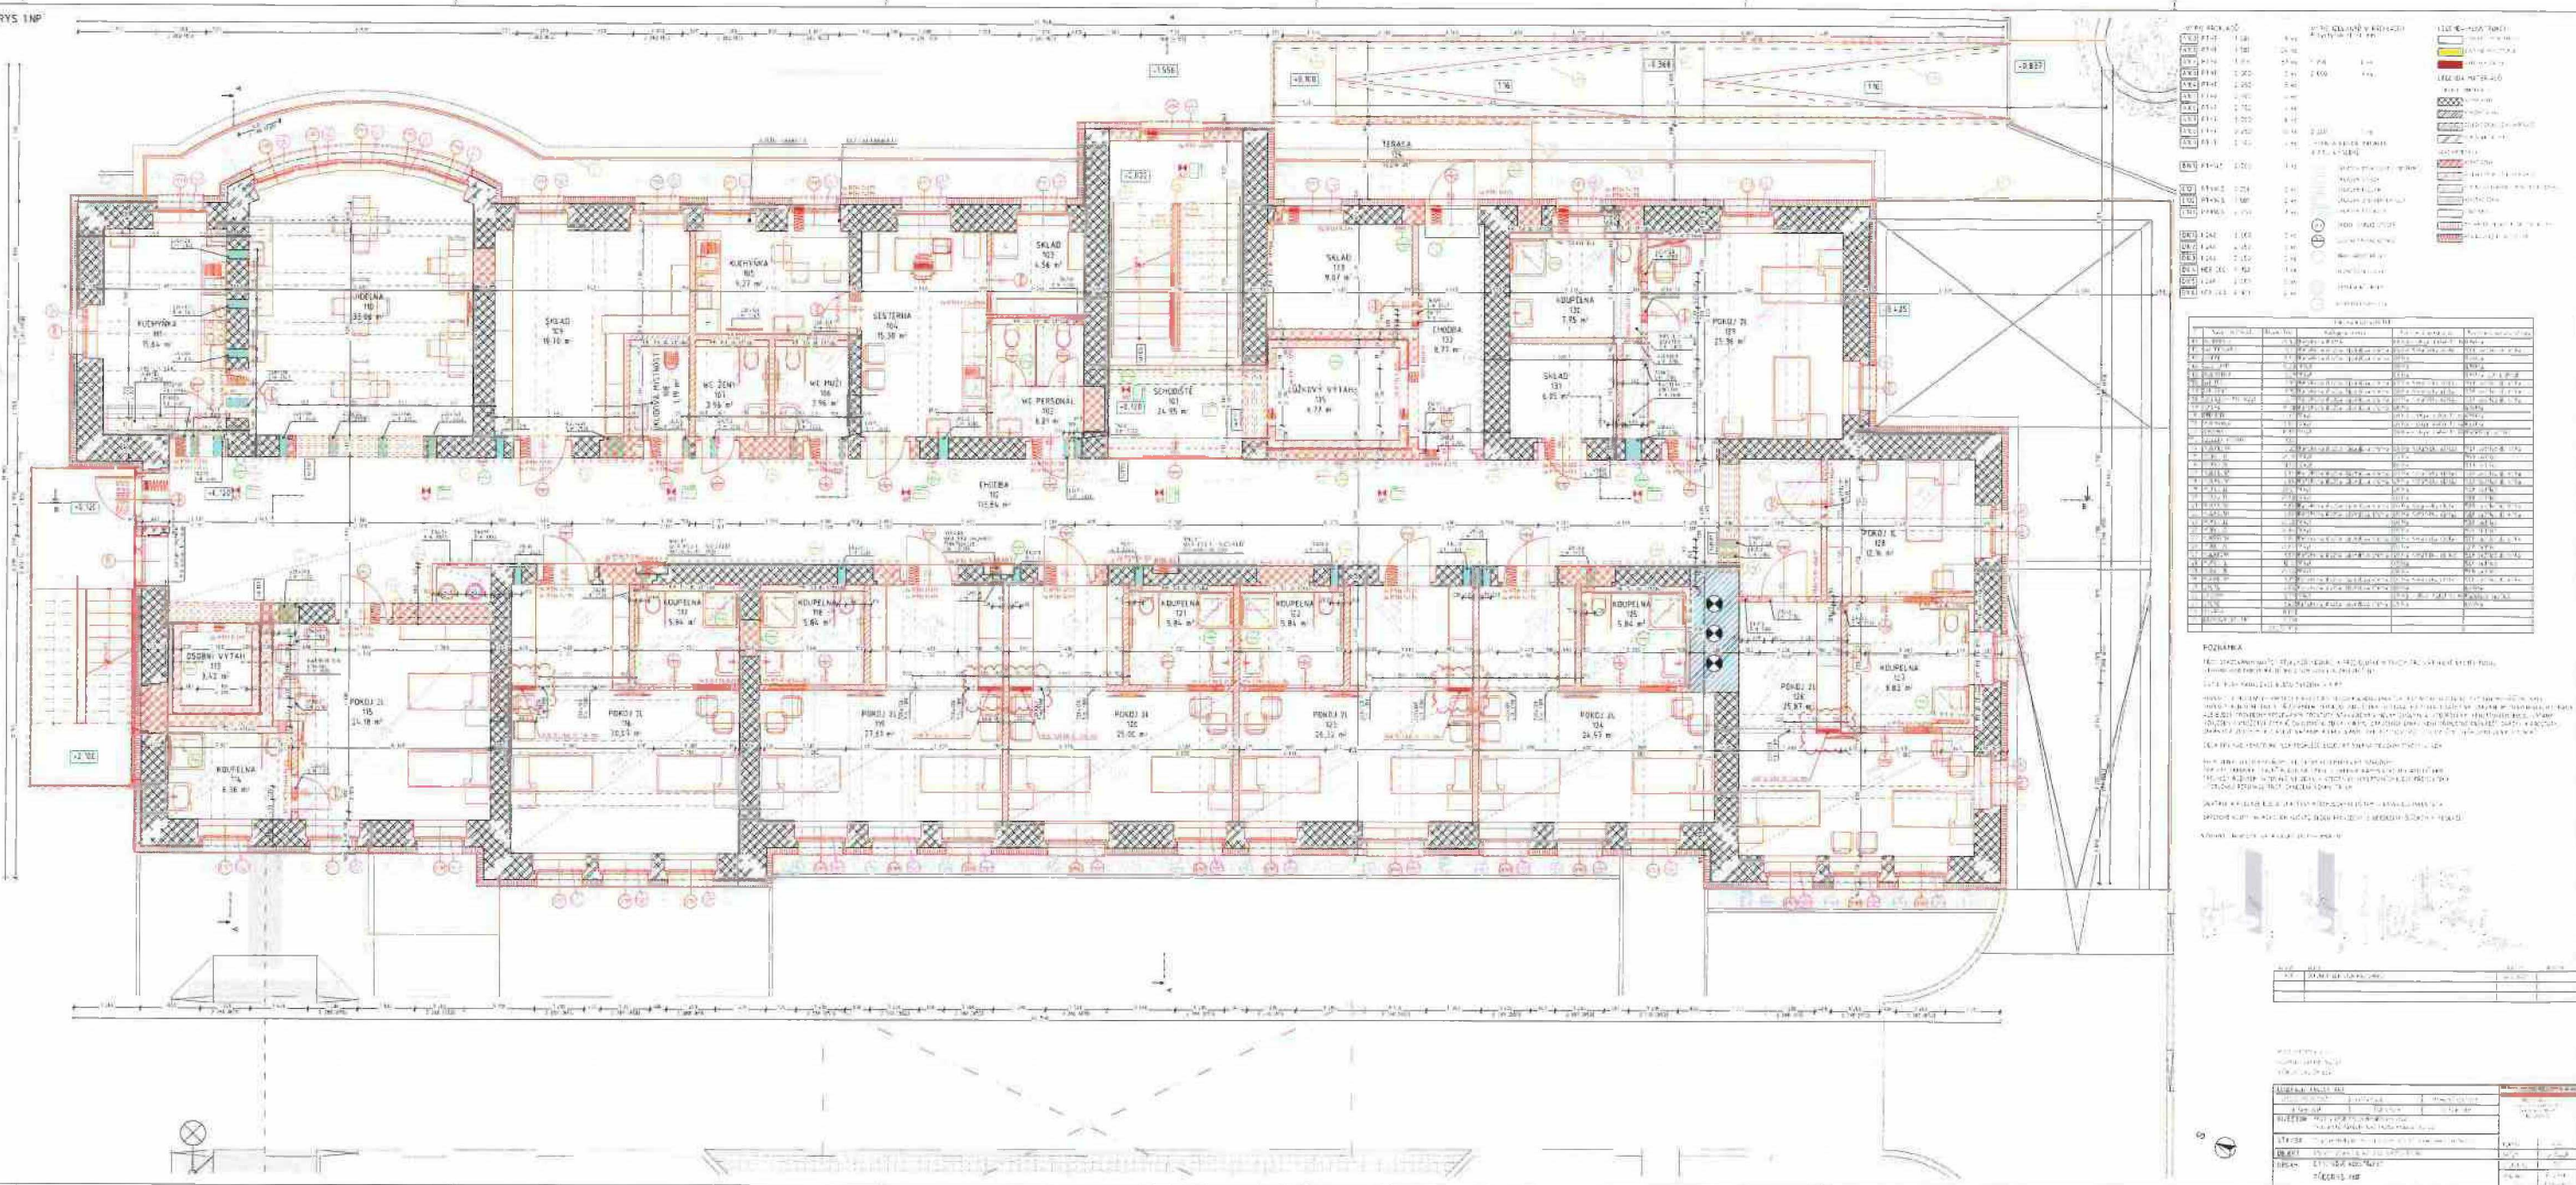

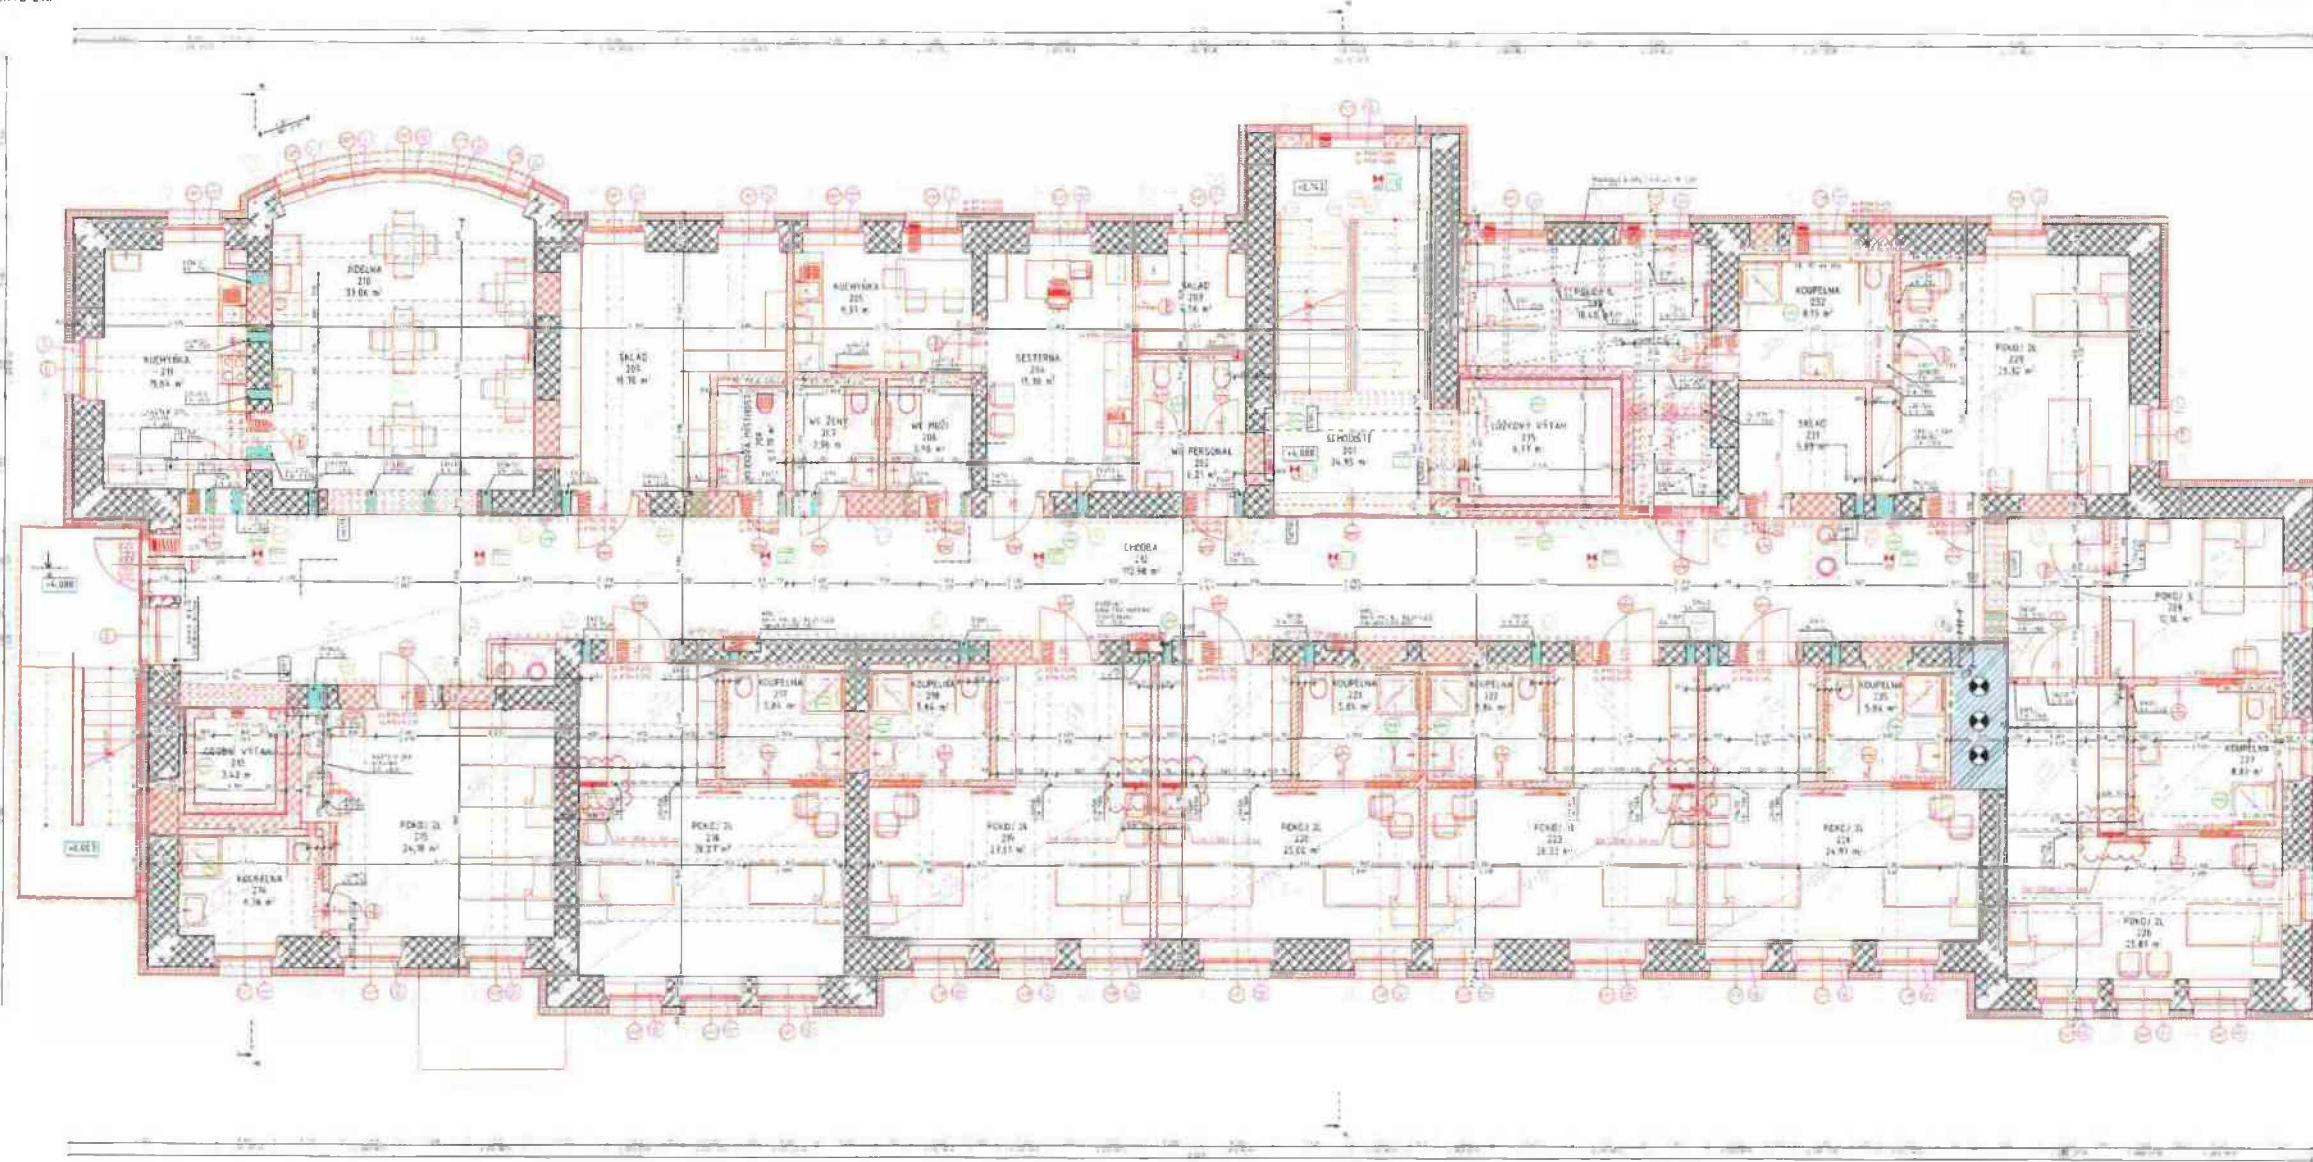

2012 年 12 月 15 日				
日期	姓名	性别	年龄	职业
2012.12.15	张三	男	35	教师
2012.12.15	李四	女	28	医生
2012.12.15	王五	男	42	工程师
2012.12.15	赵六	女	31	护士
2012.12.15	孙七	男	25	学生
2012.12.15	周八	女	38	公务员
2012.12.15	吴九	男	45	经理
2012.12.15	郑十	女	22	职员
2012.12.15	冯十一	男	33	司机
2012.12.15	陈十二	女	40	会计
2012.12.15	林十三	男	27	程序员
2012.12.15	黄十四	女	36	销售
2012.12.15	周十五	男	41	保安
2012.12.15	吴十六	女	29	文员
2012.12.15	郑十七	男	34	厨师
2012.12.15	冯十八	女	23	保洁
2012.12.15	陈十九	男	39	快递员
2012.12.15	林二十	女	43	保姆
2012.12.15	黄二十一	男	26	快递员
2012.12.15	周二十二	女	32	快递员
2012.12.15	吴二十三	男	44	快递员
2012.12.15	郑二十四	女	21	快递员
2012.12.15	冯二十五	男	37	快递员
2012.12.15	陈二十六	女	46	快递员
2012.12.15	林二十七	男	24	快递员
2012.12.15	黄二十八	女	35	快递员
2012.12.15	周二十九	男	48	快递员
2012.12.15	吴三十	女	20	快递员
2012.12.15	郑三十一	男	30	快递员
2012.12.15	冯三十二	女	40	快递员
2012.12.15	陈三十三	男	25	快递员
2012.12.15	林三十四	女	38	快递员
2012.12.15	黄三十五	男	45	快递员
2012.12.15	周三十六	女	22	快递员
2012.12.15	吴三十七	男	33	快递员
2012.12.15	郑三十八	女	42	快递员
2012.12.15	冯三十九	男	27	快递员
2012.12.15	陈四十	女	36	快递员
2012.12.15	林四十一	男	41	快递员
2012.12.15	黄四十二	女	29	快递员
2012.12.15	周四十三	男	34	快递员
2012.12.15	吴四十四	女	43	快递员
2012.12.15	郑四十五	男	21	快递员
2012.12.15	冯四十六	女	37	快递员
2012.12.15	陈四十七	男	46	快递员
2012.12.15	林四十八	女	24	快递员
2012.12.15	黄四十九	男	35	快递员
2012.12.15	周五十	女	48	快递员
2012.12.15	吴五十一	男	20	快递员
2012.12.15	郑五十二	女	30	快递员
2012.12.15	冯五十三	男	40	快递员
2012.12.15	陈五十四	女	25	快递员
2012.12.15	林五十五	男	38	快递员
2012.12.15	黄五十六	女	45	快递员
2012.12.15	周五十七	男	22	快递员
2012.12.15	吴五十八	女	33	快递员
2012.12.15	郑五十九	男	42	快递员
2012.12.15	冯六十	女	27	快递员
2012.12.15	陈六十一	男	36	快递员
2012.12.15	林六十二	女	41	快递员
2012.12.15	黄六十三	男	29	快递员
2012.12.15	周六十四	女	34	快递员
2012.12.15	吴六十五	男	43	快递员
2012.12.15	郑六十六	女	21	快递员
2012.12.15	冯六十七	男	37	快递员
2012.12.15	陈六十八	女	46	快递员
2012.12.15	林六十九	男	24	快递员
2012.12.15	黄七十	女	35	快递员
2012.12.15	周七十一	男	48	快递员
2012.12.15	吴七十二	女	20	快递员
2012.12.15	郑七十三	男	30	快递员
2012.12.15	冯七十四	女	40	快递员
2012.12.15	陈七十五	男	25	快递员
2012.12.15	林七十六	女	38	快递员
2012.12.15	黄七十七	男	45	

Requisitos:

- 10 años de experiencia en el área de desarrollo de software, con especialización en el desarrollo de aplicaciones web.
- Experiencia en el uso de tecnologías de desarrollo de software como Java, JavaScript, PHP, Python, Ruby, etc.
- Experiencia en el uso de frameworks de desarrollo de software como Spring, Django, Rails, etc.
- Experiencia en el uso de bases de datos como MySQL, PostgreSQL, Oracle, etc.
- Experiencia en el uso de herramientas de control de versiones como Git, SVN, etc.
- Experiencia en el uso de herramientas de automatización de pruebas como Selenium, JUnit, etc.
- Experiencia en el uso de herramientas de monitoreo de aplicaciones como Prometheus, Grafana, etc.
- Experiencia en el uso de herramientas de gestión de proyectos como Jira, Trello, etc.
- Experiencia en el uso de herramientas de gestión de configuración como Ansible, Puppet, etc.
- Experiencia en el uso de herramientas de gestión de infraestructura como Docker, Kubernetes, etc.
- Experiencia en el uso de herramientas de gestión de seguridad como OWASP, Nessus, etc.
- Experiencia en el uso de herramientas de gestión de calidad como SonarQube, etc.
- Experiencia en el uso de herramientas de gestión de documentación como Confluence, etc.
- Experiencia en el uso de herramientas de gestión de comunicación como Slack, Microsoft Teams, etc.
- Experiencia en el uso de herramientas de gestión de recursos humanos como SAP, etc.
- Experiencia en el uso de herramientas de gestión de finanzas como SAP, etc.
- Experiencia en el uso de herramientas de gestión de logística como SAP, etc.
- Experiencia en el uso de herramientas de gestión de marketing como SAP, etc.
- Experiencia en el uso de herramientas de gestión de ventas como SAP, etc.
- Experiencia en el uso de herramientas de gestión de atención al cliente como SAP, etc.
- Experiencia en el uso de herramientas de gestión de recursos humanos como SAP, etc.
- Experiencia en el uso de herramientas de gestión de finanzas como SAP, etc.
- Experiencia en el uso de herramientas de gestión de logística como SAP, etc.
- Experiencia en el uso de herramientas de gestión de marketing como SAP, etc.
- Experiencia en el uso de herramientas de gestión de ventas como SAP, etc.
- Experiencia en el uso de herramientas de gestión de atención al cliente como SAP, etc.

Se valorará:

- Experiencia en el uso de tecnologías de desarrollo de software como Java, JavaScript, PHP, Python, Ruby, etc.
- Experiencia en el uso de frameworks de desarrollo de software como Spring, Django, Rails, etc.
- Experiencia en el uso de bases de datos como MySQL, PostgreSQL, Oracle, etc.
- Experiencia en el uso de herramientas de control de versiones como Git, SVN, etc.
- Experiencia en el uso de herramientas de automatización de pruebas como Selenium, JUnit, etc.
- Experiencia en el uso de herramientas de monitoreo de aplicaciones como Prometheus, Grafana, etc.
- Experiencia en el uso de herramientas de gestión de proyectos como Jira, Trello, etc.
- Experiencia en el uso de herramientas de gestión de configuración como Ansible, Puppet, etc.
- Experiencia en el uso de herramientas de gestión de infraestructura como Docker, Kubernetes, etc.
- Experiencia en el uso de herramientas de gestión de seguridad como OWASP, Nessus, etc.
- Experiencia en el uso de herramientas de gestión de calidad como SonarQube, etc.
- Experiencia en el uso de herramientas de gestión de documentación como Confluence, etc.
- Experiencia en el uso de herramientas de gestión de comunicación como Slack, Microsoft Teams, etc.
- Experiencia en el uso de herramientas de gestión de recursos humanos como SAP, etc.
- Experiencia en el uso de herramientas de gestión de finanzas como SAP, etc.
- Experiencia en el uso de herramientas de gestión de logística como SAP, etc.
- Experiencia en el uso de herramientas de gestión de marketing como SAP, etc.
- Experiencia en el uso de herramientas de gestión de ventas como SAP, etc.
- Experiencia en el uso de herramientas de gestión de atención al cliente como SAP, etc.

Se valorará:

- Experiencia en el uso de tecnologías de desarrollo de software como Java, JavaScript, PHP, Python, Ruby, etc.
- Experiencia en el uso de frameworks de desarrollo de software como Spring, Django, Rails, etc.
- Experiencia en el uso de bases de datos como MySQL, PostgreSQL, Oracle, etc.
- Experiencia en el uso de herramientas de control de versiones como Git, SVN, etc.
- Experiencia en el uso de herramientas de automatización de pruebas como Selenium, JUnit, etc.
- Experiencia en el uso de herramientas de monitoreo de aplicaciones como Prometheus, Grafana, etc.
- Experiencia en el uso de herramientas de gestión de proyectos como Jira, Trello, etc.
- Experiencia en el uso de herramientas de gestión de configuración como Ansible, Puppet, etc.
- Experiencia en el uso de herramientas de gestión de infraestructura como Docker, Kubernetes, etc.
- Experiencia en el uso de herramientas de gestión de seguridad como OWASP, Nessus, etc.
- Experiencia en el uso de herramientas de gestión de calidad como SonarQube, etc.
- Experiencia en el uso de herramientas de gestión de documentación como Confluence, etc.
- Experiencia en el uso de herramientas de gestión de comunicación como Slack, Microsoft Teams, etc.
- Experiencia en el uso de herramientas de gestión de recursos humanos como SAP, etc.
- Experiencia en el uso de herramientas de gestión de finanzas como SAP, etc.
- Experiencia en el uso de herramientas de gestión de logística como SAP, etc.
- Experiencia en el uso de herramientas de gestión de marketing como SAP, etc.
- Experiencia en el uso de herramientas de gestión de ventas como SAP, etc.
- Experiencia en el uso de herramientas de gestión de atención al cliente como SAP, etc.

[illegible][illegible]



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 13

Název projektu:	Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 areálu nemocnice Opočno
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové
Objednatel:	Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové
Změnový list vystavil:	Iveta Vohralíková
Datum:	09.06.2021

Předmět změny: Diamantové řezání v 1.PP

Popis a zdůvodnění změny:

V průběhu bouracích prací a likvidace technologie původní kotelny 1. PP bylo zjištěno, že obvodové zdivo prostory je navíc opatřeno statickou ŽB sténovou přibetonávkou o tl. 200 mm (viz zápis z KD č. 32, bod č. C19). Předmětná ŽB konstrukce je v kolizi s nově vyprojektovanými exteriérovými dvevními otvory zásobovací rampy (pozice dveří č. D022 a D023). Změnový list řeší dodatečné vyčištění vybourání ŽB monolitu technologií diamantového řezání.

Přílohy změnového listu: rozpočet, CN

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0 Kč	189 295,02 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
189 295,02 Kč	-

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:

Za objednatel	
Datum:	
Za autorský	
Datum:	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Pobytové služby pro seniory v areálu nemocnice Opočno -
Dodatek č.4

JKSO

Název objektu

ZL13 - Diamantové řezání v 1.PP

EČO

Místo

č.p. 431, areál nemocnice Opočno

IČO

DIČ

Objednatel

KÚ Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245

Projektant

Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

Zhotovitel

VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

09.06.2021

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	23 294,66	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště			0,00
2		Montáž	166 000,36	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce			0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy			0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy			0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN			0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu			0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		189 295,02	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)			0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady			0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 189 295,02

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	189 295,02	28 394,25
základní	21,0	0,00	0,00

Cena s DPH 217 689,27

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pobytové služby pro seniory v areálu nemocnice Opočno - Dodatek č.4

Objekt: ZL13 - Diamantové řezání v 1.PP

Objednatel: KÚ Královehradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245

Zhotovitel: VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, hradeč Králové

Místo: č.p. 431, areál nemocnice Opočno

Zpracoval:

Datum: 9. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 189 295,02

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 180 156,00

1	005	977R001	Vyříznutí otvorů pro dveře v 1.PP (D022, D023) - viz samostatný rozpočet	kpl	1,000	180 156,00	180 156,00	CN
---	-----	---------	--	-----	-------	------------	------------	----

997 Přesun sutě 9 139,02

2	R	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	6,810	700,00	4 767,00	SOD
3	R	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	6,810	250,00	1 702,50	SOD
4	R	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	286,020	1,00	286,02	SOD
" skládka České Libchavy " 6,810*42					286,020			
Součet					286,020			
5	R	997013802	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	6,810	350,00	2 383,50	SOD

Celkem 189 295,02

VALC s.r.o.
Hradec Králové

4. června 2021

CENOVÁ NABÍDKA zakázka : SLUŽBY PRO SENIORY NEMOCNICE OPOČNO

Řezy stěnovou pilou, délka řezu 2 x 2,1 m + 1 x 1,9 m, hloubka řezu 20 cm.
(2 x 2,1 m + 1 x 1,9 m) x 2 x 0,2 m x 6.500,- Kč/m² = 15.860,- Kč x 2ks = 31.720,- Kč


Jádrový vrt průměr 200 mm, délka vrtu 4 x 0,2 m, vodorovně,
4.480,- Kč/m x 0,2 m x 4 ks = 3.584,- Kč x 3ks = 10.752,- Kč

Řez diamantovou lanovou pilou,
2,1 m x 1,9 m x 7.900,- Kč/m² = 31.521,- Kč x 4ks = 126.084,- Kč

Jádrové vrty průměr 50 mm, délka vrtu 5 x 0,8 m,
2.900,- Kč/m x 5 ks x 0,8 m = 11.600,- Kč

CENA CELKEM BEZ DPH

180.156,- Kč





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 14

Název projektu:	Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 areálu nemocnice Opočno
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové
Objednatel:	Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové
Změnový list vystavil:	Iveta Vohralíková
Datum:	09.06.2021

Předmět změny: Reprofilace

Popis a zdůvodnění změny:

V průběhu bouracích prací stávajících stropních podhledů 1.PP až 2.NP byla zjištěna lokální degradace odkrytých ŽB stropních trámů (viz zápis z KD č. 9, bod č. D1). Změnový list řeší vyčíslení aplikace ochranné systémové sanace obnažených výztuží spolu s reprofilací původních ŽB stropních trámů (obnova krytí výztuže).

Přílohy změnového listu: rozpočet

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0 Kč	92 654,06 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
92 654,06 Kč	-

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:

Za objednatel

Datum:

Za autorsk

Datum:

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Pobytové služby pro seniory v areálu nemocnice Opočno - Dodatek č.4	JKSO	
Název objektu	ZL 14 - Reprofilace	EČO	
		Místo	č.p. 431, areál nemocnice Opočno
		IČO	DIČ
Objednatel	KÚ Královohradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245		
Projektant	Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek		
Zhotovitel	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, hradeč Králové		
Zpracoval			
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
		CZ-CPA	
Dne	09.06.2021		

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	50 190,72	8	Prace přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	42 463,34	9	Bez pevné podl	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		92 654,06	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 92 654,06

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	92 654,06	13 898,11
základní	21,0	0,00	0,00

Cena s DPH 106 552,17

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pobytové služby pro seniory v areálu nemocnice Opočno - Dodatek č.4

Objekt: ZL14 - Reprofilace

Objednatel: KÚ Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245

Zhotovitel: VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, hrdec Králové

Misto: č.p. 431, areál nemocnice Opočno

Zpracoval:

Datum: 9. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 92 654,06

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 92 009,44

1	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	56,000	38,48	2 154,88	SOD
2	005	985311212	Reprofilace líc kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 20 mm	m2	32,000	907,20	29 030,40	URS x 0,72
3	005	985311213	Reprofilace líc kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 30 mm	m2	24,000	1 771,20	42 508,80	URS x 0,72
4	005	985311912	Příplatek při reprofiliaci sanačními maltami za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	56,000	76,32	4 273,92	URS x 0,72
5	005	985311913	Příplatek při reprofiliaci sanačními maltami za větší členitost povrchu (sloupy, výklenky)	m2	56,000	152,64	8 547,84	URS x 0,72
6	005	985321111	Ochranný nátěr vyztuže na cementové bázi stěn, líc kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm	m2	28,000	185,76	5 201,28	URS x 0,72
7	005	985321912	Příplatek k cenám ochranného nátěru vyztuže za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	28,000	10,44	292,32	URS x 0,72

998 Přesun hmot 644,62

8	011	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	2,677	240,80	644,62	SOD
---	-----	-----------	--	---	-------	--------	--------	-----

Celkem 92 654,06



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 15

Název projektu:	Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 areálu nemocnice Opočno
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové
Objednatel:	Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové
Změnový list vystavil:	Iveta Vohralíková
Datum:	21.06.2021

Předmět změny: Koupelny

Popis a zdůvodnění změny:

- Dle požadavku budoucího provozovatele objektu nebudou v koupelnách k otopným trubkovým tělesům dodány topné tyče. Generálním dodavatelem nebude předmětná dodávka a montáž realizována. Změnový list řeší vyčíslení odpočtu položky 27 ks topných patron otopných těles ÚT.
- Na základě požadavku budoucího provozovatele dojde ke změně dispozic a výškové umístění elektro zásuvek v místnostech koupelen. Změnový list řeší vyčíslení navýšení kabeláže a ostatních prvků elektroinstalací.

Přílohy změnového listu: rozpočet

Cena méněprací bez DPH: -56 700,00 Kč	Cena víceprací bez DPH: 41 788,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: -14 912,00 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: -

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:

Za objednatele

Datum:

Za autorský

Datum:

Datum:

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Pobytové služby pro seniory v areálu nemocnice Opočno -
Dodatek č.4

JKSO

Název objektu

ZL15 - Koupelny

EČO

Místo

č.p. 431, areál nemocnice Opočno

IČO

DIČ

Objednatel

KÚ Královohradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245

Projektant

Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

Zhotovitel

VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

21.06.2021

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	37 306,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	-56 700,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	4 482,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		-14 912,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH -14 912,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	-14 912,00	-2 236,80
základní	21,0	0,00	0,00

Cena s DPH -17 148,80

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pobytové služby pro seniory v areálu nemocnice Opočno - Dodatek č.4

Objekt: ZL15 - Koupelny

Objednatel: KÚ Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245

Zhotovitel: VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, hradec Králové

Místo: č.p. 431, areál nemocnice Opočno

Zpracoval:

Datum: 21. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	
M		Práce a dodávky M					41 788,00	
21-M		Elektromontáže					4 482,00	
1	R	Pol48	zásuvka 230V/16A IP20 s krabicí IP20...!P44	ks	27,000	166,00	4 482,00	SOD
D3		kabely (CYKY)					13 896,00	
2	R		3x2,5 mm ² pevně	m	386,000	36,00	13 896,00	SOD
D5		UKONČENÍ VODICU V ROZVADECÍCH					810,00	
3	R		Do 2,5 mm ²	ks	54,000	15,00	810,00	SOD
D6		HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY					7 600,00	
4	R		Připojení technického zařízení	hod	20,000	380,00	7 600,00	SOD
<i>Demontáž stávající instalace</i>								
D7		PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK					15 000,00	
5	R		Revizní technik	hod	10,000	520,00	5 200,00	SOD
6	R		Spolupráce s reviz. technikem	hod	5,000	380,00	1 900,00	SOD
7	R		práce nepostižitelné v ceně ku	hod	5,000	380,00	1 900,00	SOD
8	R		Zednické přímomoce-sekání	hod	20,000	300,00	6 000,00	SOD
735		Ústřední vytápění - otopná tělesa					-56 700,00	
9	X45	X4576115	Topná tyč 500W k otopnému tělesu trubkovému - včetně regulátoru teploty	kus	-27,000	2 100,00	-56 700,00	SOD
Celkem							-14 912,00	



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 16
Název projektu:	Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 areálu nemocnice Opočno	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové	
Objednatel:	Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	Iveta Vohralíková	
Datum:	23.06.2021	
Předmět změny: Nadokenní prvky		
Popis a zdůvodnění změny: V průběhu bourání stávajících okenních výplní a stropních podhledů místností č. 110 a 210 bylo zjištěno, že nad horní úroveň okenních ráků jsou instalovány plechové roletové schránky. Z důvodu požadavku zachování průběžné fasádní linie horní a dolní úrovně oken je nutné u nových okenních pozic, pro zajištění dostatečné tuhosti kotvení, nahradit původní roletový prvek systémovým prvkem purenit. Změnový list řeší dodatečné vyčíslení dodávky a montáže předmětného nadokenního prvku vč. úprav povrchů SDK zakrytování.		
Přílohy změnového listu: rozpočet, CN		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0 Kč	49 513,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
49 513,00 Kč	-	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:		
Datum:		
Za autorský doz		
Datum:		

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Pobytové služby pro seniory v areálu nemocnice Opočno -
Dodatek č.4

JKSO

Název objektu

ZL16 - nadokenní prvky

EČO

Místo

č.p. 431, areál nemocnice Opočno

IČO

DIČ

Objednatel

KÚ Královohradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245

Projektant

Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

Zhotovitel

VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

23.06.2021

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnňkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	49 513,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7 ZRN (ř. 1-6)			49 513,00	12 DN (ř. 8-11)				19 VRN (ř. 13-18)		0,00	
20 HZS			0,00	21 Kompl. činnost			0,00	22 Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 49 513,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	49 513,00	7 426,95
základní	21,0	0,00	0,00

Cena s DPH 56 939,95

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pobytové služby pro seniory v areálu nemocnice Opočno - Dodatek č.4

Objekt: ZL16 - nadokenní prvky

Objednatel: KÚ Královehradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245

Zhotovitel: VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, hradec Králové

Místo: č.p. 431, areál nemocnice Opočno

Zpracoval:

Datum: 23. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		PSV	Práce a dodávky PSV				49 513,00
		763	Konstrukce suché výstavby				21 356,00
1	R	763R001	D+M SDK obloukového nadpraží oken	kpl	1,000	21 356,00	21 356,00
		766	Výplně otvorů				28 157,00
2	R	766R001	D+M purenitu	kpl	1,000	28 157,00	28 157,00
		Celkem					49 513,00

UNI-GIPS spol. s r. o.,

Pražská třída 13, 500 04 Hradec Králové

IČO : 60109726

DIČ : CZ60109726

email : obchod@unigips.cz

tel: 602 645 115


CENOVÁ NABÍDKA

zakázka : VALC s.r.o. - NEMOCNICE OPOČNO

		jed	množ	Kč	
1.	D+M obloukového nadpraží oken	bm	12	1680	20 160,00 Kč
2.	přesun hmot	%	3,99	200	798,00 Kč
3.	doprava	%	1,99	200	398,00 Kč
	CENA CELKEM BEZ DPH				21 356,00 Kč

sestavil : Libor Kudr

dne : 23. 6. 2021





okna

PKS okna a.s.

Středořímský


Zadavatel:

VALC, Opočno

Opočno, HK

Telefon :

E-mail :



KA OKEN A DVEŘÍ

Cenová nabídka: P004160H

ze dne 22.6.2021

Vážená paní, vážený pane,

dovolujeme si Vám předložit cenovou nabídku na výrobu a dodávku **plastových oken a dveří** od společnosti PKS okna a.s. Společnost PKS okna a.s. má v oblasti výroby a dodávky oken více než 29leté zkušenosti a svojí činností se řadí mezi 5 největších výrobců oken v České republice. Naším plastovým výrobkům naprosto důvěřujeme, a proto na ně poskytujeme **záruku 72 měsíců**.

Více informací o výrobcích i o společnosti PKS okna a.s. získáte na www.pksokna.cz


Pozice	Množství	Popis	Cena / ks	Cena celkem
1	5 ks	Purenit k pol.110 Jedn.cena (5 ks * 1.108,00 Kč = 1.108,00 Kč)	1.108,00	5.540,00
2	5 ks	Purenit k pol.210 Jedn.cena (5 ks * 1.892,80 Kč = 1.892,80 Kč)	1.893,00	9.465,00
3	1 ks	Kotvy KP5 a turbošrouby Jedn.cena (1 ks *2.512,00 Kč = 1.512,00 Kč)	2.512,00	2.512,00
4	1 ks	Montážní práce Jedn.cena (1 ks *10.640,00 Kč =10.640,00 Kč)	10.640,00	10.640,00

Celková cena		28.157,00 Kč
DPH 0%	0,00 %	0,00 Kč
Celková cena		<u>28.157,00 Kč</u>

Tato cenová nabídka je platná do okamžiku naplnění výrobní kapacity.

S přátelským pozdravem

Václav Pavliš



ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 na st.p.č.453 v areálu nemocnice Opočno

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	82 426 090,59 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 243 476,82 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 56 700,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 5	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 243 476,82 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 56 700,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	300 176,82 Kč bez DPH		
a) (Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)	300 177 Kč ≤ 137 366 000 Kč	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 %	0,36 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	82 426 090,59 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 154 390,80 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 108 086,35 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 189 295,02 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 451 772,17 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	451 772,17 Kč bez DPH		
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,55 % ≤ 50,00 %	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	82 426 090,59 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 727 366,69 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 629 898,36 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 36 856,30 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Vícepráce (k odst. 6)	+ 1 312 727,37 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 219 627,80 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 2 669 992,42 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 256 484,10 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	2 926 476,52 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	3,55 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6			
Smluvní cena		82 426 090,59 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 451 772,17 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 2 669 992,42 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	– 256 484,10 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		2 865 280,49 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	3,48 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč	Dodatek č. 2	ANO
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč	Dodatek č. 4	ANO
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč	Dodatek č. 4	ANO
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	4
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 1 745 499,21 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	– 276 327,80 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	1 469 171,41 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	82 426 090,59 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	82 426 090,59 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	83 307 848,08 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	84 008 976,49 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 4	85 478 147,90 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	85 478 147,90 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Ing. Jiří Strnad
