

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel **Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451**

IČO 48623687
se sídlem Řezníčkova 451, 547 01 Náchod
zástupce Pavel Škoda, ředitel

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel **CE - ING s.r.o.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 35921

se sídlem Polská 375, Běloves, 547 01 Náchod
IČO 04475631
DIČ CZ04475631
zastoupený Janem Čejchanem, jednatelem
bankovní spojení Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu 3959710399/0800

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 4. 2022 na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky „**Stavební úpravy auly II - č. akce SM/19/358,**“ zahájeného uveřejněním výzvy k podání nabídek dne 16. 2. 2022, smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění pozdějších změn souhrnně jako „smlouva o dílo“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech (ZL) č. 1 – 8, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo obdobně s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné vícepráce a méněpráce.
3. Změna závazku ze smlouvy dle ZL č. 4 není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona.
4. Změna závazku ze smlouvy dle ZL č. 1 – 3 a 5 – 8 není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla dle článku 4 a 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovými listy č. 1 – 8, které tvoří přílohu tohoto dodatku.

2. Tabulka ceny díla dle článku 7 odst. 2 smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:


Celková cena dle původní smlouvy o dílo v Kč bez DPH	5.494.321,36
Vícepráce dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	823.318,03
Méněpráce dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	483.844,73
Celková cena dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	5.833.794,66
DPH dle dodatku č. 1 v Kč samostatně	1.225.096,88
Celková cena dle dodatku č. 1 v Kč včetně DPH	7.058.891,54

Závěrečná ustanovení

1. Otázky dodatkem výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Je-li uzavřen v listinné podobě, je tento dodatek vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě přečetly a že nebyl uzavřen v tísní nebo za jednostranně nevýhodných podmínek.

Za objednatele v Náchodě

30.8.2022



Pavel Škoda
ředitel

Jiráskovo gymnázium
Náchod, Řezníčkova 451
547 01 NACHOD
IČO: 486 23 687 IZO: 102266247
tel./fax: +420 491 423 243
e-mail: sekretariat@gymnachod.cz
www.gymnachod.cz

Za zhotovitele v Náchodě

30.8.2022

CE-ING

[6]

Polská 375, 547 01 Náchod
...IČO: 044.75.631. DIČ: CZ04475631...

Jan Čejchan
jednatel



ZMĚNOVÝ LIST – osvětlení schodiště		číslo ZL: 1
Název projektu:	Stavební úpravy auly II - č. akce SM/19/358	
Zhotovitel:	CE-ING s.r.o., IČO: 044 75 631	
Objednatel:	Jiráskovo gymnázium, Náchod, IČO: 48623687	
Změnový list vystavil:	Čejchan Jan	
Datum:	01.07.2022	
Předmět změny: prostorové osvětlení stupňů, rozvody elektroinstalace a slaboproudu Po odstranění nášlapné vrstvy hlediště bylo zjištěno, že stávající prostorové osvětlení stupňů je v nevyhovujícím stavu – popraskané chrániče a krabice a část světel není v provozu. Jejich oprava není možná, jelikož jsou dřívějšího provedení (cca 40 let staré). Bylo rozhodnuto o jejich výměně. Dále po odstranění části nosných stupňů hlediště bylo rozhodnuto o změně trasy a vypuštění části podlahových krabic z důvodu nosné konstrukce hlediště a jejím nahrazením za kabelové žlaby.		
Přílohy změnového listu: Rozpočet Změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Posun termínu: : ne Předání staveniště proběhlo dne : 16.05.2022 dokončení díla dle SOD: do 16.9.2022 § 222 zákona odst. 6		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 51.307,- Kč	79.027,87 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
27.720,87 Kč	Nemění se	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Pavel Škoda	Čejchan Jan	
Datum: 1.7.2022	Datum: 1.7.2022	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Ing. Arch. Michal Ježek	Martin Pelda, Ing. Zdeněk Nývlt	
Datum: 1.7.2022	Datum: 1.7.2022	

Martin Pelda
 V Kapse 114, 547 01 Náchod
 mobil: 603 251 085
 e-mail: martin.pelda@gmail.com
 IČ: 01300636 DIČ: CZ7306213244

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

JirGymAula, SÚ auly

Objekt:

ZL01 - osvětlení schodiště hlediště

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

01.07.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

27 720,87

DPH základní snížená	Základ daně 27 720,87 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 5 821,38 0,00
-------------------------	----------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

Cena s DPH

v CZK

33 542,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

1. 7. 2022

Jiráskovo gymnázium.
Náchod, Rezníčková 451
547 01 NÁCHOD
IČO: 486 23 687 IZO: 102266247
tel./fax: +420 491 423 243
e-mail: sekretariat@gymnachod.cz
www.gymnachod.cz

Datum a podpis:

Razítko

CE-ING
Polská 375, 547 01 Náchod
IČO: 044 75 631 DIČ: CZ0447567

Datum a podpis:

Razítko

1. 7. 2022

Martin Pelda

V Kapse 114, 547 01 Náchod
mobil: 603 251 085
e-mail: martin.pelda@gmail.com
IČ: 01300636 DIČ: CZ7306213244

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: JirGymAula, SÚ auly

Objekt: **ZL01 - osvětlení schodiště hlediště**

Místo:

Datum: 01.07.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

27 720,87

PSV - Práce a dodávky PSV

27 720,87

742 - Elektroinstalace - slaboproud

27 720,87

SOUPIS PRACÍ

Stavba: JirGymAula, SÚ auly

Objekt: ZL01 - osvětlení schodiště hlediště

Místo: Datum: 01.07.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 27 720,87

D PSV Práce a dodávky PSV 27 720,87

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 27 720,87

1	K	742001R	Osvětlení schodiště a změny tras	m	1,000	27 720,87	27 720,87	
---	---	---------	----------------------------------	---	-------	-----------	-----------	--

CE-ING, Aula Gymnázium Náchod (N1220021)

01.07.2022

v2

27 720,87

Vícepráce č. 1

VV	x	x	C. pol.	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
EL			D	Výměna svítidel ve schodech				30 628,08
EL				Svítidlo orientační, kovové zapuštěné 1,8W, 12V	ks	24,00	1 151,31	27 631,38
EL				Pomocný materiál pro uchycení svítidla	ks	24,00	124,86	2 996,70
EL			E	Odpočet podlahových krabic, záměna za krabici dle požadavku				-45 721,27
EL			14	Podlahová krabice (10 modulů) bez výzbroje přístup ke žlabu vrchem ze schodiště..		-5,00	10 261,40	-51 307,00
EL				Podlahová krabice 8 modulů 45x45, plast, víko pro koberec, náplň 1x zás. 230V, 2x zás. RJ45	ks	1,00	5 585,73	5 585,73
EL			F	Doplnění přívodního kabelu dle skutečnosti				4 747,50
EL			29	CYKY J4x16	m	15,00	269,90	4 048,50
EL			16	Kabel do CYKY 4x16 uložení pod omítkou	m	15,00	46,60	699,00
SLP			N	Doplnění kabelové trasy pod schody				38 066,56
SLP				Kabelový žlab 125x50, plechový plný vč. víka a příslušenství	m	60,00	588,61	35 316,56
SLP				Koordinační činnosti - nové řešení	kpl	1,00	1 650,00	1 650,00
SLP				Revize - nové řešení	kpl	1,00	1 100,00	1 100,00
CELKEM ELEKTRO								27 720,87

1.7. 2022

Martin Pelda


V Kapse 114, 547 01 Náchod

mobil: 603 251 085

e-mail: martin.pelda@gmail.com

IČ: 01300636 DIČ: CZ7306213244



ZMĚNOVÝ LIST – topení		číslo ZL: 2
Název projektu:	Stavební úpravy auly II - č. akce SM/19/358	
Zhotovitel:	CE-ING s.r.o., IČO: 044 75 631	
Objednatel:	Jiráskovo gymnázium, Náchod, IČO: 48623687	
Změnový list vystavil:	Čejchan Jan	
Datum:	08.07.2022	
Předmět změny: přeložka rozvodu topení Dle PD bylo nutné provést přeložku rozvodu topení. Nebylo obsaženo v VV. <i>Změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.</i>		
Přílohy změnového listu: Rozpočet Posun termínu: : ne Předání staveniště proběhlo dne : 16.05.2022 dokončení díla dle SOD: do 16.9.2022 § 222 zákona odst. 6		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 0,- Kč	6.860,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
6.860,- Kč	Nemění se	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Pavel Škoda	Čejchan Jan	
		
Datum: 8.7.2022	Datum: 8.7.2022	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Ing. Arch. Michal Ježek	Martin Pelda, Ing. Zdeněk Nývlt	
		
Datum: 8.7.2022	Datum: 8.7.2022	

Martin Pelda
 V Kapse 114, 547 01 Náchod
 mobil: 603 251 085
 e-mail: martin.pelda@gmail.com
 IČ: 01300636 DIČ: CZ7306213244

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
JirGymAula, SÚ auly
Objekt:
ZL02 - topení

KSO:
Místo:
Zadavatel:

CC-CZ:
Datum: 08.07.2022

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			6 860,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	6 860,00 0,00	21,00% 15,00%	1 440,60 0,00
Cena s DPH v CZK			8 300,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

8.7. 2022

Jiráskovo gymnázium.
Náchod, Řezníčkova 451
547 01 NÁCHOD
IČO: 486 23 687 IZO: 102266247
tel./fax: +420 491 423 243
e-mail: sekretariat@gymnachod.cz
www.gymnachod.cz

Datum a podpis:

Razítko

CE-ING
Polská 375, 547 01 Náchod
IČO: 044 75 631 DIČ: CZ04475661

Datum a podpis:

Razítko

8.7. 2022

Martin Pelda
V Kapse 114, 547 01 Náchod
mobil: 603 251 085
e-mail: martin.pelda@gmail.com
Č: 01300636 DIČ: CZ7306213244

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: JirGymAula, SÚ auly
Objekt: **ZL02 - topení**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 08.07.2022
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	6 860,00
PSV - Práce a dodávky PSV	6 860,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	6 860,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: JirGymAula, SÚ auly
Objekt: ZL02 - topení

Místo: Datum: 08.07.2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							6 860,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				6 860,00	
D	733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				6 860,00	
2	K	733002R	Přeložení potrubí - viz samostatný rozpočet	m	1,000	6 860,00	6 860,00	

1. Úprava ÚT v č.m. 2.12

Vysekání rýh ve stěně	m	8
Vybourání podlahové konstrukce	m2	3,2
Přeložení potrubí ÚT	m	17,8
Izolace potrubí	m	17,8
Začištění rýh ve zdivu	m	8
Oprava omítky štukové	m2	3,2
Oprava stávající podlahy zaklopením - deska OSB tl. 18mm	m2	3,5
Přesun hmot	kpl	1

Cena celkem

6 860,00 Kč

8.7.2022

Martin Pelda

V Kapse 114, 547 01 Náchod

mobil: 603 251 085

e-mail: martin.pelda@gmail.com

IČ: 01300636 DIČ: CZ7306213244

ZMĚNOVÝ LIST – změna okna, jeviště		číslo ZL: 3
Název projektu:	Stavební úpravy auly II - č. akce SM/19/358	
Zhotovitel:	CE-ING s.r.o., IČO: 044 75 631	
Objednatel:	Jiráskovo gymnázium, Náchod, IČO: 48623687	
Změnový list vystavil:	Čejchan Jan	
Datum:	08.07.2022	
Předmět změny: změna okna, zatemnění jeviště a hlediště Na základě místního šetření, informací dodavatele jevištních závěsů a opony a zjištění po odkrytí konstrukcí – navrhovaná výměna okna na jevišti - bylo zakryto dřevotřískovými deskami. Z důvodu komplexního zatemnění (závěs odsazený od stěn na lanech – nedokonalé zatemnění prostor jeviště) se nebude provádět vybourání okenního otvoru dle PD po odkrytí – okno bylo již dříve repasováno, tudíž není potřeba toto okno měnit (v tvorbě PD nebyl přístup – pouze vizuální kontrola z ulice). Dojde k vytvoření nové předsazené stěny z SDK konstrukce v místě okna jeviště s vložením grafitového styrenu a výmalba nové předsazené stěny tmavou barvou. Po odkrytí akustického stávajícího panelu hlediště – zadní část je nutné provést u stávajícího okna, které zůstává, stejnou úpravu s předsazenou stěnou jako u jeviště pouze se zvětšením tloušťky styrenu pro lepší tepelný komfort v místě sezení hlediště. Vše zjištěno až po odkrytí bouraných konstrukcí. <i>Změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.</i> Přílohy změnového listu: Rozpočet Posun termínu: : ne Předání staveniště proběhlo dne : 16.05.2022 dokončení díla dle SOD: do 16.9.2022 § 222 zákona odst. 6		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 70.885 ,- Kč	14.047,02 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- 56.837,98 Kč	Nemění se	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Pavel Škoda	Čejchan Jan	
Datum: 8.7.2022	Datum: 8.7.2022	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Ing. Arch. Michal Ježek	Martin Pelda,	
Datum: 8.7.2022	Ing. Zdeněk Nývlt	
	Datum: 8.7.2022	

Martin Pelda
V Kapse 114, 547 01 Náchod
mobil: 603 251 085
e-mail: martin.pelda@gmail.com
IČ: 01300636 DIČ: CZ73062411

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

JirGymAula, SÚ auly

Objekt:

ZL03 - změna okna, úprava jeviště stavební, zatemnění

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

08.07.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-56 837,98

DPH základní
snižená

Základ daně

-56 837,98

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-11 935,98

0,00

Cena s DPH

v CZK

-68 773,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

8.7.2022

Škoda

Jiráskovo gymnázium,
Náchod, Rezníčková 451

547 01 NÁCHOD

IČO: 486 23 687 IZO: 102266247

tel./fax: +420 491 423 243

e-mail: sekretariat@gymnachod.cz

www.gymnachod.cz

Datum a podpis:

Razítko

8.7.2022

Martin Pelda

V Kapse 114, 547 01 Náchod

mobil: 603 251 085

e-mail: martin.pelda@gmail.com

IČ: 01300636 DIČ: CZ7306213244

CE-ING

6

Polská 375, 547 01 Náchod

IČO: 044 75 631 DIČ: CZ04475631

8.7.2022

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

JirGymAula, SÚ auly

Objekt:

ZL03 - změna okna, úprava jeviště stavební, zatemnění

Místo:

Datum: 08.07.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-56 837,98
PSV - Práce a dodávky PSV	-56 837,98
713 - Izolace tepelné	4 520,64
763 - Konstrukce suché výstavby	8 384,17
766 - Konstrukce truhlářské	-70 885,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 142,21

SOUPIS PRACÍ

Stavba: JirGymAula, SÚ auly

Objekt: ZL03 - změna okna, úprava jeviště stavební, zatemnění

Místo:

Datum: 08.07.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-56 837,98	
D PSV Práce a dodávky PSV							-56 837,98	
D 713 Izolace tepelné							4 520,64	
2	K	713131121	Montáž izolace tepelné stěn přichycením dráty rohoží, pásů, dílců, desek	m2	10,977	95,54	1 048,74	CS ÚRS 2022 02 x koef 0,99
	VV		1,46*2,48+1,98*3,715		10,977			
3	M	28376071	deska EPS grafitová fasádní $\lambda=0,030-0,031$ tl 30mm	m2	3,983	135,63	540,21	CS ÚRS 2022 02 x koef 0,99
	VV		1,46*2,48*1,1		3,983			
4	M	28376075	deska EPS grafitová fasádní $\lambda=0,030-0,031$ tl 80mm	m2	8,091	362,34	2 931,69	CS ÚRS 2022 02 x koef 0,99
	VV		1,98*3,715*1,1		8,091			
D 763 Konstrukce suché výstavby							8 384,17	
5	K	763121421	SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xH2 12,5 s izolací EI 30	m2	3,571	832,59	2 973,18	CS ÚRS 2022 02 x koef 0,99
	VV		1,44*2,48		3,571			
6	K	763121422	SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15	m2	7,356	709,83	5 221,51	CS ÚRS 2022 02 x koef 0,99
	VV		1,98*3,715		7,356			
7	K	763121751	Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	3,571	53,06	189,48	CS ÚRS 2022 02 x koef 0,99
D 766 Konstrukce truhlářské							-70 885,00	
1	K	76662-02	*OI/04 - Dod+mtz vnějšího okna roz. 1460x2480mm, členění 2x3, všechna křídla otevíravé/vyklápěcí. Okno s průřezem tepelným mostem, kování kovové zářezové dle konkrétní nabídky dodavatele. Zasklení trojnásobné čiré tepelně-izolační. Povrch vyzorkovat dle	soub	-1,000	70 885,00	-70 885,00	SOD
	VV		-1		-1,000			
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							1 142,21	
8	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	10,927	21,60	236,02	SOD
	VV		3,571+7,356		10,927			
9	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	10,927	26,64	291,10	SOD
10	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	10,927	48,84	533,67	SOD
11	K	784221157	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu náročném	m2	3,571	22,80	81,42	SOD

Martin Pelda

V Kapse 114, 547 01 Náchod

mobil: 603 251 085

e-mail: martin.pelda@gmail.com

IČ: 01300636 DIČ: CZ7306213244

ZMĚNOVÝ LIST – úprava sil a slp		číslo ZL: 4
Název projektu:	Stavební úpravy auly II - č. akce SM/19/358	
Zhotovitel:	CE-ING s.r.o., IČO: 044 75 631	
Objednatel:	Jiráskovo gymnázium, Náchod, IČO: 48623687	
Změnový list vystavil:	Čejchan Jan	
Datum:	08.07.2022	
Předmět změny: úprava silnoproudu a slaboproudu Na základě schůzky mezi projektantem, provozovatelem, GD a hlavně divadelním technikem (Jiráskovo divadlo Hronov) bylo vybavení auly aktualizováno v souladu s vývojem technologií tak, aby rozvody umožňovaly datové přenosy v současných standardech, aby do budoucna nebylo nutné zbytečně zasahovat (bourat, strhávat koberce...) do zrekonstruované auly, aby provoz byl energeticky úspornější a ovládání jednodušší. Přílohy změnového listu: Rozpočet Posun termínu: : <i>ne</i> Předání staveniště proběhlo dne : 16.05.2022 dokončení díla dle SOD: do 16.9.2022 § 222 zákona odst. 4		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 210.408,48 Kč	509.754,44 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
299.345,96 Kč	Nemění se	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Pavel Škoda	Čejchan Jan	
Datum: 8.7.2022	Datum: 8.7.2022	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Ing. Arch. Michal Ježek	Martin Pelda, Ing. Zdeněk Nývlt	
Datum: 8.7.2022	Datum: 8.7.2022	

Martin Pelda
V Kapse 114, 547 01 Náchod
mobil: 603 251 085
e-mail: martin.pelda@gmail.com
IČ: 01300636 DIČ: CZ7306213244

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

JirGymAula, SÚ auly

Objekt:

ZL04 - změna - úpravy slb, sil rozvodů a koncových prvků

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

08.07.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

299 345,96

DPH základní
snižena

Základ daně

299 345,96

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

62 862,65

0,00

Cena s DPH

v CZK

362 208,61

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

8.7. 2022

Škoda

Jiráskovo gymnázium,
Náchod, Řezníčkova 451

547 01 NÁCHOD

IČO: 486 23 687 IZO: 102266247

tel./fax: +420 491 423 243

e-mail: sekretariat@gymnachod.cz

www.gymnachod.cz

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

8.7. 2022

Martin Pelda

V Kapse 114, 547 01 Náchod

mobil: 603 251 085

e-mail: martin.pelda@gmail.com

IČ: 01300636 DIČ: CZ7306213244

CE-ING

CE

Polská 375, 547 01 Náchod
IČO: 044 75 631 DIČ: CZ04475631

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: JirGymAula, SÚ auly

Objekt: ZL04 - změna - úpravy slb, sil rozvodů a koncových prvků

Místo:

Datum: 08.07.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	299 345,96
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
M - Práce a dodávky M	299 345,96
22-M02 - Slaboproudé rozvody	399 273,72
21-M - Elektromontáže	-99 927,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba: JirGymAula, SÚ auly

Objekt: ZL04 - změna - úpravy slb, sil rozvodů a koncových prvků

Misto: Datum: 08.07.2022

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							299 345,96	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00	
D	M		Práce a dodávky M				299 345,96	
D	22-M02		Slaboproudé rozvody				399 273,72	
2	K	01slp-R	Dod+mtž SLP - viz.samostatný rozpočet - úprava	soub	1,000	399 273,72	399 273,72	
D	21-M		Elektromontáže				-99 927,76	
1	K	01sil-R	Dod+mtž Silnoproudých rozvodů a osvětlení - viz.samostatný rozpočet - úprava	soub	1,000	-99 927,76	-99 927,76	

Martin Pelda

/ Kapse 114, 547 01 Náchod

mobil: 603 251 085

mail: martin.pelda@gmail.com

01300636 DIČ CZ7306213244

VV	x	x	Č. pol.	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
EL Silnoproud								-99 927,76
			A	<i>Doplnění stmívání osvětlení nad a pod balkonem (celkem budou 4 nezávislé stmívané kanály osvětlení s možností centrálního vypnutí - 1) lustr, 2) reflektory po obvodu sálu, 3) svítidla nad balkonem, 4) svítidla pod balkonem)</i>				15 175,03
EL			22	Regulátor Dali např. DAP-04 PWM	ks	2,00	4 322,16	8 644,32
EL				Stmívač DALI triakový 288W	ks	2,00	3 265,36	6 530,71
			B	<i>Odpočet stmívačů scénického osvětlení z rozpočtu silnoproudu (nový typ je uveden ve aktuálním rozpočtu slaboproudu)</i>				-128 117,80
EL			26	Nástěnný stmívač DDP121B-WM-TER (12 OKRUHU)	ks	-2,00	64 058,90	-128 117,80
			C	<i>Úprava ovládacích skříní</i>				13 015,01
				ROZVÁDĚČ RSA 1 stávající ÚPRAVA doplnění: - 1x jistič 32C/3 + 1x chránič 40/4/003 - zásuvky 400V pro AV - 4x jistič 16C/1 + 1x chránič 40/4/003 - zásuvky pro aktivní repro - 5x jistič 16B/1 - zásuvky pro scénické osvětlení	ks	1,00	6 005,41	6 005,41
EL				OVLAĐACÍ SKRINKA MS 1 (TECH. ZAZEMI) doplnění: - provedení v RAL dle výběru investora (atypická výroba) - 1x vypínač 20A/1 + stykač 20A/3 - ovládání zásuvek repro	ks	1,00	986,76	986,76
				OVLAĐACÍ SKRINKA MS Z (V AULE) doplnění: - provedení v RAL dle výběru investora (atypická výroba) - 1x vypínač 20A/1 + stykač 20A/3 - ovládání zásuvek repro - 14x datová zásuvka Cat6 STP	ks	1,00	4 747,93	4 747,93
EL			oprava	OVLAĐACÍ SKRINKA MS 3 (U VSTUPU) doplnění: - provedení v RAL dle výběru investora (atypická výroba) - 1x vypínač 20A/1 + stykač 20A/3 - ovládání zásuvek repro	ks	1,00	1 274,91	1 274,91
SLP Slaboproud								399 273,72
			G	<i>Doplnění zásuvek 400V</i>				13 146,31
SLP				Zásuvka 400V/32A/5p zapuštěná	ks	1,00	1 063,17	1 063,17
SLP				Zásuvka 400V/32A/5p nástěnná kombinovaná se zásuvkou 230V	ks	2,00	958,63	1 917,26
SLP				CYKY 5x6	m	50,00	171,21	8 560,59
SLP				Krabice KO125	ks	2,00	235,79	471,57
SLP				Trubka ochranná 50mm	m	15,00	75,58	1 133,71
			H	<i>Doplnění zásuvek 230V pro aktivní reproduktory</i>				23 660,00
SLP			2	EI krabice zapuštěná KR 68 pod přístorje spojitelná	ks	10,00	7,30	73,00
SLP			2	krabicová rozvodka zpuštěná vč. upevnění	ks	10,00	37,90	379,00
SLP			9	Zásuvka 1 f. jednoduchá 230 V zap. s clonkami IP 20	ks	10,00	146,80	1 468,00
SLP			14	Připojení a upevnění zásuvek	ks	10,00	136,00	1 360,00
SLP			27	CYKY J3x2,5	m	200,00	68,60	13 720,00
SLP			12	Kabel CYKY na povrchu a pod om.	m	200,00	33,30	6 660,00
			I	<i>UTP rozvod</i>				18 302,21
SLP			2	EI krabice zapuštěná KR 68 pod přístorje spojitelná	ks	3,00	7,30	21,90
SLP			2	krabicová rozvodka zpuštěná vč. upevnění	ks	3,00	37,90	113,70
SLP			oprava	Zásuvka datová Cat6 FTP	ks	2,00	543,94	1 087,88
SLP			oprava	Kabel Cat6 S/FTP	m	160,00	62,16	9 945,02
SLP				Patch panel vč. zapojení	kpl	1,00	2 912,72	2 912,72
SLP			6	Trubka PVC , pod omítku i na,	m	70,00	60,30	4 221,00
			J	<i>FTP rozvod</i>				49 197,05
SLP			2	EI krabice zapuštěná KR 68 pod přístorje spojitelná	ks	6,00	7,30	43,80
SLP			2	krabicová rozvodka zpuštěná vč. upevnění	ks	6,00	37,90	227,40
SLP			oprava	Kabel Cat6 S/FTP	m	380,00	62,16	23 619,41
SLP				Zapojení kabeláže na patch panelu	kpl	1,00	4 160,24	4 160,24
SLP			6	Trubka PVC , pod omítku i na,	m	100,00	60,30	6 030,00
SLP				Trubka ochranná 50mm	m	200,00	75,58	15 116,20
			K	<i>Rozvod zvuku</i>				52 148,73
SLP			původní SLP	Mikrofonní kabel viz příloha č.4	bal	-1,00	13 474,56	-13 474,56
SLP			původní SLP	Mikrofonní kabel metráž viz příloha č.4	m	-15,00	104,88	-1 573,20
SLP				Kabel SCY 2x2,5	m	140,00	77,06	10 788,65
SLP				Multi par kabel Sommer cable mistral MCF12	m	70,00	273,63	19 154,23
SLP				Multi par kabel Sommer cable mistral MCF08	m	30,00	219,01	6 570,21
SLP				Sommer Cable SC Stage 22 Highflex SW	m	465,00	59,50	27 668,39
SLP			6	Trubka PVC , pod omítku i na,	m	50,00	60,30	3 015,00
			L	<i>Rozvod DMX</i>				21 681,38
SLP			původní SLP	Kabel DMX - metráž	m	-160,00	77,56	-12 409,60
SLP			oprava	Kabel Cat6 S/FTP	m	500,00	62,16	31 078,18
SLP			6	Trubka PVC , pod omítku i na,	m	50,00	60,26	3 012,80

SLP									
SLP		M	Doplnění zásuvek 230V pro scénické osvětlení (nestmívané zásuvky)						29 411,00
SLP		2	El krabice zapuštěná KR 68 pod přístorje spojitelná	ks	12,00	7,30		87,60	
SLP		2	krabicová rozvodka zpuštěná vč. upevnění	ks	12,00	37,90		454,80	
SLP		9	Zásuvka 1 f. jednoduchá 230 V zap. s clonkami IP 20	ks	12,00	146,80		1 761,60	
SLP		14	Připojení a upevnění zásuvek	ks	12,00	136,00		1 632,00	
SLP		27	CYKY J3x2,5	m	250,00	68,60		17 150,00	
SLP		12	Kabel CYKY na povrchu a pod om.	m	250,00	33,30		8 325,00	
SLP									
SLP		O	Dodávka zařízení zvuku						115 820,09
SLP		původní SLP	Zvukový pult viz příloha č.3 - Mix pult Behringer Xenyx X1832USB - odpočet za požadavky	ks	1,00	-1 267,30		-1 267,30	
SLP		původní SLP	aktivní reprobox / sada 1pár viz příloha č.5 -Reprobedny RCF ART 915-A - upřesnění specifikace - původní se již nevyrábí +	ks	2,00	14 516,22		29 032,44	
SLP		navíc	Reprobedny EV ZXA1-90B / (RCF Art 708-A MK IV)	ks	5,00	14 202,50		71 012,50	
SLP		původní SLP	Stojan na reprobox viz příloha č.6	ks	-2,00	2 956,62		-5 913,24	
SLP		původní SLP	Držák reproduktoru lakovaný - nosnost 30kg	ks	-2,00	1 408,98		-2 817,96	
SLP		oprava	Držáky na zeď Milenium multispeaker MSW4	ks	2,00	671,89		1 343,78	
SLP		původní SLP	Koncovky kabelu M+F viz příloha č.4	ks	-24,00	208,38		-5 001,12	
SLP			Konektor XLR Neutrik NC3 FD-L1	ks	12,00	98,33		1 179,90	
SLP			Konektor XLR Neutrik NC3 MD-L1	ks	20,00	93,96		1 879,10	
SLP			Neutrik NC3 MXX	ks	14,00	93,96		1 315,37	
SLP			Neutrik NC3 FXX	ks	14,00	93,96		1 315,37	
SLP			Patch panel Neutrik NYS SPP L1 Set	ks	1,00	1 857,25		1 857,25	
SLP			the sssnake SK369S-06 Patchcable	ks	1,00	264,39		264,39	
SLP			pro snake TPY 2030 KPP	ks	1,00	168,25		168,25	
SLP			pro snake TPI-Twin 3.0	ks	1,00	221,78		221,78	
SLP			Cordial CFY 3 VPP	ks	1,00	327,75		327,75	
SLP			Palmer PAN 04	ks	1,00	2 185,00		2 185,00	
SLP			the sssnake MXP 8050	ks	1,00	857,61		857,61	
SLP			Stairville DIN 8 pol. Plug Male	ks	1,00	147,49		147,49	
SLP			Stairville DIN 8 Pin Jack	ks	1,00	131,10		131,10	
SLP			the sssnake SRR 8050	ks	1,00	723,24		723,24	
SLP			Thon Studio Rack 18U 50 black	ks	1,00	4 151,50		4 151,50	
SLP			Thon Rack Panel 1U	ks	2,00	105,97		211,95	
SLP			Thon Rack Panel 4U Flat	ks	2,00	280,77		561,55	
SLP			Adam Hall 874 E 03 Rack Drawer ERGO	ks	1,00	1 484,71		1 484,71	
SLP			Zakončovací krabičky na stěnách	ks	9,00	161,24		1 451,19	
SLP			Jack 6,3mm Neutrik NP3X	ks	34,00	131,10		4 457,40	
SLP			Panel pro snake Front Panel 4HE	ks	2,00	345,23		690,46	
SLP			Plechová krabice pro snake Stagebox Housing 9915	ks	2,00	640,21		1 280,41	
SLP			Neutrik DBA Blanking Plate	ks	8,00	27,31		218,50	
SLP			Thon Rack Panel 1U 8XLR	ks	1,00	211,95		211,95	
SLP		oprava	Millenium Multi Speaker Wallmount MSW1	ks	4,00	534,45		2 137,80	
SLP									
SLP		P	Dodávka zařízení scénického osvětlení						50 570,46
SLP		původní SLP	Světelný pult viz příloha č.1	ks	-1,00	11 637,54		-11 637,54	
SLP			Mixpult Showtec Showmaster 24MKII	ks	1,00	6 336,50		6 336,50	
SLP		původní SLP	Rozbočovač DMX signálu viz příloha č.2 - upřesnění specifikace - původní se již nevyrábíSplitter Botex DMX Splitter DD-6 RDM	ks	1,00	1 431,98		1 431,98	
SLP			Výkonové jednotky Botex DPX-1210T NET	ks	1,00	18 572,50		18 572,50	
SLP			Výkonové jednotky Botex DPX-620 III 6-Ch. Dimmer	ks	1,00	10 160,25		10 160,25	
SLP		původní SLP	Kovová rozvodná uzamykatelná skříň 400x500x200	ks	-2,00	2 323,92		-4 647,84	
SLP			Rack na výkonové jednotky Thon Multiflex 10U Modulrack 45	ks	1,00	3 998,55		3 998,55	
SLP		původní SLP	Koncovky kabelu	ks	-18,00				
SLP			Konektor XLR Neutrik NC3 FD-L1	ks	10,00				
SLP			Konektor XLR Neutrik NC3 MD-L1	ks	3,00				
SLP			pro snake TPD-3 0,5 FM	ks	3,00				
SLP			Panel pro snake Front Panel 4HE	ks	2,00				
SLP			Neutrik NE8 FDV-Y-110	ks	10,00	254,55		2 545,53	
SLP			Sestava na portálovou tyč	ks	8,00				
SLP			C-hák	ks	10,00				
SLP			Lanko bezpečnostní	ks	20,00	28,90		578,00	
SLP		původní SLP	Světlo na obarvení scény 230/DMX řízení viz příloha č.7	ks	-6,00	3 924,72		-23 548,32	
SLP			Stairville Retro Flat Par 18x10W RGBWA UV	ks	5,00	6 336,50		31 682,50	
SLP			Cameo Thunder Wash 600 RGBW	ks	2,00	7 101,25		14 202,50	
SLP			pro snake TPD-3 1 FM	ks	2,00	131,10		262,20	
SLP			pro snake TPD-3 2 FM	ks	4,00	158,41		633,65	
SLP									
SLP		R	Práce a činnosti						25 336,50
SLP		původní SLP	Úprava stávajícího ozvučení 5+1 , nová kabeláž pod omítkou + rozšíření	kpl	0,15	11 730,00		1 759,50	
SLP		původní SLP	Zapojení, oživení a odzkoušení kompletního systému AV - původní	hod	4,00	483,00		1 932,00	
SLP			Zpracování projektové dokumentace AV	kpl	1,00	12 075,00		12 075,00	
SLP			Koordináční činnosti - nové řešení	kpl	1,00	7 770,00		7 770,00	
SLP			Revize - nové řešení	kpl	1,00	1 800,00		1 800,00	
CELKEM ELEKTRO									299 345,96

8.7.2022

Martin Pelda


V Kapse 114, 547 01 Náchod

mobit: 603 251 085

e-mail: martin.pelda@gmail.com

IČ: 01300636 DIČ: CZ7306213244



ZMĚNOVÝ LIST – demontáž topení a likvidace		číslo ZL: 5
Název projektu:	Stavební úpravy auly II - č. akce SM/19/358	
Zhotovitel:	CE-ING s.r.o., IČO: 044 75 631	
Objednatel:	Jiráskovo gymnázium, Náchod, IČO: 48623687	
Změnový list vystavil:	Čejchan Jan	
Datum:	08.07.2022	
Předmět změny: demontáž topných těles Po odstranění stávajícího akustického panelu hlediště byl zjištěna osazená dvě stará nefunkční tělesa v nikách za panely. Bylo dohodnuto jejich odstranění, likvidace a zaslepení rozvodů		
Přílohy změnového listu: Rozpočet <i>Změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.</i>		
Posun termínu: : ne Předání staveniště proběhlo dne : 16.05.2022 dokončení díla dle SOD: do 16.9.2022 § 222 zákona odst. 6		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 0	2.744,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
2.744,- Kč	Nemění se	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Pavel Škoda 	Čejchan Jan   IČO: 044 75 631, DIČ: CZ04475631 Polská 375, 547 01 Náchod	
Datum: 8.7.2022	Datum: 8.7.2022	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Ing. Arch. Michal Ježek 	Martin Pelda, Ing. Zdeněk Nývlt	
Datum: 8.7.2022	Datum: 8.7.2022	

Martin Pelda
 V Kapsě 114, 547 01 Náchod
 mobil: 603 251 085
 e-mail: martin.pelda@gmail.com
 IČ: 01300636 DIČ: CZ73062132




KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

JirGymAula, SÚ auly

Objekt:

ZL05 - Demontáž topení + likvidace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

08.07.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			2 744,00
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 744,00 0,00	21,00% 15,00%	576,24 0,00
Cena s DPH			3 320,24
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

8.7.2022

Škoda
Jiráskovo gymnázium.
Náchod, Rezníčková 451
547 01 NÁCHOD
IČO: 486 23 687 IZO: 102266247
tel./fax: +420 491 423 243
e-mail: sekretariat@gymnachod.cz
www.gymnachod.cz

CE-ING
Polská 375, 547 01 Náchod
IČO: 044 75 631 DIČ: CZ04475631

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

8.7.2022

Martin Pelda
V Kapse 114, 547 01 Náchod
mobil: 603 251 085
e-mail: martin.pelda@gmail.com
IČ: 01300636 DIČ: CZ7306213244

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

JirGymAula, SÚ auly

Objekt:

ZL05 - Demontáž topení + likvidace

Místo:

Datum: 08.07.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 744,00

PSV - Práce a dodávky PSV

2 744,00

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

2 744,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: JirGymAula, SÚ auly

Objekt: ZL05 - Demontáž topení + likvidace

Místo: Datum: 08.07.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 744,00

D PSV Práce a dodávky PSV 2 744,00

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 2 744,00

1	K	733001R	Úprava topení viz samostatný rozpočet - demontáž stávajících topidel	m	1,000	2 744,00	2 744,00	
---	---	---------	--	---	-------	----------	----------	--

Handwritten mark

ZL05

1. Demontáž stávajících topidel

Demontáž stávajících topidel	ks	2
Zaslepení stávajícího potrubí	ks	2
Přesun hmot	kpl	1
Odvoz stávajících topidel	ks	2
Uložení na skládku	ks	2

Cena celkem

2 744,00 Kč

8.7. 2022

Martin Pelda

V Kapse 114, 547 01 Náchod
mobil: 603 251 085
e-mail: martin.pelda@gmail.com
IČ: 01300636 DIČ: CZ7306213244

Handwritten signature

ZMĚNOVÝ LIST – OK konstrukce techniky		číslo ZL: 6
Název projektu:	Stavební úpravy auly II - č. akce SM/19/358	
Zhotovitel:	CE-ING s.r.o., IČO: 044 75 631	
Objednatel:	Jiráskovo gymnázium, Náchod, IČO: 48623687	
Změnový list vystavil:	Čejchan Jan	
Datum:	02.08.2022	
Předmět změny: ocelová konstrukce jeviště Na základě zjištění skladby podhledu a z důvodu špatné nosnosti stropní konstrukce jeviště (PRKENNÉ POBYTÍ S RÁKOSEM A OMÍTKOU) dojde k vytvoření nové nosné konstrukce z „jacklů“ pro uchycení požadované divadelní techniky a osvětlení mezi nosnými stěnami <i>Změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.</i> Přílohy změnového listu: Rozpočet Posun termínu: : ne Předání staveniště proběhlo dne : 16.05.2022 dokončení díla dle SOD: do 16.9.2022 § 222 zákona odst. 6		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 0,- Kč	7.462,74 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
7.462,74 Kč	Nemění se	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele: Pavel Škoda  Datum: 2.8.2022	Za zhotovitele: Čejchan Jan    Polská 375, 547 01 Náchod IČO: 044 75 631 DIČ: CZ04475631 Datum: 2.8.2022	
Za autorský dozor: Ing. Arch. Michal Ježek  Datum: 2.8.2022	Za technický dozor stavebníka: Martin Pelda, Ing. Zdeněk Nývlt Datum: 2.8.2022	

Martin Pelda
 V Kapse 114, 547 01 Náchod
 mobil: 603 251 085
 e-mail: martin.pelda@gmail.com
 IČ: 01300636 DIČ: CZ7306213244



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

JirGymAula, SÚ auly

Objekt:

ZL06 - nosná OK konstrukce pro jeviště

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

02.08.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

7 462,74

DPH základní
snížená

Základ daně

7 462,74

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

1 567,18

0,00

Cena s DPH

v CZK

9 029,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

2.8.2022 Jiráskovo gymnázium,
Náchod, Rezníčková 451
547 01 NÁCHOD
IČO: 486 23 687 IZO: 102266247
tel./fax: +420 491 423 243 ①
e-mail: sekretariat@gymnachod.cz
www.gymnachod.cz

CE-ING 
Polská 375, 547 01 Náchod
IČO: 044 75 631 DIČ: CZ04475631

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

2.8.2022
Martin Pelda
V Kapse 114, 547 01 Náchod
mobil: 603 251 085
e-mail: martin.pelda@gmail.com
IČ: 01300636 DIČ: CZ7306213244

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

JirGymAula, SÚ auly

Objekt:

ZL06 - nosná OK konstrukce pro jeviště

Místo:

Datum: 02.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

7 462,74

PSV - Práce a dodávky PSV

7 462,74

767 - Konstrukce zámečnické

7 462,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

JirGymAula, SÚ auly

Objekt:

ZL06 - nosná OK konstrukce pro jeviště

Místo:

Datum: 02.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

7 462,74

D PSV Práce a dodávky PSV

7 462,74

D 767 Konstrukce zámečnické

7 462,74

1	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 50 do 100 kg	kg	70,525	39,70	2 799,84	CS ÚRS 2022 02 x koef. 0,99
		VV	5*3,1*4,55		70,525			
2	M	14550154	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 60x40x3mm	t	0,075	62 172,00	4 662,90	CS ÚRS 2022 02 x koef. 0,99
		VV	0,075		0,075			

L. S. 1011

Martin Pelda

V Kapse 114, 547 01 Náchod

mobil: 603 251 085

e-mail: martin.pelda@gmail.com

IČ: 01300636 DIČ: CZ7306213244

ZMĚNOVÝ LIST – parketová podlaha, podium		číslo ZL: 7
Název projektu:	Stavební úpravy auly II - č. akce SM/19/358	
Zhotovitel:	CE-ING s.r.o., IČO: 044 75 631	
Objednatel:	Jiráskovo gymnázium, Náchod, IČO: 48623687	
Změnový list vystavil:	Čejchan Jan	
Datum:	30.08.2022	
Předmět změny: parketová podlaha, změna desek - podium Změna spočívá v úpravě stávající parketové podlahy a podlahy podia. Z důvodu „vrzání“, zjištěných velkých nerovností a vypadané stávající vlysové (po odkrytí přilepené) podlahové krytiny a výškového uspořádání (při montáži dle PD dochází ke zvýšení podlahy - prahu dveří o + 4 cm) je navrženo odstranění stávající parketové podlahy na dřevěný záklop, změna podkladní konstrukce z 2*OSB 12,5mm na 2*OSB 15 mm s vložením distanční resp. separační podložky z geotextilie. Po odkrytí jevištní plochy – zadní části bylo nutné doplnění další kročejové izolace polystyrénem pro odstranění hrubých nerovností a tím spojení s novou přední částí. Dochází ke změně nášlapné OSB desky jeviště z OSB 15 mm na dřevotřískovou desku břízovou tl.15 pro zesílení tuhosti a povrchové úpravy.		
<i>Změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.</i>		
Přílohy změnového listu: Rozpočet		
Posun termínu: : ne Předání staveniště proběhlo dne : 16.05.2022 dokončení díla dle SOD: do 16.9.2022 § 222 zákona odst. 6		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 48.759,93 Kč	102.947,91 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
54.187,98 Kč	Nemění se	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Pavel Škoda	Čejchan Jan	
Datum: 30.8.2022	CE-ING Polská 375, 547 01 Náchod IČO: 044 75 631 DIČ: CZ04475631	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Ing. Arch. Michal Ježek	Martin Pelda,	
Datum:	Ing. Zdeněk Nývlt	
	Datum: 30.8.2022	

Martin Pelda
 V Kapse 114, 547 01 Náchod
 mobil: 603 251 085
 e-mail: martin.pelda@gmail.com
 IČ: 01300636 DIČ: CZ7306213244

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

JirGymAula, SÚ auly

Objekt:

ZL07 - Parketová podlaha, podium

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30. 8. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

54 187,98

DPH základní
snižená

Základ daně

54 187,98

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

11 379,48

0,00

Cena s DPH

v CZK

65 567,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

30. 8. 2022

30. 8. 2022

Jiráskovo gymnázium,
Náchod, Rezníčková 451

547 01 NÁCHOD

IČO: 486 23 687 IZO: 102266247

tel./fax: +420 491 423 243

e-mail: sekretariat@gymnachod.cz

www.gymnachod.cz

CE-ING

6

Polská 375, 547 01 Náchod
IČO: 044 75 631 DIČ: CZ04475631

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

30. 8. 2022

Martin Pelda

V Kapse 114 547 01 Náchod

mobil: 603 251 085

e-mail: martin.pelda@gmail.com

IČ: 01300636 DIČ: CZ7306213244

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

JirGymAula, SÚ auly

Objekt:

ZL07 - Parketová podlaha, podium

Místo:

Datum: 30. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

54 187,98

HSV - Práce a dodávky HSV

2 625,52

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 625,52

PSV - Práce a dodávky PSV

51 562,46

713 - Izolace tepelné

8 328,08

762 - Konstrukce tesařské

18 593,93

766 - Konstrukce truhlářské

19 844,80

775 - Podlahy skládané

4 795,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba: JirGymAula, SÚ auly
 Objekt: ZL07 - Parketová podlaha, podium

Místo: Datum: 30. 8. 2022
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							54 187,98	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 625,52	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 625,52	
4	K	632481215	Separční vrstva z geotextilie	m2	49,660	52,87	2 625,52	CS ÚRS 2022 02 x koef. 0,99
D	PSV		Práce a dodávky PSV				51 562,46	
D	713		Izolace tepelné				8 328,08	
6	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	49,660	47,12	2 339,98	CS ÚRS 2022 02 x koef. 0,99
7	M	28372302	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl. 30mm	m2	52,143	114,84	5 988,10	CS ÚRS 2022 02 x koef. 0,99
VV			49,66*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		52,143			
D	762		Konstrukce tesařské				18 593,93	
1	K	762511282x	Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl. 2x12 mm broušených na pero a drážku kotvených do stávající dřevěné podlahy	m2	-47,303	1 030,80	-48 759,93	SOD
VV			"dle výkresu 511, překrytí stávající dřevěné podlahy" (9,22*6,1 6,165*1,45)*1		-47,303			
VV			Součet		-47,303			
3	K	762511284	Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl. 2x15 mm broušených na pero a drážku lepených	m2	49,660	1 356,30	67 353,86	CS ÚRS 2022 02 x koef. 0,99
D	766		Konstrukce truhlářské				19 844,80	
5	K	76699-T/04-ú	T/04 - Dod+mtž nové rámové kce jeviště roz. 6165x2100mm, z dřevěných hranolů, desek OSB 3 N tl. 15mm, součástí podkladky z příček z porobetonu tl. 150mm (12 kusů), vč. impregnačního nátěru a akustické izolace. Vše vč. spoj. a kotevniho materiálu. Bližší popi	soub	29,797	666,00	19 844,80	R
VV			změna vrchní desky nášlapné konstrukce:					
VV			6,165*2,105+5,28*1,92+5,455*(0,27+0,955)		29,797			
D	775		Podlahy skládané				4 795,65	
2	K	775511810	Demontáž podlah vlysových přibíjených s lištami přibíjenými do suti	m2	47,030	101,97	4 795,65	CS ÚRS 2022 02 x koef. 0,99
VV			47,03		47,030			

30. 8. 2022

Martin Pelda

V Kapse 114, 547 01 Náchod

mobil: 603 251 065

mail: martin.pelda@gmail.com

DIČ: C27306213244

DEK

Co hledáte?



Přihlášení



Stavebniny

Elektronikální

Voda

Typy

Nárad

Barvy

a

Příslušenství

AKCE

TEMATA

UDALOSTI

...

> Stavebniny > Dřevo > OSB desky



Deska KRONOSPAN OSB 3 P+D 15×2500×625 mm

číslo položky: 3010488170

katalogový kód: 58M54

Výrobky značky: KRONOSPAN

typ OSB 3, pero-drážka, 1,5625 m²/ks, šířka 625 mm, délka 2500 mm, tloušťka 15 mm, 47 ks/pal.~~628,13 Kč~~ ⓘ

sleva 45%

345,47 Kč

bez DPH za deska

418,02 Kč

s DPH za deska

221,10 Kč

bez DPH za m²**267,53 Kč**s DPH za m²

Dostupné na 48 prodejnách

Skladem ⓘ

1 ↕ deska

do košíku přidáte 1 deska / 1,56 m²

345,47 Kč celkem bez DPH

418,02 Kč celkem s DPH

Do košíku

Popis / Parametry

Dokumenty

Hodnocení

Popis

Desky OSB jsou víceúčelové desky vyráběné unikátní technologií lepení orientovaných dřevěných třísek ve třech

vrstvách. Ve vrchních vrstvách jsou orientovány podélným směrem, ve středové vrstvě jsou orientovány příčným směrem. Rozměry, tvar a směrová orientace třísek v jednotlivých vrstvách maximálně využívají přirozené vlastnosti dřeva k dosažení těch nejlepších mechanicko-fyzikálních parametrů desek. Desky neobsahují přirozené vady rostlého dřeva (suky, praskliny apod.).

Parametry

typ	OSB 3
plocha	1,5625 m ² /ks
délka	2500 mm
šířka	625 mm
tloušťka	15 mm
hrana	pero-drážka
povrch	nebroušený

Dokumenty

POZOR ZMĚNA! Zrušení osobního odběru na vybraných pobočkách naleznete zde <https://www.baushop.cz/oznameni>.

[Zavřít](#)

OSB KRONOBUILD P+D 2500 x 625 mm 15mm (1.5625m²/bal)

Novinka



V případě, že se Vám v košíku nezobrazí vaše pobočka přejděte na produkt OSB SWISS KRONO PD.

Původně: 401 Kč/m²
-44%

226,11 Kč/m² vč. DPH

Skladem

Příslušenství k tomuto produktu



LVSMD004000 pegovaná

Střecha

-4%

120 Kč

120 Kč

LVSMD004000

Ac



PŘEKLIŽKA.EU

MÁME PRODEJ PŘEKLIŽEK



Domů / Fóliované / Překližka (15*1500*3000) F/W bříza



PŘEKLIŽKA (15*1500*3000) F/W BŘÍZA

3948 Kč/dělna bez DPH

4 776 Kč včetně DPH

3948 / 4,5 m² -- tj. 877 Kč/m²

1

PŘIDAT DO KOŠÍKU

Katalogové číslo: 1015

Kategorie: Fóliované

DALŠÍ INFORMACE

DALŠÍ INFORMACE

Hmotnost	54 kg
Rozměry	3000 × 1500 × 15 mm
Provedení	F/W
Dřevina	Bříza

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.

Souhlasím




České stavebniny, s.r.o.

- online obchod

prodej stavebního materiálu, izolací, desek, teras, palubek a hranolů

[Hlavní stránka](#) [O společnosti](#) [Místní osobní příjezd](#) [Informace dle](#) [KČD](#) [Nejnovější nabídky](#) [Nabídky slev](#) [Kontakt](#) [Hodnotíme vaše zkušenosti](#)

PŘEKLIŽKA VODOVZDORNÁ BŘÍZA - 15 MM

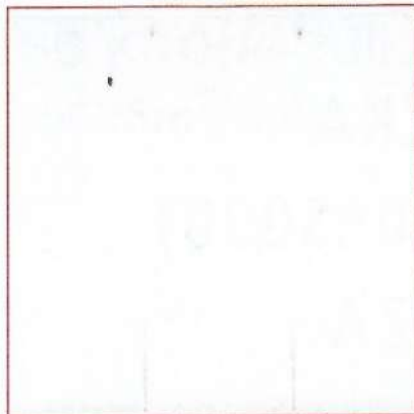

Překližka je vhodná při truhlářské nebo nábytkářské výrobě, pracovní desky stolů, k domácím úpravám, ve stavebnictví nebo kutilství, materiál bříza kvality BB/CP.

Odběrné místo: Sklad Brandýs nad Labem

Cena s DPH: 3 549,0 Kč/ks

Cena bez DPH: 2 933,1 Kč

Množství: ks

Přidat do košíku

2933 / 3,1 m²

946 Kč/m²

Všechny dýhy jsou z břízy. Skládá se z lichého počtu 11 dřevěných lisovaných dýh, slepených močovinoformaldehydovým lepidlem. Není určena pro venkovní nechráněné prostředí. **tloušťka:** 15 mm. **Rozměry:** 2 500 mm x 1 250 mm. **Paleta:** 40 ks. **Hmotnost:** 30 kg.

POZOR ZMĚNA! Zrušení osobního odběru na vybraných pobočkách naleznete zde <https://www.baushop.cz/oznameni>.

Zavřít

**Překližka folie hladká bříza - protiskluz 15 mm
(3.125m²/bal)**

Novinka

~~Původně: 1 015 Kč/m²~~
~~-10%~~

913,18 Kč/m² vč. DPH
Skladem

Popis produktu Překližka folie hladká bříza - protiskluz

Překližka folie hladká bříza

Parametry

Výrobce :	Timbeply
Šířka :	1250 mm
Tloušťka :	15
Balení (plocha) :	3,125
Varianty produktu :	15 mm
Objem (mj) :	0,04687 m3
Délka (mm) :	2500
Hmotnost (kg) :	10,2
Hmotnost (mj) :	10,2 kg

Hodnocení Překližka folie hladká bříza - protiskluz

ZMĚNOVÝ LIST – zařízení video		číslo ZL: 8
Název projektu:	Stavební úpravy auly II - č. akce SM/19/358	
Zhotovitel:	CE-ING s.r.o., IČO: 044 75 631	
Objednatel:	Jiráskovo gymnázium, Náchod, IČO: 48623687	
Změnový list vystavil:	Čejchan Jan	
Datum:	30.08.2022	
Předmět změny: dodávka zařízení video Na základě prostorového uspořádání zadní části jeviště – odstup jevištních závěsů od stěn, umístění divadelního osvětlení a ozvučení, nové nosné ocelové konstrukce, nebylo možné provést dodávku zařízení video projekce včetně požadovaných pláten se zadní projekcí. Z tohoto důvodu byl projekt změně a došlo k přecenění této části na nové použitelné řešení.		
Přílohy změnového listu: Rozpočet <i>Změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.</i> Posun termínu: : ne Předání staveniště proběhlo dne : 16.05.2022 dokončení díla dle SOD: do 16.9.2022 § 222 zákona odst. 6		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 102.484,32 Kč	100.474,05 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- 2.010,27 Kč	Nemění se	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Pavel Škoda	Čejchan Jan	
Datum: 30.8.2022	Datum: 30.8.2022	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Ing. Arch. Michal Ježek	Martin Pelda,	
Datum: 30.8.2022	Ing. Zdeněk Nývlt	
	Datum: 30.8.2022	

Martin Pelda
V Kapse 114, 547 01 Náchod
mobil: 603 251 085
e-mail: martin.pelda@gmail.com
IČ: 01300636 DIČ: CZ7306213244

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

JirGymAula, SÚ auly

Objekt:

ZL08 - promítací technika

KSO:

Misto:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

30. 8. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-2 010,27

DPH základní
snížená

Základ daně

-2 010,27

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-422,16

0,00

Cena s DPH

v CZK

-2 432,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

30. 8. 2022

Zhotovitel

30. 8. 2022

Jiráskovo gymnázium,
Náchod, Řezníčkova 451

547 01 NÁCHOD

IČO: 486 23 687 IZO: 102266247

tel./fax: +420 491 423 243

e-mail: sekretariat@gymnachod.cz

www.gymnachod.cz

Datum a podpis:

30. 8. 2022

Martin Pelda

V Kapse 114, 547 01 Náchod
mobil: 603 251 085

e-mail: martin.pelda@gmail.com
IČ: 01300636 DIČ: CZ7306213244

CE-ING

Polská 375, 547 01 Náchod
IČO: 044 75 631 DIČ: CZ04475631

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: JirGymAula, SÚ auly
Objekt: **ZL08 - promítací technika**

Místo: Datum: 30. 8. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-2 010,27
PSV - Práce a dodávky PSV	-2 010,27
742 - Elektroinstalace - slaboproud	-2 010,27

SOUPIS PRACÍ

Stavba: JirGymAula, SÚ auly
Objekt: **ZL08 - promítací technika**

Místo: Datum: 30. 8. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-2 010,27	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-2 010,27	
D	742		Elektroinstalace - slaboproud				-2 010,27	
1	K	742002	Promítací technika - viz samostatný rozpočet	m	1,000	-2 010,27	-2 010,27	

CE-ING, Aula Gymnázium Náchod (N1220021)

30.08.2022

v2

-2 010,27

Vicepráce č. 8

VV	x	x	C. pol.	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
SLP			Q	Dodávka zařízení video				-3 060,27
SLP			původní SLP	Projektor viz příloha č.9	ks	-1,00	28 661,22	-28 661,22
SLP			původní SLP	Držák projektoru závěsný otočný	ks	-1,00	1 904,40	-1 904,40
SLP				Interaktivní dataprojektor OPTOMA W320USTi (přední)	ks	1,00	49 708,75	49 708,75
SLP			původní SLP	Plátno s možností zadní projekce - šířka 4000mm ,dálkové ovládání	ks	-1,00	59 156,46	-59 156,46
SLP				Plátno Reflecta MOTOR Ultra Lux (350x241cm, 16:9, viditelné 340x191cm (přední projekce)	ks	1,00	32 775,00	32 775,00
SLP			původní SLP	Převodník FTP/HDMI viz příloha č.8	ks	-1,00	12 762,24	-12 762,24
SLP				Převodníky HDMI	ks	1,00	6 555,00	6 555,00
SLP				HDMI kabel optika 30m	ks	1,00	2 731,25	2 731,25
SLP			oprava	Euromet 04383 UFO Ceiling Mount Si	ks	2,00	3 714,50	7 429,00
SLP				HDMI kabel	ks	2,00	112,53	225,06
SLP								
SLP			R	Práce a činnosti				1 050,00
SLP				Koordinační činnosti - nové řešení	kpl	1,00	1 050,00	1 050,00
CELKEM ELEKTRO								-2 010,27

30.8.2022

Martin Pelda

V Kapse 114, 547 01 Náchod

mobil: 603 251 085

e-mail: martin.pelda@gmail.com

IČ: 01300636 DIČ: CZ7306213244

