

DODATEK č. 5
ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 4. 2017 ve znění dodatku č. 1 – č. 4
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

č. účtu: 43-1430860267/0100

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) COLAS CZ, a.s.

Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

IČO: 261 77 005

DIČ: CZ26177005

zastoupený Ing. Pavlem Hudlerem, ředitelem divize silniční stavitelství

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha, č. účtu 7408-201/0100

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**II/303 Pěkov - průtah**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 5, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny takto:

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Příslušné údaje
Datum zahájení prací	1.1.3.2	18. 4. 2017
Zimní přestávka		24. 11. 2017 – 8. 5. 2018
Datum zahájení prací po zimní přestávce		9. 5. 2018
Doba pro dokončení Stavby (= prací)	1.1.3.3	2. 6. 2018
Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po termínu dokončení Stavby)		6 týdnů po termínu dokončení Stavby (14. 7. 2018)
Doba realizace Díla		28 týdnů + 24 dnů + 25 dnů + 6 týdnů

2) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný harmonogram je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 7 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 5 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.


Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Číslo stavby: 34111

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne 01. 06. 2018

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15


.....
Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman


COLAS CZ, a.s.

Ke Klíčovu 9
190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177008 (14)
Tel.: 286003511, Fax: 286003600

.....
Zhotovitel
Ing. Pavel Hudler
ředitel divize Silniční stavitelství

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

Číslo stavby :	34111
Registrační číslo projektu :	CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003138
Smlouva o dílo uzavřená dne :	12.04.2017

5

Název stavby :

II/303 Pěkov - průtah

Název objektu :

II/303 Pěkov - průtah

Objednatel :

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

Dopravně inženýrská kancelář, Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové, IČ 27466868

Zhotovitel :

COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ 26177005

Popis a zdůvodnění změny :

1. Z důvodů nepříznivých klimatických podmínek je termín začátku stavebních prací posunut z 2.4.2018 na 9.5.2018. Doba realizace díla se nemění 28 týdnů + 24 dnů + 25 dnů + 6 týdnů.

Přílohy evidenčního listu :

1.	Zápis z KD 16
2.	harmonogram stavby
3.	zápis PCR
4.	
5.	

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku	Cena navrhovaných změn č. 5:		Nová cena stavby po změně č. 5:	Celková změna +/- oproti cen. nabídky:
		méněpráce	vícepráce		
52 610 800,00 Kč	57 925 736,42 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	57 925 736,42 Kč	5 314 936,42 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.5:		1 776 933,34 Kč	7 091 869,76 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zhotovitel :	COLAS CZ,a.s.	Jiří Kava	03.05.2018	
Projektant :	Dopravně inženýrská kancelář	Ing. Miloš Burianec	03.05.2018	
Správce stavby :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
Hlavní inženýr a TDS:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Jiří Koutník	03.05.2018	
Asistent technického dozora:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Irena Vaněčková	03.05.2018	
Supervize :				



ZÁPIS

Ze 16. kontrolního dne stavby a koordinátora BOZP na staveništi

„II/303 Pěkov-průtah“

stavba číslo: 34111

Registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003138

ze dne: 29.3.2018

Přítomni: dle presenční listiny

I. Kontrola úkolů z minulého KD:

- 1/1 Zhotovitel předloží upravený harmonogram postupu prací, včetně vyznačení doby přerušení. Stavba byla upozorněna na povinnost dodržet harmonogram a termín dokončení stavby, pokud možno zkrátit termín výstavby.
- 1/2 Zhotovitel byl upozorněn, že případní subdodavatelé musí být předem odsouhlaseni technickým dozorem investora. K dnešnímu dni byly odsouhlaseni:
Bezedos s.r.o. – úprava propustků, dodávka betonů
VESIBA s.r.o. – dodávka a montáž svodidel
SAT s.r.o. – frézování vozovky
Dopravní značení Náchod s.r.o. – VDZ a svislé dopravní značení
Broumovské stavební sdružení s.r.o. – doprava kameniva a štěrkodrtě
Dopravní stavby a rekonstrukce, Heršpická 781/7, Brno 63900, IČO 03476740 – stavby opěrných zdí
- 1/4 IZS požaduje maximální zabezpečení průjezdnosti stavby z důvodu přístupu.
- 1/5 PČR požaduje kontrolu DZ na objížďkách
- 8/2 Sloup naproti č.p. 139 označit Z 9 - trvá
- 12/4 U opravovaných opěrných zdí č. 9 a 10 jsou stávající betonové přístupové mostky k přilehlým nemovitostem. Tyto mostky budou v rámci oprav zdí vybourány a nahrazeny železobetonovým rámem místo betonových trub DN 1200 - projektant a zhotovitel dodá podklady pro ZL 5.
- 13/1 U č.p. 63 je nutno zabezpečit objekt proti vztlínání vody. Navrhnuť podél zdi položit betonové žlabovky s odvodněním do potoka. ZL 5



- 14/2 PČR DI Náchod požaduje Z9 u opěrné zdi č. 2,
- 14/5 Na požadavek PČR DI Náchod bude po celé trase (kde to bezpečnost vyžaduje) po dobu zimní přestávky instalováno dočasné betonové svodidlo zaručující bezpečnost silničního provozu.
- 14/7 Žádáme zhotovitele o návrh řešení opravy obrusné vrstvy od ZÚ po km 20,500.
- 15/2 Výsadba stromů bude na jaře 2018

II. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:

Popis provedených prací:

Práce na I. etapě

- Chodníky

Práce na II. etapě

- Výstavba opěrných zdí

Předpokládané práce na další období:

- Svodidla
- Opěrné zdi

Plnění věcného harmonogramu: harmonogram je plněn

Dopravní opatření: bez připomínek

Předávání RDS: bude průběžně předávána

Fotodokumentace: předávána průběžně, předáno pasport budov

III. Finanční plnění:

Smluvní ujednání:

Výzva k provedení díla k 12.4.2017

Souhrn smluvních dohod ze dne:	12.04.2017
Datum zahájení prací:	18.04.2017
Datum zprůjezdnění 1.etapy:	04.06.2017
Datum zprůjezdnění 2.etapy:	24.10.2017
Termín dokončení prací:	24.10.2017
Termín pro dokončení stavby:	14.12.2017
Doba realizace stavby:	28+6 týdnů

Náklady na stavbu dle souhrnu smluvních dohod (vč. DPH.): 52 610 800,00 Kč

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové oddíl B,
vložka 2548, IČO : 27502988, DIČ : CZ27502988
www.uskhk.eu



ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.



Dodatek č.1 ze dne 13.6.2017	53 286 108,21 Kč
Dodatek č.2 ze dne 3.8.2017	54 431 538,14 Kč
Dodatek č.3 ze dne 3.10.2017	54 431 538,14 Kč
Doba realizace stavby:	28 týdnů + 24 dnů + 6 týdnů
Doba pro dokončení stavby:	23.11.2017
Doba pro dokončení díla:	4.1.2018
Dodatek č.4 ze dne 23.11.2017	57 925 736, 42 Kč
Doba realizace stavby:	28 týdnů + 24 dnů + 25 dnů + 6 týdnů
Doba pro dokončení stavby:	1.4.2018
Doba pro dokončení díla:	25.4.2018

Stavební práce jsou prováděny dle schváleného harmonogramu postupu výstavby.

Fakturace stavby (vč. DPH.):	za duben 2017	397 212,02 Kč
	za květen 2017	7 430 956,13 Kč
	za červen 2017	3 318 250,05 Kč
	za červenec 2017	5 640 683,80 Kč
	vícepráce	603 098,44 Kč
	srpen 2017	8 589 497,59 Kč
	vícepráce	919 127,30 Kč
	září 2017	8 472 550,06 Kč
	vícepráce	1 621 022,23 Kč
	říjen 2017	8 409 858,51 Kč
	vícepráce 1	65 982,94 Kč
	vícepráce 2	54 299,14 Kč
	listopad 2017	3 318 755,49 Kč
	listopad 2017	- 4 747,31 Kč
	celkem 2017	48 836 546,39 Kč

IV. Na KD bylo projednáno (nové úkoly):

16/1 Z důvodů nepříznivých klimatických podmínek stavba požádá o uzavírku od 9.5.2018 doba realizace díla se nemění.

16/2 Asistentem TDS bude Ing. Irena Vaněčková

V. Kontrola kvality:

Zpráva za uplynulé období: stavba probíhá bez závad



VI. Zápis koordinátora BOZP na staveništi:

Při veškerých stavebních činnostech, s přihlédnutím k charakteru prací a místním podmínkám, je nutno dodržovat bezpečnost práce a Plán BOZP na staveništi. Pozornost je nutné věnovat používání ochranných pomůcek všech pracovníků stavby i účastníků KD (výstražné vesty, ochranné přilby, atd.), tak jako i bezpečnostním postupům a předpisům s používanou mechanizací. Požadujeme doplnit zábradlí v místech výkopů pro základy opěrné zdi a v případě rýh pro odvodnění. Doložit potvrzení o vzájemném předání rizik mezi zhotoviteli, vyvěsit oznámení o zahájení prací pro OIP, Označit ochranná pásma, používat OOP. Kontrolovat DIO- označení vstupů na staveniště, trasy pro chodce apod.

Koordinátor BOZP na staveništi upozornil zhotovitele na řádné označení staveniště. Toto zajištění staveniště je nutné denně kontrolovat (výstražné tabulky, bezpečný pohyb chodců, atd.).

Po splnění výše uvedeného – bez zásadních připomínek.

VII. Připomínky a stanoviska, ostatní:

VIII. Závěr:

Příští kontrolní den je plánován duben 2018.

Zapsali dne: 29.3.2018

Asistent TDS:

Ing. Irena Vaněčková

Za hlavního inženýra stavby, TDS a koordinátora BOZP na staveništi:

Ing. Jiří Koutník

Za zhotovitele stavby:

Jiří Kava

Ing. Jaromír Novotný

Za autorský dozor stavby:

Ing. Lukáš Burianec



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR


PREZENČNÍ LISTINA

Ze 16. kontrolního dne: **11/303 Pěkov - průtah**

jednání se uskutečnilo dne: 29.3.2018 v 9,00 na staveništi

Jméno	Firma	Telefon	E-mail	Podpis
Ing. Irena Vaněčková	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	723 757 169	irena.vaneckova@uskhk.eu	
Ing. Jiří Koutník	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	724 768 076	jiri.koutnik@uskhk.eu	
Ing. Jaromír Novotný	COLAS CZ, a.s.	733 780 164	jaromir.novotny@colas.cz	
Ing. Lukáš Burianec	Dopravně inženýrská kancelář	737 732 952	lukasb@dik-hk.cz	
	Colas CZ a.s.	723 780 164		

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové oddíl B,
vložka 2548, IČO : 27502988, DIČ : CZ27502988
www.uskhk.eu

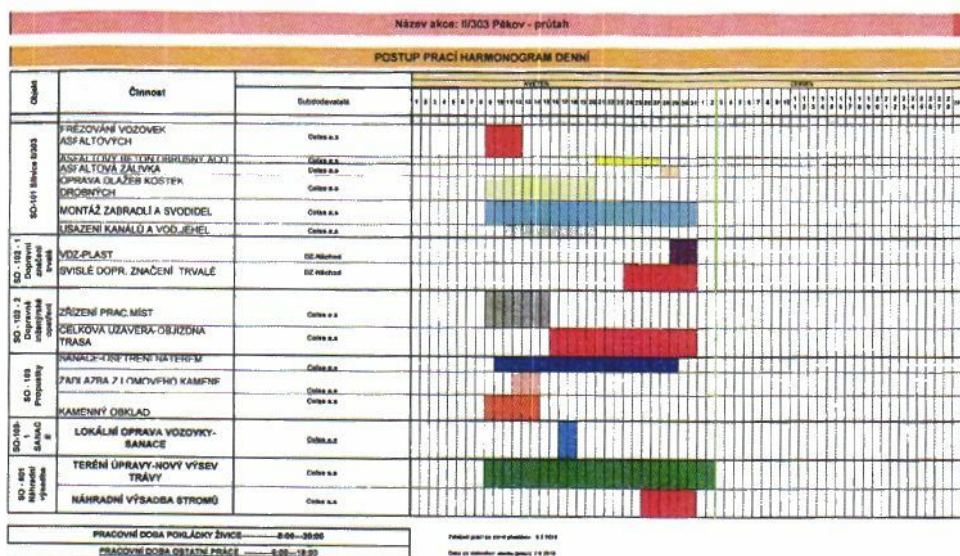

Dobrý den,

dopravní inspektorát nemohl odsouhlasit uzavírku silnice II/303 (Průtah obcí Pěkov) v období do 1. 4. 2018, z důvodu nepředvídatelnosti příznivých klimatických podmínek a tím možné vážné ohrožení na již tak nevyhovujících objízdných trasách po silnicích III. tříd. Z tohoto důvodu bylo doporučeno odsunutí uzavírky silnice na květen 2018.

S pozdravem

por. Bc. David Kult

komisař

+420 974 534 258

+420 601 335 762

na.di.komunikace@pcr.cz

ÚZEMNÍ ODBOR NÁCHOD

Dopravní inspektorát

Přihovské náměstí 1176
547 45 Náchod



POSTUP PRACÍ HARMONOGRAM DENNÍ

[illegible]

PRACOVNÍ DOBA POKLÁDKY ŽIVICE-----8:00---20:00

PRACOVNÍ DOBA OSTATNÍ PRÁCE6:00--18:00

Zahájení prací po zimní přestávce : 9.5.2018

Doba do dokončení stavby (práci): 2 6 2018

Doba pro dokončení díla: 14. 7. 2018
