

Dodatek č. 3

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel **Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov**
sídlo Procházkova 818, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov
IČO 001 95 201
DIČ CZ00195201
zástupce PharmDr. Jana Třešňáková, ředitelka

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel **Průmstav Náchod s.r.o.**
sídlo Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod
IČO 252 75 062
DIČ CZ25275062
zástupce Ing. Zdeněk Možíš, jednatel
 nebo Vratislav Zítka, jednatel

dále jako „zhotovitel“, objednatel a prodávající společně také jako „smluvní strany“.

Článek 1 Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 8. 2018 na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „**Centrum duševního zdraví RIAPS Trutnov - stavební práce**“, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2018-009682 (dále jen „veřejná zakázka“), smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“).
2. Změny závazku ze smlouvy dle změnových listů (ZL) č. 10–15, 17–18, 20–21, 24, 26–27 není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona, jelikož jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.
3. Změna závazku ze smlouvy v rozsahu víceprací dle změnových listů (ZL) č. 9, 16, 19, 22–23, 25, 28–29 není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona.

Článek 2 Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla dle článku 4 a 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovými listy č. 9–29, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Cena díla dle článku 7 odst. 2 se mění následujícím způsobem:

Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí

Celková cena dle původní smlouvy o dílo v Kč bez DPH	38.431.515,10
Vícepráce dle změnových listů č. 1–4 Kč bez DPH	803.246,87
Méněpráce dle změnových listů č. 1–4 Kč bez DPH	264.519,41

Celková cena v Kč bez DPH dle dodatku č. 1	38.970.242,56
Vícepráce dle změnových listů č. 5–8 Kč bez DPH	490.062,20
Méněprací dle změnových listů č. 5–8 Kč bez DPH	32.823,21
Odstranění administrativního pochybení ze změnového listu č. 3 dle dodatku č. 1	- 0,08
Celková cena v Kč bez DPH dle dodatku č. 2	39.427.481,47
Vícepráce dle změnových listů č. 9–29 Kč bez DPH	1.262.521,75
Méněprací dle změnových listů č. 9–29 Kč bez DPH	909.375,94
Celková cena v Kč bez DPH dle dodatku č. 3	39.780.627,28
DPH v Kč samostatně	8.353.931,73
Celková cena v Kč včetně DPH dle dodatku č. 3	48.134.559,01

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Článek 3 Závěrečná ustanovení

1. Otázky dodatkem výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě přečetly a že nebyl uzavřen v tísní nebo za jednostranně nevýhodných podmínek.

Příloha č. 1 Změnové listy č. 9–29

Za objednatele v Trutnově dne 2.3.4.2020

Sdružení zdravotních a léčebných
okresů Trutnov
ředitelství, Procházkova 818
541 01 Trutnov
"1"

PharmDr. Jana Třešňáková
ředitelka

Za zhotovitele v dne

PROMSTAV NACHOD

PROMSTAV NACHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD
DOBROŠOVSKÁ 1776 TEL. FAX 491 423 757

Vratislav Zítka
jednatel společnosti



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 09	
Název projektu:	Centrum duševního zdraví RIAPS Trutnov, reg. číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_048/0004463		
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., IČO: 25275062		
Objednatel:	Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, IČO: 00195201		
Změnový list vystavil:	Ing. Kateřina Meierová		
Datum:	11.09.2019		
Předmět změny: EI – parapetní žlaby			
Popis a zdůvodnění změny: SOL upřesnil požadavek na trasy parapetních kabelových žlabů. Proti původnímu zadání došlo k navýšení metrů realizace z důvodu variabilnějšího uspořádání pracovišť s možností jejich předpokládaného navýšení. V parapetních žlabech bude vyměněna stínící přepážka za původně projektovanou běžnou přepážku. Změna přepážky sníží vliv silových kabelů na souběžně vedené slaboproudé.			
Přílohy změnového listu: rozpočet - ZL 09 Zakreslení tras kabelových žlabů			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
-16 515,18 Kč bez DPH		34 870,34 Kč bez DPH	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
18 355,16 Kč bez DPH		bez dopadu do termínu	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:			
Za objednatele:		Za zhotovitele:	
Miroslav Petera Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov Ředitelství, Procházkova 818 541 01 Trutnov -4-		Vratislav Zítka PRŮMSTAV NACHOD PRŮMSTAV NACHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD DOBROŠOVSKÁ 176, TEL.-FAX 491 423 757	
Datum: 9.10.2019		Datum: 25.9.2019	
Za autorský dozor:		Za technický dozor stavebníka:	
Ing. Marek Pavlíček 		Ing. Gerhard Schmiedl 	
Datum: 9.10.19		Datum: 9/10/19	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ, NA NIVÁCH 57**

Název objektu **ZL 09 - EI - parapetní žlaby**

JKSO

EČO

Místo

TRUTNOV

IČ

DIČ

Objednatel **SDRUŽENÍ OZDRAVOVEN A LÉČEBEN OKRESU TRUTNOV**

Projektant **ATELIER PAVLÍČEK**

Zhotovitel **Průmstav Náchod s.r.o.**

Zpracoval

25275062

CZ25275062

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	18 355,16	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00%
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		18 355,16	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

28.9.2019



PRŮMSTAV NÁCHOD

PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 M. NÁCHOD
DOBROŠOVSKÁ 1776, TEL.-FAX 491 423 757

D Celkem bez DPH 18 355,16

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	18 355,16	3 854,58

Cena s DPH 22 209,74

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ, NA NIVÁCH 57

Objekt: ZL 09 - EI - parapetní žlaby

Objednatel: SDRUŽENÍ OZDRAVOVEN A LÉČEBEN OKRESU TRUTNOV

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: TRUTNOV

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
D1	1. Elektroinstalace - silnoproudá	0,00	17 919,71	17 919,71	0,000	0,000
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	435,45	435,45	0,000	0,000
	Celkem	0,00	18 355,16	18 355,16	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ, NA NIVÁCH 57

Objekt: ZL 09 - EI - parapetní žlaby

Objednatel: SDRUŽENÍ OZDRAVOVEN A LÉČEBEN OKRESU TRUTNOV

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: TRUTNOV

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D1 1. Elektroinstalace - silnoproudá

17 919,71

11	R	Pol14	Parapetní kanál 140x70 vč. kolen, spojek a koncovek, vika, přepážky	M	-60,000	269,00	-16 140,00
12	R	Pol14.1	Parapetní kanál 140x70 vč. kolen, spojek a koncovek, vika, přepážky stínící s Al folií	M	107,516	303,87	32 670,89

"reálná výměra"

"m.č. 001"	2,52+2*2,2	6,920
"m.č. 111"	4,2+2*2,2	8,600
"m.č. 112"	4,3+2*2,2	8,700
"m.č. 114"	19,161+2*2,2	23,561
"m.č. 216"	4,2+2*2,2	8,600
"m.č. 218"	4,5+2*2,2	8,900
"m.č. 221"	20,315+2*2,2	24,715
"m.č. 223"	13,12+2*2,2	17,520
Součet		107,516

5	R	Pol2	Krabice elinstalační plastová KP67/2 pod omítku prázdná	KS	-78,000	4,81	-375,18
6	R	Pol11	Krabice elinstalační plastová KP PK do parapetního žlabu prázdná	KS	72,000	24,50	1 764,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

435,45



10	R	R.0010	Jiné VRN ve výši 2,43%	Kč	435,450	1,00	435,45
----	---	--------	------------------------	----	---------	------	--------


Celkem


18 355,16

-16 515,18
34 870,34


18 355,16

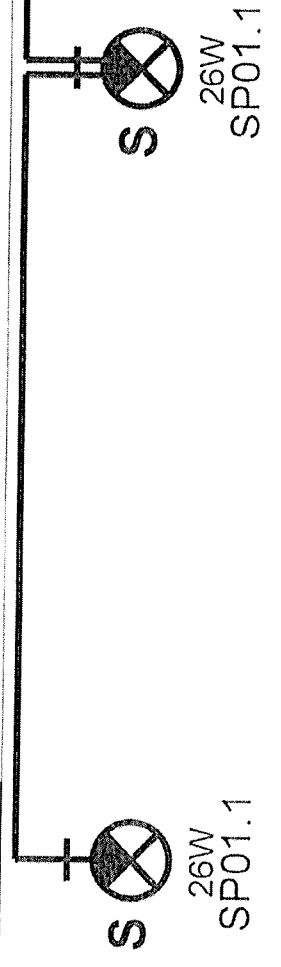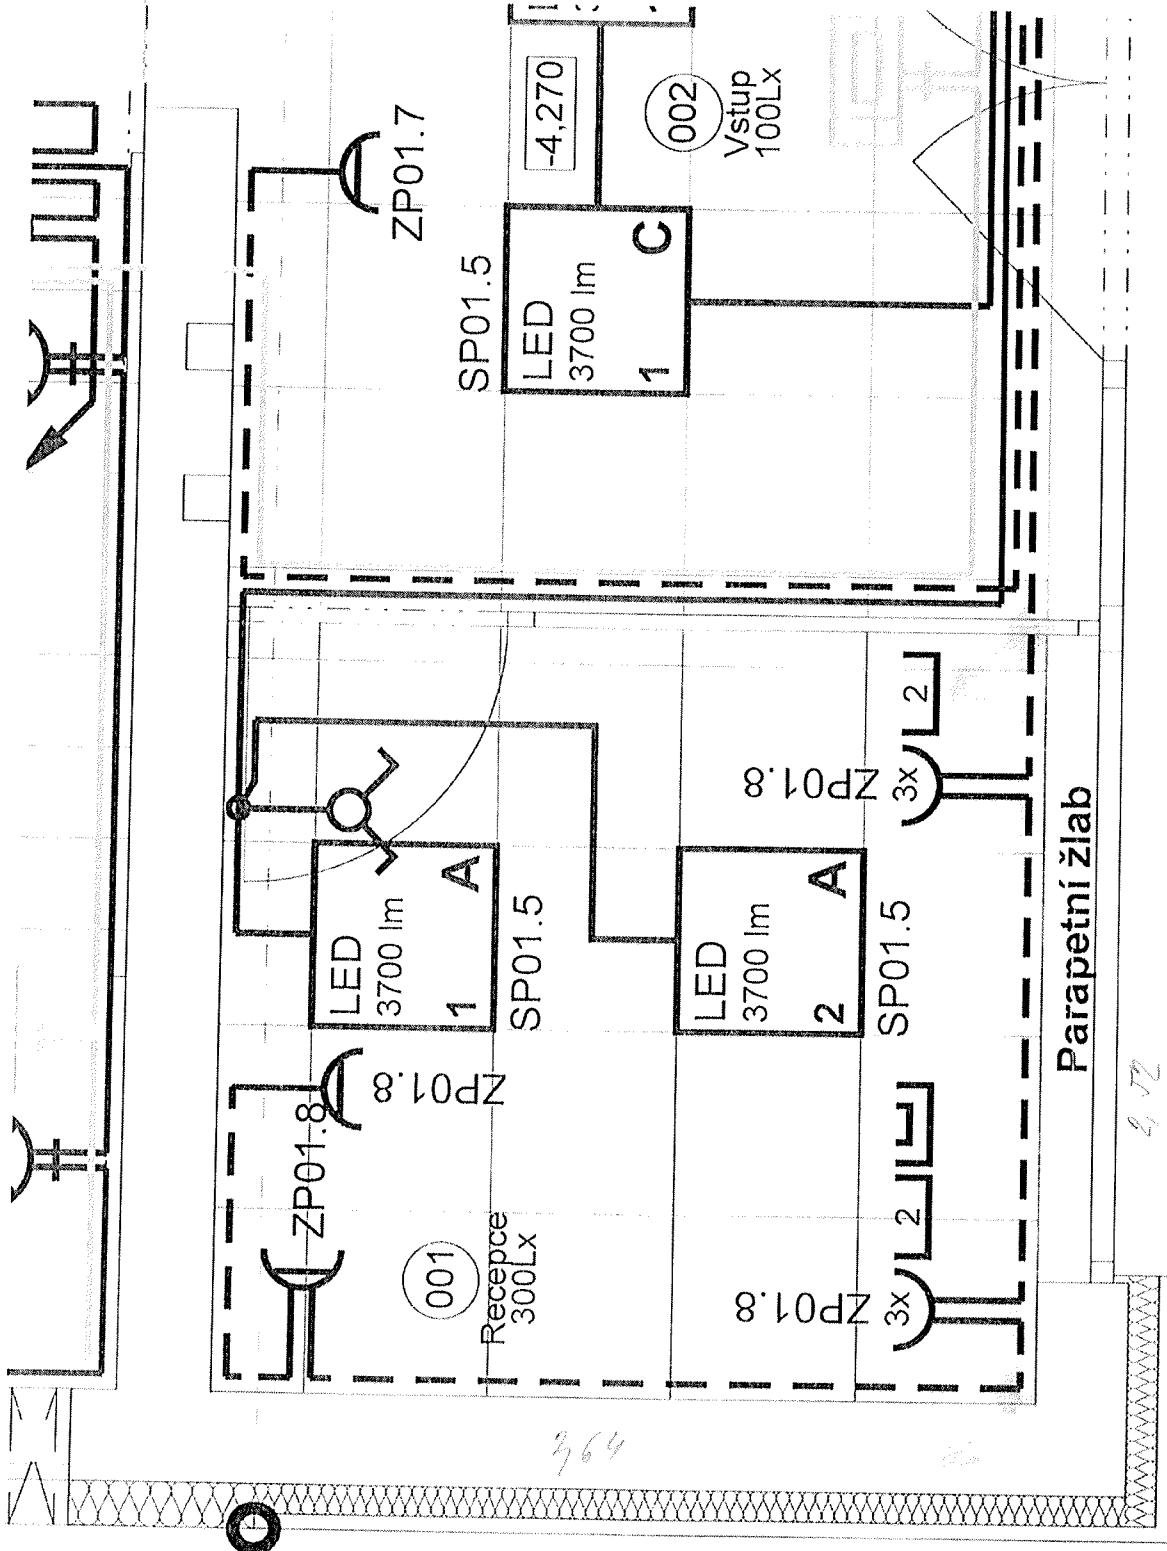


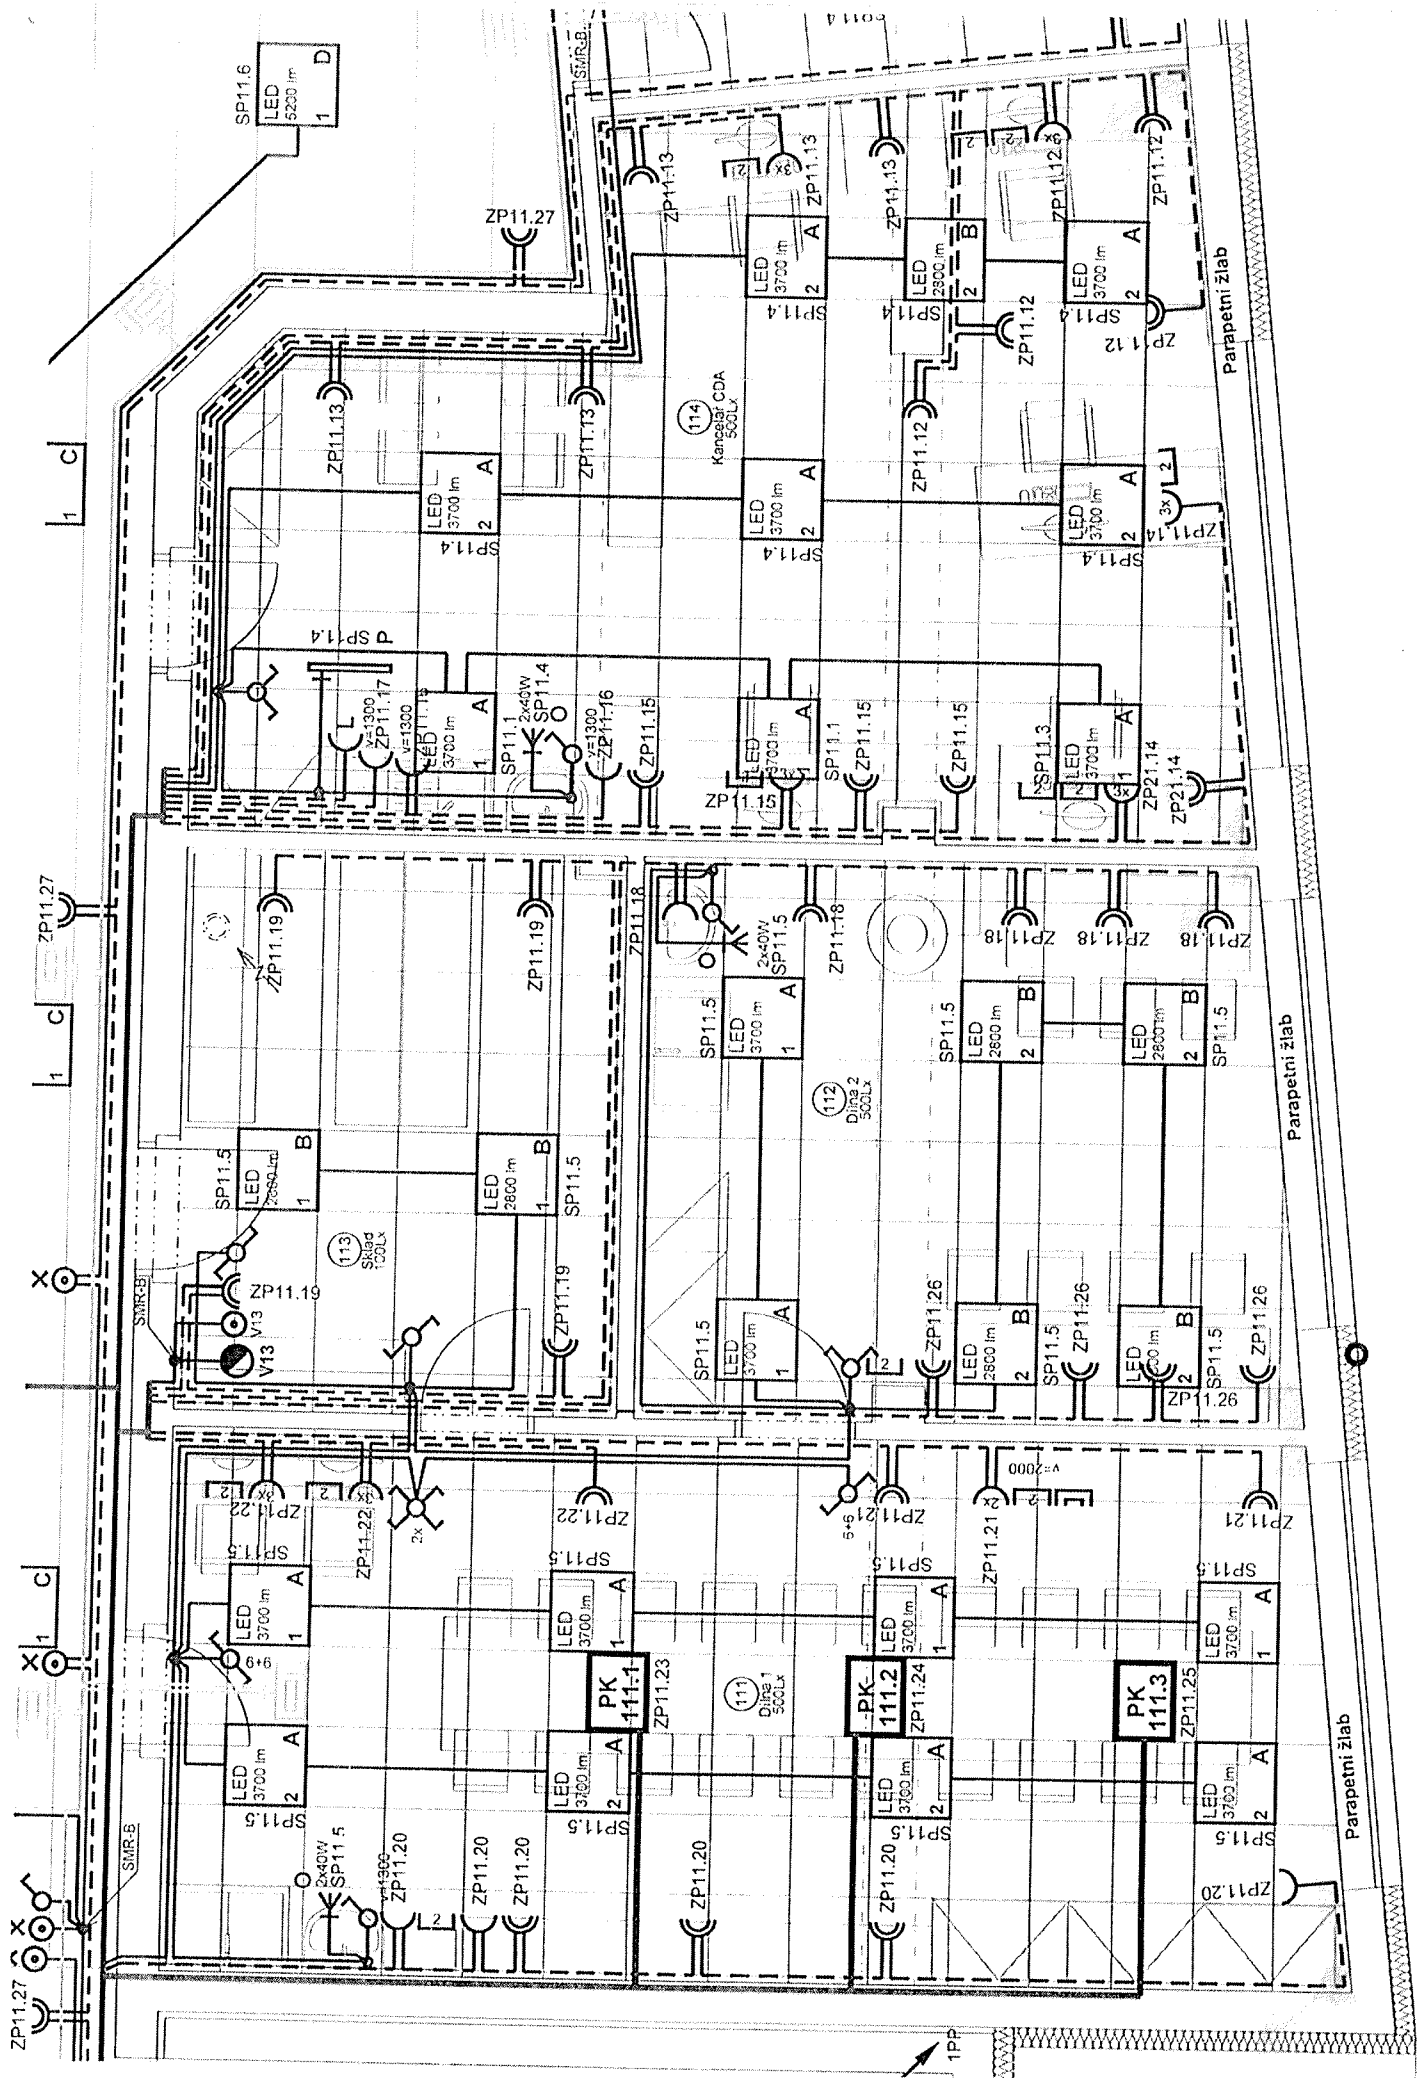

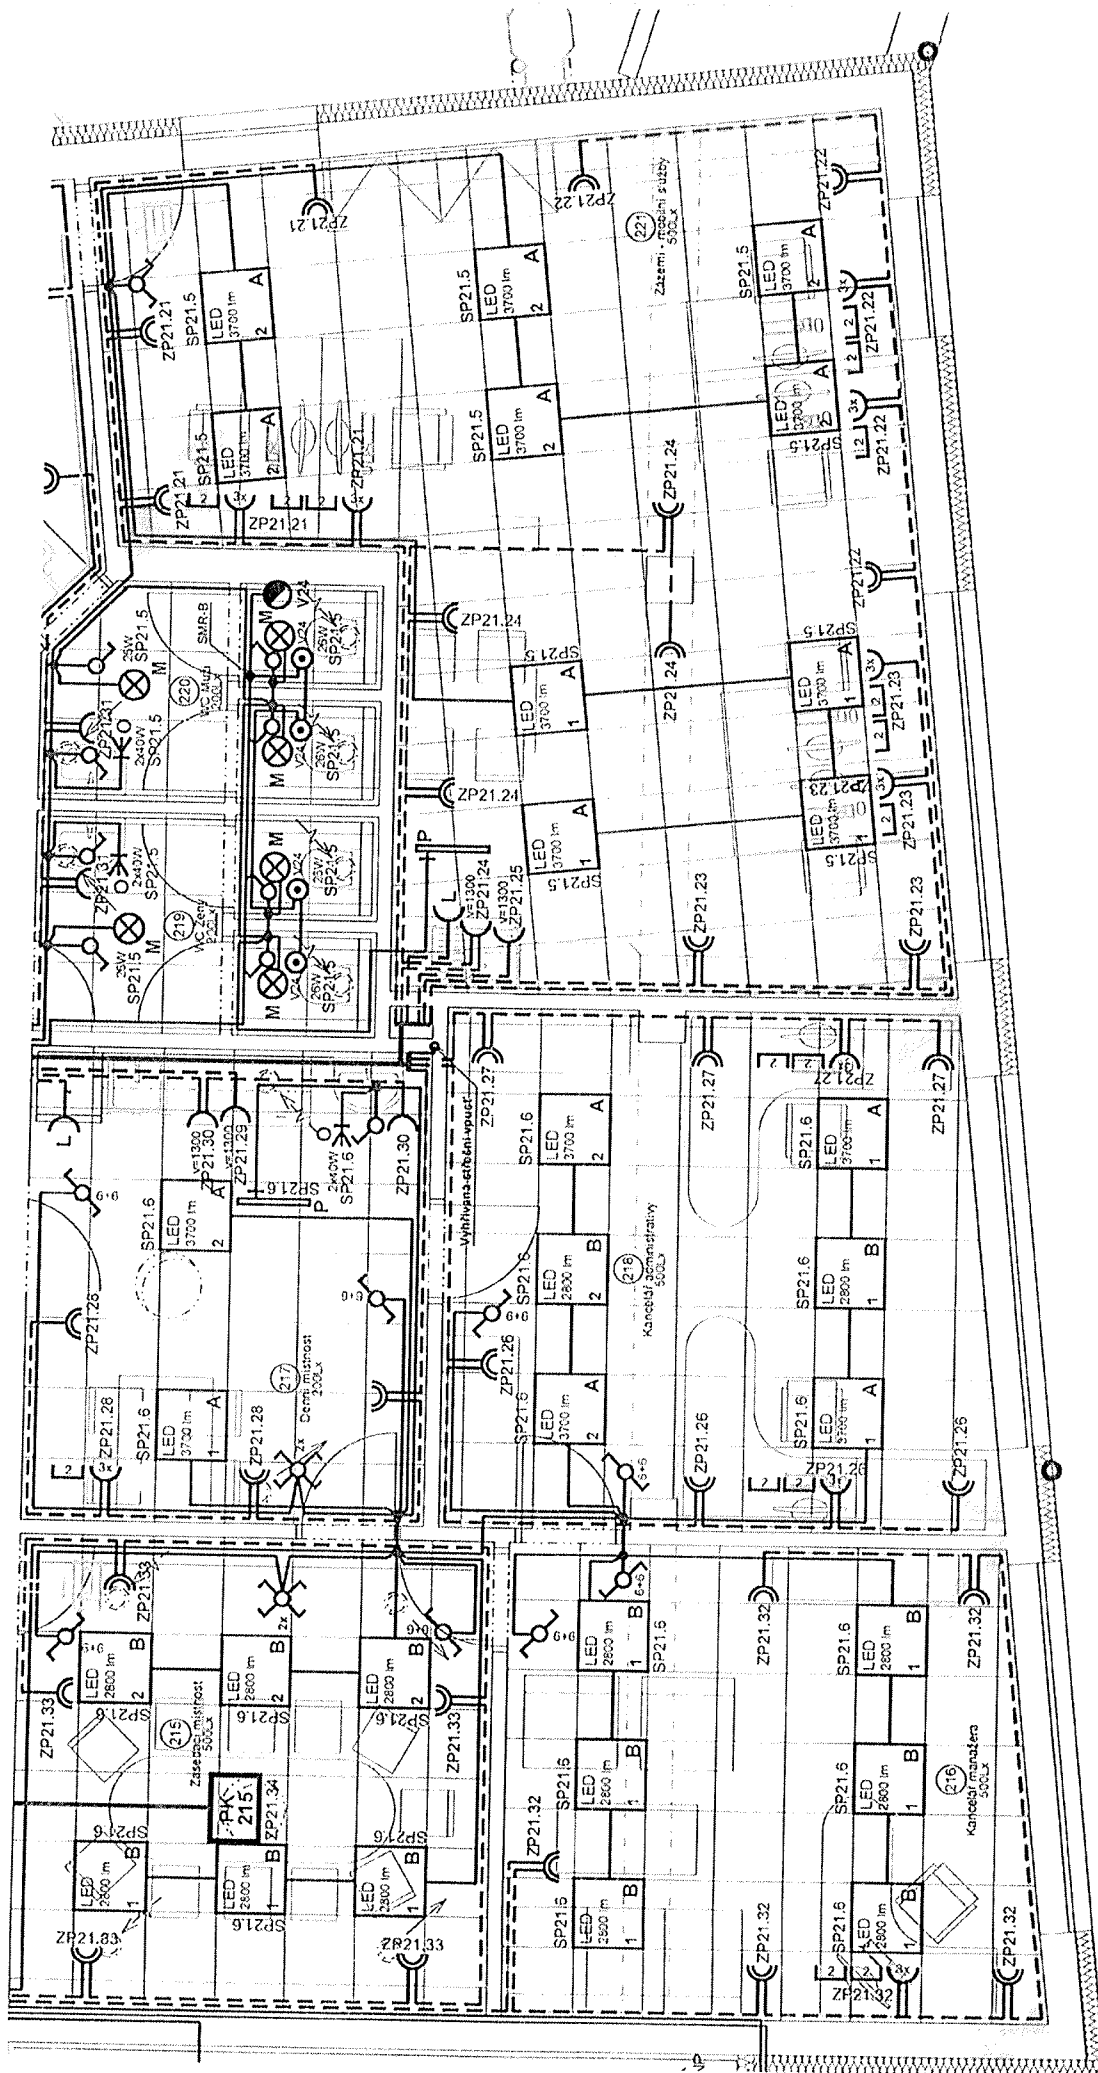

Soumrakový
snímač

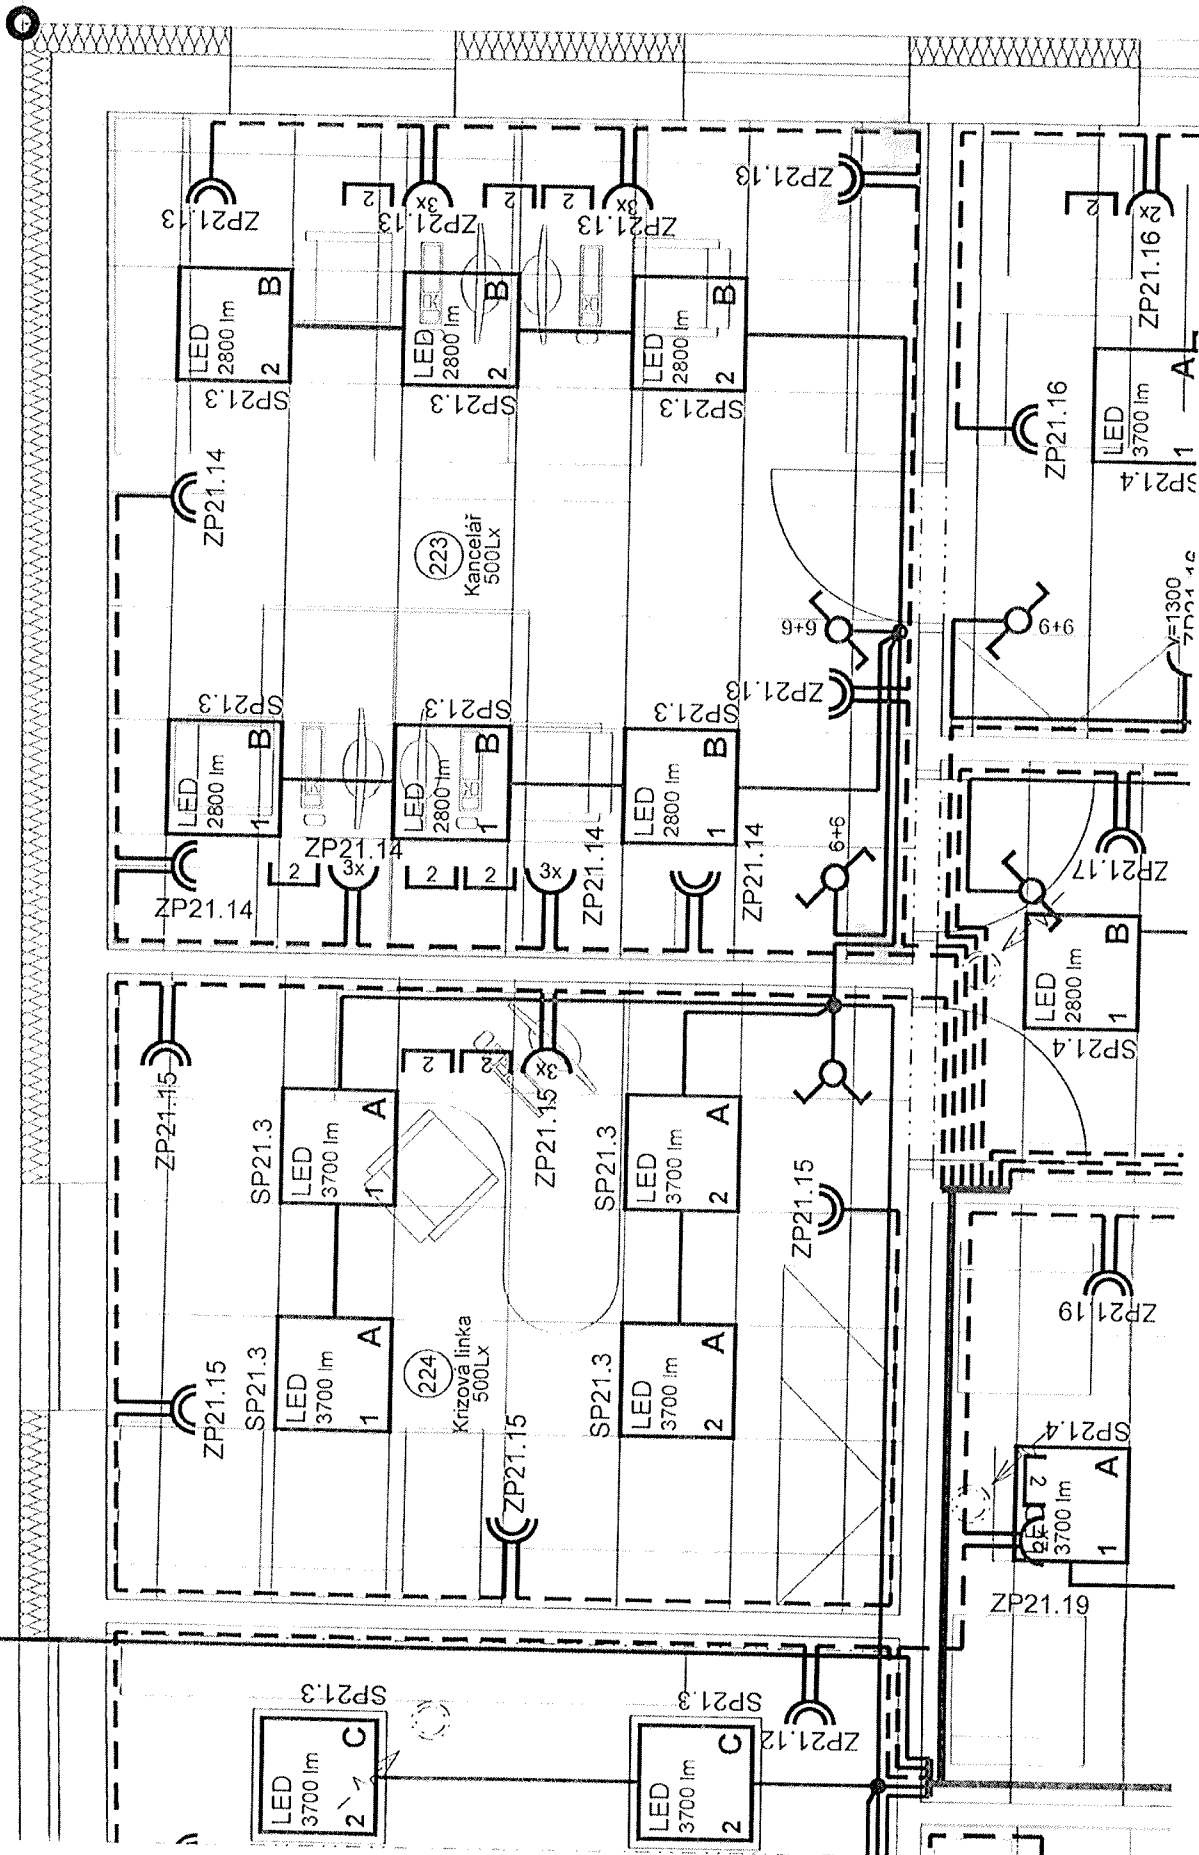



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 10
Název projektu:	Centrum duševního zdraví RIAPS Trutnov, reg. číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_048/0004463	
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., IČO: 25275062	
Objednatel:	Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, IČO: 00195201	
Změnový list vystavil:	Ing. Kateřina Meierová	
Datum:	11.09.2019	
Předmět změny: ÚT – revize otopných těles		
Popis a zdůvodnění změny:		
Byl zjištěn nesoulad mezi počty radiátorů ve výkresové dokumentaci a výkazu výměr. Projektant zpracoval porovnávací tabulku, ve které je uveden do souladu výkaz výměr s projektovou dokumentací.		
Přílohy změnového listu:		
rozpočet - ZL 10 revize otopných těles od projektanta ÚT		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-24 160,- Kč bez DPH	24 563,47 Kč bez DPH	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
403,47 Kč bez DPH	bez dopadu do termínu	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Miroslav Petera Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov Řednělství, Procházekova 818 541 01 Trutnov -4-	Vratislav Zítka  PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD DOBROŠOVSKÁ 178a, TEL/FAX 491 423 757	
Datum: 25.9.2019	Datum: 25.9.2019	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Ing. Marek Pavlíček 	Ing. Gerhard Schmiedl 	
Datum: 25.9.19	Datum: 25.9.19	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ, NA NIVÁCH 57**

JKSO

Název objektu **ZL 10 - ÚT - revize otopných těles**

EČO

Místo

TRUTNOV

IČ

DIČ

Objednatel **SDRUŽENÍ OZDRAVOVEN A LÉČEBEN OKRESU TRUTNOV**

Projektant **ATELIER PAVLÍČEK**

Zhotovitel **Průmstav Náchod s.r.o.**

Zpracoval

25275062

CZ25275062

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	403,47	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00%
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		403,47	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

25.9.2019

 PRUMSTAV NACHOD s.r.o. 547 01 NACHOD
 DOBROŠOVSKÁ 1776, TEL. FAX 491 423 757

D Celkem bez DPH **403,47**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	403,47	84,73

Cena s DPH **488,20**

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ, NA NIVÁCH 57

Objekt: ZL 10 - ÚT - revize otopných těles

Objednatel: SDRUŽENÍ OZDRAVOVEN A LÉČEBEN OKRESU TRUTNOV

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: TRUTNOV

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
D3	3. Armatury	0,00	1 335,60	1 335,60	0,000	0,000
D4	4. Otopná tělesa	0,00	-941,70	-941,70	0,000	0,000
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	9,57	9,57	0,000	0,000
	Celkem	0,00	403,47	403,47	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ, NA NIVÁCH 57

Objekt: ZL 10 - ÚT - revize otopných těles

Objednatel: SDRUŽENÍ OZDRAVOVEN A LÉČEBEN OKRESU TRUTNOV

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: TRUTNOV

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D3 3. Armatury

1 335,60

13	R	734 20-9103	montáž záv. armatur s jedním závitem, G 1/2" (DN 15)	KS	2,000	20,90	41,80
7	R	Pol20	rohový radiátorový ventil, tlakově nezávislý radiátorový ventil s vestavěným regulátorem průtoku, rozsah průtoků 10÷150 l/hod, G 1/2"	KS	1,000	643,00	643,00
8	R	Pol21	rohové šroubení, uzavírací a regulační (otevřeno na plno)	KS	1,000	150,00	150,00
9	R	Pol22	svěrné šroubení pro přesné měděné potrubí, 15 x 1/2"	KS	2,000	75,90	151,80
10	R	Pol23	opěrné pouzdro pro měděné potrubí, 15 x 1/2"	KS	2,000	44,00	88,00
11	R	Pol24	kapalinová termostatická hlavice s vestavěným čidlem, standardní, s vnitřní aretací požadovaných poloh (sedvénmazarážkami), připojení M30x1,5, rozsah 6÷28°C, stupnice Ns vnitřní aretací požadovaných polohastavení s teplotami	KS	1,000	250,00	250,00
12	R	Pol25	stěnová kruhová plastová krytka trubky připojení otopného tělesa ze zdi, pro. Cu potrubí O 12÷18 mm	KS	2,000	5,50	11,00

D4 4. Otopná tělesa

-941,70

2	R	Pol38	dtto, 8/600/95	KS	-1,000	3 540,00	-3 540,00
3	R	Pol40	dtto, 14/600/95	KS	-1,000	6 200,00	-6 200,00
4	R	Pol41	dtto, 16/500/95	KS	-2,000	7 210,00	-14 420,00
5	R	R.01	dtto, 14/500/95	KS	1,000	5 486,54	5 486,54
1	R	Pol32	dtto, 16/500/95	KS	2,000	6 270,00	12 540,00
6	R	R.02	dtto, 4/600/95	KS	1,000	2 687,26	2 687,26
15	R	735 13-1312	montáž otop. těles hliníkových, 6÷10 článků	SOU BOR	1,000	1 090,00	1 090,00
14	R	út.R01	Úprava otop. těles včetně uchycení a rúřic	soub or	1,000	1 414,50	1 414,50

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

9,57

16	R	R.0010	Jiné VRN ve výši 2,43%	Kč	9,570	1,00	9,57
----	---	--------	------------------------	----	-------	------	------

Celkem


403,47

-24 160,00

24 563,47

403,47

Číslo řádku	Položka	Popis položky	Měrná jednotka	Počet OT vykázaných ve výkazu výměr	Počet OT dle skutečnosti na výkresech (dle PD)	Rozdíl v počtu OT dle výkazu/sk
92		4. Otopná tělesa designové hliníková článkové otopné těleso, bílé, přípojovací rozteč h 500 mm, výška H 578 mm, délka L 80 mm, hloubka D 95 mm, zaoblené hrany, nominální výkon 10 článků = 1280 W při 75/65/20°C, od dodavatele zkompletováno do potřebných počtů článků (sestav), 2/500/95				
95		dtto, 4/500/95	ks	10,00	10,00	-
96		dtto, 6/500/95	ks	2,00	2,00	-
97		dtto, 8/500/95	ks	2,00	2,00	-
98		dtto, 10/500/95	ks	12,00	12,00	-
99		dtto, 12/500/95	ks	14,00	14,00	-
100		dtto, 14/500/95	ks	10,00	10,00	-
100a		dtto, 16/500/95	ks	-	1,00	- 1,00
101		dtto, 18/500/95	ks	2,00	4,00	- 2,00
102		dtto, 20/500/95	ks	2,00	2,00	-
103		dtto, 24/500/95	ks	4,00	4,00	-
104		dtto, 28/500/95	ks	1,00	1,00	-
105		dtto, 28/500/95	ks	1,00	1,00	-
106		designové hliníková článkové otopné těleso, bílé, přípojovací rozteč h 600 mm, výška H 680 mm, délka L 80 mm, hloubka D 95 mm, zaoblené hrany, nominální výkon 10 článků = 1450 W při 75/65/20°C, od dodavatele zkompletováno do potřebných počtů článků (sestav), 4/600/95	ks	1,00	1,00	-
106a		dtto, 4/600/95	ks	-	1,00	- 1,00
107		dtto, 8/600/95	ks	2,00	1,00	1,00
108		dtto, 12/600/95	ks	1,00	1,00	-
109		dtto, 14/600/95	ks	3,00	2,00	1,00
110		dtto, 16/500/95	ks	5,00	3,00	2,00
111		montážní balíček pro výše uvedená hliníková článková otopná tělesa, který se skládá z: 4x růžice 1/2" s teflonovým těsněním, 1x zátka 1/2", 1x odvzdušňovací ventil 1/2", 2+3x sada uchycení na zeď (počet sad uchycení = dle délky OT (počtu článků))	soubor	72,00	-	-
118		snížení počtů článků stávajícího otopného tělesa z hliníkových článků 500/95 v místnosti č. 116 ve stávající budově RIAPS, tj. snížení počtu z původních 16 článků na 6 článků 500/95, včt. potřebného instalačního materiálu (růžice, vsuvky, ...), včt. nutnosti uzavření stávající stoupačky v budově RIAPS a částečného vypuštění vody z OT a stoupačky, a následného napuštění vody v dané stoupačce	soubor	1,00	-	-
168	Vypracoval	T. Vinšálek				
169	Datum	2019_07_07				



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 11
Název projektu:	Centrum duševního zdraví RIAPS Trutnov, reg. číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_048/0004463	
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., IČO: 25275062	
Objednatel:	Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, IČO: 00195201	
Změnový list vystavil:	Ing. Kateřina Meierová	
Datum:	11.09.2019	
Předmět změny: příčky		
Popis a zdůvodnění změny:		
V rozpočtu, který je přílohou SoD, byla chybná výměra příček. Projektant provedl přepočet výměr, který uvedl do souladu výkresovou dokumentaci, skutečnost a výkaz výměr.		
Přílohy změnového listu:		
rozpočet - ZL 11 výpočet ploch příček od projektanta		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0 bez DPH	29 169,47 Kč bez DPH	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
29 169,47 bez DPH	bez dopadu do termínu	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Miroslav Petera Sdružení ozdravoven a léčebn. okresu Trutnov Ředitelství, Procházkova 818 541 01 Trutnov -4- Datum: 9.10.19	Vratislav Zítka PRŮMSTAV NÁCHOD PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD ROZVOJOVSKÁ 1776, TEL.-FAX 491 423 757 Datum: 20.9.2019	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Ing. Marek Pavlíček Datum: 9.10.19	Ing. Gerhard Schmiedl Datum: 9.10.19	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ, NA NIVÁCH 57**

Název objektu **ZL 11 - přičky**

JKSO

EČO

Místo

TRUTNOV

IČ

DIČ

Objednatel **SDRUŽENÍ OZDRAVOVEN A LÉČEBEN OKRESU TRUTNOV**

Projektant **ATELIER PAVLÍČEK**

Zhotovitel **Průmstav Náchod s.r.o.**

Zpracoval

25275062

CZ25275062

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	29 169,47	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00%
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		29 169,47	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

25.9. 2018

PRŮMSTAV NÁCHOD

PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD
DOBROŠOVSKÁ 1776, TEL.-FAX 491 423 757

D Celkem bez DPH 29 169,47

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	29 169,47	6 125,59

Cena s DPH 35 295,06

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ, NA NIVÁCH 57

Objekt: ZL 11 - příčky

Objednatel: SDRUŽENÍ OZDRAVOVEN A LÉČEBEN OKRESU TRUTNOV

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: TRUTNOV

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
D10	011-BĚŽNÉ STAVEBNÍ PRÁCE	0,00	28 477,47	28 477,47	11,586	0,000
34	Stěny a příčky	0,00	25 638,90	25 638,90	11,586	0,000
99	Přesun hmot a manipulace se suti	0,00	2 838,57	2 838,57	0,000	0,000
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	692,00	692,00	0,000	0,000
	Celkem	0,00	29 169,47	29 169,47	11,586	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ, NA NIVÁCH 57

Objekt: ZL 11 - příčky

Objednatel: SDRUŽENÍ OZDRAVOVEN A LÉČEBEN OKRESU TRUTNOV

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: TRUTNOV

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D10 011-BĚŽNÉ STAVEBNÍ PRÁCE

28 477,47

34 Stěny a příčky

25 638,90

1	R	342248112	PŘÍČKA 11,5CM PŘÍČKOVKY KERAM P+D P10 MVC	M2	44,205	580,00	25 638,90
			"1.NP" -32,891+28,8		-4,091		
			"2.NP" -295,545+313,99		18,445		
			"3.NP" -397,07+426,921		29,851		
			Součet		44,205		

99 Přesun hmot a manipulace se sutí

2 838,57

2	R	998011003	PŘESUN HMOT BUDOVA ZDĚNÁ V -24M	T	11,586	245,00	2 838,57
---	---	-----------	---------------------------------	---	--------	--------	----------

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

692,00

3	R	R.0010	Jiné VRN ve výši 2,43%	Kč	692,000	1,00	692,00
---	---	--------	------------------------	----	---------	------	--------

Celkem

29 169,47

From: Ing. Marek Pavlíček - Atelier [<mailto:pavlicek@atelierpavlicek.cz>]

Sent: Thursday, July 25, 2019 2:33 PM

To: Průmstav Náchod s.r.o. - Miroslav Rojší

Subject: CDZ - příčky 11,5

Dobrý den,

v příloze zasílám výpočet ploch příček tl. 11,5 cm na akci CDZ Trutnov.

S pozdravem

Marek Pavlíček

--

Ing. Marek Pavlíček

ATELIER PAVLÍČEK

Rooseveltova 2855

544 01 Dvůr Králové n/L

GSM: +420 603 202 456

www.atelierpavlicek.cz



RODOLFO

MAC WROLET

RODOLFO

1. PP

32,841 H²28,86 H²+ 4,091 H²

1. WF

185,525 H²312,89 H²- 18,445 H²

2. WF

397,07 H²426,921 H²- 29,851 H²

RECKT TL 125 MM

1. PP $4,14 \cdot (1,5 + 2,5 + 1,71 + 3,3) = 37,31 \text{ M}^2$

DWELL (ODERLET): $2,24 \cdot (0,9 + 0,9 + 1 + 1) = 8,51 \text{ M}^2$

$37,31 - 8,51 = \underline{\underline{28,8 \text{ M}^2}}$

1 NT

$3,75 \cdot (2,04 + 4,19 + 7,595 + 4,47 + 3,4) = \underline{\underline{103,856 \text{ M}^2}}$

$3,90 \cdot (0,6 + 12,13 + 4,10 + 8,21) = \underline{\underline{97,656 \text{ M}^2}}$

$3,82 \cdot (4,28 + 1,8 + 1,85 + 1,75 + 9,89 + 2,7 + 2,65 + 2,6) = \underline{\underline{105,126 \text{ M}^2}}$

PIATS: $3,95 \cdot (5,6 + 3,925 + 0,11 + 1,025) = \underline{\underline{42,502 \text{ M}^2}}$

DWELL (ODERLET): $2,17 \cdot (2 \cdot 0,9 + 1) = 6,076 \text{ M}^2$

$2,24 \cdot (0,9 + 1) = 4,256 \text{ M}^2$

$2,24 \cdot (0,2 \cdot 7 + 0,9 \cdot 2) = 16,576 \text{ M}^2$

$2,12 \cdot 0,8 = 1,596 \text{ M}^2$

$\left. \begin{array}{l} 6,076 \\ 4,256 \\ 16,576 \end{array} \right\} = \underline{\underline{28,604 \text{ M}^2}}$

STRECKEN TRIMM (ODERLET): $(4 + 0,5) + (10 \cdot 0,6 \cdot 0,25) + (0,6 \cdot 8,21) = \underline{\underline{6,546 \text{ M}^2}}$

$(103,856 + 97,656 + 105,126 + 42,502) - (28,604 + 6,546) =$

$= 349,14 - 35,15 = \underline{\underline{313,99 \text{ M}^2}}$

2. VP

$$3,25 \cdot (2,635 + 4,09 + 4,465 + 2,97 + 1,25 + 3,45 + 3,9 + 3,165 + 0,9) =$$
$$= \underline{\underline{118,625 \text{ HZ}}}$$

$$3,72 \cdot (0,6 + 12,13 + 12,13 + 2,10 + 3,92 \cdot 3 + 4,16 + 4,25) =$$
$$= \underline{\underline{179,525 \text{ HZ}}}$$

$$3,65 \cdot (5,0 \cdot 3 + 0,84 + 1,25 + 8,34 + 2 \cdot 2,9 + 1,675 + 2,55 + 2,16 +$$
$$+ 2,605 + 2,65 + 2,69 + 1,775 + 1,650) = \underline{\underline{180,255 \text{ HZ}}}$$

$$\text{JNE PL (OZECET)} : \{ 2,17 \cdot (110,8 + 14 \cdot 0,9) = \underline{\underline{46,438}} \}$$

STROTKU TRAMF

$$(\text{OZECET}) : (17 \cdot 0,0025) + (4,16 \cdot 0,6) = \underline{\underline{5,046 \text{ HZ}}}$$

$$(118,625 + 179,525 + 180,255) - (46,438 + 5,046) =$$
$$= 478,405 - 51,484 = \underline{\underline{426,921 \text{ HZ}}}$$



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 12
Název projektu:	Centrum duševního zdraví RIAPS Trutnov, reg. číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_048/0004463	
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., IČO: 25275062	
Objednatel:	Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, IČO: 00195201	
Změnový list vystavil:	Ing. Kateřina Meierová	
Datum:	11.09.2019	
Předmět změny: Kuchyňské linky – odpočet dřezů		
Popis a zdůvodnění změny: Dřezy ke kuchyňským linkám se vyskytují v rozpočtu „Kuchyňské linky“ i v rozpočtu „ZTI“. Jedná se tedy o duplicitní položky a z rozpočtu „kuchyňské linky“ jsou dřezy odečteny.		
Přílohy změnového listu: rozpočet - ZL 12		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-14 278,74 Kč bez DPH	0 Kč bez DPH	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-14 278,74 Kč bez DPH	bez dopadu do termínu	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Miroslav Petera Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov Ředitelství, Procházkova 818 541 01 Trutnov -4-	Vratislav Zítka PRŮMSTAV NÁCHOD PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD DOBROŠOVSKÁ 175, TEL.-FAX 491 423 757	
Datum: 9.10.19	Datum: 25.9.2019	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Ing. Marek Pavlíček	Ing. Gerhard Schmiedl	
Datum: 9.10.19	Datum: 9.10.19	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ, NA NIVÁCH 57**

JKSO

Název objektu **ZL 12 - kuchyňské linky - odpočet dřezů**

EČO

Místo

TRUTNOV

IČ

DIČ

Objednatel **SDRUŽENÍ OZDRAVOVEN A LÉČEBEN OKRESU TRUTNOV**

Projektant **ATELIER PAVLIČEK**

Zhotovitel **Průmstav Náchod s.r.o.**

Zpracoval

25275062

CZ25275062

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	-14 278,74	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00%
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-14 278,74	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



PRŮMSTAV NÁCHOD

PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD
DOBROŠOVSKÁ 170, TEL. FAX 491 423 757

D Celkem bez DPH -14 278,74

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižovaná	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-14 278,74	-2 998,54

Cena s DPH -17 277,28

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ, NA NIVÁCH 57

Objekt: ZL 12 - kuchyňské linky - odpočet dřezů

Objednatel: SDRUŽENÍ OZDRAVOVEN A LÉČEBEN OKRESU TRUTNOV

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: TRUTNOV

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
kch	Kuchyňské linky	0,00	-13 940,00	-13 940,00	0,000	0,000
D1	místnost č. 7	0,00	-1 650,00	-1 650,00	0,000	0,000
D2	místnost č. 110	0,00	-1 380,00	-1 380,00	0,000	0,000
D3	místnost č. 114	0,00	-1 380,00	-1 380,00	0,000	0,000
D4	místnost č. 210	0,00	-2 630,00	-2 630,00	0,000	0,000
D5	místnost č. 211	0,00	-1 380,00	-1 380,00	0,000	0,000
D6	místnost č. 221	0,00	-1 380,00	-1 380,00	0,000	0,000
D7	místnost č. 225	0,00	-1 380,00	-1 380,00	0,000	0,000
D8	místnost č. 213	0,00	-1 380,00	-1 380,00	0,000	0,000
D9	místnost č. 217	0,00	-1 380,00	-1 380,00	0,000	0,000
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	-338,74	-338,74	0,000	0,000
	Celkem	0,00	-14 278,74	-14 278,74	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ, NA NIVÁCH 57


Objekt: ZL 12 - kuchyňské linky - odpočet dřezů

Objednatel: SDRUŽENÍ OZDRAVOVEN A LÉČEBEN OKRESU TRUTNOV

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: TRUTNOV

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
kch Kuchyňské linky							-13 940,00
D1 místnost č. 7							-1 650,00
5	R	k4	dvojdřez	ks	-1,000	1 650,00	-1 650,00
D2 místnost č. 110							-1 380,00
6	R	k11	dřez nerez s odkapem	ks	-1,000	1 380,00	-1 380,00
D3 místnost č. 114							-1 380,00
7	R	k11	dřez nerez s odkapem	ks	-1,000	1 380,00	-1 380,00
D4 místnost č. 210							-2 630,00
8	R	k11	dřez nerez s odkapem	ks	-1,000	2 630,00	-2 630,00
D5 místnost č. 211							-1 380,00
9	R	k11	dřez nerez s odkapem	ks	-1,000	1 380,00	-1 380,00
D6 místnost č. 221							-1 380,00
10	R	k11	dřez nerez s odkapem	ks	-1,000	1 380,00	-1 380,00
D7 místnost č. 225							-1 380,00
11	R	k11	dřez nerez s odkapem	ks	-1,000	1 380,00	-1 380,00
D8 místnost č. 213							-1 380,00
12	R	k11	dřez nerez s odkapem	ks	-1,000	1 380,00	-1 380,00
D9 místnost č. 217							-1 380,00
13	R	k11	dřez nerez s odkapem	ks	-1,000	1 380,00	-1 380,00
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							-338,74
14	R	R.0010	Jiné VRN ve výši 2,43%	Kč	-338,740	1,00	-338,74
Celkem							-14 278,74



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo ZL: 13
Název projektu:	Centrum duševního zdraví RIAPS Trutnov, reg. číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_048/0004463	
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., IČO: 25275062	
Objednatel:	Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, IČO: 00195201	
Změnový list vystavil:	Ing. Kateřina Meierová	
Datum:	11.09.2019	
Předmět změny: SLP – kabel strukturované kabeláže		
Popis a zdůvodnění změny: Kabely strukturované kabeláže Cat 6a budou nahrazeny nově kabely Cat6. Důvodem je nesoulad původního návrhu kabeláže (Cat 6a) a koncových prvků (nevhodných na kabely Cat 6a). Kabely Cat 6 jsou z pohledu uživatelského vhodné a bude možno použít projektované koncové prvky.		
Přílohy změnového listu: rozpočet - ZL 13		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-195 908,55 Kč bez DPH	156 768,- Kč bez DPH	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-39 140,55 Kč bez DPH	bez dopadu do termínu	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Miroslav Petera Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov Ředitelství, Procházkova 818 541 01 Trutnov -4-	Vratislav Zítka PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD DOBROŠOVSKÁ 1776, TEL: FAX 491 423 757	
Datum: 9.10.19	Datum: 20.9.2019	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Ing. Marek Pavlíček	Ing. Gerhard Schmiedl	
Datum: 9.10.19	Datum: 9.10.19	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ, NA NIVÁCH 57**

JKSO

Název objektu **ZL 13 - SLP - kabel strukturované kabeláže**

EČO

Místo

TRUTNOV

IČ

DIČ

Objednatel **SDRUŽENÍ OZDRAVOVEN A LÉČEBEN OKRESU TRUTNOV**

Projektant **ATELIER PAVLÍČEK**

Zhotovitel **Průmstav Náchod s.r.o.**

Zpracoval

25275062

CZ25275062

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	-39 140,55	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00%
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-39 140,55	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



PRŮMSTAV NÁCHOD

PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD
DOBROŠOVSKÁ 1776, TEL.-FAX 491 423 757

25.9.2019

[Handwritten signature]

D Celkem bez DPH -39 140,55

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-39 140,55	-8 219,52

Cena s DPH -47 360,07

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ, NA NIVÁCH 57

Objekt: ZL 13 - SLP - kabel strukturované kabeláže

Objednatel: SDRUŽENÍ OZDRAVOVEN A LÉČEBEN OKRESU TRUTNOV

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: TRUTNOV

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
D11	11. Strukturovaná kabeláž, telefon, signalizace WC imobilní stávajícího RACK a napojení na	0,00	-36 900,00	-36 900,00	0,000	0,000
D12	stáv. SK	0,00	-1 312,00	-1 312,00	0,000	0,000
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	-928,55	-928,55	0,000	0,000
	Celkem	0,00	-39 140,55	-39 140,55	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ, NA NIVÁCH 57

Objekt: ZL 13 - SLP - kabel strukturované kabeláže

Objednatel: SDRUŽENÍ OZDRAVOVEN A LÉČEBEN OKRESU TRUTNOV

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: TRUTNOV

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D11 11. Strukturovaná kabeláž, telefon, signalizace WC imobilní

-36 900,00

1	R	Pol197	Kabeláž UTP Cat6A LSZH bezhalogenový	M	-9 000,000	20,90	-188 100,00
---	---	--------	--------------------------------------	---	------------	-------	-------------

"rozdíl mezi kabelem Cat 6a a Cat 6 : -4,1 Kč/m" -9000 -9 000,000

3	R	Pol197.1	Kabel cat6 LSZH bezhalogenový	M	9 000,000	16,80	151 200,00
---	---	----------	-------------------------------	---	-----------	-------	------------

D12 12. Propojení budov, doplnění stávajícího RACK a napojení na stáv. SK

-1 312,00

2	R	Pol230	Kabel UTP Cat6A LSZH bezhalogenový	M	-320,000	21,50	-6 880,00
---	---	--------	------------------------------------	---	----------	-------	-----------

"rozdíl mezi kabelem Cat 6a a Cat 6 : -4,1 Kč/m" -320 -320,000

4	R	Pol197.2	Kabel cat6 LSZH bezhalogenový	M	320,000	17,40	5 568,00
---	---	----------	-------------------------------	---	---------	-------	----------

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

-928,55

10	R	R.0010	Jiné VRN ve výši 2,43%	Kč	-928,550	1,00	-928,55
----	---	--------	------------------------	----	----------	------	---------


Celkem

-39 140,55

-195 908,55

156 768,00

-39 140,55



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 14
Název projektu:	Centrum duševního zdraví RIAPS Trutnov, reg. číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_048/0004463	
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., IČO: 25275062	
Objednatel:	Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, IČO: 00195201	
Změnový list vystavil:	Ing. Kateřina Meierová	
Datum:	9.10.2019	
Předmět změny: m.č. 006, 007 - úpravy povrchů pomocí těsnících omítek (Weber) Popis a zdůvodnění změny: Při odstraňování vnitřní povrchové úpravy kleneb v m.č. 006 a 007 bylo zjištěno, že povrch původních kleneb z kamene je nesoudržný a trpí zvýšenou vlhkostí. Proto byl navržen způsob zpevnění a izolace povrchu s napojením na hydroizolaci podlahy. Z nabízených technických řešení specializovaných firem bylo vybráno jako nevhodnější systémové řešení firmy Weber. Rozvody instalací budou vedeny u podlahy v dvoukomorovém parapetním žlabu. V m.č. 007 bude pod izolační souvrství vyžděna přízdívka z betonových cihel jako vyrovnaní nerovného povrchu pod obklad a pro montáž kuchyňské linky. Přílohy změnového listu: rozpočet - ZL 14		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-94 974,- Kč bez DPH	460 066,76 Kč bez DPH	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
365 092,76 Kč bez DPH	bez dopadu do termínu	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Miroslav Petera Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov Ředitelství, Procházkova 818 541 01 Trutnov -4-	Vratislav Zítka PRŮMSTAV NÁCHOD PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD DOBROSOVSKÁ 1778, TEL. FAX 491 423 157	
Datum: 8.4.2020	Datum: 8.4.2020	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Ing. Marek Pavlíček 	Ing. Gerhard Schmiedl 	
Datum: 8.4.20	Datum: 8.4.20	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ, NA NIVÁCH 57

JKSO

Název objektu

ZL 14 - m.č. 006, 007 - úpravy povrchů pomocí těsnících omítek (Weber)

EČO

Místo

TRUTNOV

IČO

DIČ

Objednatel

SDRUŽENÍ OZDRAVOVEN A LÉČEBEN OKRESU TRUTNOV

Projektant

ATELIER PAVLIČEK

Zhotovitel

Průmstav Náchod s.r.o.

25275062

CZ25275062

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	140 988,99
2		Montáž	224 103,77
3	PSV	Dodávky	0,00
4		Montáž	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00
6		Montáž	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		365 092,76
20	HZS		0,00

B Doplnkové náklady

8	Práce přesčas	0,00
9	Bez pevné podl.	0,00
10	Kulturní památka	0,00
11		0,00
12	DN (ř. 8-11)	
21	Kompl. činnost	0,00

C Náklady na umístění stavby

13	Zařízení staveniště	0,00
14	Projektové práce	0,00
15	Územní vlivy	0,00
16	Provozní vlivy	0,00
17	Jiné VRN	0,00%
18	VRN z rozpočtu	0,00
19	VRN (ř. 13-18)	0,00
22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



PRŮMSTAV NÁCHOD

PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD
DOBROŠOVSKÁ 1726 TEL: FAX: 491 423 757

D Celkem bez DPH

365 092,76

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	365 092,76	76 669,48

Cena s DPH

441 762,24

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ, NA NIVÁCH 57

Objekt: ZL 14 - m.č. 006, 007 - úpravy povrchů pomocí těsnících omítek (Weber)

Objednatel: SDRUŽENÍ OZDRAVOVEN A LÉČEBEN OKRESU TRUTNOV

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: TRUTNOV

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	1 568,89	632,79	2 201,68	0,678	0,000
4	Vodorovné konstrukce	264,00	1 038,84	1 302,84	0,146	0,000
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	578,35	-62 312,41	-61 734,06	0,132	0,000
D14	013-BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ	0,00	35 775,37	35 775,37	0,000	0,478
D4	4. Dešťová kanalizace - vnitřní	220,17	-12 860,73	-12 640,56	0,003	0,000
61	Úprava povrchů vnitřních	115 044,78	203 632,35	318 677,13	6,129	0,000
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	23 312,80	6 439,09	29 751,89	0,313	0,000
21-M	Elektromontáže	0,00	43 097,19	43 097,19	0,000	0,000
D1	1. Elektroinstalace - silnoproudá	0,00	43 334,79	43 334,79	0,000	0,000
D11	11. Strukturovaná kabeláž, telefon, signalizace WC imobilní	0,00	-237,60	-237,60	0,000	0,000
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	8 661,28	8 661,28	0,000	0,000
	Celkem	140 988,99	224 103,77	365 092,76	7,401	0,478

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ, NA NIVÁCH 57

Objekt: ZL 14 - m.č. 006, 007 - úpravy povrchů pomocí těsnících omítek (Weber)

Objednatel: SDRUŽENÍ OZDRAVOVEN A LÉČEBEN OKRESU TRUTNOV

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: TRUTNOV

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

3 Svislé a kompletní konstrukce 2 201,68

96	011	342242221	Příčky jednoduché z příčkovek betonových na MC tl 70 mm	m2	4,628	475,73	2 201,68
"m.č. 007 - vyrovnání za kuchyňskou linkou"					4,628		
(2,1+0,985)*1,5							

4 Vodorovné konstrukce 1 302,84

86	014	411235210	Zazdivka otvorů pl do 0,0225 m2 v klenbách cihlami tl do 150 mm	kus	2,000	228,00	456,00
85	014	411237211	Zazdivka otvorů pl do 0,25 m2 v klenbách cihlami tl do 150 mm	kus	2,000	423,42	846,84

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6 SPÁROVÁNÍ ROVNÉ MC ZEĎ KÁMEN -61 734,06

18	R	627452101	SPÁROVÁNÍ ROVNÉ MC ZEĎ KÁMEN	M2	-157,762	400,00	-63 104,80
"MÍSTNOST Č.006							
-((2*3.14*2.92/2)*7.63)					-69,958		
"MÍSTNOST Č.007							
-((2*3.14*2.76/2)*5.9)					-51,132		
"STĚNY Č.006							
-((3.14*2.92*2.92)/2-1.2*2+(1.2+2*2)*0.85)					-15,406		
"STĚNY Č.007							
-(2*(3.14*2.76*2)/2-1.2*2-0.9*2.02)					-13,115		
-((0.9+2*2.02)*1.65)					-8,151		
Součet					-157,762		
83	014	611135002	Vyrovnání podkladu vnitřních stropů maltou cementovou tl do 10 mm	m2	3,500	309,92	1 084,72
84	014	611135092	Příplatek k vyrovnání vnitřních stropů maltou cementovou za každých dalších 5 mm tl	m2	3,500	81,72	286,02

D14 013-BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ 35 775,37

1	R	978011191	OTLUČ OMÍT VNITŘ MV,MVC STROP 100%	M2	-121,090	74,40	-9 009,10
"MÍSTNOST Č.6							
-(2*3.14*2.92/2)*7.63					-69,958		
"MÍSTNOST Č.7							
-(2*3.14*2.76/2)*5.9					-51,132		
Součet					-121,090		
88	R	978013191	OTLUČ OMÍT VNITŘ STĚN MV,MVC 100%	M2	-28,521	58,60	-1 671,33
"MÍSTNOST Č.006							
-((3.14*2.92*2.92)/2-1.2*2+(1.2+2*2)*0.85)					-15,406		
"MÍSTNOST Č.007							
-(2*(3.14*2.76*2)/2-1.2*2-0.9*2.02)					-13,115		
Součet					-28,521		
3	R	978023251	ODSPÁR ZDI KAM REŽNÉ	M2	-149,611	40,60	-6 074,21
"MÍSTNOST Č.6							
"STROPY" -((2*3.14*2.92/2)*7.63)					-69,958		
"MÍSTNOST Č.7							
-((2*3.14*2.76/2)*5.9)					-51,132		
"STĚNY Č.006							

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ, NA NIVÁCH 57

Objekt: ZL 14 - m.č. 006, 007 - úpravy povrchů pomocí těsnících omítek (Weber)

Objednatel: SDRUŽENÍ OZDRAVOVEN A LÉČEBEN OKRESU TRUTNOV

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: TRUTNOV

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

$-(3.14 \cdot 2.92 \cdot 2.92) / 2 - 1.2 \cdot 2 + (1.2 + 2 \cdot 2) \cdot 0.85$ -15,406

"MÍSTNOST Č.007

$-(2 \cdot (3.14 \cdot 2.76 \cdot 2) / 2 - 1.2 \cdot 2 - 0.9 \cdot 2.02)$ -13,115

Součet -149,611

79	R	622903110	MYTÍ VNĚ OMÍTEK SLOŽ 1-2 TLAK.VODOU	M2	157,762	49,70	7 840,77
80	005	985111121	Otlučení omítek lice kleneb a podhledů včetně dočištění ocelovými kartáči	m2	157,762	283,27	44 689,24

D4

4. Dešťová kanalizace - vnitřní

-12 640,56

17	R	Pol18	dodávka + montáž: typový odvodňovací štěrbínový nerezový žlab(materiál AISI 304) žlab, L 4000 mm, šíře vtokového otvoru 20 mm, šíře vrchního dílu 50 mm, výška žlabu 70+80 mm (spádový), 1x čelo slepé, 1x čelo s odtokem DN 50)	SOU BOR	-1,000	14 800,00	-14 800,00
107	R	Pol28	dodávka+montáž, podlahová vpust, polyetylenová, s pevnou izolační přírubou, s kombinovaným vodním zápachovým uzávěrem a mechanickým plovákovým (zvonkovým) zápachovým uzávěrem, který v případě vyschnutí uzavře odtokový přepad, vodorovný odtok, s mřížkou z	KS	1,000	1 860,00	1 860,00
58	002	212755213	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 80 mm bez lože	m	7,600	39,40	299,44

61

Úprava povrchů vnitřních

318 677,13

106	R	612.01	Odrhové zkoušky	kplt	2,000	1 250,00	2 500,00
67	005	985311212	Reprofilace lice kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 20 mm	m2	157,762	1 204,14	189 967,53

"Adhezní můstek Webersan 951 S (8 kg/m2)"

15 kg/10mm - 30 kg/20mm), DO 15%

"klenby" 69,958+51,132 121,090

"svislé stěny" 15,406+13,115+8,151 36,672

Součet 157,762

71	R	612476611.1	SAN OMÍTKA ZDI ŠTUK TL 22MM	M2	157,762	800,00	126 209,60
----	---	-------------	-----------------------------	----	---------	--------	------------

"Sanační omítka Webersan super (10 kg/10mm)"

"Sanační štukWebersan 600 (5,4 kg/3mm)"

"nátěr Kerasil"

"klenby" 69,958+51,132 121,090

"svislé stěny" 15,406+13,115+8,151 36,672

Součet 157,762

711

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

29 751,89

76	711	711493111.1	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnící hmotou dvousložkovou na bázi cementu	m2	68,370	435,16	29 751,89
----	-----	-------------	--	----	--------	--------	-----------

$0,987 = 496, - \cdot 0,987 = 489,55 \text{ Kč/m}^2$, spotřeba 4,5 kg /

voda - 2 vrstvy (2 kg/1vrstva - 2 vrstvy/ 4kg)"

"materiál v položce 71149311 - 4,5 kg/m2 "

$489,55 / 4,5 \cdot 4 = 435,16 \text{ Kč/m}^2$ "

68,37 68,370

21-M

Elektromontáže

43 097,19

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ, NA NIVÁCH 57

Objekt: ZL 14 - m.č. 006, 007 - úpravy povrchů pomocí těsnících omítek (Weber)

Objednatel: SDRUŽENÍ OZDRAVOVEN A LÉČEBEN OKRESU TRUTNOV

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: TRUTNOV

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D1

1. Elektroinstalace - silnoproudá

43 334,79

97	R	Pol2	Krabice elinstalační plastová KP67/2 pod omítku prázdná	KS	-16,000	4,81	-76,96
			"silnoproud - m.č. 006" -15+2		-13,000		
			"006 - za televizi" 2		2,000		
			"silnoproud - m.č. 007" -13		-13,000		
			"007 - za televizi" 2		2,000		
			"007 - za kuchyňskou linkou" 6		6,000		
			Součet		-16,000		
98	R	Pol11	Krabice elinstalační plastová KP PK do parapetního žlabu prázdná	KS	22,000	24,50	539,00
			"silnoproud" 16		16,000		
			"SLP" 6		6,000		
			Součet		22,000		
100	R	R.21011	parapetní kanál dvoukomorový 210x70D, dělicí přepážka stínící s Al fólií, vč. rohů, koutů, spojek a koncovek	m	43,000	868,25	37 334,75
101	R	R.21012	L profil pro montáž k zemi	ks	71,000	78,00	5 538,00

D11

11. Strukturovaná kabeláž, telefon, signalizace WC imobilní

-237,60

99	R	Pol2	Krabice elinstalační plastová KP67/2 pod omítku prázdná	KS	-6,000	39,60	-237,60
			"SLP - m.č. 006" -10		-10,000		
			"006 - za televizi" 4		4,000		
			"SLP - m.č. 007" -8		-8,000		
			"007 - za televizi" 4		4,000		
			"007 - za kuchyňskou linkou" 4		4,000		
			Součet		-6,000		

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

8 661,28

59	R	R.0010	Jiné VRN ve výši 2,43%	Kč	8 661,280	1,00	8 661,28
----	---	--------	------------------------	----	-----------	------	----------

Celkem

365 092,76



-94 974,00


460 066,76

365 092,76

					Orientační zkouška přidržnosti - záznam			
použitý tmel					Objednatel: Průmstav Náchod			
podklad		Cementová omítka						
Data a počasí průběhu zkoušky								
		Datum		počasí		Místo stavby: Trutnov Na Nivách 57		
zhotovení vzorků								
zrání vzorků počet dní								
provedení zkoušky 1.		11.12.2019						
provedení zkoušky 2.								
číslo	zkušební místo	doba zrání		výsledek	tl. vrstvy mm	způsob porušení		poznámka
		dny				MPa	vrstva	
1.	Viz foto			0,26	1	V omítce	100	
2.	Viz foto			0,17	22	Od podkladu	100	
3.	Viz foto			0,00	20	Od podkladu	100	
4.	Viz foto			0,46	1	V omítce	100	
5.	Viz foto			0,03	18	Od podkladu	100	
6.	Viz foto			0,04	19	Od podkladu	100	
7.	Viz foto			0,01	21	Od podkladu	100	
8.								
9.								
10.								
		1. termín	2. termín	Poznámka: V ČSN 73 2901 – provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů(ETICS) v odstavci 5.1.2. se doporučuje, aby průměrná hodnota přidržnosti lepicí hmoty k podkladu byla nejméně 0,2 MPa s tím, že žádný výsledek zkoušky přidržnosti lepicí hmoty k podkladu nesmí být menší než 0,08 MPa.				
Počet zkoušek		7						
Výsledná hodnota		0,13						
Nevyhovující výsledek								
Zkoušky provedl: Aplikační technik Jaroslav Hladík		Záznam vyhotovil:			Datum:		Podpis:	

Místa zkoušky přídržnosti byla určena realizační firmou

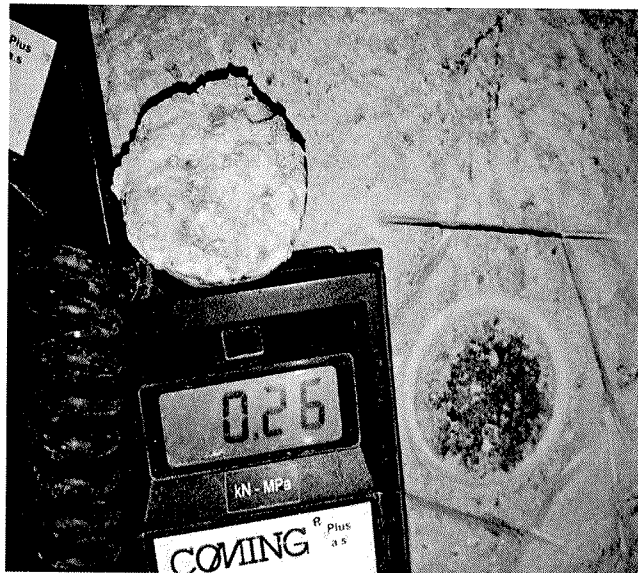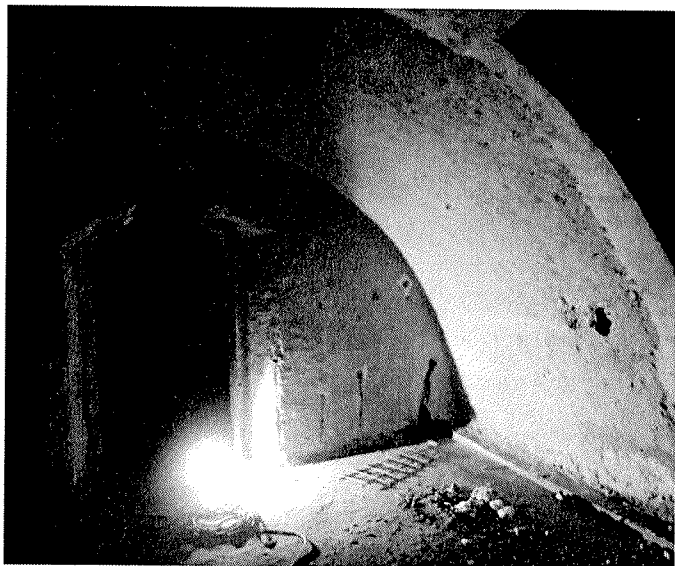

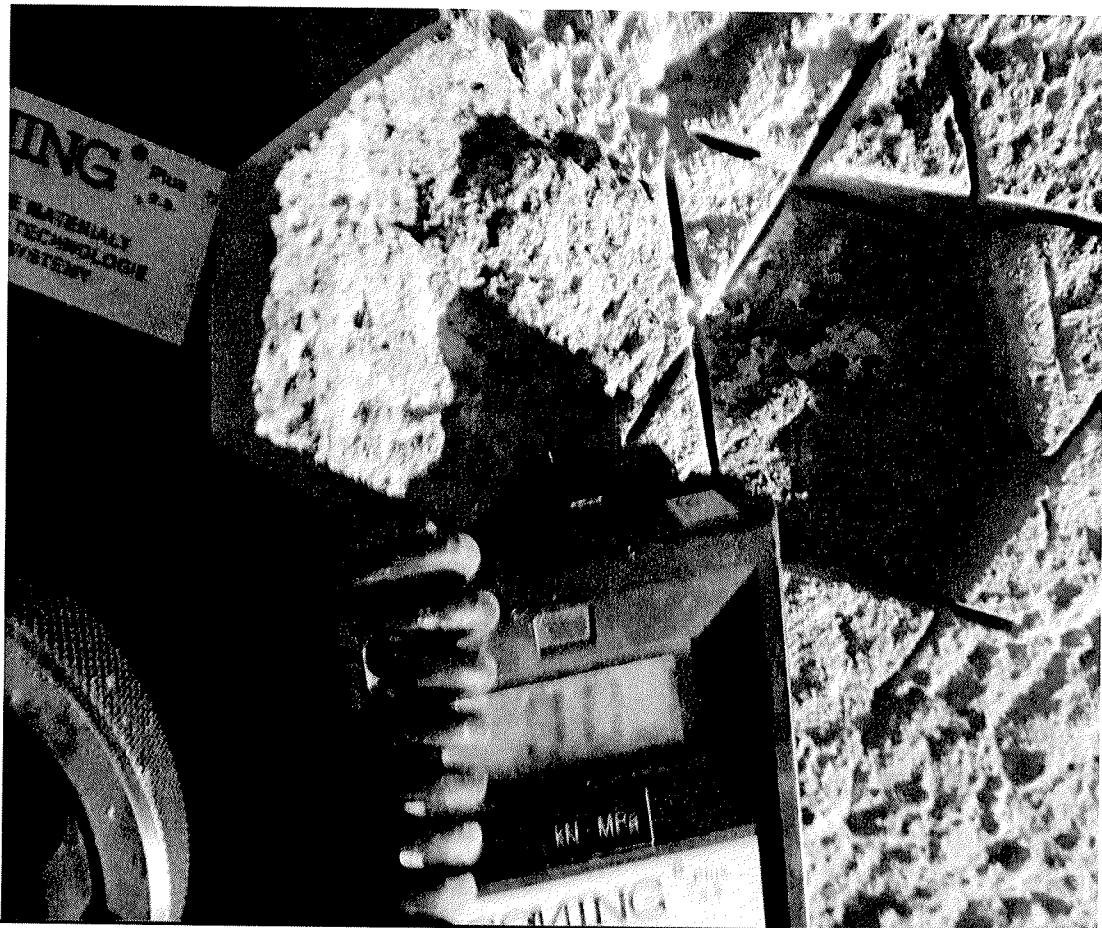



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 15
Název projektu:	Centrum duševního zdraví RIAPS Trutnov, reg. číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_048/0004463	
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., IČO: 25275062	
Objednatel:	Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, IČO: 00195201	
Změnový list vystavil:	Ing. Kateřina Meierová	
Datum:	9.12.2019	
Předmět změny: sadové úpravy a zpevněné plochy		
Popis a zdůvodnění změny: Vzhledem k tomu, že se do dne uzavření dodatku nepodařilo majetkoprávně vypořádat všechny vztahy k pozemkům tak, jak bylo předpokládáno v PD, nedojde k realizaci stavebních prací na pozemcích p.č. 249/3, 2553/2 a 2235/1 k.ú. Trutnov, jejichž vlastníkem je Město Trutnov. Místa překopů pro inženýrské sítě budou uvedena do původního stavu.		
Přílohy změnového listu: rozpočet - ZL 15 mapky se zakreslením dotčených ploch		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-93 787,53 Kč bez DPH	26 734,50 Kč bez DPH	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-67 053,03 Kč bez DPH	bez dopadu do termínu	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Miroslav Petera Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov Ředitelství, Procházkova 818 541 01 Trutnov -4-	Vratislav Zítka	
Datum: 30.1.2020	Datum: 30.1.2020	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Ing. Marek Pavlíček	Ing. Gerhard Schmiedl	
Datum: 30.1.20	Datum: 30.1.20	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ, NA NIVÁCH 57**

Název objektu **ZL 15 - sadové úpravy a zpevněné plochy**

JKSO

EČO

Místo

TRUTNOV

IČ

DIČ

Objednatel **SDRUŽENÍ OZDRAVOVEN A LÉČEBEN OKRESU TRUTNOV**

Projektant **ATELIER PAVLÍČEK**

Zhotovitel **Průmstav Náchod s.r.o.**

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

9.12.2019

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	-67 053,03	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-67 053,03	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

PRŮMSTAV NÁCHOD
PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD
ústecký kraj, IČO: 14612

D Celkem bez DPH -67 053,03

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-67 053,03	-14 081,14

Cena s DPH -81 134,17

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ, NA NIVÁCH 57

Objekt: ZL 15 - sadové úpravy a zpevněné plochy

Objednatel: SDRUŽENÍ OZDRAVOVEN A LÉČEBEN OKRESU TRUTNOV

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: TRUTNOV

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
D20	221-POZEMNÍ KOMUNIKACE	0,00	-12 773,38	-12 773,38	0,000	-38,755
91	Doplňující práce na komunikaci	0,00	-15 931,80	-15 931,80	0,000	0,000
D22	231-POZEMKOVÉ ÚPRAVY	0,00	-36 757,12	-36 757,12	0,000	0,000
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	-1 590,73	-1 590,73	0,000	0,000
	Celkem	0,00	-67 053,03	-67 053,03	0,000	-38,755

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ, NA NIVÁCH 57

Objekt: ZL 15 - sadové úpravy a zpevněné plochy

Objednatel: SDRUŽENÍ OZDRAVOVEN A LÉČEBEN OKRESU TRUTNOV

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: TRUTNOV

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D20 221-POZEMNÍ KOMUNIKACE

-12 773,38

45	R	566905111	VYSPR PODKL PODKLAD BET PO PŘEKOP	M3	2,700	5 500,00	14 850,00
			27*0,10		2,700		
46	R	572952112	VYSPRAV KRYTU PŘEKOP ACO 7CM	M2	27,000	350,00	9 450,00
			5*3+4*3		27,000		
47	R	919731122	ZAROV STYČNÉ PL PODKL ŽIVIČ TL 10CM	M	11,000	120,00	1 320,00
44	R	59245266R	Dlažba betonová barevná 20x10x8, povrch STANDARD	M2	-4,408	299,00	-1 317,99
			-2,15*2,05		-4,408		
43	R	596215040R0	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	M2	-4,408	308,00	-1 357,66
5	R	113107161	ODSTRAŇ PODKLAD -200M2 KAM DRC 10CM	M2	-80,685	30,00	-2 420,55
2	R	113107182	ODSTRAŇ PODKLAD -200M2 ŽIVICE 10CM	M2	-80,685	51,40	-4 147,21
			-(26,35+2,0)*2,1		-59,535		
			-(5+11,05)*3		-48,150		
			5*3+4*3		27,000		
			Součet		-80,685		
3	R	113202111	VYTRHÁNÍ OBRUB KRAJNIC	M	-35,550	51,40	-1 827,27
			-(26,35+2,15+5+11,05)		-44,550		
			5+4		9,000		
			Součet		-35,550		
6	R	919735112	ŘEZÁNÍ ŽIVIČ KRYTU TL 5-10CM	M	15,000	74,30	1 114,50
			-(3+3)		-6,000		
			(3*2+5)+(3*2+4)		21,000		
			Součet		15,000		
8	R	979082213	VODOR DOPRAVA SUTI SUCHO 1KM	T	-38,755	213,00	-8 254,82
9	R	979082219	PŘÍPL ZKD 1KM SUTI SUCHO 1KM	T	-232,530	9,30	-2 162,53
			-38,755*6		-232,530		
7	R	979087212	NAKLÁDÁNÍ DOPRAV PROSTRŮ SUTI	T	-38,755	60,00	-2 325,30
10	R	979099115	SKLÁDKOVNÉ BETON	T	-7,288	1 000,00	-7 288,00
11	R	979099145	SKLÁDKOVNÉ ASFALTOVÉ POVRCHY	T	-17,751	292,00	-5 183,29
12	R	979099155	SKLÁDKOVNÉ KAMENIVO	T	-13,716	235,00	-3 223,26

91 Doplnující práce na komunikaci

-15 931,80

34	R	917862111R U2	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku 1000/150/250	M	-47,700	334,00	-15 931,80
			-(26,35*2+4)		-56,700		
			5+4		9,000		
			Součet		-47,700		

D22 231-POZEMKOVÉ ÚPRAVY

-36 757,12

22	R	182001112	PLOŠ ÚPRAVA TERÉN +/- 0,1M SVAH 1:2	M2	-52,700	35,00	-1 844,50
33	R	184802211	CHEM ODPLEVEL POSTŘÍK PŘED ZAL 1:2	M2	-52,700	4,60	-242,42
25	R	180402112	ZALOŽENÍ PARKOVÝ TRÁVNÍK SVAH 1:2	M2	-52,700	24,00	-1 264,80
			-(2*26,35)		-52,700		

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
26	R	005724100	SMĚS TRAVNÍ PARKOVÁ REKREAČNÍ	KG	-1,580	130,00	-205,40
24	R	183102214	JAMKA -0,12M3 VÝMĚNA 50% HOR SV 1:2	KUS	-8,000	120,00	-960,00
27	R	184102114	VÝSADBA DŘEVINY+BAL D -0,5M ROVINA	KUS	-8,000	320,00	-2 560,00
28	R	026504030	JAVOR KULOVITÝ ACER PLAT GLOBOSUM 200CM	KUS	-8,240	3 500,00	-28 840,00
31	R	184202112	UKOTVENÍ DŘEVIN KŮL D -0,1M DL -3M	KUS	-8,000	105,00	-840,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

-1 590,73

35	R	R.0010	Jiné VRN ve výši 2,43%	Kč	-1 590,730	1,00	-1 590,73
----	---	--------	------------------------	----	------------	------	-----------


Celkem

-67 053,03


-93 787,53


26 734,50

-67 053,03

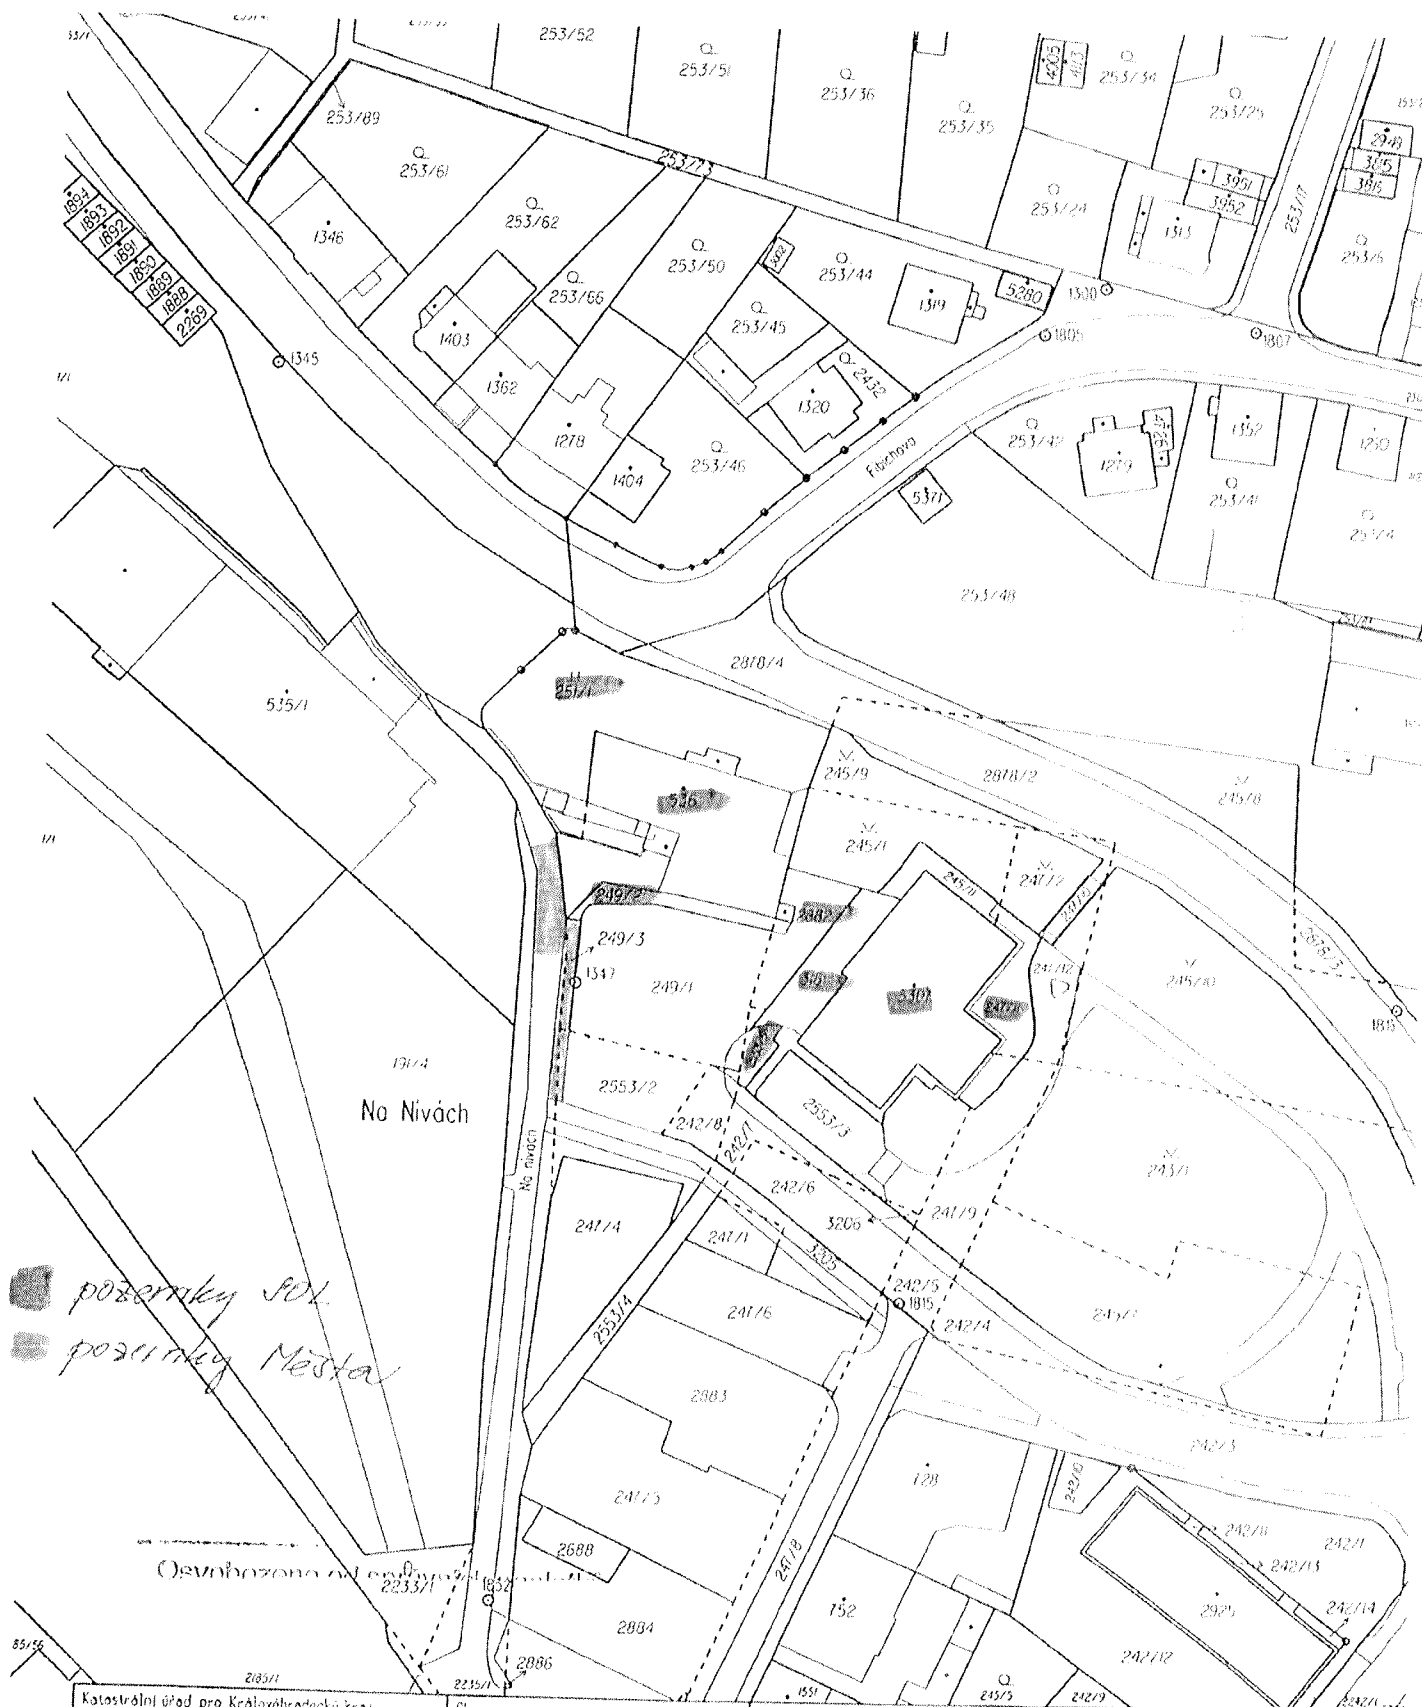

Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov	Okres Trutnov	Obec Trutnov	Podpis Číslo PU 2454/2018-618
Kat. území Trutnov	Mapový list č. TRUTNOV 2-1/43	Měřítko 1:1000	Rozitko
KOPIE KATASTRÁLNÍ MAPY			
Stav k 22.10.2018, 12:58:45	Vyhotovil Břežinová Iva	Dne 22.10.2018 12:58:45	



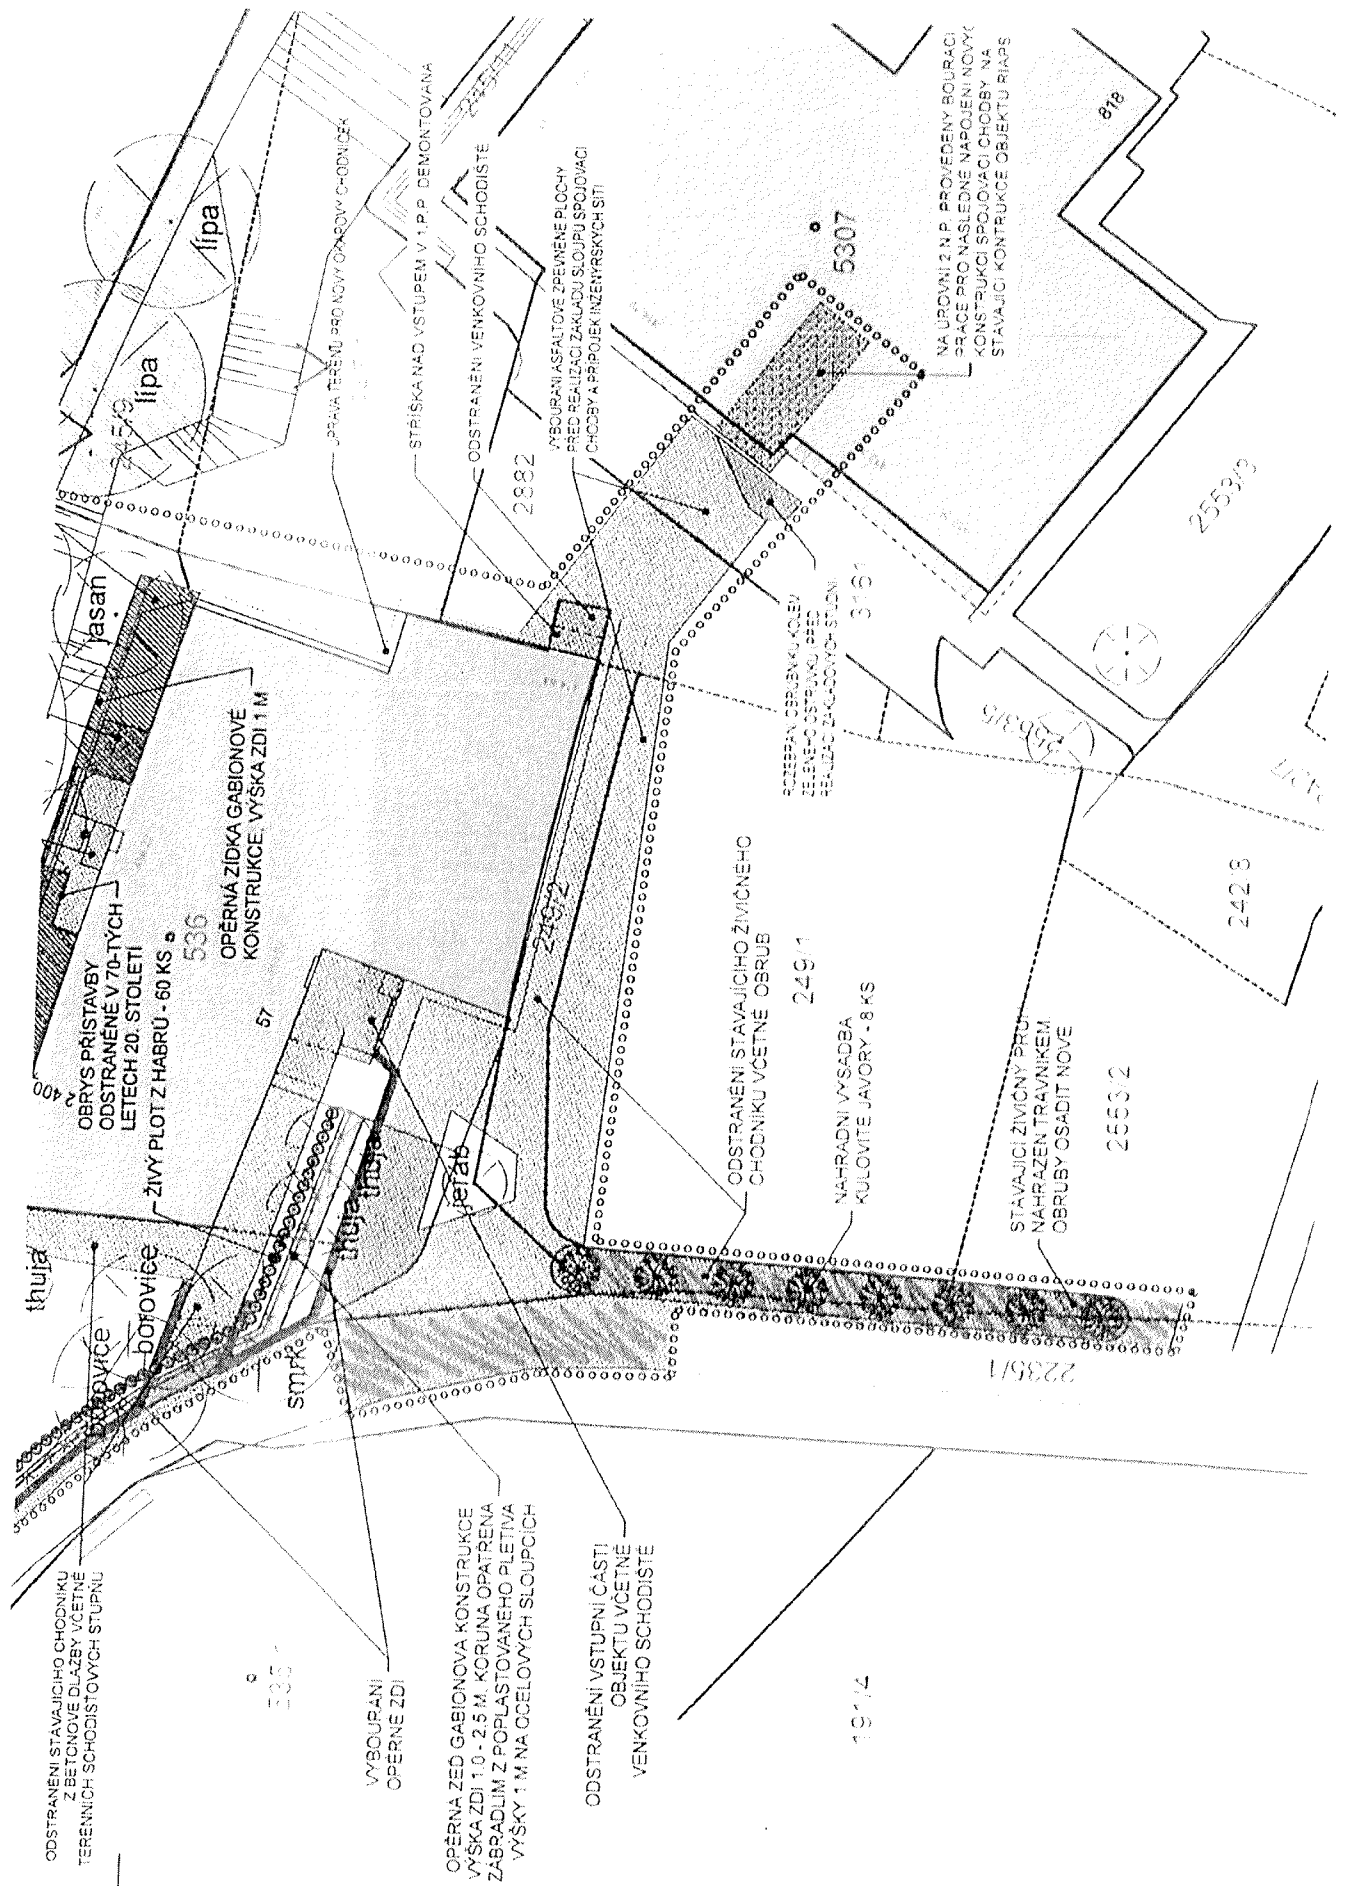



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 16
Název projektu:	Centrum duševního zdraví RIAPS Trutnov, reg. číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_048/0004463	
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., IČO: 25275062	
Objednatel:	Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, IČO: 00195201	
Změnový list vystavil:	Ing. Kateřina Meierová	
Datum:	31.10.2019	
Předmět změny: Keramické obklady		
Popis a zdůvodnění změny: Byla provedena revize výměry keramických obkladů ve vztahu ke smluvnímu rozpočtu a výkazu výměr. Úpravy spočívají v: - dopočítání chybějících obkladů za umyvadly v m.č. 007 a 117 - úpravě ploch obkladů za kuchyňskými linkami. Obklad byl naprojektován od země do v. 1,5m. S investorem a uživatelem bylo dohodnuto, že u některých kuchyňských linek s horními skříňkami bude obklad proveden pouze nad pracovní deskou. Spodní část obkladů pod pracovní deskou byla za kuchyňskými linkami odečtena v m.č. 114, 210, 211, 213, 217, 221, 225.		
Přílohy změnového listu: rozpočet - ZL 16		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-3 954,42 Kč bez DPH	2 938,62 Kč bez DPH	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-1 015,80 Kč bez DPH	bez dopadu do termínu	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Miroslav Petera Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov Ředitelství, Průmyslová 100 541 01 Trutnov	Vratislav Zítka PRŮMSTAV NÁCHOD PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o. 547 01 NÁCHOD DOBROŠOVSKÁ 1776 TEL. FAX 491 423 757	
Datum: 5.11.2019	Datum: 31.10.2019	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Ing. Marek Pavlíček 	Ing. Gerhard Schmiedl 	
Datum: 5.11.19	Datum: 5/11/19	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ, NA NIVÁCH 57

JKSO

Název objektu

ZL 16 - Keramické obklady

EČO

Místo

TRUTNOV

IČO

DIČ

Objednatel

SDRUŽENÍ OZDRAVOVEN A LÉČEBEN OKRESU TRUTNOV

Projektant

ATELIER PAVLÍČEK

Zhotovitel

Průmstav Náchod s.r.o.

25275062

CZ25275062

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady			C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	-1 015,80	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-1 015,80	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

PRŮMSTAV NÁCHOD
PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD
DOBROŠOVSKÁ 1725 TEL.-FAX 491 423 752

D Celkem bez DPH -1 015,80

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-1 015,80	-213,32

Cena s DPH -1 229,12

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ, NA NIVÁCH 57
Objekt: ZL 16 - Keramické obklady

Objednatel: SDRUŽENÍ OZDRAVOVEN A LÉČEBEN OKRESU TRUTNOV

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: TRUTNOV

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
61	Úprava povrchů vnitřních	0,00	2 193,00	2 193,00	0,000	0,000
D59	781-OBKLADY KERAMICKÉ	0,00	-3 930,32	-3 930,32	0,000	0,000
D63	784-MALBY A TAPETOVÁNÍ	0,00	745,62	745,62	0,000	0,000
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	-24,10	-24,10	0,000	0,000
	Celkem	0,00	-1 015,80	-1 015,80	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ, NA NIVÁCH 57

Objekt: ZL 16 - Keramické obklady

Objednatel: SDRUŽENÍ OZDRAVOVEN A LÉČEBEN OKRESU TRUTNOV

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: TRUTNOV

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

61 Úprava povrchů vnitřních 2 193,00

2	R	612473182	VNI OMÍTKA ZDI SMS ŠTUKOVÁ	M2	8,772	250,00	2 193,00
			"MÍSTNOST Č.114				
			1,3*0,9		1,170		
			"MÍSTNOST Č.117				
			-1,5*1,2		-1,800		
			"MÍSTNOST Č.210				
			(0,6+1,12)*0,9		1,548		
			"MÍSTNOST Č.211				
			1,1*0,9		0,990		
			"MÍSTNOST Č.213				
			(0,96*0,9+0,52*1,5)		1,644		
			"MÍSTNOST Č.217				
			(0,6+1,8)*0,9		2,160		
			"MÍSTNOST Č.221				
			(1,1+0,6)*0,9		1,530		
			"MÍSTNOST Č.225				
			(1,1+0,6)*0,9		1,530		
			Součet		8,772		

D59 781-OBKLADY KERAMICKÉ -3 930,32

5	R	597610000	OBKLADAČKY KERAMICKÉ - PŘEDBĚŽNĚ 300/M2	M2	-4,353	300,00	-1 305,90
			-4,146*1,05		-4,353		
			Součet		-4,353		
4	R	781413114	MTŽ OBKLAD PÓROV LEPIDLO -45KS/M2	M2	-4,146	633,00	-2 624,42
			"MÍSTNOST Č.007				
			(0,984+2,1)*1,5		4,626		
			"MÍSTNOST Č.114				
			-1,3*0,9		-1,170		
			"MÍSTNOST Č.117				
			1,5*1,2		1,800		
			"MÍSTNOST Č.210				
			-(0,6+1,12)*0,9		-1,548		
			"MÍSTNOST Č.211				
			-1,1*0,9		-0,990		
			"MÍSTNOST Č.213				
			-(0,96*0,9+0,52*1,5)		-1,644		
			"MÍSTNOST Č.217				
			-(0,6+1,8)*0,9		-2,160		
			"MÍSTNOST Č.221				
			-(1,1+0,6)*0,9		-1,530		
			"MÍSTNOST Č.225				
			-(1,1+0,6)*0,9		-1,530		
			Součet		-4,146		

D63 784-MALBY A TAPETOVÁNÍ 745,62

10	R	784181101	3,8M	M2	8,772	8,00	70,18
----	---	-----------	------	----	-------	------	-------

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ, NA NIVÁCH 57

Objekt: ZL 16 - Keramické obklady

Objednatel: SDRUŽENÍ OZDRAVOVEN A LÉČEBEN OKRESU TRUTNOV

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: TRUTNOV

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
11	R	784221101	3,8M	M2	8,772	37,00	324,56
12	R	784221155	BARVU	M2	8,772	40,00	350,88

VRN


Vedlejší rozpočtové náklady

-24,10

13	R	R.0010	Jiné VRN ve výši 2,43%	Kč	-24,100	1,00	-24,10
----	---	--------	------------------------	----	---------	------	--------

Celkem

-1 015,80




EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 17
Název projektu:	Centrum duševního zdraví RIAPS Trutnov, reg. číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_048/0004463	
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., IČO: 25275062	
Objednatel:	Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, IČO: 00195201	
Změnový list vystavil:	Ing. Kateřina Meierová	
Datum:	31.10.2019	
Předmět změny: Posunutí ventilačního křídla v hliníkové stěně 10L		
Popis a zdůvodnění změny: Pokud by ventilační křídlo zůstalo v původní poloze, došlo by stykem hliníkové stěny s projektovaným podhledem ke špatnému fungování otevírání okna. Z tohoto důvodu se ventilační křídlo posouvá o pozici níže. Změna je bez dopadu do ceny a termínu.		
Přílohy změnového listu: pozice z „Tabulky dveří a oken“ - původní pozice z „Tabulky dveří a oken“ - nová		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0	0	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
0	bez dopadu do termínu	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Miroslav Petera Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov Ředitelství, Procházkova 818 541 01 Trutnov -4-	Vratislav Zítka PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD DOBROŠOVSKÁ 1776, TEL.-FAX 491 423 757	
Datum: 5.11.2019	Datum: 31.10.2019	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Ing. Marek Pavlíček 	Ing. Gerhard Schmiedl 	
Datum: 5.11.19	Datum: 31.10.19	

PŮVODNÍ ŘEŠENÍ DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

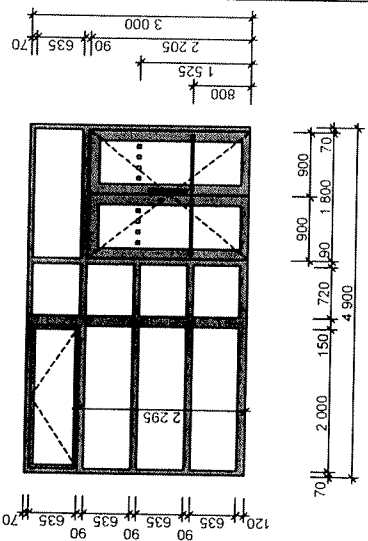OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET				POZNÁMKA
			I.P.P.	I.N.P.	2.N.P.	CELK.	
10 L		HLINÍKOVÁ VSTUPNÍ PROSKLENÁ ČLENĚNÁ STĚNA S VCHODOVÝMI DVOUKRÍDLÝMI SYMETRICKÝMI DVEŘMI 1800 x 2205 MM LEVÝMI DOVNITŘ OTEVÍRAJÝMI, PRŮCHOD JEDNÍM KRÍDLEM 900 x 2205 MM, VNĚ MADLO UVNITŘ KLÍKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ+ ELEKTRICKÝ VRATNÝ, SAMOZAVÍRAČ, STAVEČ DVEŘNÍHO KRÍDLA, NA VENKOVNÍ STRANĚ OBOU DVEŘNÍCH KRÍDEL VODOROVNÉ MADLO VE VÝŠCE 800 - 1000 MM, TROJSKLO DVEŘNÍCH KRÍDEL OPATŘENO OZNAČENÍM PRO ZRAKOVĚ POSTÍŽENÉ OSOBY - PRUH ZE ZNAČEK JASNE VIDITELNÝCH OPROTI POZADÍ VE VÝŠCE 1400-1600 MM, SOUČÁSTÍ PROSKLENÉ STĚNY JE JEDNOKRÍDLÉ OKNO SKLAPEČI 2000 x 630 MM S PAKOVÝM OVLÁDÁNÍM, STAVEBNÍ OTVOR PRO CELOU PROSKLENOU STĚNU 4900 x 3000 MM, OKNO OPATŘENO PAKOVÝM OVLÁDÁNÍM, BARVA OBOUSTRANNĚ SVĚTLÉ ŠEDÁ RAL 7040, OMIŤKOVÉ LÍSTY, TĚSNÍCÍ PASKY (OBOUSTRANNĚ), ZASKLENÍ PRŮHLEDNÝM TĚPELNĚ IZOLAČNÍM TROJSKLEM (DVEŘE VČETNĚ SPODNÍ ČÁSTI PROSKLENÉ STĚNY ZASKLENY BEZPEČNOSTNÍM TROJSKLEM), NA EXTERIEROVÉ STRANĚ SKLO REFLEXNÍ, PRŮMĚRNÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA CELEHO PRVKU $U = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, 4900 x 3000	1	-	-	1	POHLED NA PROSKLENOU STĚNU JE Z EXTERIÉRU !

TABULKY PSV	OKNA A DVEŘE	Č. ZAKÁZ.: 03/16	VÝKR. Č.: AR.23/3
-------------	--------------	------------------	-------------------

OZN.	SCHEMA	POPIS	POZNÁMKA			
			POČET			
			I.P.P.	I.N.P.	2.N.P.	CELK.
		HLINÍKOVÁ VSTUPNÍ PROSKLENÁ ČLENĚNÁ STĚNA S VCHODOVÝMI DVOUKŘÍDLÝMI SYMETRICKÝMI DVERMI 1800 x 2205 MM LEVÝMI DOVNITŘ OTEVÍRÁVÝMI, PRŮCHOD JEDNÍM KŘIDLEM 900 x 2205 MM, VNE MADLO UVNITŘ KLIKA, ZAMEK VLOŽKOVÝ+ ELEKTRICKÝ VRÁTNÝ, SAMOZAVÍRAČ, STAVEČ DVERNÍHO KŘIDLA, NA VENKOVNÍ STRANĚ OBOU DVERNÍCH KŘIDEL VODOROVNĚ MADLO VE VÝŠCE 800 - 1000 MM, TROJSKLO DVERNÍCH KŘIDEL OPATŘENO OZNACENÍM PRO ZRAKOVÉ POSTÍŽENÉ OSOBY - PRUH ZE ZNAČEK JASNĚ VIDITELNÝCH OPROTI POZADÍ VE VÝŠCE 1400-1600 MM, SOUČASTI PROSKLENÉ STĚNY JE JEDNOKŘIDLE OKNO SKLAPEČI 2000 x 630 MM S PAKOVÝM OVLADÁNÍM, STAVEBNÍ OTVOR PRO CELOU PROSKLENOU STĚNU 4900 x 3000 MM, OKNO OPATŘENO PAKOVÝM OVLADÁNÍM, BARVA OBOUSTRANNE SVĚTLÉ SEDA RAL 7040, OMITKOVÉ LISTY, TĚSNICI PASKY (OBOUSTRANNE), ZASKLENÍ PRŮHLÍDEJNÝM TEPELNĚ IZOLAČNÍM TROJSKLEM (DVEŘE, VČETNĚ SPODNÍ ČÁSTI PROSKLENÉ STĚNY ZASKLENY BEZPEČNOSTNÍM TROJSKLEM), NA EXTERIEROVĚ STRANĚ SKLO REFLEXNÍ, PRUMĚRNÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA CELEHO PRVKU $U = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, 4900 x 3000	1	-	-	1
			POHLED NA PROSKLENOU STĚNU JE Z EXTERIÉRU !			

TABULKY PSV	OKNA A DVEŘE	Č. ZAKÁZ.: 03/16	VÝKR. Č.: AR.23/3
-------------	--------------	------------------	-------------------



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 18
Název projektu:	Centrum duševního zdraví RIAPS Trutnov, reg. číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_048/0004463	
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., IČO: 25275062	
Objednatel:	Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, IČO: 00195201	
Změnový list vystavil:	Ing. Kateřina Meierová	
Datum:	20.11.2019	
Předmět změny: Požární vodovod , redukční ventil		
Popis a zdůvodnění změny: Byl doplněn chybějící zpětný a redukční ventil na vodovodní přípojce.		
Přílohy změnového listu: rozpočet - ZL 18		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	6 112,83 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
6 112,83 Kč	bez dopadu do termínu	
Niže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Miroslav Petera Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov Ředitelství, Procházkova 818 541 01 Trutnov -4.	Vratislav Zítka	PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD DOBROŠOVSKÁ 1776, TEL-FAX 491 423 717
Datum: 5.11.2019	Datum: 31.10.2019	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Ing. Marek Pavlíček	Ing. Gerhard Schmiedl	
Datum: 5.11.19	Datum: 5/11/19	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ, NA NIVÁCH 57**

JKSO

Název objektu **ZL 18 - požární vodovod, redukční ventil**

EČO

Místo

TRUTNOV

IČO

DIČ

Objednatel **SDRUŽENÍ OZDRAVOVEN A LÉČEBEN OKRESU TRUTNOV**

Projektant **ATELIER PAVLIČEK**

Zhotovitel **Průmstav Náchod s.r.o.**

Zpracoval

25275062

CZ25275062

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	145,02	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	5 967,81	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		6 112,83	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

PRŮMSTAV NÁCHOD
PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD
DOBROŠOVSKÁ 1776 TEL.-FAX 491 423 757

D Celkem bez DPH 6 112,83

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižovaná	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	6 112,83	1 283,69

Cena s DPH 7 396,52

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ, NA NIVÁCH 57

Objekt: ZL 18 - požární vodovod, redukční ventil

Objednatel: SDRUŽENÍ OZDRAVOVEN A LÉČEBEN OKRESU TRUTNOV

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: TRUTNOV

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
D7	7. Vodovod - vnitřní	0,00	5 967,81	5 967,81	0,000	0,000
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	145,02	145,02	0,000	0,000
	Celkem	0,00	6 112,83	6 112,83	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ, NA NIVÁCH 57

Objekt: ZL 18 - požární vodovod, redukční ventil

Objednatel: SDRUŽENÍ OZDRAVOVEN A LÉČEBEN OKRESU TRUTNOV

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: TRUTNOV

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D7

7. Vodovod - vnitřní

5 967,81

8	R	72237.R00	Ventil redukční Honeywell závitový D06F - 1 1/2 a 6/4", 1,5-6 bar mosaz	ks	1,000	5 967,81	5 967,81
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

145,02

10	R	R.0010	Jiné VRN ve výši 2,43%	Kč	145,020	1,00	145,02
----	---	--------	------------------------	----	---------	------	--------

Celkem


6 112,83



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 19
Název projektu:	Centrum duševního zdraví RIAPS Trutnov, reg. číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_048/0004463	
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., IČO: 25275062	
Objednatel:	Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, IČO: 00195201	
Změnový list vystavil:	Ing. Kateřina Meierová	
Datum:	17.12.2019	
Předmět změny: Malby, nátěry – omyvatelný nátěr		
Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu sjednocení barev v jednotlivých místnostech bylo rozhodnuto, že celá místnost bude vymalována v jenom odstínu a část, kde měl být olejový omyvatelný nátěr bude přelakována krycím transparentním omyvatelným lakem.		
Přílohy změnového listu: rozpočet - ZL 19		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-44 979,76 Kč	41 022,16 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-3 957,60 Kč	bez dopadu do termínu	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Miroslav Petera sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov Ředitelství, Pracházka 818 541 01 Trutnov -4-	Vratislav Zítka	
Datum: 30.1.2020	Datum: 30.1.2020	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Ing. Marek Pavlíček	Ing. Gerhard Schmiedl	
Datum: 30.1.20	Datum: 30.1.20	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ, NA NIVÁCH 57	JKSO	
Název objektu	ZL 19 - Malby, nátěry - omyvatelný nátěr	EČO	
		Místo	TRUTNOV
		IČO	DIČ
Objednatel	SDRUŽENÍ OZDRAVOVEN A LÉČEBEN OKRESU TRUTNOV		
Projektant	ATELIER PAVLÍČEK		
Zhotovitel	Průmstav Náchod s.r.o.	25275062	CZ25275062
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	
		17.12.2019	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	-30 017,81	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	14 322,99	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	11 737,22	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-3 957,60	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel


PRŮMSTAV NÁCHOD
 PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01
 DOBROŠOVSKÁ 1776
 TRUTNOV

D Celkem bez DPH				-3 957,60
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15,0	0,00	0,00	
základní	21,0	-3 957,60	-831,10	
Gena s DPH				-4 788,70

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ, NA NIVÁCH 57

Objekt: ZL 19 - Malby, nátěry - omyvatelný nátěr

Objednatel: SDRUŽENÍ OZDRAVOVEN A LÉČEBEN OKRESU TRUTNOV

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: TRUTNOV

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
D61	783-NÁTĚRY	14 322,99	-33 148,65	-18 825,66	0,127	0,000
D63	784-MALBY A TAPETOVÁNÍ	0,00	14 961,95	14 961,95	0,000	0,000
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	-93,89	-93,89	0,000	0,000
	Celkem	14 322,99	-18 280,59	-3 957,60	0,127	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ, NA NIVÁCH 57

Objekt: ZL 19 - Malby, nátěry - omyvatelný nátěr

Objednatel: SDRUŽENÍ OZDRAVOVEN A LÉČEBEN OKRESU TRUTNOV

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: TRUTNOV

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D61 783-NÁTĚRY

-18 825,66

2	R	783812100	NÁTĚR OLEJ STĚN 2X+1X EMAIL	M2	-176,023	210,00	-36 964,83
1	R	783812190	NÁTĚR OLEJ STĚN NAPUŠTĚNÍ	M2	-176,023	45,00	-7 921,04
7	783	783827425	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový	m2	176,023	148,05	26 060,21

D63 784-MALBY A TAPETOVÁNÍ

14 961,95

8	R	784181101	ZÁKLAD AKRYLÁT JEDNONÁS PENETRACE M. V - 3,8M	M2	176,023	8,00	1 408,18
4	R	784221101	DVOJNÁS BÍLÉ MALBY SMĚS ZA SU DOBŘ OTĚR - 3,8M	M2	176,023	37,00	6 512,85
5	R	784221155	PŘÍPLATEK K CENÁM 2X MALEB ZA SUCHA ZA BARVU	M2	176,023	40,00	7 040,92

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

-93,89

9	R	R.0010	Jiné VRN ve výši 2,43%	Kč	-93,890	1,00	-93,89
---	---	--------	------------------------	----	---------	------	--------

Celkem

-3 957,60

-44 979,76

41 022,16

-3 957,60



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 20
Název projektu:	Centrum duševního zdraví RIAPS Trutnov, reg. číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_048/0004463	
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., IČO: 25275062	
Objednatel:	Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, IČO: 00195201	
Změnový list vystavil:	Ing. Kateřina Meierová	
Datum:	16.1.2020	
Předmět změny: keramický sokl		
Popis a zdůvodnění změny: Ve výkazu výměr byla chybně použita položka keramický sokl s pozlábkem . Tato je nahrazena keramickým soklem s oblou hranou.		
Přílohy změnového listu: rozpočet - ZL 20		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-188 963,73 Kč	144 393,89 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-44 569,84 Kč	bez dopadu do termínu	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Miroslav Petera Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov Ředitelství, Procházková 818 541 01 Trutnov -4-	Vratislav Zítka PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD DOBROŠOVSKÁ 1776, TEL -FAX 491 423 757	
Datum: 16.1.2020	Datum: 12.2.2020	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Ing. Marek Pavlíček 	Ing. Gerhard Schmiedl 	
Datum: 12.2.20	Datum: 14.2.20	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ, NA NIVÁCH 57	JKSO	
Název objektu	ZL 20 - keramický sokl	EČO	
		Místo	TRUTNOV
		IČO	DIČ
Objednatel	SDRUŽENÍ OZDRAVOVEN A LÉČEBEN OKRESU TRUTNOV		
Projektant	ATELIER PAVLÍČEK		
Zhotovitel	Průmstav Náchod s.r.o.	25275062	CZ25275062
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	09.01.2020
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	113 199,39	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	-162 060,69	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	4 291,46	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00%
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-44 569,84	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

PRŮMSTAV NÁCHOD
PRŮMSTAV NÁCHOD S.R.O., 547 01 NÁCHOD
DOBROŠOVSKÁ 1776
547 01 NÁCHOD

D Celkem bez DPH				-44 569,84
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15,0	0,00	0,00	
základní	21,0	-44 569,84	-9 359,67	
Cena s DPH			-53 929,51	

E Přípočty a odpočty	
Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ, NA NIVÁCH 57

Objekt: ZL 20 - keramický sokl

Objednatel: SDRUŽENÍ OZDRAVOVEN A LÉČEBEN OKRESU TRUTNOV

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: TRUTNOV

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
D55	771-PODLAHY KERAMICKÉ	113 199,39	-156 711,88	-43 512,49	0,592	0,000
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	-1 057,35	-1 057,35	0,000	0,000
	Celkem	113 199,39	-157 769,23	-44 569,84	0,592	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ, NA NIVÁCH 57

Objekt: ZL 20 - keramický sokl

Objednatel: SDRUŽENÍ OZDRAVOVEN A LÉČEBEN OKRESU TRUTNOV

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: TRUTNOV

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D55

771-PODLAHY KERAMICKÉ

-43 512,49

2	R	597614170	KERAMICKÝ SOKL S POŽLÁBKEM	M	-564,132	288,00	-162 470,02
4	R	597614170.1	KERAMICKÝ SOKL S POŽLÁBKEM	M	-53,550	288,00	-15 422,40
13	R	771474112	MTŽ SOKL KERAM ROVNÝ FLEX LEP -90	M	-41,380	242,00	-10 013,96

"m.č. 006 - sokl" -27,74 -27,740

"006 - ostění dveří" (0,7+0,85)*2 3,100

"m.č. 007 - sokl" -18,24 -18,240

"007 - ostění dveří" 0,75*2 1,500

Součet -41,380

10	R	597614080	DLAŽBA KERAMICKÁ-VIZ SKLADBY-PŘEDBĚŽNĚ 350/M2	M2	7,282	350,00	2 548,70
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

"schody - sokl" 53,55*0,08*1,1 4,712

"m.č. 006 - sokl" (0,7*2+0,85*2)*0,075*1,1 0,256

"m.č. 007 - sokl" (0,75*2+2)*0,075*1,1 0,289

"m.č. 011 - sokl" 24,55*0,075*1,1 2,025

Součet 7,282

11	771	771591185	Podlahy řezání keramických dlaždic rovné	kus	282,333	15,20	4 291,46
----	-----	-----------	--	-----	---------	-------	----------

"schody - sokl" 53,55/0,3 178,500

"m.č. 006 - sokl" (0,7*2+0,85*2)/0,3 10,333

"m.č. 007 - sokl" (0,75*2+2)/0,3 11,667

"m.č. 011 - sokl" 24,55/0,3 81,833

Součet 282,333

5	597	59761009	sokl - podlahy (barevný) 30 x 8 x 0,8 cm l. j.	kus	1 645,340	68,80	113 199,39
---	-----	----------	--	-----	-----------	-------	------------

564,132/0,3 1 880,440

"m.č. 006" -27,74/0,3 -92,467

"m.č. 007" -18,24/0,3 -60,800

"m.č. 011" -24,55/0,3 -81,833

Součet 1 645,340

8	R	771591115	SPÁROVÁNÍ DLAŽBY SILIKONEM	M	588,269	41,40	24 354,34
---	---	-----------	----------------------------	---	---------	-------	-----------

"keramický sokl - přechod dlažba-sokl" 537,269+51 588,269

Součet 588,269

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

-1 057,35

12	R	R.0010	Jiné VRN ve výši 2,43%	Kč	-1 057,350	1,00	-1 057,35
----	---	--------	------------------------	----	------------	------	-----------

Celkem

-44 569,84

-188 963,73

144 393,89

-44 569,84



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 21
Název projektu:	Centrum duševního zdraví RIAPS Trutnov, reg. číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_048/0004463	
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., IČO: 25275062	
Objednatel:	Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, IČO: 00195201	
Změnový list vystavil:	Ing. Kateřina Meierová	
Datum:	16.1.2020	
Předmět změny: Textilní čistící zóna v m.č. 002		
Popis a zdůvodnění změny: Ve výkazu výměr a v PD je uvažována textilní čistící zóna bez dalších požadavků. Do těchto prostor ale musí být použit materiál vhodný do únikových cest, proto obyčejnou textilní rohož nahrazujeme rohoží Cleanwell Atrium.		
Přílohy změnového listu: rozpočet - ZL 21 technický list Cleanwell Atrium		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 6263,57 Kč	20 145,49 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
13 881,92 Kč	bez dopadu do termínu	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Miroslav Petera Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov Ředitelství, Procházkova 818 541 01 Trutnov -4-	Vratislav Zítka PRŮMSTAV NÁCHOD PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD DOBROŠOVSKÁ 1776. TEL.: FAX: 491 423 757	
Datum: 12.2.2020	Datum: 12.2.2020	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Ing. Marek Pavlíček	Ing. Gerhard Schmiedl	
Datum: 12.2.20	Datum: 12/2/20	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ, NA NIVÁCH 57**

JKSO

Název objektu **ZL 21 - textilní čistící zóna v m.č. 002**

EČO

Místo

TRUTNOV

IČO

DIČ

Objednatel **SDRUŽENÍ OZDRAVOVEN A LÉČEBEN OKRESU TRUTNOV**

Projektant **ATELIER PAVLIČEK**

Zhotovitel **Průmstav Náchod s.r.o.**

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

16.1.2020

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	12 746,40	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	5,22	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	1 130,30	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00%
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		13 881,92	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



PRŮMSTAV NÁCHOD

PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD
DOBROŠOVSKÁ 1776, TEL.-FAX 491 423 757

[Handwritten signature]

D Celkem bez DPH 13 881,92

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	13 881,92	2 915,20

Cena s DPH 16 797,12

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ, NA NIVÁCH 57

Objekt: ZL 21 - textilní čistící zóna v m.č. 002

Objednatel: SDRUŽENÍ OZDRAVOVEN A LÉČEBEN OKRESU TRUTNOV

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: TRUTNOV

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
D57	776-PODLAHY POVLAKOVÉ	5,22	13 547,37	13 552,59	0,000	0,000
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	329,33	329,33	0,000	0,000
	Celkem	5,22	13 876,70	13 881,92	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ, NA NIVÁCH 57

Objekt: ZL 21 - textilní čistící zóna v m.č. 002

Objednatel: SDRUŽENÍ OZDRAVOVEN A LÉČEBEN OKRESU TRUTNOV

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: TRUTNOV

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D57

776-PODLAHY POVLAKOVÉ

13 552,59

1	R	697510300	KOBEREC ZÁTĚŽOVÝ-ČISTÍCÍ	M2	-10,353	605,00	-6 263,57
4	776	776212111	Volné položení textilních pásů s podlepením spojů páskou	m2	9,150	81,33	744,17
2	R	776.R01	Textilní rohož Cleanwell Atrium černý 328x279 cm	m2	9,150	1 848,00	16 909,20
5	767	767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím	m	5,280	74,12	391,35
3	R	776.R02	Al profil 10/30/2 mm (přechod mezi dlažbou a čistící zónou)	m	5,280	335,50	1 771,44
1,7+0,9+2,68					5,280		

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

329,33

6	R	R.0010	Jiné VRN ve výši 2,43%	Kč	329,330	1,00	329,33
---	---	--------	------------------------	----	---------	------	--------

Celkem

13 881,92

-6 263,57

20 145,49

13 881,92



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 22
Název projektu:	Centrum duševního zdraví RIAPS Trutnov, reg. číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_048/0004463	
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., IČO: 25275062	
Objednatel:	Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, IČO: 00195201	
Změnový list vystavil:	Ing. Kateřina Meierová	
Datum:	13.1.2020	
Předmět změny: Opěrná zeď a oplocení u VZT jednotek		
Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu zajištění bezpečnosti veřejnosti a zamezení případnému vandalizmu bude kolem venkovních VZT klimatizačních jednotek vybudována část opěrné zdi a oplocení s brankou.		
Přílohy změnového listu: rozpočet - ZL 22		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-139,60 Kč	33 057,70 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
32 918,10 Kč	bez dopadu do termínu	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Miroslav Petera Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov Ředitelství, Procházkova 818 541 01 Trutnov -4-	Vratislav Zítka PRŮMSTAV NÁCHOD PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD DOBROŠOVSKÁ 1775 TEL -FAX 491 423 757	
Datum: 8.4.2020	Datum: 12.2.2020	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Ing. Marek Pavlíček 	Ing. Gerhard Schmiedl 	
Datum: 8.4.20	Datum: 8/4/20	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ, NA NIVÁCH 57**

Název objektu **ZL 22 - Opěrné zedě a oplocení u VZT jednotek**

JKSO

EČO

Misto

TRUTNOV

IČO

DIČ

Objednatel

SDRUŽENÍ OZDRAVOVEN A LÉČEBEN OKRESU TRUTNOV

Projektant

ATELIER PAVLÍČEK

Zhotovitel

Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracoval

25275062

CZ25275062

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	14 369,45	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	18 548,65	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00%
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		32 918,10	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



PRŮMSTAV NÁCHOD

PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD
DOBROŠOVSKÁ 177 TEL.-FAX 491 423 757

12.2. 2020

D Celkem bez DPH 32 918,10

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižovaná	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	32 918,10	6 912,80

Cena s DPH 39 830,90

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ, NA NIVÁCH 57

Objekt: ZL 22 - Opěrné zeď a oplocení u VZT jednotek

Objednatel: SDRUŽENÍ OZDRAVOVEN A LÉČEBEN OKRESU TRUTNOV

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: TRUTNOV

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	6 644,29	2 458,07	9 102,36	2,360	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	5 807,29	2 092,92	7 900,21	2,355	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	837,00	365,15	1 202,15	0,005	0,000
D10	011-BĚŽNÉ STAVEBNÍ PRÁCE	0,00	10 617,98	10 617,98	0,000	0,000
63	Podlahy a podlahové konstrukce	0,00	2 034,45	2 034,45	0,000	0,000
D18	015-ZVLÁŠTNÍ STAVEBNÍ PRÁCE	7 284,32	962,37	8 246,69	0,187	0,000
D2	001-ZEMNÍ PRÁCE	0,00	2 585,97	2 585,97	0,000	0,000
D22	231-POZEMKOVÉ ÚPRAVY	0,00	-139,60	-139,60	0,000	0,000
D35	711-IZOLACE PROTI VODĚ	0,00	432,30	432,30	0,000	0,000
D53	767-KOVOVÉ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE	440,84	850,63	1 291,47	0,009	0,000
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	780,93	780,93	0,000	0,000
	Celkem	14 369,45	18 548,65	32 918,10	2,556	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ, NA NIVÁCH 57

Objekt: ZL 22 - Opěrné zeď a oplocení u VZT jednotek

Objednatel: SDRUŽENÍ OZDRAVOVEN A LÉČEBEN OKRESU TRUTNOV

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: TRUTNOV

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

9 102,36

3

Svislé a kompletní konstrukce

7 900,21

25	011	311113214	Nosná zeď tl 300 mm ze štípaných tvárnic ztraceného bednění přírodních včetně výplně z betonu	m2	3,300	1 895,04	6 253,63
			2,2*1,5		3,300		
6	R	311361821	VÝZTUŽ ZEĎ NOSNÁ BET OCEL 10 505	T	0,013	37 800,00	491,40
22	231	348272515	Plotová stříška pro zeď tl 295 mm z tvarovek hladkých nebo štípaných přírodních	m	2,200	525,08	1 155,18

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 202,15

28	011	953961213	Kotvy chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	10,800	99,69	1 076,65
			"základ - ztracené bednění, 4 ks/m" 2,2*4		8,800		
			"kotvení do zdi" 2		2,000		
			Součet		10,800		
30	130	13021033	tyč ocelová žebírková DIN 488 výztuž do betonu D 12mm	t	0,005	25 100,00	125,50
			Hmotnost: 0,89 kg/m				
			8*0,6*0,89/1000		0,004		
			2*0,4*0,89/1000		0,001		
			Součet		0,005		

D10

011-BĚŽNÉ STAVEBNÍ PRÁCE

10 617,98

1	R	274321511	ZÁKLADOVÝ PÁS ŽB C25/30	M3	1,663	2 750,00	4 573,25
			(2,2+2,55)*0,5*0,7		1,663		
2	R	274351215	ZŘÍZENÍ BEDNĚNÍ STĚN ZÁKL PÁSŮ	M2	3,325	220,00	731,50
			"50%" (2,2+1,6+3,15+2,55)*0,7/2		3,325		
3	R	274351216	ODSTRANĚNÍ BEDNĚNÍ STĚN ZÁKL PÁSŮ	M2	3,325	55,00	182,88
4	R	274361821	VÝZTUŽ ZÁKL PÁSŮ BET OCEL 10505	T	0,083	37 300,00	3 095,90
			1,663*0,05		0,083		

63

Podlahy a podlahové konstrukce

2 034,45

41	R	213141111	MTŽ GEOTEX -1:5 Š DO 3 M	M2	4,950	14,20	70,29
42	R	673905118	TEXTILIE NETKANÁ 300G/M2	M2	4,950	19,80	98,01
38	R	637121113	OKAPOVÝ CHODNÍK KAČÍREK TL 20CM	M2	4,950	377,00	1 866,15
			(2,2-0,4)*(3,15-0,4)		4,950		

D18

015-ZVLÁŠTNÍ STAVEBNÍ PRÁCE

8 246,69

32	231	338171121	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60 m se zalitím MC	kus	8,000	98,70	789,60
44	553	55342263	sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2500/48x1,5mm	kus	4,000	200,40	801,60
45	553	55342255	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2500/38x1,5mm	kus	2,000	160,90	321,80
46	553	55342275	vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 3000mm	kus	2,000	203,30	406,60

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ, NA NIVÁCH 57

Objekt: ZL 22 - Opěrné zeď a oplocení u VZT jednotek

Objednatel: SDRUŽENÍ OZDRAVOVEN A LÉČEBEN OKRESU TRUTNOV

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: TRUTNOV

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
23	231	348101210	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 2 m2	kus	1,000	221,09	221,09
24	553	55342321	branka vchodová kovová	kus	1,000	5 706,00	5 706,00

D2 001-ZEMNÍ PRÁCE

2 585,97

10	R	132301101	HLB RÝH -60CM TR.4 -100M3	M3	1,663	1 320,00	2 195,16
			2,2*0,5*0,7		0,770		
			2,55*0,5*0,7		0,893		
			Součet		1,663		
11	R	132301109	PŘÍPL ZA LEP RÝHA 0,6M H4	M3	1,663	235,00	390,81

D22 231-POZEMKOVÉ ÚPRAVY

-139,60

39	R	180402112	ZALOŽENÍ PARKOVÝ TRÁVNÍK SVAH 1:2	M2	-4,950	24,00	-118,80
40	R	005724100	SMĚS TRAVNÍ PARKOVÁ REKREAČNÍ	KG	-0,160	130,00	-20,80

D35 711-IZOLACE PROTI VODĚ

432,30

12	R	711161531	IZOL FÓLIE NOPOVÁ PRO SPOD STAVBU S TEXTILÍ	M2	3,300	131,00	432,30
			2,2*1,5		3,300		

767-KOVOVÉ DOPLŇKOVÉ

D53 KONSTRUKCE

1 291,47

36	231	348401130	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu	m	5,350	77,28	413,45
			2,2*3,15		5,350		
37	313	31327514	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 180cm	m	5,350	82,40	440,84
16	R	767912150	MTŽ NAPÍNACÍ DRÁT -15°	M	16,050	4,80	77,04
			5,35*3		16,050		
17	R	156191000	DRÁT KRUHOVÝ NAPÍNACÍ 2,5/3,8 MM POPLASTOVANÝ	M	17,655	4,80	84,74
			16,05*1,1		17,655		
18	R	767912160	PŘIHÁČKOVÁNÍ PLETIVA K DRÁTU -15°	M	16,050	12,00	192,60
19	R	156192000	DRÁT KRUHOVÝ VÁZACÍ 2,5/3,5MM POPLAST	M	6,000	4,80	28,80
20	R	156192200	NAPÍNACÍ ELEMENT FEZN	KUS	3,000	18,00	54,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

780,93

43	R	R.0010	Jiné VRN ve výši 2,43%	Kč	780,930	1,00	780,93
----	---	--------	------------------------	----	---------	------	--------

Celkem

32 918,10

-139,60

33 057,70

32 918,10



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 23
Název projektu:	Centrum duševního zdraví RIAPS Trutnov, reg. číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_048/0004463	
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., IČO: 25275062	
Objednatel:	Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, IČO: 00195201	
Změnový list vystavil:	Ing. Kateřina Meierová	
Datum:	16.1.2020	
Předmět změny: ZTI – spotřební materiál – vyjmutí z dodávky		
Popis a zdůvodnění změny: Na žádost investora bude vyjmut spotřební materiál z dodávky díla.		
Přílohy změnového listu: rozpočet - ZL 23		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-3 550,94 Kč	0 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-3 550,94 Kč	bez dopadu do termínu	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Miroslav Petera Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov Ředitelství, Procházkova 818 541 01 Trutnov -4-	Vratislav Zítka PRŮMSTAV NÁCHOD PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o. 547 01 NÁCHOD DOBROŠOVSKÁ 1776 úřadovna 2	
Datum: 30.1.2020	Datum: 30.1.2020	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Ing. Marek Pavlíček	Ing. Gerhard Schmiedl	
Datum: 30.1.20	Datum: 30.1.20	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ, NA NIVÁCH 57

JKSO

Název objektu

ZL 23 - ZTI - spotřební materiál - vyjmutí z dodávky

EČO

Místo

TRUTNOV

IČO

DIČ

Objednatel

SDRUŽENÍ OZDRAVOVEN A LÉČEBEN OKRESU TRUTNOV

Projektant

ATELIER PAVLÍČEK

Zhotovitel

Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

16.01.2020

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	-3 550,94	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00%
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-3 550,94	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

PRŮMSTAV NÁCHOD
PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD
DOBROŠOVSKÁ 176,
PROJEKT

D Celkem bez DPH -3 550,94

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-3 550,94	-745,70

Cena s DPH -4 296,64

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ, NA NIVÁCH 57
Objekt: ZL 23 - ZTI - spotřební materiál - vyjmutí z dodávky

Objednatel: SDRUŽENÍ OZDRAVOVEN A LÉČEBEN OKRESU TRUTNOV
Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.
Místo: TRUTNOV

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
D8	8. Zařizovací předměty	0,00	-3 466,70	-3 466,70	0,000	0,000
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	-84,24	-84,24	0,000	0,000
	Celkem	0,00	-3 550,94	-3 550,94	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ, NA NIVÁCH 57

Objekt: ZL 23 - ZTI - spotřební materiál - vyjmutí z dodávky

Objednatel: SDRUŽENÍ OZDRAVOVEN A LÉČEBEN OKRESU TRUTNOV

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: TRUTNOV

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D8 8. Zařizovací předměty

-3 466,70

1	R	Pol124	dodávka+montáž, toaletní papír, O 30 cm, 3-vrstvý	KS	-13,000	66,20	-860,60
3	R	Pol127	dodávka+montáž, sáčky do koše 30 l, z fólie HDPE, mikrotenu	KS	-41,000	10,50	-430,50
4	R	Pol130	dodávka+montáž, jednotlivé papírové ručníky, dvouvrstvé, 25x23 cm, balení 200 ks	KS	-28,000	77,70	-2 175,60


VRN Vedlejší rozpočtové náklady

-84,24

5	R	R.0010	Jiné VRN ve výši 2,43%	Kč	-84,240	1,00	-84,24
---	---	--------	------------------------	----	---------	------	--------

Celkem

-3 550,94



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 24
Název projektu:	Centrum duševního zdraví RIAPS Trutnov, reg. číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_048/0004463	
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., IČO: 25275062	
Objednatel:	Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, IČO: 00195201	
Změnový list vystavil:	Ing. Kateřina Meierová	
Datum:	16.1.2020	
Předmět změny: kobercové sokly		
Popis a zdůvodnění změny: Ve výkazu výměr byla chybně použita položka „Kobercový sokl obšitý“ – ten bude nahrazen původně zamýšleným soklem kobercovým vkládaným do lišty. Toto řešení je vhodnější z důvodu provozní údržby uživatele.		
Přílohy změnového listu: rozpočet - ZL 24		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-49 758,28 Kč	51 261,76 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
1 503,48 Kč	bez dopadu do termínu	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Miroslav Petera Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov Ředitelství, Procházkova 818 541 01 Trutnov 4 Datum: 12.2.2020	 PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD DOBROŠOVSKÁ 1276, TEL.-FAX 491 423 757 Vratislav Zítka Datum: 12.2.2020	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Ing. Marek Pavlíček Datum: 12.2.20	Ing. Gerhard Schmiedl Datum: 12/2/20	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ, NA NIVÁCH 57**

Název objektu **ZL 24 - kobercové solky**

JKSO

EČO

Místo

TRUTNOV

IČO

DIČ

Objednatel **SDRUŽENÍ OZDRAVOVEN A LÉČEBEN OKRESU TRUTNOV**

Projektant **ATELIER PAVLÍČEK**

Zhotovitel **Průmstav Náchod s.r.o.**

Zpracoval

25275062

CZ25275062

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	-40 144,20	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	4 629,78	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	37 017,90	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00%
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		1 503,48	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

PRŮMSTAV NÁCHOD

PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD
DOBROŠOVSKÁ 1776, TEL.-FAX 491 423 757

D Celkem bez DPH 1 503,48

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	1 503,48	315,73

Cena s DPH 1 819,21

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ, NA NIVÁCH 57

Objekt: ZL 24 - kobercové solky

Objednatel: SDRUŽENÍ OZDRAVOVEN A LÉČEBEN OKRESU TRUTNOV

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: TRUTNOV

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
776	Podlahy povlakové	4 629,78	-3 161,96	1 467,82	0,007	0,000
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	35,66	35,66	0,000	0,000
	Celkem	4 629,78	-3 126,30	1 503,48	0,007	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ, NA NIVÁCH 57

Objekt: ZL 24 - kobercové solky

Objednatel: SDRUŽENÍ OZDRAVOVEN A LÉČEBEN OKRESU TRUTNOV

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: TRUTNOV

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

776 Podlahy povlakové

1 467,82

5	R	697512240	SOKL KOBERCOVÝ OBŠITÝ	M	-226,174	220,00	-49 758,28
20	776	7764111.R	Montáž kobercových soklíků výšky do 100 mm do lišt vkládaných	m	226,174	184,14	41 647,68
7	R	697402550	KOBER ZÁTĚŽ OZN>32,PA100%,1730G/M2,HM>730G/M2	M2	24,879	385,00	9 578,42
"sokl" 226,174*0,1*1,1					24,879		
Součet					24,879		

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

35,66

21	R	R.0010	Jiné VRN ve výši 2,43%	Kč	35,660	1,00	35,66
----	---	--------	------------------------	----	--------	------	-------

Celkem

1 503,48

-49 758,28

51 261,76

1 503,48



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 25
Název projektu:	Centrum duševního zdraví RIAPS Trutnov, reg. číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_048/0004463	
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., IČO: 25275062	
Objednatel:	Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, IČO: 00195201	
Změnový list vystavil:	Ing. Kateřina Meierová	
Datum:	16.1.2020	
Předmět změny: Úprava stropu vstupu do prostoru s valenou klenbou do m.č. 006 + z m.č. 006 do 007		
Popis a zdůvodnění změny: V PD ve výkresech „AR.06_Bourací práce - Příčný řez I-I“ a „AR.15_Příčný řez B-B“ je poznámka, že úprava vstupu do prostoru s valenou klenbou bude řešena během stavebních prací. Toto je vyčíslení těchto nákladů vycházející ze skutečnosti.		
Přílohy změnového listu: rozpočet - ZL 25		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0	54 836,64 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
54 836,64 Kč	bez dopadu do termínu	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Miroslav Petera	Vratislav Zítka	
Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov Ředitelství, Procházkova 818 541 01 Trutnov -4-	PRŮMSTAV NÁCHOD PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD DOBROŠOVSKÁ 1776, PROVOZ PROVOZ	
Datum: 30.1.2020	Datum: 30.1.2020	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Ing. Marek Pavlíček	Ing. Gerhard Schmiedl	
Datum: 30.1.20	Datum: 30.1.20	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ, NA NIVÁCH 57

Objekt: ZL 25 - Úprava stropu vstupu do prostoru s valenou klenbou do m.č. 006 + z m.č. 006 do 007

Objednatel: SDRUŽENÍ OZDRAVOVEN A LÉČEBEN OKRESU TRUTNOV

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: TRUTNOV

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
A.	Prostup pro VZT do m.č. 06	9 656,93	33 660,41	43 317,34	5,104	11,700
4	Vodorovné konstrukce	7 352,74	9 664,27	17 017,01	4,577	0,000
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 304,19	1 826,62	4 130,81	0,527	0,000
99	Přesun hmot a manipulace se suti	0,00	1 250,48	1 250,48	0,000	0,000
D14	013-BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ	0,00	20 919,04	20 919,04	0,000	11,700
B.	Prostup pro VZT z m.č. 06 do m.č. 07	1 846,63	8 371,75	10 218,38	1,023	1,350
4	Vodorovné konstrukce	1 846,63	7 170,98	9 017,61	1,023	1,350
99	Přesun hmot a manipulace se suti	0,00	250,64	250,64	0,000	0,000
D14	013-BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ	0,00	950,13	950,13	0,000	0,000
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	1 300,92	1 300,92	0,000	0,000
	Celkem	11 503,56	43 333,08	54 836,64	6,127	13,050

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZL - CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ, NA NIVÁCH 57

Objekt: ZL 25 - Úprava stropu vstupu do prostoru s valenou klenbou do m.č. 006 + z m.č. 006 do 007

Objednatel: SDRUŽENÍ OZDRAVOVEN A LÉČEBEN OKRESU TRUTNOV

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: TRUTNOV

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

A. Prostup pro VZT do m.č. 06

43 317,34

4 Vodorovné konstrukce

17 017,01

38	014	279232511	Postupná podezdívka základového zdiva cihlami pálenými na MC	m3	1,058	4 954,74	5 242,11
"boční postupné přizdivky"							
"bok levý" 1,37*0,9*0,3					0,370		
"bok pravý" 1,37*0,9*0,25					0,308		
"bok pravý zadní" 0,95*1,6*0,25					0,380		
Součet					1,058		
37	014	411388532	Zabetonování otvorů v klenbách	m3	0,726	8 813,91	6 398,90
přichycení kari sítě, proházení betonem v tl. cca 20 cm"							
"strop" (2,5+0,5+0,3)*1,1*0,2					0,726		
61	R	413351213	ZŘÍZENÍ PODPĚR KCE -10KPA NOSNÍK-4M	M2	12,000	365,00	4 380,00
3*4					12,000		
62	R	413351214	ODSTRAŇ PODPĚR KCE -10KPA NOSNÍK-4M	M2	12,000	83,00	996,00

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

4 130,81

54	014	612135002	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou cementovou tl do 10 mm	m2	3,986	278,33	1 109,42
"boční postupné přizdivky"							
"bok levý" 1,37*0,9					1,233		
"bok pravý" 1,37*0,9					1,233		
"bok pravý zadní" 0,95*1,6					1,520		
Součet					3,986		
55	014	612135092	Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn maltou cementovou za každých dalších 5 mm tl	m2	39,860	75,80	3 021,39
"tl cementové vyrovnávky 2-10 cm .. pr. tl. 6 cm"							
3,986*10					39,860		

99 Přesun hmot a manipulace se sutí

1 250,48

24	R	998011003	PŘESUN HMOT BUDOVA ZDĚNÁ V -24M	T	5,104	245,00	1 250,48
----	---	-----------	---------------------------------	---	-------	--------	----------

D14 013-BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ

20 919,04

70	013	971026591	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 1 m2 na MC tl přes 900 mm	m3	4,680	2 921,52	13 672,71
1,7*1,37*0,9+1,7*0,95*1,6					4,680		
11	R	979081111	ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU DO 1KM	T	10,296	213,00	2 193,05
12	R	979081121	ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU ZKD 1KM	T	61,776	9,30	574,52
10,296*6					61,776		
10	R	979082121	VNITROSTAV DOPRAVA SUTI ZKD 5M	T	10,296	6,00	61,78
13	R	979098232	SKLÁDKOVNÉ NETŘÍDĚNÝ STAVEBNÍ ODPAD	T	10,296	429,00	4 416,98

B. Prostup pro VZT z m.č. 06 do m.č. 07

10 218,38

4 Vodorovné konstrukce

9 017,61

71	013	971026591	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 1 m2 na MC tl přes 900 mm	m3	0,540	2 921,52	1 577,62
----	-----	-----------	--	----	-------	----------	----------

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZL - CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ, NA NIVÁCH 57


Objekt: ZL 25 - Úprava stropu vstupu do prostoru s valenou klenbou do m.č. 006 + z m.č. 006 do 007

Objednatel: SDRUŽENÍ OZDRAVOVEN A LÉČEBEN OKRESU TRUTNOV

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: TRUTNOV

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
"nadpraží 006-007" 0,6*0,45*2					0,540		
60	R	Pol21	dodávka+montáž: chránička PVC, KG SN 8, DN 250	M	4,000	766,00	3 064,00
2*2					4,000		
46	014	411388532	Zabetonování otvorů v klenbách	m3	0,344	8 813,91	3 031,99
0,6*0,45*2-3,14*0,125*0,125*2*2					0,344		
56	R	413351213	ZŘÍZENÍ PODPĚR KCE -10KPA NOSNÍK-4M	M2	3,000	365,00	1 095,00
57	R	413351214	ODSTRAŇ PODPĚR KCE -10KPA NOSNÍK-4M	M2	3,000	83,00	249,00
99 Přesun hmot a manipulace se sutí							250,64
48	R	998011003	PŘESUN HMOT BUDOVA ZDĚNÁ V -24M	T	1,023	245,00	250,64
D14 013-BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ							950,13
50	R	979081111	ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU DO 1KM	T	1,350	213,00	287,55
51	R	979081121	ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU ZKD 1KM	T	8,100	9,30	75,33
1,35*6					8,100		
52	R	979082121	VNITROSTAV DOPRAVA SUTI ZKD 5M	T	1,350	6,00	8,10
53	R	979098232	SKLÁDKOVNÉ NETŘÍDĚNÝ STAVEBNÍ ODPAD	T	1,350	429,00	579,15
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							1 300,92
72	R	R.0010	Jiné VRN ve výši 2,43%	Kč	1 300,918	1,00	1 300,92
Celkem							54 836,64



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 26
Název projektu:	Centrum duševního zdraví RIAPS Trutnov, reg. číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_048/0004463	
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., IČO: 25275062	
Objednatel:	Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, IČO: 00195201	
Změnový list vystavil:	Ing. Kateřina Meierová	
Datum:	23.1.2020	
Předmět změny: zařizovací předměty		
Popis a zdůvodnění změny: V projektu v m.č. 204 a 205 je navrženo řešení, které způsobuje prostorovou kolizi sprchového koutu a okna. S ohledem na provozní nevhodnost takového řešení je navržena úprava tvaru a rozměrů sprchových koutů, aby nezasahovaly do oken. V m.č.214 by dle navrženého řešení docházelo ke kolizi umyvadla (60 cm) s kastlíkem odtahu od digestoře, proto bude namontováno umyvadlo 50 cm.		
Přílohy změnového listu: rozpočet - ZL 26		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-22 440,- Kč	35 990,55 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
13 550,55 Kč	bez dopadu do termínu	
Niže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Miroslav Petera Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov Ředitelství, Procházkova 81/ 541 01 Trutnov	Vratislav Zítka PRŮMSTAV NACHOD PRŮMSTAV NACHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD DOBROŠOVSKÁ 1776, TEL.:FAX 491 423 75	
Datum: 26.2.2020	Datum: 12.2.2020	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Ing. Marek Pavlíček	Ing. Gerhard Schmiedl	
Datum: 26.2.20	Datum: 26/2/20	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ, NA NIVÁCH 57**

Název objektu **ZL 26 - zařizovací předměty**

JKSO

EČO

Místo

TRUTNOV

IČO

DIČ

Objednatel **SDRUŽENÍ OZDRAVOVEN A LÉČEBEN OKRESU TRUTNOV**

Projektant **ATELIER PAVLÍČEK**

Zhotovitel **Průmstav Náchod s.r.o.**

Zpracoval

25275062

CZ25275062

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	-21 178,53	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	29 410,70	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	5 318,38	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00%
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		13 550,55	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



PRŮMSTAV NÁCHOD

PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD
DOBROŠOVSKÁ 1776 TEL.-FAX 491 423 757

D Celkem bez DPH 13 550,55

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	13 550,55	2 845,62

Cena s DPH 16 396,17

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ, NA NIVÁCH 57

Objekt: ZL 26 - zařizovací předměty

Objednatel: SDRUŽENÍ OZDRAVOVEN A LÉČEBEN OKRESU TRUTNOV

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: TRUTNOV

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
D8	8. Zařizovací předměty	29 410,70	-16 181,62	13 229,08	0,126	0,000
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	321,47	321,47	0,000	0,000
	Celkem	29 410,70	-15 860,15	13 550,55	0,126	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ, NA NIVÁCH 57

Objekt: ZL 26 - zařizovací předměty

Objednatel: SDRUŽENÍ OZDRAVOVEN A LÉČEBEN OKRESU TRUTNOV

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: TRUTNOV

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D8

8. Zařizovací předměty

13 229,08

6	R	725 24-9103	montáž sprchových koutů (sprchové dveře, závěsy a tyče)	KS	-2,000	850,00	-1 700,00
2	R	Pol105	sprchový kout čtverhrubý 90 cm + sprchová vanička samonosná nízká čtverhrub 90 cm + sprchové dveře posuvné 90 cm čtverhrubé, výplň čirý polystyrol, barva profilu bílá, včt. typového sprchového syfonu	SOU BOR	-2,000	9 900,00	-19 800,00
"m.č. 204" -1					-1,000		
"m.č. 205" -1					-1,000		
Součet					-2,000		

7	721	725241901	Montáž vaničky sprchové atypické	soub or	2,000	1 806,21	3 612,42
14	554	55423034	Vanička sprchová akrylátová obdélníková 1000x800 mm	kus	1,000	4 194,80	4 194,80
13	554	55423036.1	Vanička sprchová akrylátová čtverhrubá 1000x1000 mm	kus	1,000	4 610,00	4 610,00
10	721	7252445.1	Zástěna sprchová rohová rámová s výplní tl. 3 mm dveře posuvné na vaničku 1000x800 mm	soub or	1,000	10 955,70	10 955,70
11	721	7252448.1	Zástěna sprchová rohová bezpečnostní sklo tl. 4 mm dveře otvíravé dvoukřídlové na čtverhrubou vaničku 1000x1000 mm	soub or	1,000	9 925,00	9 925,00
15	721	725865311	Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku	kus	2,000	715,58	1 431,16
1	R	Pol92	umyvadlo 60 cm, standardní, keramické, s otvorem pro baterii, s přepadem, bílé	KS	-1,000	940,00	-940,00
"m.č. 214" -1					-1,000		
5	R	Pol921	umyvadlo 50 cm, standardní, keramické, s otvorem pro baterii, s přepadem, bílé	KS	1,000	940,00	940,00
"m.č. 214" 1					1,000		

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

321,47

16	R	R.0010	Jiné VRN ve výši 2,43%	Kč	321,470	1,00	321,47
----	---	--------	------------------------	----	---------	------	--------


Celkem

13 550,55

-22 440,00

35 990,55




13 550,55



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 27
Název projektu:	Centrum duševního zdraví RIAPS Trutnov, reg. číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_048/0004463	
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., IČO: 25275062	
Objednatel:	Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, IČO: 00195201	
Změnový list vystavil:	Ing. Kateřina Meierová	
Datum:	13.02.2020	
Předmět změny: SDK podhled v m.č. 002, 003		
Popis a zdůvodnění změny: Protože výška uložení VZT potrubí pod stropem se musela přizpůsobit bouranému otvoru do valené klenby (z m.č. 003 do m.č. 006), musí být minerální kazetový podhled nahrazen SDK podhledem – z důvodu zachování co největší průchozí výšky místnosti. Svítidla nebudou zapuštěná, ale s přidáním pomocných rámečků montována jako stropní. Do SDK podhledu v m.č. 103,203,210,211,002,003 budou doplněna revizní dvířka.		
Přílohy změnového listu: rozpočet - ZL 27		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-11 648,80 Kč	20 233,97 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
8 585,17 Kč	bez dopadu do termínu	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla: 		
Za objednatele:  Miroslav Petera Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov Ředitelství, Procházkova 818 541 01 Trutnov -4-	Za zhotovitele:  Vratislav Zítka PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD DOBROŠOVSKÁ 1776 TEL.-FAX 491 423 757	
Datum: 26.2.2020	Datum: 26.2.2020	
Za autorský dozor: Ing. Marek Pavlíček  Datum: 26.2.20	Za technický dozor stavebníka: Ing. Gerhard Schmiedl  Datum: 26/2/20	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ, NA NIVÁCH 57	JKSO	
Název objektu	ZL 27 - SDK pohled v m.č. 002, 003	EČO	
		Místo	TRUTNOV
		IČO	DIČ
Objednatel	SDRUŽENÍ OZDRAVOVEN A LÉČEBEN OKRESU TRUTNOV		
Projektant	ATELIER PAVLÍČEK		
Zhotovitel	Průmstav Náchod s.r.o.	25275062	CZ25275062
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	8 585,17	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		8 585,17	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



PRŮMSTAV NÁCHOD

PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD
DOBROŠOVSKÁ 1776, TEL-FAX 491 421 767

D Celkem bez DPH		8 585,17	
DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	8 585,17	1 802,89
Cena s DPH		10 388,06	

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ, NA NIVÁCH 57

Objekt: ZL 27 - SDK pohled v m.č. 002, 003

Objednatel: SDRUŽENÍ OZDRAVOVEN A LÉČEBEN OKRESU TRUTNOV

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: TRUTNOV

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
	KONSTRUKCE					
D47	SÁDROKARTONOVÉ	0,00	4 748,47	4 748,47	0,000	0,000
D63	784-MALBY A TAPETOVÁNÍ	0,00	793,03	793,03	0,000	0,000
21-M	Elektromontáže	0,00	2 840,00	2 840,00	0,000	0,000
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	203,67	203,67	0,000	0,000
	Celkem	0,00	8 585,17	8 585,17	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ, NA NIVÁCH 57

Objekt: ZL 27 - SDK pohled v m.č. 002, 003

Objednatel: SDRUŽENÍ OZDRAVOVEN A LÉČEBEN OKRESU TRUTNOV

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: TRUTNOV

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
D47			763-DŘEVOSTAVBY A KONSTRUKCE SÁDROKARTONOVÉ	4 748,47			
1	R	763135015	SDK PODHLED KAZETA MINERÁLNÍ AKUSTICKÁ	M2	-17,623	661,00	-11 648,80
			"1.PP				
			"m.č. 002" -(3,28*2,69)		-8,823		
			"m.č. 003" -(5,5*1,6)		-8,800		
			Součet		-17,623		
3	R	763131714	SDK PODHLED ZÁKL PENETRAČNÍ NÁTĚR	M2	17,623	25,50	449,39
2	R	763132110	SDK PODHLED ZAV 2XCD D112 GKB 12,5	M2	17,623	621,00	10 943,88
4	R	763172313	MTŽ REVIZ DVÍŘKA 40X40CM SDK KCE	KUS	6,000	316,00	1 896,00
			"m.č. 103" 1		1,000		
			"m.č. 203" 1		1,000		
			"m.č. 210" 1		1,000		
			"m.č. 211" 1		1,000		
			"m.č. 002" 1		1,000		
			"m.č. 003" 1		1,000		
			Součet		6,000		
5	R	590307120	DVÍŘKA REVIZNÍ S ZÁMKEM 400 X 400 - OZN.O4	KUS	6,000	518,00	3 108,00
D63			784-MALBY A TAPETOVÁNÍ	793,03			
6	R	784181101	3,8M	M2	17,623	8,00	140,98
7	R	784221101	3,8M	M2	17,623	37,00	652,05
21-M			Elektromontáže	2 840,00			
9	R	763901.R	M+D pomocný rámeček pro osazení svítidla k SDK stropu	ks	4,000	710,00	2 840,00
			"m.č. 002" 2		2,000		
			"m.č. 003" 2		2,000		
			Součet		4,000		
VRN			Vedlejší rozpočtové náklady	203,67			
8	R	R.0010	Jiné VRN ve výši 2,43%	Kč	203,670	1,00	203,67
Celkem				8 585,17			
							-11 648,80
							20 233,97
							8 585,17



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 28
Název projektu:	Centrum duševního zdraví RIAPS Trutnov, reg. číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_048/0004463	
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., IČO: 25275062	
Objednatel:	Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, IČO: 00195201	
Změnový list vystavil:	Ing. Kateřina Meierová	
Datum:	30.3..2020	
Předmět změny: Revize SLP- kódovací klávesnice, switch,...		
Popis a zdůvodnění změny:		
1 ks pomocného zdroje z PD nahrazen 2 ks menších zdrojů rozmístěných po objektu pro lepší rozložení napájení – vhodnější řešení s ohledem na délku kabeláží. - GSM brána vč. hlasového modulu nahrazena GPRS vysílačem pro napojení na bezpečnostní agenturu – na žádost investora s ohledem na provozní požadavky - Kódovací klávesnice s LCD dotykovým displejem, nahrazeno klávesnicí standardní – na žádost investora snadnější kódování v zimních měsících 3 ks releový modul – není nutný, instalované zařízení nevyužije jeho výstupy vypuštěn ze zakázky 7 ks Switche 24 port jsou nahrazeny jedním switch 48 port usnadní organizaci datových rozvodů - Do stávající TÚ Přidán Exterder switch module, úprava stávající TÚ, stávající nevyhovující zařízení demontováno bude předáno uživateli . - Pro zajištění odpovídající kvality signálu doplněn anténní stožár		
Přílohy změnového listu: rozpočet - ZL 28		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-123 789,84 Kč	106 092,60 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-17 697,24 Kč	bez dopadu do termínu	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Miroslav Petera Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov Datum: 8.4.2020 Ředitelství, Procházkova 518 541 01 Trutnov -4.	Vratislav Zítka PRŮMSTAV NÁCHOD PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD DOBROŠOVSKÁ 1775 TEL.-FAX 491 423 757	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Ing. Marek Paylíček Datum: 8.4.2020	Ing. Gerhard Schmiedl Datum: 8/4/20	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ, NA NIVÁCH 57**

Název objektu **ZL 28 - revize SLP - kódovací klávesnice, switch, ...**

JKSO

EČO

Místo **TRUTNOV**

IČO

DIČ

Objednatel **SDRUŽENÍ OZDRAVOVEN A LÉČEBEN OKRESU TRUTNOV**

Projektant **ATELIER PAVLÍČEK**

Zhotovitel **Průmstav Náchod s.r.o.**

Zpracoval

25275062	CZ25275062

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	-17 697,24	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00%
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-17 697,24	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

PRŮMSTAV NÁCHOD
 PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD
 DOBROŠOVSKÁ 1776 TEL.-FAX 491 423 757

D Celkem bez DPH				-17 697,24
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15,0	0,00	0,00	
základní	21,0	-17 697,24	-3 716,42	
Cena s DPH				-21 413,66

E Přípočty a odpočty	
Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ, NA NIVÁCH 57
 Objekt: ZL 28 - revize SLP - kódovací klávesnice, switch, ...

Objednatel: SDRUŽENÍ OZDRAVOVEN A LÉČEBEN OKRESU TRUTNOV
 Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.
 Místo: TRUTNOV

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
D10	10. PZTS (EZS)	0,00	-6 066,00	-6 066,00	0,000	0,000
D11	11. Strukturovaná kabeláž, telefon, signalizace WC imobilní	0,00	-30 815,00	-30 815,00	0,000	0,000
D12	stávajícího RACK a napojení na stáv. SK	0,00	11 711,60	11 711,60	0,000	0,000
D13	13. Satelitní a televizní systém	0,00	5 142,00	5 142,00	0,000	0,000
D14	14. HZS, PD, revize	0,00	2 750,00	2 750,00	0,000	0,000
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	-419,84	-419,84	0,000	0,000
	Celkem	0,00	-17 697,24	-17 697,24	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ, NA NIVÁCH 57

Objekt: ZL 28 - revize SLP - kódovací klávesnice, switch, ...

Objednatel: SDRUŽENÍ OZDRAVOVEN A LÉČEBEN OKRESU TRUTNOV

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: TRUTNOV

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D10 10. PZTS (EZS)

-6 066,00

4	R	Pol163	Pomocný zdroj vč. skříně, transf. aku a oddělovače sběrnic	KS	-1,000	6 160,00	-6 160,00
11	R	Pol163.D	Pomocný zdroj vč. skříně, transformátoru a aku , použity 2 zdroje o menším proudu rozmístěné po budově pro lepší rozložení napájení	KS	2,000	3 080,00	6 160,00
5	R	Pol164	GSM brána vč. hlasového modulu	KS	-1,000	4 980,00	-4 980,00
12	R	Pol164.D	GPRS vysílač pro napojení na bezpečnostní agenturu, AKU1,2Ah	KS	1,000	7 032,00	7 032,00
1	R	Pol166	Kódovací klávesnice LCD (grafický dotykový 5" barevný LCD displej 6,4 x 11,2 cm, signalizace všech stavů pomocí ikon a popisů, přehledné a pohodlné ovládání přímo na dotykovém LCD, zobrazení půdorysů objektu se zobrazením stavu čidel, zobrazení Annunciáto	KS	-3,000	4 680,00	-14 040,00
2	R	Pol166.D	Kódovací klávesnice stávdard (dle stávající budovy)	KS	3,000	4 004,00	12 012,00
13	R	Pol170	Releový modul PGM4 vč. krabice	KS	-3,000	2 030,00	-6 090,00

D11 11. Strukturovaná kabeláž, telefon, signalizace WC imobilní

-30 815,00

7	R	Pol190	Switch 24port 10/100/1000 mng, VLAN, 4xSFP	KS	-4,000	10 800,00	-43 200,00
8	R	Pol191	Switch 24port 10/100/1000 mng, VLAN, 4xSFP, PoE	KS	-2,000	16 300,00	-32 600,00
14	R	Pol191.D	Switch -48HP- náhrada za ostatní switche	ks	1,000	44 985,00	44 985,00

D12 12. Propojení budov, doplnění stávajícího RACK a napojení na stáv. SK

11 711,60

9	R	Pol190	Switch 24port 10/100/1000 mng, VLAN, 4xSFP	KS	-1,000	16 300,00	-16 300,00
15	R	Pol999.D	TÚ - Extender Switch module 1xBRI + 4xLAN - pro verzi 4.6 , ve stávající ústředně nebyl switch ale pouze modul 1x BRI -nekompatibilní s switch module 4	ks	1,000	28 011,60	28 011,60

D13 13. Satelitní a televizní systém

5 142,00

10	R	Pol237.D	Stožár výsuvný , trojnožka , žárový zinek	KS	1,000	5 142,00	5 142,00
----	---	----------	---	----	-------	----------	----------

D14 14. HZS, PD, revize

2 750,00

16	R	Pol250	Úprava a nastavení stávající TÚ	SET	0,500	5 500,00	2 750,00
----	---	--------	---------------------------------	-----	-------	----------	----------

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

-419,84

3	R	R.0010	Jiné VRN ve výši 2,43%	Kč	-419,840	1,00	-419,84
---	---	--------	------------------------	----	----------	------	---------


Celkem

-17 697,24

-123 789,84

106 092,60

-17 697,24



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 29
Název projektu:	Centrum duševního zdraví RIAPS Trutnov, reg. číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_048/0004463	
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., IČO: 25275062	
Objednatel:	Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, IČO: 00195201	
Změnový list vystavil:	Ing. Kateřina Meierová	
Datum:	31.3..2020	
Předmět změny: Změna dveřního kování		
Popis a zdůvodnění změny: Žádost investora s ohledem na provozní požadavky – zaměnit u některých dveří dveřní kování KLIKA-KLIKA (dle PD) za kování KLIKA-KOULE resp. KOULE-KOULE		
Přílohy změnového listu: rozpočet - ZL 29		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-14 263,- Kč	14 263,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
0 Kč	bez dopadu do termínu	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Miroslav Petera	Vratislav Zítka	
Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov Ředitelství, Procházekova 818 541 01 Trutnov -4-	PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD DOBROŠOVSKÁ 1776 TEL. FAX 491 423 75	
Datum: 8.4.2020	Datum: 8.4.2020	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Ing. Marek Pavlíček	Ing. Gerhard Schmiedl	
Datum: 8.4.20	Datum: 8/4/20	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **ZL - CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ, NA NIVÁCH 57**

JKSO

Název objektu **ZL 29 - změna kování u dveří**

EČO

Místo

TRUTNOV

IČO

DIČ

Objednatel **SDRUŽENÍ OZDRAVOVEN A LÉČEBEN OKRESU TRUTNOV**

00195201

CZ00195201

Projektant **ATELIER PAVLIČEK**

25275062

CZ25275062

Zhotovitel **Průmstav Náchod s.r.o.**

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

31.03.2020

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



PRŮMSTAV NÁCHOD

PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD
DOBROŠOVSKÁ 1776 TEL.-FAX 491 423 75

[Handwritten signature]

D Celkem bez DPH 0,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	0,00	0,00

Cena s DPH 0,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZL - CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ, NA NIVÁCH 57

Objekt: ZL 29 - změna kování u dveří

Objednatel: SDRUŽENÍ OZDRAVOVEN A LÉČEBEN OKRESU TRUTNOV

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: TRUTNOV

Zpracoval:

Datum: 31. 3. 2020

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
	766-KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ					
D51	- MONTÁŽ	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	Celkem	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZL - CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ, NA NIVÁCH 57

Objekt: ZL 29 - změna kování u dveří

Objednatel: SDRUŽENÍ OZDRAVOVEN A LÉČEBEN OKRESU TRUTNOV

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: TRUTNOV

Zpracoval:

Datum: 31. 3. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
D51			766-KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ - MONTÁŽ				0,00
1	R	549146220	KOVÁNÍ DVEŘNÍ 72 MATNÝ NIKL	KUS	-17,000	839,00	-14 263,00
			"kování KLIKA-KLIKA"				
			"vstup-recepce 002/001" -1		-1,000		
			"skupinová - konzultační 117/118" -1		-1,000		
			"chodba - konzultační 103/118" -1		-1,000		
			"chodba - kancelář CDA 103/114" -1		-1,000		
			"chodba - šatna klienti 103/119" -1		-1,000		
			"chodba - zázemí služeb 203/221" -1		-1,000		
			"chodba - konzultační místnost mobilní služby 203/222" -1		-1,000		
			"chodba-konzultační místnost krizové služby 203/226" -1		-1,000		
			"chodba - zázemí KL 203/225" -1		-1,000		
			"chodba - příjem 2 203/213" -1		-1,000		
			"chodba - příjem 1 203/214" -1		-1,000		
			"denní místnost/ administrativy 217/218" -1		-1,000		
			"zasedací/ ředitel 215/216" -1		-1,000		
			"chodba/šatna personál 203/227" -1		-1,000		
			"konzultační místnost/kancelář 222/223" -1		-1,000		
			"201/203 chodba schodiště/chodba " -1		-1,000		
			"RIAPS/115" -1		-1,000		
			Součet		-17,000		
2	R	54914622.1	KOVÁNÍ DVEŘNÍ 72 MATNÝ NIKL	KUS	15,000	839,00	12 585,00
			"kování KLIKA-KOULE"				
			"vstup-recepce 002/001" 1		1,000		
			"skupinová - konzultační 117/118" 1		1,000		
			"chodba - konzultační 103/118" 1		1,000		
			"chodba - kancelář CDA 103/114" 1		1,000		
			"chodba - šatna klienti 103/119" 1		1,000		
			"chodba - zázemí služeb 203/221" 1		1,000		
			"chodba - konzultační místnost mobilní služby 203/222" 1		1,000		
			"chodba-konzultační místnost krizové služby 203/226" 1		1,000		
			"chodba - zázemí KL 203/225" 1		1,000		
			"chodba - příjem 2 203/213" 1		1,000		
			"chodba - příjem 1 203/214" 1		1,000		
			"denní místnost/ administrativy 217/218" 1		1,000		
			"zasedací/ ředitel 215/216" 1		1,000		
			"chodba/šatna personál 203/227" 1		1,000		
			"konzultační místnost/kancelář 222/223" 1		1,000		
			Součet		15,000		
3	R	54914622.2	KOVÁNÍ DVEŘNÍ 72 MATNÝ NIKL	KUS	2,000	839,00	1 678,00
			"kování KOULE-KOULE"				
			"201/203 chodba schodiště/chodba " 1		1,000		
			"RIAPS/115" 1		1,000		
			Součet		2,000		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZL - CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ, NA NIVÁCH 57

Objekt: ZL 29 - změna kování u dveří

Objednatel: SDRUŽENÍ OZDRAVOVEN A LÉČEBEN OKRESU TRUTNOV

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: TRUTNOV

Zpracoval:

Datum: 31. 3. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Celkem

0,00
