

DODATEK č. 3
ke Smlouvě o dílo ze dne 9. 8. 2019 ve znění dodatku č. 1 – č. 2
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIC: CZ70889546

zastoupený hejtmánem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) M-SILNICE a.s.

Husova 1697, 530 03 Pardubice

Korespondenční adresa: M - SILNICE a.s., oblastní závod SEVER,
Hradecká 415, 506 01 Jičín

IČO: 421 96 868

DIC: CZ42196868

zastoupený Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsdou představenstva a Mgr. Michalem Kropáčem, členem představenstva

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „III/2961 Svoboda nad Úpou – Janské Lázně – rekonstrukce
komunikace – úsek č. 3“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 3, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny takto:

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Příslušné údaje
Datum zahájení prací	1.1.3.2	V termínu určeném zadavatelem (19. 8. 2019)
Přerušeni prací	1.1.3.3	12 dní (9. 9. 2019, 10. 9. 2019, 27. 9. 2019, 30. 9. 2019, 1. 10. 2019, 2. 10. 2019, 3. 10. 2019, 4. 10. 2019, 5. 10. 2019, 8. 10. 2019, 9. 10. 2019, 10. 10. 2019)
Přerušeni plnění zakázky (zimní přestávka)		4. 1. 2020 – 29. 3. 2020
Přerušeni stavebních prací		6. 4. 2020 – 5. 7. 2020
Doba pro dokončení Stavby (= prací) (bez přerušeni stavebních prací a bez přerušeni plnění zakázky, včetně prodloužení stavebních prací) Celkem pro I. a II. sekci.		12 týdnů (I. sekce) + 6 týdnů (po dokončení I. sekce) + 16 týdnů (II. sekce) od termínu určeného zadavatelem – bez přerušeni prací, včetně prodloužení stavebních prací (22. 10. 2020)
Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po termínu dokončení Stavby) (bez přerušeni stavebních prací a bez přerušeni plnění zakázky, včetně prodloužení stavebních prací) Celkem pro I. a II. sekci		12 týdnů (I. sekce) + 6 týdnů (po dokončení I. sekce) + 16 týdnů (II. sekce) + 6 týdnů (po dokončení II. sekce) od termínu určeného zadavatelem (3. 12. 2020)
Doba realizace Díla za I. a II. sekci (bez přerušeni stavebních prací a bez přerušeni plnění zakázky, včetně prodloužení stavebních prací)		28 týdnů (tj. součet doby realizace prací v týdnech za I. a II. sekci) + 6 + 6 týdnů
Datum zahájení prací I. sekce		19. 8. 2019
II. sekce		30. 3. 2020
Doba pro dokončení Stavby (= prací) I. sekce	1.1.3.3	12 týdnů od termínu určeného zadavatelem – bez přerušeni prací (22. 11. 2019)
II. sekce		16 týdnů od termínu zahájení prací po přerušeni plnění zakázky - bez přerušeni stavebních prací, včetně prodloužení stavebních prací (22. 10. 2020)

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Příslušné údaje
Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po termínu dokončení Stavby) I. sekce II. sekce	1.1.3.3	6 týdnů po termínu dokončení Stavby (3. 1. 2020) 6 týdnů po termínu dokončení Stavby (3. 12. 2020)
Doba realizace Díla I. sekce II. sekce		12 týdnů + 6 týdnů 16 týdnů (bez přerušení stavebních prací, včetně prodloužení stavebních prací) + 6 týdnů

2) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný harmonogram je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne

Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

V Hradci Králové dne



Zhotovitel M - SILNICE a.s.
Ing. Zdeněk Babka
místopředseda představenstva



Zhotovitel M - SILNICE a.s.
Mgr. Michal Kropáč
člen představenstva



EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

Číslo stavby :	36850
Registrační číslo projektu :	
Smlouva o dílo uzavřena dne :	9.8.2019

3

Název stavby :

III/2961 Svoboda nad Úpou - Janské Lázně - rekonstrukce komunikace - úsek č.3, II.etapa

Název objektu :

SO 101 Silnice III/2961 - km 2,716 - 3,347

Objednatel :

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

M - PROJEKCE s.r.o., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

Zhotovitel :

M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

Popis a zdůvodnění změny :

SO 101 Silnice III/2961 - km 2,980 - 3,150 - Jelikož v tomto úseku stále provádí firma AQUAVIT spol. s r.o. zemní práce pro výměnu horkovodu za parovod v Janských Lázních, je nutné stavbu prodložit o 18 dní, než budou ukončeny zásypy a hutnění nad trasou parovodu. Tyto práce měly být ukončeny dne 28.9.2020. Dle SoD a PD zhotovitel provádí kompletní výměnu konstrukčních vrstev, tyto práce nelze provádět souběžně s jiným zhotovitelem na stejném úseku. Podle SoD a dodatku č. 1 měla být opětovně stavba zahájena dne 6.7.2020. Před vlastními stavebními pracemi na silnici v této trase prováděla firma VaK Trutnov výměnu vodovodu a kanalizace, její zhotovitel nedodržel termín dokončení a předání dokončených prací společnosti VaK a termín byl posunut na 13.7.2020, jelikož zhotovitel komunikace provádí kompletní výměnu konstrukčních vrstev a nebylo možné provádět zemní práce souběžně s pracemi na vodovodu a kanalizaci. Termín dokončení stavby se posouvá na 22.10.2020, termín dokončení díla se posouvá na 3.12.2020. Celková doba realizace Stavby se mění na 28 týdnů + 6 týdnů + 6 týdnů.

Přílohy evidenčního listu :

1.	Claim od zhotovitele M- Silnice a.s
2.	Odpověď na Claim
3.	Vyjádření od firmy AQUAVIT spol. s r.o. + fotky + HMG
4.	Stavební deník
5.	Zápis z KD č.3.
6.	HMG

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku č.2 (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č.3:		Nová cena stavby po změně č.3:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
		méněpráce	vícepráce		
45 439 446,16 Kč	45 439 446,16 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	46 589 258,81	46 589 258,81 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.3:		0,00 Kč	0,00 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zhotovitel :	M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice			
Projektant (autorský dozor) :	M - PROJEKCE s.r.o., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové			
Správce stavby :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
Hlavní inženýr :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
Technický dozor :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
Asistent technického dozoru:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			

Vyřizuje: Ing. Petr Mareš
vedoucí provozu HK, OZ SEVER

e-mail:

mobil:

Ing. Jiří Koutník
hlavní inženýr stavby

Věc: žádost o prodloužení doby pro dokončení

Stavba: „III/2961 Svoboda nad Úpou – Janské Lázně – rekonstrukce komunikace –
úsek č. 3“

Na základě článku 8.4 Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem, obecné podmínky Vás žádáme o prodloužení doby pro dokončení prací na výše uvedené stavbě.

Předpoklad prodloužení výstavby byl avizován na KD č.3 dne 7.9.2020:

- zhotovit stavby upozorňuje na předpokládané prodloužení doby pro dokončení stavby z důvodu neumožnění pokračování kontinuální výstavby komunikace vzhledem k nepředanému staveništi posledního úseku po výstavbě parovodu - zemních prací od dodavatele Aquavit, jedná se o 4. pracovní fázi stavby km 2,980 – km 3,150
- dle harmonogramu dodavatele Aquavit se předpokládá předání staveniště uvedeného úseku v termínu 28.9.2020

Vzhledem k výstavbě v daném úseku druhým zhotovitelem provádějícím inženýrské sítě (parovod, vodovod) a k místním podmínkám neumožňující souběh prací 2 zhotovitelů ve stejném úseku výstavby (viz. fotodokumentace), žádáme dnem 10.9.2020 o odložení nástupu na 4. pracovní fázi stavby komunikace v km 2,980 – 3,150 do doby převzetí staveniště od zhotovitele Aquavit spol. s r.o..

Předání staveniště od společnosti Aquavit spol. s r.o. bude dnem 28.9.2020.

Prodloužení doby pro dokončení bude o termín 10.9. – 27.9.2020, což je 18 dní.

Termín dokončení stavebních prací dle SOD: 5.10.2020

Termín dokončení stavebních prací po prodloužení doby výstavby: 23.10.2020



M-SILNICE

M - SILNICE a.s.

Pardubice, Husova 1697

OZ Sever, provoz Hradec Králové

Prodloužení doby výstavby nebude mít vliv na finanční plnění objednatele a zhotovitel prohlašuje, že nebude požadovat finanční nárok v souvislosti s prodloužením doby dokončení stavebních prací.

V Hradci Králové dne 10.9.2020



Ing. Petr Mareš

vedoucí provozu HK, OZ SEVER

Souhlasím s prodloužením doby
pro dokončení v uvedeném termínu.

Ing. Jiří Koutník
hlavní inženýr stavby



ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradecké kraje a.s.
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové
Česká republika

M- SILNICE, a.s.
Oblastní závod SEVER, provoz HK
Bratří Štefanů 492,
500 03 Hradec Králové

Váš dopis značky/ze dne:
10. 9. 2020

Číslo jednací:

Vyřizuje/telefon:
Ing. Klára Bednářová,

V Hradci Králové dne:
14.9.2020

Žádost o prodloužení doby pro dokončení

Stavba: III/2961 Svoboda nad Úpou – Janské Lázně – rekonstrukce komunikace – úsek č.3

Vážení,

Správce stavby obdržel od Zhotovitele dopis ze dne 10.9.2020. Zhotovitel v něm oznamuje Správci stavby, že stavba bude prodloužena o dobu 18 - ti dnů z důvodu nemožnosti provádět stavební činnosti dvou zhotovitelů- tj. firma M-SILNICE a.s. a firma AQUAVIT spol. s r.o. ve stejném úseku rekonstruované silnice. Firma AQUAVIT spol. s r.o. provádí zemní práce pro výstavby parovodu v Janských Lázních. Dle předloženého harmonogramu od firmy AQUAVIT spol. s r.o. bude část v km 2,980 - 3,150 kompletně hotova a předána dne 28. 9. 2020.

Správce stavby na základě tohoto zjištění prodlužuje stavební práce do 01.11.2020.

S pozdravem

Ing. Klára Bednářová
Hlavní inženýr stavby



AQUAVIT, spol. s r.o. * 541 01 TRUTNOV * Rudolfa Frimla 856
registrován u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2014
IČ : 46506527 * DIČ: CZ 46506527 * KB Trutnov 714549601/0100

Údržba silnic Královehradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59
Hradec Králové - Palčice
500 04

Trutnov, 21.9.2020

Věc : Vyjádření k termínu stavby


V rámci akce KONVERZE SCZT JANSKÉ LÁZNĚ postupujeme dle harmonogramu.
Do 28.9.potřebujeme umožnit vjezd techniky do ulic Školní a za Zdenu z důvodu
dokončujících prací na souvisejících etapách.
Úsek (km 2,980-3,150) vám můžeme předat 28.9.2020
Dále posílám foto ze stavby kde je zřejmé že práce nebylo možné provádět v souběhu
Harmonogram přílohou

děkuji

Martin Vít
jednatel společnosti

Výstavba parovodu v ul. Černohorská v Janských Lázních



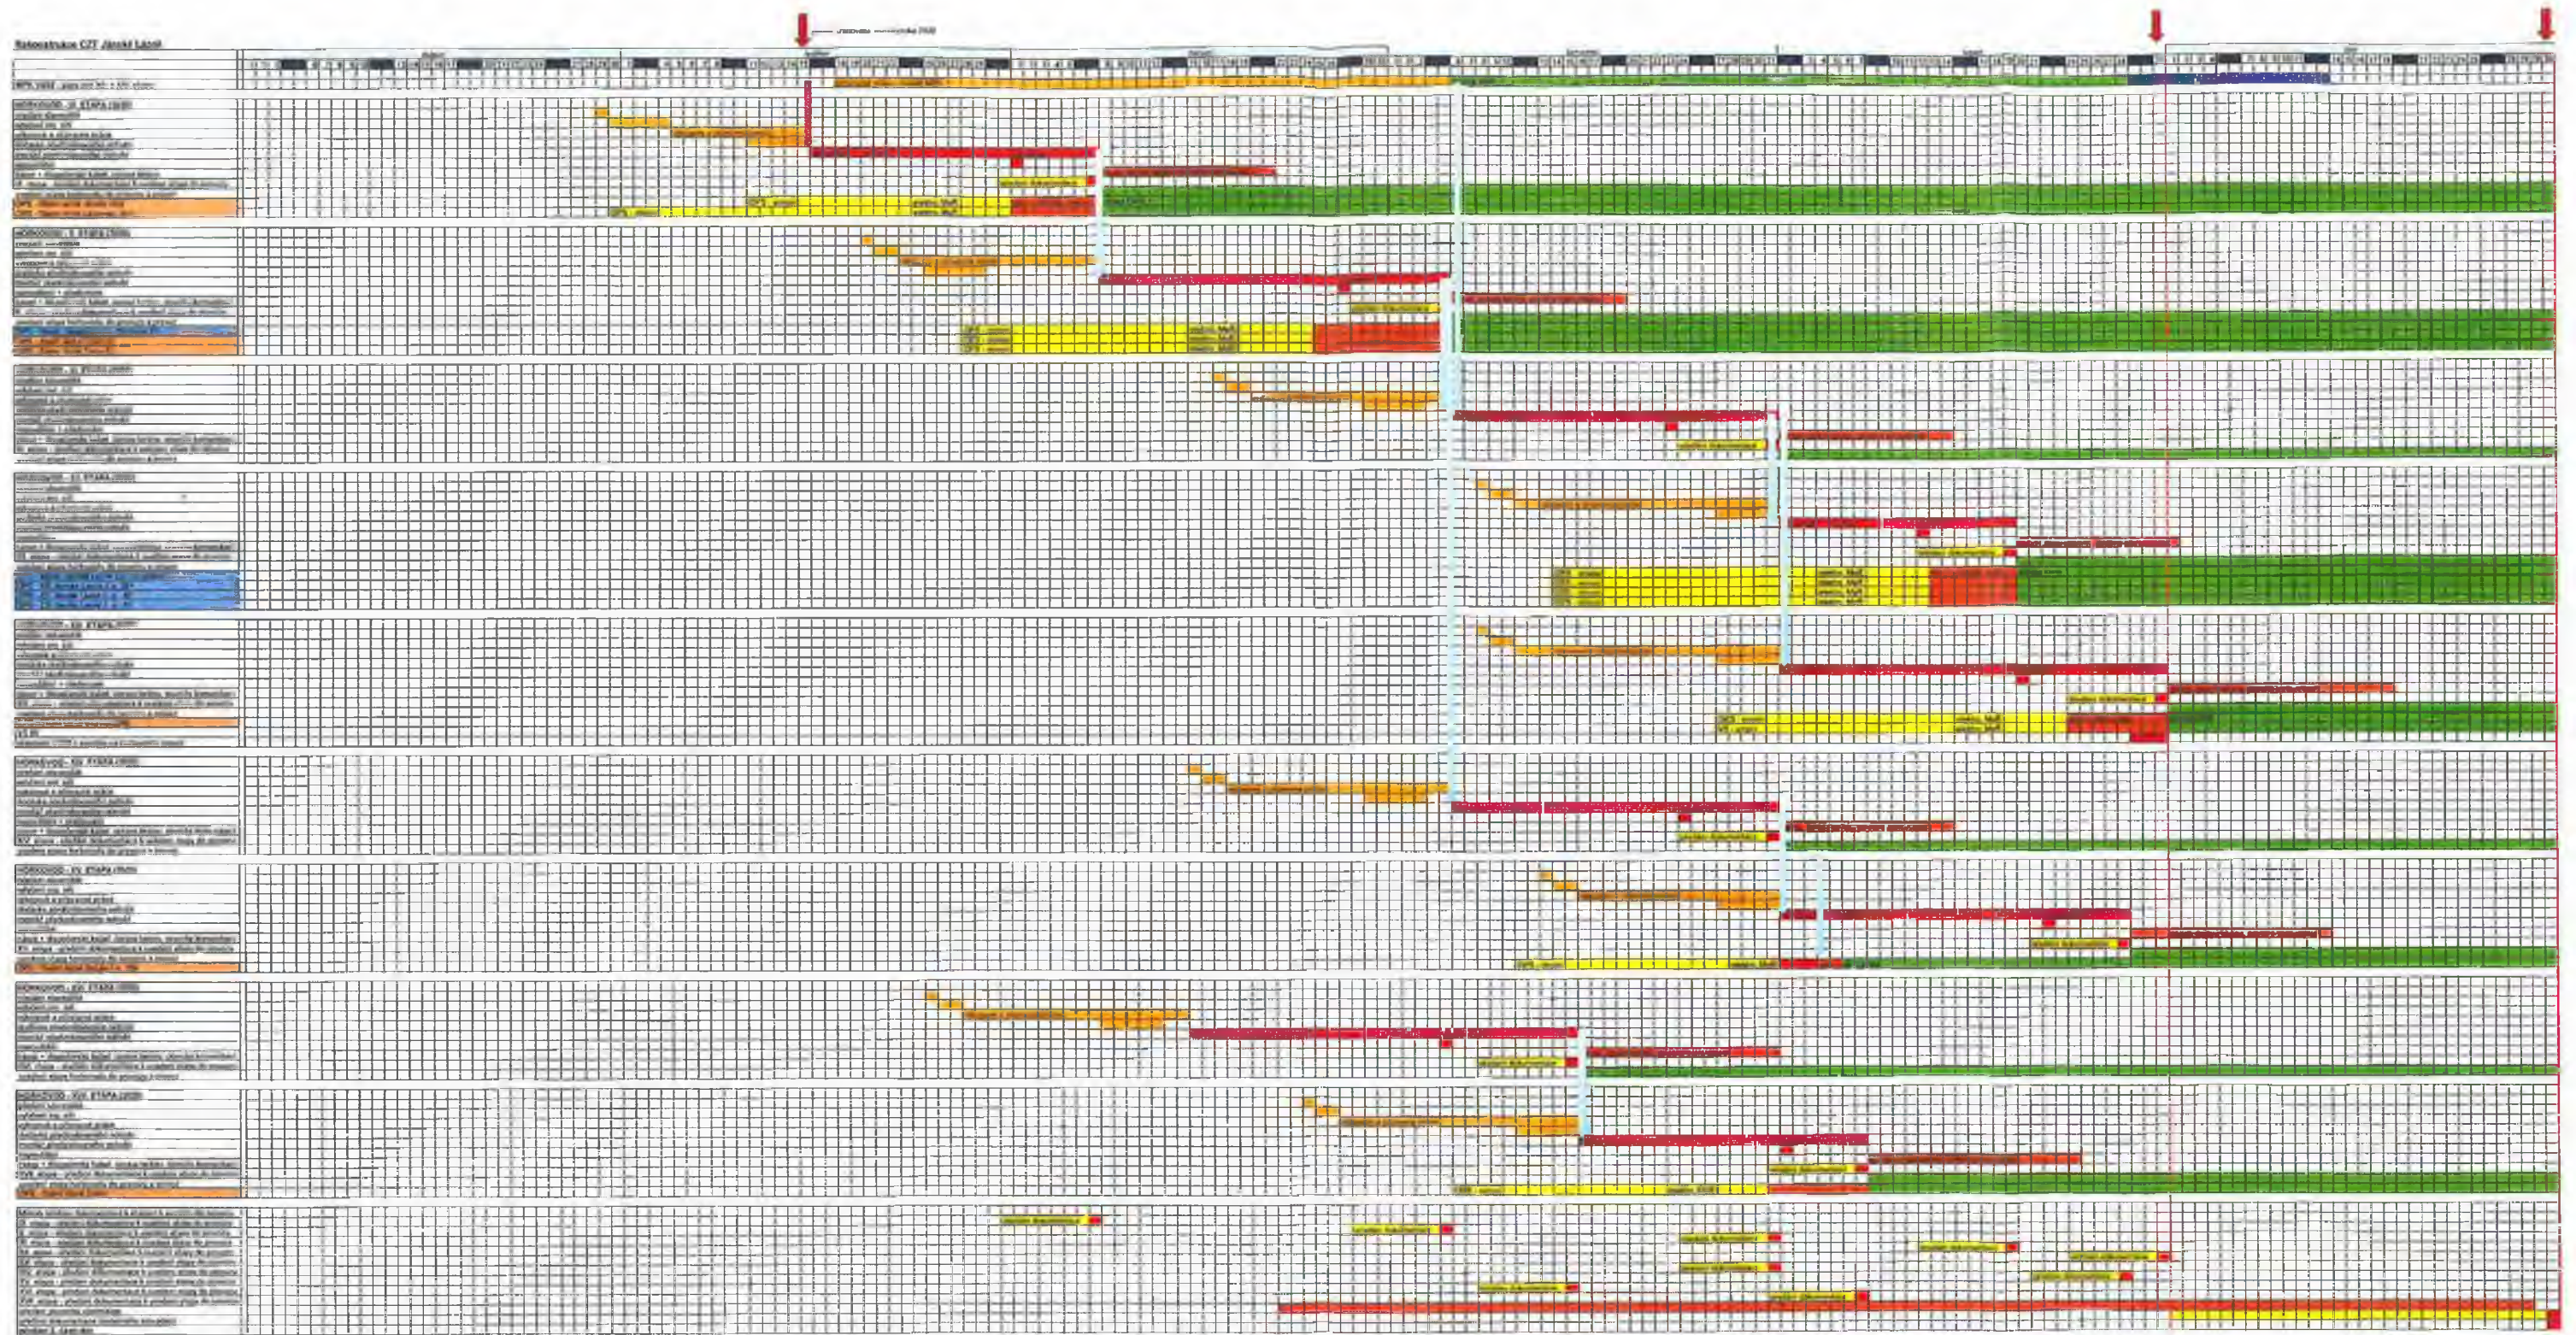

Denní záznamy stavby

List číslo 20/02

III/2961 Suchbata vod Úpan - Jourské Lázně - úsek č.3

Datum

šlopující: Imelauf Petr, Rychtář Václav

diškusce: Tsubota 4x, utvářející 3x

STROJE: bagr CAT 312B, minibagr KOTÁTSU, vibro. clistka

MIKASA: ruční nůž D-1112

DOPRAVA: T815 - 3H4 0101 - Rychtář

T815 - 4H5 1212 - Rychtář

T815 - 0H1 2275 - MACEJKO

T815 - 2H4 9419 - MACEJKO

PROVEDENÍ PRÁCE: - navržen a uvržen S3 c/63 v km

2,840 - 2,960

- zhotovení betonové v km 2,830 - 2,860 upraveno

c v km 2,920 - 2,960 upraveno

POČASÍ: +12°C +24°C, JASNO

9. 9. 2020

PRACOVNÍ DOBA: 6.00 - 16.00 hod. / přestávka přest. 11.00 - 11.30

STŘEDA

PRACOVNÍCI: THP - Kubicek Petr

šlopující: Imelauf Petr, Rychtář Václav

diškusce: Tsubota 4x, utvářející 3x

STROJE: bagr CAT 312B, minibagr KOTÁTSU, v. br. clistka

MIKASA

DOPRAVA: T815 - 3H4 0101 - Rychtář

T815 - 4H5 1212 - Rychtář

T815 - 0H1 2275 - MACEJKO

T815 - 2H4 9419 - MACEJKO

PROVEDENÍ PRÁCE: - navržen a uvržen S3 c/63 v

km 2,840 - 2,860 a upraveno v křižovatce

- zhotovení betonové v km 2,900 - 2,960 v km DD 150

- finální úprava úseku 2,83 - 2,96 pro potrubí

obnovení

POČASÍ: +15°C, ZATÍŽENO

10. 9. 2020

PRACOVNÍ DOBA: 6.00 - 16.00 hod. / přestávka přest. 11.00 - 11.30

ČTVRTEK

PRACOVNÍCI: THP - Kubicek Petr

šlopující: Imelauf Petr, Rychtář Václav

diškusce: Tsubota 4x, utvářející 3x

STROJE: bagr CAT 312B, heliohobagr KOTÁTSU; minibagr KOTÁTSU, vibro clistka SUEBIC 50x50

Denní záznamy stavby

List číslo: 21/02

III/2001 Suchbátka ucel výpr - Janstě' Ca'zue' - výsk c' 3

Datum

DOPRAVA TE15 - 344 0101 - Rycht
TE15 - 445 1212 - Rycht
TE15 - 011 2222 - DACE TKA
PRŮVEDENÍ PRÁCE: - pokračování a s' směr do interakce
- fotometr výpravy v km 2,680 - 2,820 vpravo i vlevo
PRÁCE V KRAJINĚ: 2,680 - 3,150 Rycht HODNĚNÍ PRŮVEDENÍ
STAVBY: P. AKRAT - 6.8. DODATEK č. 3.

POČASÍ: +7°C - +23°C SÍLA JASNO
PRÁCE: DOPRAVA: 6.00 - 15.00 hod. (pokračování pr. 11.00 - 11.30)
PRÁCE: THP - Kubice Petr
SHOPING: Imeant Petr; Rycht Václav
CHLIVICE: Tsubera 44; Ubařinci 34
STAVBA: faktory CA 1212, min. bytů KATISU
DOPRAVA: TE15 - 344 0101 - Rycht
TE15 - 445 1212 - Rycht

PRŮVEDENÍ PRÁCE: - pokračování řezů vzhledem do hloubky
v km 2,820 - 2,860 vpravo
- přeměna chodníků přestav
- příprava na obklopení
MATERIÁL: TIG Kára vodo - HCT - 5m³

POČASÍ: +13°C - +28°C JASNO
PRÁCE: DOPRAVA: 6.00 - 16.00 hod. (pokračování pr. 11.00 - 11.30)
PRÁCE: THP - Kubice Petr
SHOPING: Rycht Václav, Imeant Petr
CHLIVICE: Tsubera 44
STAVBA: faktory KATISU; min. bytů KATISU
DOPRAVA: TE15 - 344 0101 - Rycht
TE15 - 445 1212 - Rycht

PRŮVEDENÍ PRÁCE: - pokračování řezů vzhledem do hloubky
v km 2,860 - 2,900 vlevo
- demontáž železných oken v chodníku v km 2,860 - 2,870 vpravo
- vyčištění od prachu a příprava na obklopení
- namíření železných chodníků z řezů vzhledem do hloubky
MATERIÁL: TIG Kára vodo - HCT - 5m³



ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



ZÁPIS

z 3. kontrolního dne stavby a koordinátora BOZP na staveništi

**„III/2961 SVOBODA NAD ÚPOU – JANSKÉ LÁZNĚ, REKONSTRUKCE KOMUNIKACE,
ÚSEK č. 3, II. ETAPA“**

stavba číslo: 36850b

ze dne: 07.09.2020

Přítomni: dle presenční listiny

I. Kontrola úkolů z minulého KD:

- 1/1 Prověřena možnost snížení silniční obruby před objektem TERRA v JL, Město Janské Lázně
Souhlasí se snížením silniční obruby za podmínky, že stavební úpravy uhradí Státní léčebné lázně
- 1/2 Projektant předložil změnu úpravy chodníku před penzionem Janský potok II. - **splněno**
- 1/4 Provedena výměna odvodňovacího žlabu u parkoviště před Lázeňským domem - **splněno**
- 1/5 Obchůzná trasa pro pěší mimo prostor stavby vyznačena - **splněno**

II. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:

Plnění věcného harmonogramu:

- zhotovitel stavby M Silnice a.s., upozorňuje na předpokládané přerušení stavby z důvodu neumožnění pokračování kontinuální výstavby komunikace vzhledem k nepředanému staveništi posledního úseku parovodu, tedy zemních prací ve staničení km 2,980 – 3,150 od dodavatele Aquavit Trutnov.

Popis provedených prací:

- Popis provedených prací: SO 101 Silnice v úseku km 2,827 – 2,980
- Odstranění podkladních vrstev stávající komunikace
- Zřízení uličních vpustí včetně přípojek
- Ruční výkop sond na inž. sítě

- SO 131 – Chodníky (město Janské Lázně a KHK) v úseku km 2,827 – 2,980
- Odstranění podkladních vrstev chodníků
- Ruční výkop sond na inž. sítě

Předpokládané práce na další období: SO 101 Silnice v úseku km 2,827 – 2,980

- Pokládka silničních obrub a zahradních obrub
- Konstrukce komunikace v km 2,827 – 2,980
- Konstrukce chodníku v km 2,827 – 2,980
- Konstrukce přípojných komunikací



ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Dopravní opatření:

- dle schváleného DIO

Předávání RDS:

- dokumentace RDS bude předávána v etapách s postupem výstavby

Fotodokumentace:

- je průběžně prováděna a bude předávána

III. Finanční plnění:

Smluvní ujednání:

Souhrn smluvních dohod ze dne: 09.08.2019

II. etapa km 2,716 – 3,347:

Datum zahájení prací: 30.03.2020

Přerušení stavebních prací: od 06.04.2020

Zahájení stavebních prací po přerušení: 13.07.2020

Termín dokončení prací: 27.09.2020

Termín pro dokončení stavby: 01.11.2020

Doba realizace stavby: 12 + 6 týdnů

Náklady na stavbu dle souhrnu smluvních dohod (vč. DPH): 45 439 446,16 Kč

Stavební práce jsou prováděny dle schváleného harmonogramu postupu výstavby.

Fakturace stavby (vč. DPH): 4 520 250,99Kč

IV. Na KD bylo projednáno (nové úkoly):

- 2/1 Zhotovitel předloží k odsouhlasení vícenáklady na betonovou stabilizaci, kterou si budou hradit Léčebné lázně Janské Lázně před objektem TERRA v k. ú. Janské Lázně cca 88m2. **splněno**
- 1/2 Bude provedena úprava chodníku před objektem penzionu Janský potok II, dle upravené PD. **probíhá**
- 1/3 Zhotovitel předloží objednateli materiálové zdroje včetně výroben s doložením přepravních vzdáleností a doby přepravy k odsouhlasení. **trvá**
- 1/4 Bude provedena výměna odvodňovacího žlabu u parkoviště před Lázeňským domem v k. ú. Janské Lázně. **splněno**



ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



- 1/5 Vzhledem k uzavírcce celé komunikace pro pěší a imobilní občany a pacienty J. Lázní bude vyznačena piktogramy a šípkami nově obchůzná trasa po dohodě a odsouhlasení Městem J. Lázně. **splněno**
- 1/6 Od km 2,855 (penzion Janský potok II) – 2,922 (kostel) bude kompletně uzavřen celý úsek komunikace vč. chodníků pro pěší, imobilní a pro automobilovou dopravu po dobu výstavby komunikace vč. pokládky živičného koberce.
- 3/1 Provést koridor pro pěší, aby byl umožněn bezpečný průchod chodců a přístup do objektů nacházejících se za uzavírkou dle ROZHODNUTÍ podle ustanovení §25 odst. 6 písm. c) zákona o pozemních komunikacích v rámci možnosti zachování bezpečnosti provozů stavby a třetích osob.
- 3/2 Úprava chodníku před objektem TERRY, změna chodníku na parkovací stání a chodník, dle projednání s Policií ČR.

V. Kontrola kvality:

Zhotovitel průběžně provádí předepsané kontrolní zkoušky dle KZP na pláni tělesa.

VI. Zápis koordinátora BOZP na staveništi:

Při veškerých stavebních činnostech, s přihlédnutím k charakteru prací a místním podmínkám, je nutno dodržovat bezpečnost práce a Plán BOZP na staveništi. Pozornost je nutné věnovat používání ochranných pomůcek všech pracovníků stavby i účastníků KD (výstražné vesty, ochranné přilby, atd.), tak jako i bezpečnostním postupům a předpisům s používanou mechanizací.

Koordinátor BOZP na staveništi upozornil zhotovitele na řádné označení staveniště. Toto zajištění staveniště je nutné denně kontrolovat (výstražné tabulky, bezpečný pohyb chodců, atd.).

Byla provedena kontrola staveniště – viz. samostatný zápis.

VII. Připomínky a stanoviska, ostatní:

VIII. Závěr:

Příští kontrolní den je plánován dne 24.09.2020 v 11,00 hod. na stavbě.



ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



KRÁLOVÉHRADECKÝ
KRAJ



Za správce stavby a TDI:

Ing. Daniel Jakwerth



Za asistenta TDS:

Ing. Jaroslava Valentová

Za hlavního inženýra stavby:

Ing. Klára Bednářová



Za zhotovitele stavby:

Ing. Petr Kubiček



Za autorský dozor stavby:

Ing. Jan Fiala



Za koordinátora BOZP na staveništi:

Ing. Klára Bednářová



Přílohy k zápisu:

Prezenční listina



ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



PREZENČNÍ LISTINA

z 3. kontrolního dne: III/2961 SVOBODA NAD ÚPOU – JANSKÉ LÁZNĚ, REKONSTRUKCE KOMUNIKACE, ÚSEK č. 3

II. ETAPA

stavba číslo: 36850b

dne: 07.09.2020 na stavbě rekonstrukce komunikace v k. ú. Janské Lázně

Jméno	Firma	Telefon	E-mail	Podpis
Ing. Klára Bednářová	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Hradec Králové			
Ing. Daniel Jakwerth	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Trutnov			
Ing. Jaroslava Valentová	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Trutnov			
Zdeňka Janků	Správa Silnic Královéhradeckého kraje, p.o. Trutnov			omluvena
Ing. Jiří Hradecký	Starosta Města Janské Lázně			
Ing. Petr Straka	Město Janské Lázně			
Ing. Petr Mareš	M- SILNICE a.s.			

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové oddíl B,
vložka 2548, IČO : 27502988, DIČ : CZ27502988



ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



KRAJ
KRAJ

Ing. Petr Kubíček	M- SILNICE a.s.			
Ing. Jaroslav Seifrt	Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s., Hradec Králové			
Ing. Jan Fiala	Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s., Hradec Králové			





ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Informativní dodatek ke zpracování dat stavba: „III/2961 SVOBODA NAD ÚPOU – JANSKÉ LÁZNĚ, REKONSTRUKCE KOMUNIKACE, ÚSEK č. 3, II. ETAPA“

Zpracování osobních dat

Vyplněním Vašich osobních údajů se Královéhradecký kraj, IČ 70889546, se sídlem Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, zastoupený společností ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., se sídlem Kutnohorská 59/23, 500 04 Plačice, Hradec Králové, IČ 27502988, stane správcem Vašich osobních údajů. Společnost ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., se sídlem Kutnohorská 59/23, 500 04 Plačice, Hradec Králové, IČ 27502988, se stane zpracovatelem Vašich osobních údajů na základě příkazní smlouvy a smlouvy o zpracování osobních údajů, uzavřené s Královéhradeckým krajem. Z právního titulu plnění smlouvy evidujeme Adresa, Akademický titul, Angažma, Číslo osvědčení o autorizaci, DIČ fyzické osoby, Email, Jméno, Korespondenční adresa, Místo podnikání, Osvědčení o autorizaci, Podpis, Pracovní pozice, Příjmení, Telefon, Údaj o členství v profesní komoře/obdobně organizaci, po dobu 10 let od ukončení zadávacího řízení. Tyto údaje zpracováváme za účelem realizace stavby na základě smlouvy o dílo na zhotovení stavby - veřejné zakázky.

Vaše práva

Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat opravu udaných osobních údajů, požádat o sdělení, jaké osobní údaje o vás evidujeme, případně požádat o výmaz osobních údajů, bude-li to možné. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebyť předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním některého z osobních údajů, informujeme Vás, že tento souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat a je povinností správce tento údaj následně vymazat a dále jej nezpracovávat. Odvoláním souhlasu nemíjí dotčena zákonnost zpracování, vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Vaším právem je podat stížnost dozоровému úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů) proti tomuto zpracování. Se svými žádostmi se můžete obracet na email [redacted] nebo na sídlo naší společnosti ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59/23, 500 04 Plačice, Hradec Králové.

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové oddíl B,
vložka 2548, IČO : 27502988, DIČ : CZ27502988




ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.


Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Jméno	Firma	Telefon	E-mail	Podpis



HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENÍŠTI

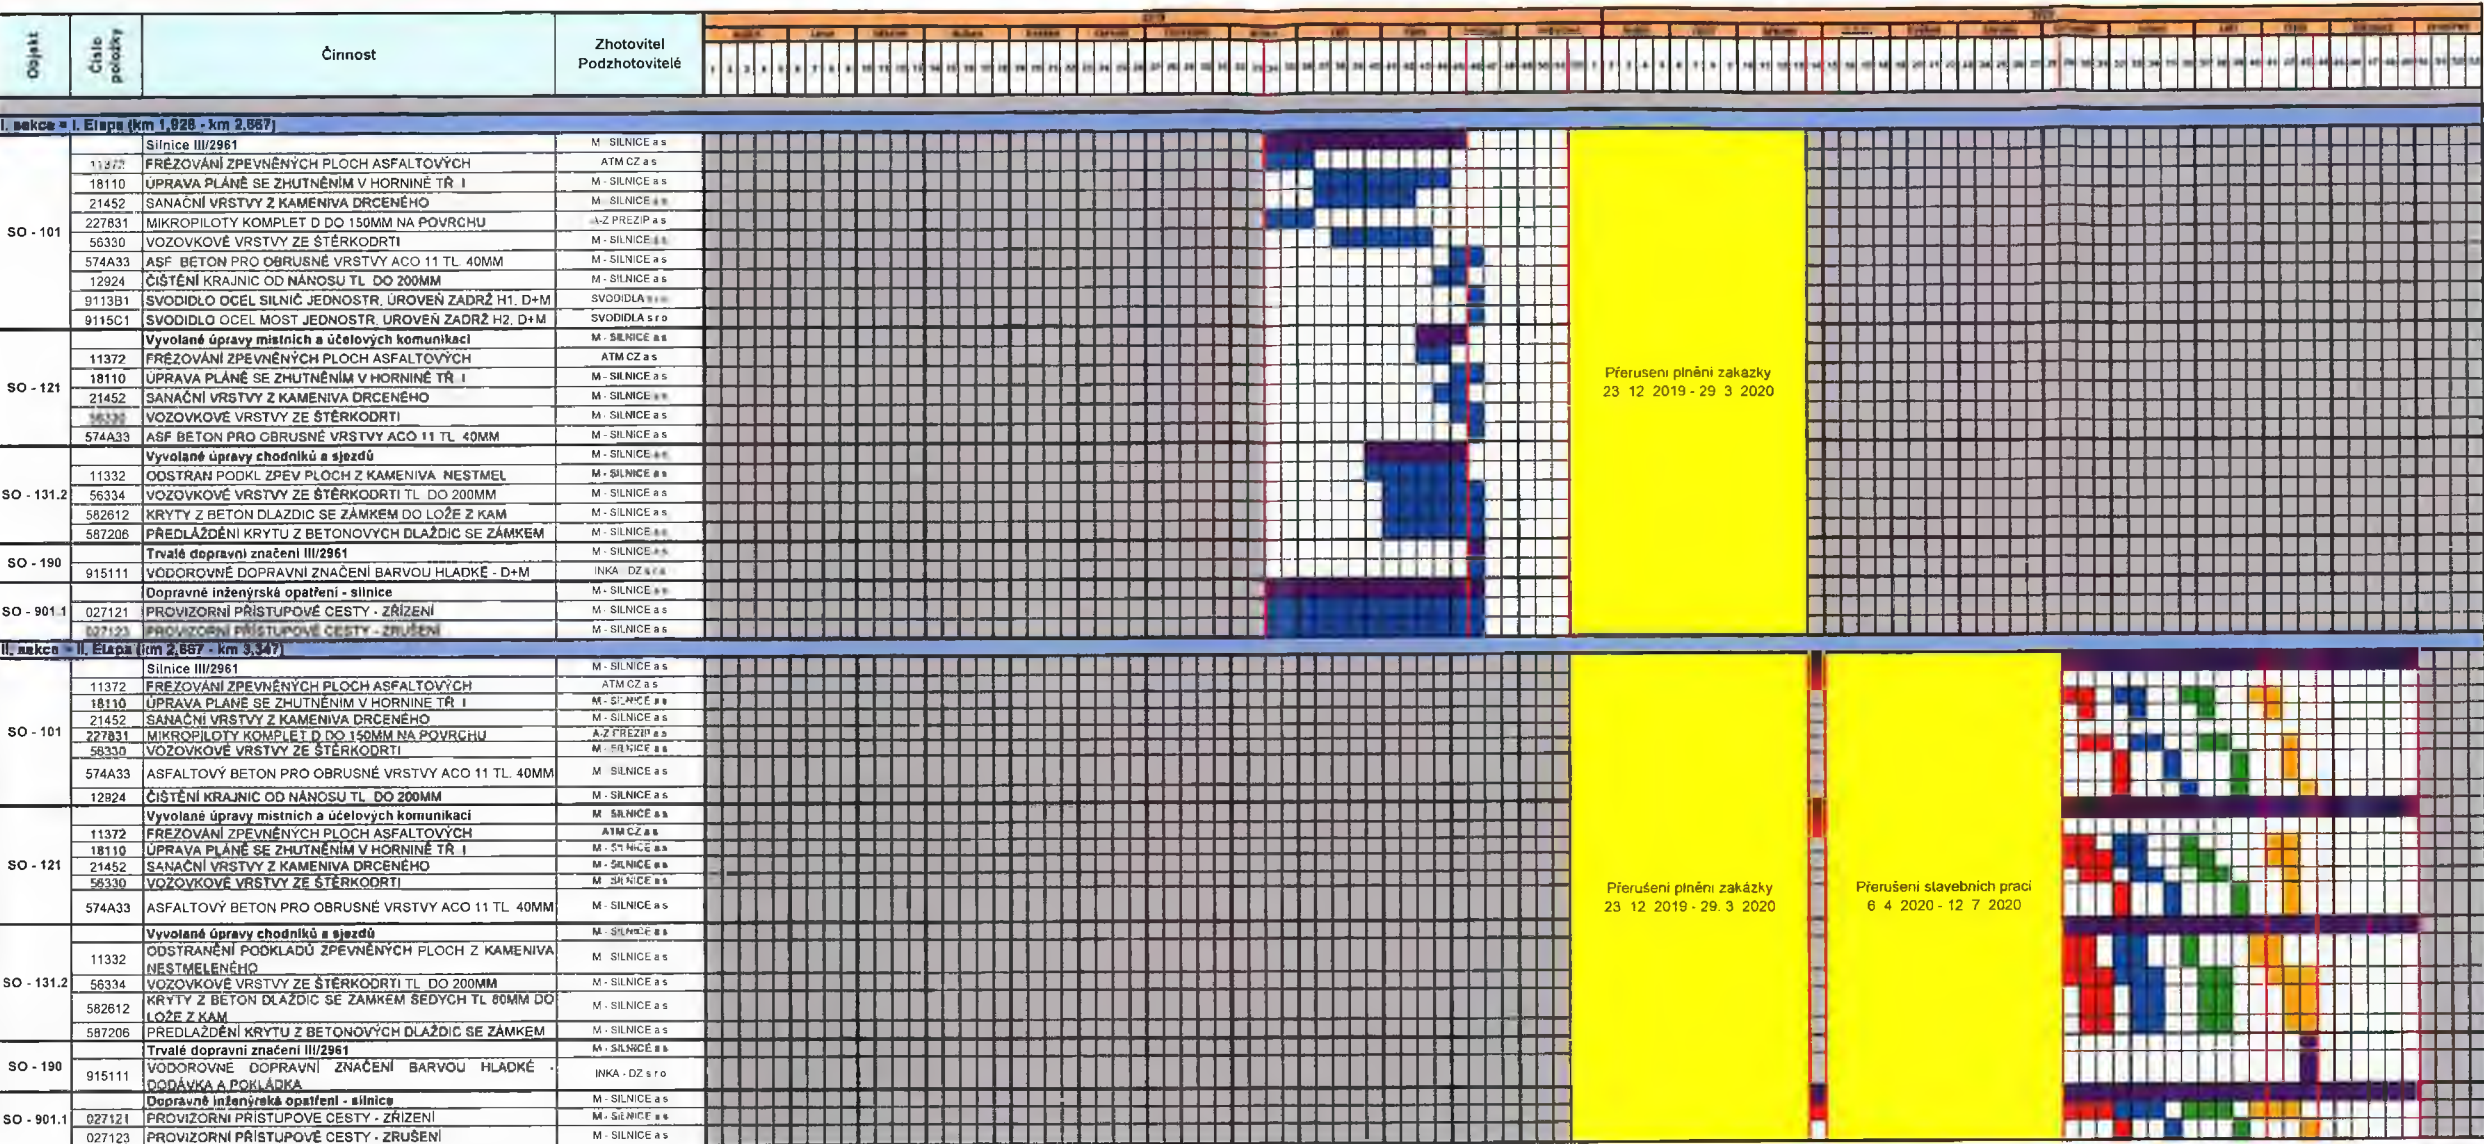

I. sekce I. Etapa (rok 2019, km 1,928 - km 2,667)	
Termín zahájení I. sekce Díla:	19.8.2019
Doba pro dokončení I. sekce Stavby (=práci):	22.11.2019
Doba pro dokončení I. sekce Díla:	3.1.2020
Doba realizace I. sekce Díla:	12 týdnů + 6 týdnů
Zahájení přerušení plnění zakázky:	4.1.2020
Ukončení přerušení plnění zakázky:	29.3.2020
II. sekce II. Etapa (rok 2020, km 2,667 - km 3,347)	
Termín zahájení II. sekce Díla:	30.3.2020
Termín přerušení stavebních prací:	6.4.2020 - 12.7.2020
Termín pokračování stavebních prací:	13.7.2020
Termín prodloužení stavebních prací - dodatek č.3:	10.9.2020 - 27.9.2020 (18 dní)
Termín nástupu 4. pracovní fáze - dodatek č.3:	28.9.2020
Doba pro dokončení II. sekce Stavby (=práci):	22.10.2020
Doba pro dokončení II. sekce Díla:	3.12.2020
Doba realizace II. sekce Díla:	16 týdnů + 6 týdnů
Doba pro dokončení Stavby (= práci):	22.10.2020
Doba pro dokončení Díla:	3.12.2020
Doba realizace Díla:	28 týdnů + 6 týdnů + 6 týdnů

Popis fází II. sekce - rok 2020:	
1. pracovní fáze stavby	km 3,150 - km 3,347
2. pracovní fáze stavby	km 2,667 - km 2,820
3. pracovní fáze stavby	km 2,820 - km 2,980
4. pracovní fáze stavby	km 2,980 - km 3,150
pro všechny pracovní fáze stavby	km 2,667 - km 3,347
