

Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

zastoupený: Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem kraje

IČ: 708 89 546

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále též „objednatel“)

a

Průmstav Náchod s.r.o.

se sídlem: Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod

zastoupený: Vratislavem Zítkou, jednatelem

IČ: 252 75 062

DIČ: CZ25275062

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 12145

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále též „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 7 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 31. 1. 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 17. 9. 2020, dodatku č. 2 ze dne 22. 10. 2020, dodatku č. 3 ze dne 16. 2. 2021, dodatku č. 4 ze dne 21. 6. 2021, dodatku č. 5 ze dne 16. 8. 2021 a dodatku č. 6 ze dne 27. 10. 2021, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky nazvané: **Poradenské a vzdělávací centrum Královéhradeckého kraje při PPP v Trutnově – stavební práce**. Veřejná zakázka byla oznámena ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2019-037563 (dále jen „veřejná zakázka“).

I.

Účel dodatku

1. Tento dodatek je dále uzavírán dle čl. 6 odst. 6.3 a odst. 6.4 a čl. 16 odst. 16.2 původní smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění

pozdějších předpisů (dále též jako „zákon“) v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací – víceprací, méněprací a nutných změn.

Jedná se o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50 % původní ceny veřejné zakázky, podle § 222 odst. 6 zákona, a dále změny, spočívající ve stavebních pracích a s nimi souvisejícími dodávkami a službami, které nebudou realizovány s ohledem na změny podle tohoto odstavce, a které proto zadavatel, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní ceny veřejné zakázky, podle § 222 odst. 6 zákona – práce podle Změnového listu č. 48 až č. 59.

2. Celkový cenový nárůst v souvislosti se změnami podle odst. 1 tohoto článku nepřesáhne 30 % původní ceny závazku.
3. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou změnové listy č. 48 až č. 59, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
4. Změny podle odst. 1 tohoto článku činí:
vícepráce: 696 321,58 Kč bez DPH
méněpráce: - 132 609,64 Kč bez DPH
5. Celková smluvní cena se tedy **navyšuje o 563 711,94 Kč bez DPH.**

II.

Vymezení rozsahu změn

Čl. 6 odst. 6.2 původní smlouvy se mění a nově zní takto:

Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí:

Cena celkem: 56 189 190,27 Kč bez DPH

(slovy: padesátšestmilionůstoosmdesátdevěttisícstodevadesát korun českých dvacetsedm haléřů)

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/35/1966/2020 ze dne 7. 12. 2020.


Přílohy tohoto dodatku:

Příloha č. 1: Změnový list č. 48 až č. 59

Příloha č. 2: Změny závazků ze smlouvy

Za objednatele:

V Hradci Králové dne



Královéhradecký kraj
Mgr. Martin Červíček
hejtman

Za zhotovitele:

V Náchodě dne

15.12.2021



Průmstav Náchod s.r.o.
Vratislav Zítka
jednatel

"Poradenské centrum KHK při PPP Trutnov"

Soupis změnových listů - dodatek č.7 k SoD

Návrh ZL č.	ZL	Název	Celková cena bez DPH
ZL 48		natíraný sokl u epoxidových podlah	111 660,70 Kč
ZL 49		EI doplnění kabeláže k osvětlení	31 588,59 Kč
ZL 50		SDK podhledy	85 081,45 Kč
ZL 51		zamezení přístupu do úzkého prostoru u opěrné zdi	19 145,60 Kč
ZL 52		propojení rozvaděčů pojistkové skříně a elektroměrného rozvaděče	13 239,06 Kč
ZL 53		základové konstrukce pod vnější kamenné schodiště	48 022,83 Kč
ZL 54		SDK podhled v m.č. 1.13	-2 643,73 Kč
ZL 55		žaluzie	2 067,73 Kč
ZL 56		penetrace pod plovoucí podlahy	151 424,97 Kč
ZL 57		doplnění palisád kolem lípy	45 035,01 Kč
ZL 58		sešívání trhlín v podlaze, přechodové lišty	49 879,70 Kč
ZL 59		drobné zámečnické konstrukce - dokončovací práce	9 210,03 Kč
Dodatek č.7			563 711,94

V Náchodě dne 10.12.2021





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL : 48
Název projektu:	Poradenské a vzdělávací centrum Královéhradeckého kraje při PPP v Trutnově, reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0011193	
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., IČ: 25275062	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, IČ : 70889546	
Změnový list vystavil:	Ing. Kateřina Meierová	
Datum:	10.12.2021	
Předmět změny: natíraný sokl u epoxidových podlah		
Popis a zdůvodnění změny: Původní sokl z epoxidové stěrky bude nahrazen natíraným polyuretanovým soklem. Z hygienických a provozních důvodů doplňujeme natíraný polyuretanový sokl i do místností s podlahou s PU stěrkou (v tendrovém výkazu výměr nebylo uvažováno).		
Přílohy změnového listu: rozpočet - ZL 48		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-12 729,32,- Kč	124 390,02,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
111 660,70,- Kč	bez dopadu do termínu	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele: Veronika Jandrová	Za zhotovitele: Vratislav	
Datum: 14. 12. 2021	Datum: 14. 12. 2021	
Za autorský dozor: Martin Just – ATIP a.s.	Za technický dozor stavebníka: Ing. Luboš Kasper	
Datum: 14. 12. 2021	Datum: 14. 12. 2021	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby
Název objektu

Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov
ZL 48 - natíraný sokl u epoxidových podlah

JKSO 801 39 12

EČO

Místo

Trutnov

IČO

DIČ

Objednatel

Královohradecký kraj, Hradec Králové

Projektant

ATIP a.s., Trutnov

Zhotovitel

Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracoval

70889546

25261568

25275062

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	11 477,70	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	79 698,84	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	22 523,29	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	-2 039,13	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		111 660,70	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 111 660,70

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	111 660,70	23 448,75

Cena s DPH 135 109,45

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt: ZL 48 - natíraný sokl u epoxidových podlah

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: Trutnov

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

87 640,34

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

61 613,37

20	014	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	356,229	172,96	61 613,37
----	-----	-----------	--	---	---------	--------	-----------

"NOVÁ POLOŽKA

"Oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/2 x index 0,92

356,229

356,229

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

25 890,72

18	211	931994141	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry pracovní do 1,5 cm2	m	356,229	72,68	25 890,72
----	-----	-----------	--	---	---------	-------	-----------

"NOVÁ POLOŽKA

"Oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/2 x index 0,92

"0.01" (7,46+4,1)*2+0,55*2-0,7-0,8-1,2

21,520

"0.03" (8,91+4,175)*2+0,55*2+0,25*2-0,8*2

26,170

"0.05" (5,26+4,175)*2+0,55*2-0,8*2

18,370

"0.08" 3,975*2+6,04-0,8+3,14*1,6

18,214

"0.15" (2,61+2,405+0,55)*2-0,7

10,430

"1.04" (3,35+5,005+0,55)*2-0,9

16,910

"1.05" (4,925+5,71)*2+0,55*2-0,9

21,470

"1.06" 5,05*2+3,58*2+0,55*2-0,9-0,8

16,660

"1.07" 4,61+2,695+1,1+4,7+0,15+1,3-0,8

13,755

"1.21" (1,35+0,875)*2-0,8

3,650

"4.16" 7,875+1,23+5,0+5,9+5,86-0,9

24,965

"4.17" (8,2+5,41)*2-0,9

26,320

Mezisoučet

218,434

"vytažení na sokl"

"schodiště levá část"

9*(0,3+0,17)

28,530

(2*1,5+3-0,9)

5,100

2*10*(0,3+0,17)

9,400

(1,1*2+2,405)

4,605

2*10*(0,3+0,17)

9,400

(2,8+2*1,4+0,9)

6,500

(1,1*2+2,425)

4,625

2*10*(0,3+0,17)

9,400

(2,8+2*1,3-0,9)

4,500

(2*1,1+2,425)

4,625

(2,8+2*1,4-0,9)

4,700

"schodiště pravá část

(13+12)*(0,32+0,17)

12,250

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			(3,4+2*1,4)		6,200		
			(12+12)*(0,32+0,17)		11,760		
			(3,4+2*1,4)+2		8,200		
			"vyrovnávací schodiště 2. a 3.NP"				
			2*8*(0,3+0,2)		8,000		
			Mezisoučet		137,795		
			Součet		356,229		

998 Přesun hmot 136,25

21	R	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	0,545	250,00	136,25
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

PSV Práce a dodávky PSV 20 484,16

777 Podlahy lité -12 729,32

11	R	777611201R	Kompl. dod. + mtž. krycí nátěr se vsypem vč. penetrace NÁTĚR 1	m2	-11,581	1 090,00	-12 623,29
----	---	------------	---	----	---------	----------	------------

"vytažení na sokl"

"schodiště levá část"

-9*(0,3+0,17)*0,1

-2,853

-(2*1,5+3-0,9)*0,1

-0,510

-2*10*(0,3+0,17)*0,1

-0,940

-(1,1*2+2,405)*0,1

-0,461

-2*10*(0,3+0,17)*0,1

-0,940

-(2,8+2*1,4+0,9)*0,1

-0,650

-(1,1*2+2,425)*0,1

-0,463

-2*10*(0,3+0,17)*0,1

-0,940

-(2,8+2*1,3-0,9)*0,1

-0,450

-(2*1,1+2,425)*0,1

-0,463

-(2,8+2*1,4-0,9)*0,1

-0,470

"schodiště pravá část"

-(13+12)*(0,32+0,17)*0,1

-1,225

-(3,4+2*1,4)*0,1

-0,620

-(12+12)*(0,32+0,17)*0,1

-1,176

-(3,4+2*1,4)*0,1+2

1,380

"vyrovnávací schodiště 2. a 3.NP"

-2*8*(0,3+0,2)*0,1

-0,800

Součet

-11,581

2	R	998777203	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	-126,230	0,84	-106,03
---	---	-----------	--	---	----------	------	---------

783 Dokončovací práce - nátěry 33 213,48

8	783	783000121	Zakrývání konstrukcí včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo prvků olepením páskou nebo fólií	m	712,458	10,76	7 666,05
---	-----	-----------	---	---	---------	-------	----------

"NOVÁ POLOŽKA"

"Oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/2 x index 0,92

2*356,229

712,458

19	596	59660029	páska univerzální lepicí a připojovací 60mm/30m	m	783,704	14,72	11 536,12
----	-----	----------	---	---	---------	-------	-----------

"NOVÁ POLOŽKA"

"Oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/2 x index 0,92

712,458*1,1

783,704

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
3	783	783801201	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru obroušení	m2	21,375	18,22	389,45

"NOVÁ POLOŽKA

"Oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/2 x index 0,92

21,375

21,375

4	783	783813131	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický	m2	21,375	71,39	1 525,96
---	-----	-----------	--	----	--------	-------	----------

"NOVÁ POLOŽKA

"Oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/2 x index 0,92

"0.01" $((7,46+4,1)*2+0,55*2-0,7-0,8-1,2)*0,06$

1,291

"0.03" $((8,91+4,175)*2+0,55*2+0,25*2-0,8*2)*0,06$

1,570

"0.05" $((5,26+4,175)*2+0,55*2-0,8*2)*0,06$

1,102

"0.08" $(3,975*2+6,04-0,8+3,14*1,6)*0,06$

1,093

"0.15" $((2,61+2,405+0,55)*2-0,7)*0,06$

0,626

"1.04" $((3,35+5,005+0,55)*2-0,9)*0,06$

1,015

"1.05" $((4,925+5,71)*2+0,55*2-0,9)*0,06$

1,288

"1.06" $(5,05*2+3,58*2+0,55*2-0,9-0,8)*0,06$

1,000

"1.07" $(4,61+2,695+1,1+4,7+0,15+1,3-0,8)*0,06$

0,825

"1.21" $((1,35+0,875)*2-0,8)*0,06$

0,219

"4.16" $(7,875+1,23+5,0+5,9+5,86-0,9)*0,06$

1,498

"4.17" $((8,2+5,41)*2-0,9)*0,06$

1,579

Mezisoučet

13,106

"vytažení na sokl"

"schodiště levá část"

$9*(0,3+0,17)*0,06$

1,712

$(2*1,5+3-0,9)*0,06$

0,306

$2*10*(0,3+0,17)*0,06$

0,564

$(1,1*2+2,405)*0,06$

0,276

$2*10*(0,3+0,17)*0,06$

0,564

$(2,8+2*1,4+0,9)*0,06$

0,390

$(1,1*2+2,425)*0,06$

0,278

$2*10*(0,3+0,17)*0,06$

0,564

$(2,8+2*1,3-0,9)*0,06$

0,270

$(2*1,1+2,425)*0,06$

0,278

$(2,8+2*1,4-0,9)*0,06$

0,282

"schodiště pravá část"

$(13+12)*(0,32+0,17)*0,06$

0,735

$(3,4+2*1,4)*0,06$

0,372

$(12+12)*(0,32+0,17)*0,06$

0,706

$((3,4+2*1,4)+2)*0,06$

0,492

"vyrovnávací schodiště 2. a 3.NP"

$2*8*(0,3+0,2)*0,06$

0,480

Mezisoučet

8,269

Součet

21,375

7	783	783897611	Krycí (ochranný) nátěr omítek Příplatek k cenám za provádění barevného nátěru v odstínu středně sytém dvojnásobného	m2	21,375	14,81	316,56
---	-----	-----------	---	----	--------	-------	--------

"NOVÁ POLOŽKA

"Oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/2 x index 0,92

21,375

21,375

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
17	783	783947161	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný polyuretanový vodou ředitelný	m2	21,375	551,08	11 779,34

"NOVÁ POLOŽKA

"Oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/2 x index 0,92

21,375

21,375

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

3 536,20

13	R	R.0010	Jiné VRN ve výši 3,17%	%	1 115,520	3,17	3 536,20
----	---	--------	------------------------	---	-----------	------	----------

Celkem

111 660,70



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL : 49
Název projektu:	Poradenské a vzdělávací centrum Královéhradeckého kraje při PPP v Trutnově, reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0011193	
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., IČ: 25275062	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, IČ : 70889546	
Změnový list vystavil:	Ing. Kateřina Meierová	
Datum:	10.12.2021	
Předmět změny: EI - doplnění kabeláže k osvětlení		
Popis a zdůvodnění změny: Doplnění světelných okruhů a kabeláž mezi rozvaděčem a ovládáním osvětlení. V tendrovém výkazu výměr nebyla tato kabeláž započítána.		
Přílohy změnového listu: rozpočet - ZL 49		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	31 588,59,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
31 588,59,- Kč	bez dopadu do termínu	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele: Veronika Janderová		
Datum: 14.12.		
Za autorský dozor: Martin Just – ATIP a		
Datum: 14.12.2021		
		Datum: 17.12.21

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

JKSO

801 39 12

Název objektu

ZL 49 - EI doplnění kabeláže k osvětlení

EČO

Místo

Trutnov

IČO

DIČ

Objednatel

Královehradecký kraj, Hradec Králové

70889546

Projektant

ATIP a.s., Trutnov

25261568

Zhotovitel

Průmstav Náchod s.r.o.

25275062

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	31 588,59	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		31 588,59	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 31 588,59

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	31 588,59	6 633,60

Cena s DPH 38 222,19

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt: ZL 49 - EI doplnění kabeláže k osvětlení

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: Trutnov

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D1 Elektrické rozvody a zařízení 30 618,00

D3 320. Kabely a vodiče 30 618,00

1	R	741 12-2015.1	Kabel instalační, izolace PVC, CYKY-J 3x1,5, pod omítku	m	1 012,500	30,24	30 618,00
			"TENDROVÁ POLOŽKA"				

"1.PP" 10+8+6+12+16+14+8+9+11 94,000

"1.NP"
5+10+19+18+13+11+5+14+22+15+17+4+6+12+4+10+2+
6+11+13+8+12+21 258,000

"2.NP"
8+6*2+20+14+12+7+10+6+8+5*4+3+8+11+7+16+5+4+1,
5+8+5+9++2+2+4+8+10+14+17 251,500

"3.NP"
2++7+10+13+17+20+22+24+16+13+10+8+8+6+5*2+10+
8+2+2+12+15+4*4 251,000

"4.NP" 4+8+9+13+17+19+18+15+9+5+6+10+25 158,000

Součet 1 012,500

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 970,59

2	R	R.0010	Jiné VRN ve výši 3,17%	%	306,180	3,17	970,59
---	---	--------	------------------------	---	---------	------	--------

Celkem 31 588,59



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL : 50
Název projektu:	Poradenské a vzdělávací centrum Královéhradeckého kraje při PPP v Trutnově, reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0011193	
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., IČ: 25275062	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, IČ : 70889546	
Změnový list vystavil:	Ing. Kateřina Meierová	
Datum:	10.12.2021	
Předmět změny: SDK podhledy		
Popis a zdůvodnění změny: Bylo dohodnuto, že potrubní instalace vedoucí pod stropem a svisle po zdech budou z estetických důvodů v nezbytně nutných případech zakryty SDK podhledem, předsazenou stěnou nebo kastlíkem. Do SDK podhledů budou osazeny revizní dvířka.		
Přílohy změnového listu: rozpočet - ZL 50		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-18 137,50,- Kč	103 218,95,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
85 081,45,- Kč	bez dopadu do termínu	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele: Veronika Janderová	Za zhotovitele:	
Datum: 14.		
Za autorský dozr Martin Just – AT		
Datum: 14.		

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov**

Název objektu **ZL 50 - SDK podhledy**

JKSO

801 39 12

EČO

Místo

Trutnov

IČO

DIČ

Objednatel **Královohradecký kraj, Hradec Králové**

Projektant **ATIP a.s., Trutnov**

Zhotovitel **Průmstav Náchod s.r.o.**

Zpracoval

70889546

25261568

25275062

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	-15 523,30	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	36 572,68	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	64 032,07	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		85 081,45	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH **85 081,45**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	85 081,45	17 867,10

Cena s DPH **102 948,55**

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt: ZL 50 - SDK podhledy

Objednatel: Královéhradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: Trutnov

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV -18 137,50

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -18 134,25

3	R	611381021R	Sádrová tenkovrstvá omítka tl. 5 mm - stropy	m2	-72,537	250,00	-18 134,25
			"TENDROVÁ POLOŽKA				

"1.14"	-8,3	-8,300
"1.15"	-10,1	-10,100
"2.01 - u výtahu"	-1,8*2,4	-4,320
"2.06"	-2,05*1,98-0,5*0,5	-4,309
"2.07"	-3,2*1,795	-5,744
"2.13"	-1,9*0,4-1,725*0,5	-1,623
"2.14"	-1,8*2,605-2,53*2,605	-11,280
"2.15"	-1,8*2,32	-4,176
"3.14"	-2,91*1,83	-5,325
"3.21"	-2,45*1,895-1,8*0,4	-5,363
"3.22"	-1,55*2,675-2,935*2,675	-11,997
Součet		-72,537

998 Přesun hmot -3,25

4	R	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	-0,013	250,00	-3,25
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 100 604,75

763 Konstrukce suché výstavby 100 604,75

13	763	763121413	Stěna předsažená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 87,5 mm, profil 75	m2	16,300	541,88	8 832,64
			"NOVÁ POLOŽKA				
			"oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/2 x 0,92				

"2.17"	4,9*1,0	4,900
"3.22"	1,8	1,800
"1.09"	5,6	5,600
"4.09, 4.10"	4,0	4,000
Součet		16,300

12	763	763131414	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 15 mm, bez izolace	m2	69,944	737,84	51 607,48
			"NOVÁ POLOŽKA				
			"oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/2 x 0,92				

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem

"1.14"	8,3	8,300
"1.15"	10,1	10,100
"2.01 - u výtahu"	1,8*2,4	4,320
"2.06"	2,05*1,98	4,059
"2.07"	3,2*1,795	5,744
"2.14"	1,8*2,605+2,53*2,605	11,280
"2.15"	1,8*2,32	4,176
"3.14"	2,91*1,83	5,325
"3.21"	2,45*1,895	4,643
"3.22"	1,55*2,675+2,935*2,675	11,997
Součet		69,944

10	763	763164561	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8 m, opláštěný deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm	m2	34,600	712,08	24 637,97
			"NOVÁ POLOŽKA				
			"oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/2 x 0,92				

"2.06"	2,1	2,100
"2.13"	3,8	3,800
"3.21"	1,8	1,800
"1.01"	1,7	1,700
"1.08"	4,7	4,700
"3.19"	3,7	3,700
"stoupačky u Geberitu"	16,8	16,800
Součet		34,600

16	763	763172352	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro podhledy velikost (šxv) 300 x 300 mm	kus	10,000	332,12	3 321,20
			"NOVÁ POLOŽKA				
			"oceněno dle URS, CU 2021/2 x 0,92				

10 10,000

17	RGS	RGS.KB5103 20	revizní dvířka s automat. zámkem bez požár. odolnosti 300x300 mm	kus	10,000	815,04	8 150,40
			"NOVÁ POLOŽKA				
			"oceněno dle URS, CU 2021/2 x 0,92				

10 10,000

9	R	998763403	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	965,490	4,20	4 055,06
---	---	-----------	--	---	---------	------	----------

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 614,20

14	R	R.0010	Jiné VRN ve výši 3,17%	%	824,670	3,17	2 614,20
----	---	--------	------------------------	---	---------	------	----------

Celkem 85 081,45



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL : 51
Název projektu:	Poradenské a vzdělávací centrum Královéhradeckého kraje při PPP v Trutnově, reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0011193	
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., IČ: 25275062	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, IČ : 70889546	
Změnový list vystavil:	Ing. Kateřina Meierová	
Datum:	10.12.2021	
Předmět změny: zamezení přístupu do úzkého prostoru u opěrné zdi		
Popis a zdůvodnění změny: Ve volně přístupné části areálu bude z bezpečnostních důvodů osazena uzamykatelná branka , které zamezí přístupu do úzkého prostoru mezi objektem a opěrnou zdí.		
Přílohy změnového listu: rozpočet - ZL 51 nab. dodavatele		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	19 145,60,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
19 145,60,- Kč	bez dopadu do termínu	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele: Veronika Jander	Za zhotovitele:	
Datum:		
Za autorský doz Martin Just – AT		
Datum:		

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov**

JKSO

801 39 12

Název objektu **ZL 51 - zamezení přístupu do úzkého prostoru mezi objektem a opěrnou zdi**

EČO

Místo

Trutnov

IČO

DIČ

Objednatel **Královohradecký kraj, Hradec Králové**

70889546

Projektant **ATIP a.s., Trutnov**

25261568

Zhotovitel **Průmstav Náchod s.r.o.**

25275062

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	75,12	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	784,16	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	130,15	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	18 156,17	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		19 145,60	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 19 145,60

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	19 145,60	4 020,58

Cena s DPH 23 166,18

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt: ZL 51 - zamezení přístupu do úzkého prostoru mezi objektem a opěrnou zdí

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: Trutnov

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 271,02

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 271,02

4	011	953961112	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 10, hloubka 90 mm	kus	6,000	45,17	271,02
			"NOVÁ POLOŽKA				
			"oceněno dle URS, CU 2021/2 x index 0,92				
6					6,000		

PSV Práce a dodávky PSV 18 286,32

767 Konstrukce zámečnické 18 286,32

1	R	767.501	M+D plotového dílu 110x300 cm, rám jeří 30/2, výplň svařovaná síť 40/40/3 mm, horní pevný díl s botčí proti přelezení, žárový zinek	kplť	1,000	17 610,00	17 610,00
			"NOVÁ POLOŽKA				
			"dle nabídky subdodavatele + 10% obchodní marže				
1					1,000		
7	767	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	3,000	130,64	391,92
			"NOVÁ POLOŽKA				
			"oceněno dle URS, CU 2021/2 x index 0,92				
3					3,000		
6	311	31197003	tyč závitová Pz 4.6 M10	m	1,800	37,54	67,57
			"NOVÁ POLOŽKA				
			"oceněno dle URS, CU 2021/2 x index 0,92				
0,3*6					1,800		
2	R	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	180,690	1,20	216,83

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 588,26

3	R	R.0010	Jiné VRN ve výši 3,17%	%	185,570	3,17	588,26
---	---	--------	------------------------	---	---------	------	--------

Celkem 19 145,60

Katerina Meierova

Od: [REDACTED]
Odesláno: středa 20. října 2021 19:58
Komu: Katerina Meierova
Předmět: Re: PPP Trutnov - branka do úzkého prostoru za budovou

Zdravím.

Posílám cenu za branku do prostoru za budovou= 16009,-

- jekl - rám 30/2, výplň síť svařovaná 40/40/3 mm ,
- kladka, panty, z hora ostré botce proti přeлезení ,
- žárový zinek.
- Montáž.

Děkuji a pěkný den.

Tylš J.

----- Původní e-mail -----

Od: Katerina Meierova [REDACTED]
Komu: TYLŠ zámečník <[REDACTED]>
Datum: 18. 10. 2021 11:09:54
Předmět: PPP Trutnov - branka do úzkého prostoru za budovou

Dobrý den.

Na akci „**Poradenské centrum KHK při PPP v Trutnově**“ bychom potřebovali vyrobit ještě jeden prvek.

Jedná se o opatření, aby nebyl volný přístup do úzkého prostoru mezi budovou a opěrnou zdí.

Průchod se široký 110 cm.

Naše představa je taková, že by se po římsu (cca 180 cm) udělala uzamykatelná branka (visací zámek) a nad ní pevná část.

Realizace : nejpozději leden 2021

Až budete v Trutnově, tak Vám to chlapi ukážou, aby jste si to mohli zaměřit.

V příloze zasílám „náskres“...

Prosím o cenovou nabídku (aspoň „náštel“)

Předem děkuji a přeji pěkný den!



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL : 52
Název projektu:	Poradenské a vzdělávací centrum Královéhradeckého kraje při PPP v Trutnově, reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0011193	
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., IČ: 25275062	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, IČ : 70889546	
Změnový list vystavil:	Ing. Kateřina Meierová	
Datum:	10.12.2021	
Předmět změny: propojení rozvaděčů pojistkové skříně a elektroměrného rozvaděče		
Popis a zdůvodnění změny: Původně měl ČEZ distribuce dodávat a osazovat novou pojistkovou skříň. Po schůzce na stavbě bylo rozhodnuto, že se využije stávající pojistková skříň, je ale nutné udělat úpravy v elektroinstalaci obsahující kabeláže a zemnění.		
Přílohy změnového listu: rozpočet - ZL 52 CN dodavatele		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	13 239,06,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
13 239,06,- Kč	bez dopadu do termínu	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele: Veronika Jandová	Za zhotovitele:	
Datum:		
Za autorský doz. Martin Just – AT		
Datum: 14.12.2021	Datum: 17.12.21	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov	JKSO	801 39 12
Název objektu	ZL 52 - Propojení rozvaděčů pojistkové skříně a elektroměrného rozvaděče	EČO	
		Místo	Trutnov
		IČO	DIČ
Objednatel	Královéhradecký kraj, Hradec Králové	70889546	
Projektant	ATIP a.s., Trutnov	25261568	
Zhotovitel	Průmstav Náchod s.r.o.	25275062	
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	7 790,82	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		7 790,82	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		5 448,24	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 13 239,06			
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	15,0	0,00	0,00
				základní	21,0	13 239,06	2 780,20
				Cena s DPH 16 019,26			
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel		0,00	
				Klouzavá doložka		0,00	
				Zvýhodnění		0,00	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt: ZL 52 - Propojení rozvaděčů pojistkové skříně a elektroměrného rozvaděče

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: Trutnov

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D1 Venkovní osvětlení

7 384,05

D2 310. Elektroinstalační úložný materiál

6 261,75

1	R	741 11-0302	Ohebná dvoupáštiová korugovaná chránička, Ø50 -, kód EL312 151 dle knihy specifikací	m	5,000	29,21	146,05
			"TENDROVÁ POLOŽKA				

5

5,000

5	R	741.01	spojka kabelová trhací spojovače svařená do CY 5x25	kplt	1,000	1 725,00	1 725,00
			"NOVÁ POLOŽKA				
			"dle nabídky subdodavatele + 15% obchodní marže"				

1

1,000

6	R	741.02	kabel CYKY 5*25	m	6,000	469,20	2 815,20
			"NOVÁ POLOŽKA				
			"dle nabídky subdodavatele + 15% obchodní marže"				

6

6,000

8	R	741.3	vyrovnání potenciálu a zemnění	kplt	1,000	1 575,50	1 575,50
			"NOVÁ POLOŽKA				
			"dle nabídky subdodavatele + 15% obchodní marže"				

1

1,000

D6 Zemní a pomocné stavební práce

1 122,30

9	R	460 15-0183	Hloubení kabelových rýh ručně, s přemístěním výkopku do 3m, šířky 35cm, hloubky 100cm, v hornině třídy 3	m	6,000	110,16	660,96
			"tendrová položka				

6

6,000

10	R	460 56-0183	Zásyp kabelových rýh ručně, s uložením výkopku ve vrstvách, včetně zhutnění a urovnání povrchu, šířky 35cm, hloubky 100cm, v hornině třídy 3	m	6,000	63,55	381,30
			"tendrová položka				

6

6,000

3	R	460 42-1201	Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z, prohozeného výkopku tloušťka 5cm nad kabel, šířky do 65cm	m	6,000	13,34	80,04
			"tendrová položka				

6

6,000

HZS Hodinové zúčtovací sazby

5 448,24

7	HZS	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník	hod	8,000	333,96	2 671,68
			"položka ze ZL 24"				

8

8,000

12	HZS	HZS3132	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení při externích montážích elektromontér VN a VVN odborný	hod	6,000	462,76	2 776,56
			"NOVÁ POLOŽKA				

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"oceněno dle URS, ČU 2021/2 x index 0,92				
			6		6,000		

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 406,77

11	R	R.0010	Jiné VRN ve výši 3,17%	%	128,320	3,17	406,77
----	---	--------	------------------------	---	---------	------	--------

Celkem 13 239,06



PODKLAD PRO FAKTURACI

IČ: 48170241, DIČ: CZ48170241

Žižkova 532, 54101 Trutnov

Petr Štoviček

mail: [REDACTED]

příjemce: PRŮMSTAV NÁCHOD

PPP VCP

č.	položka	počet mj	cena za mj	cena celkem
PROPOJENÍ ROZVÁDĚČŮ POJISTKOVÉ SKŘÍNĚ A ELEKTROMĚROVÉHO ROZVÁDĚČE				
1	spojka kabelová trhací spojovače svařená do CY 5x25	1 kpl	1 500,00	1 500,00
2	CYKY 5X25	6 m	408,00	2 448,00
3	chránička korugovaná KOPOS P50 rudá	5 m	21,00	105,00
4	řezání v konstrukcích a stavební přípomoc	8 hod	350,00	2 800,00
5	vyrovnání potenciálu a zemnění	1 kpl	1 370	1 370,00
6	přesuny a doprava	1 kpl	200	200,00
7	montáže	6 hod	450	2 700,00
7	výkopové a zemní práce	1 kpl	2 050,00	2 050,00

celkem bez dph

13 173 Kč

v Trutnově 09.12.2021



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL : 53
Název projektu:	Poradenské a vzdělávací centrum Královéhradeckého kraje při PPP v Trutnově, reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0011193	
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., IČ: 25275062	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, IČ : 70889546	
Změnový list vystavil:	Ing. Kateřina Meierová	
Datum:	10.12.2021	
Předmět změny: základové konstrukce pod vnější kamenné schodiště		
Popis a zdůvodnění změny: Po vybourání kamenných stupňů venkovního schodiště nebyla zachycena nosná konstrukce schodů. Bude tedy provedena nová základová konstrukce a boční zídka . V tomto ZL jsou potřebné konstrukce dopočítány.		
Přílohy změnového listu: rozpočet - ZL 53 CN dodavatele – schodišťové madlo		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	48 022,83,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
48 022,83,- Kč	bez dopadu do termínu	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele: Veronika Jandová	Za zhotovitele:	
Datum:		
Za autorský d Martin Just –		
Datum:		

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov**

Název objektu **ZL 53 - základové konstrukce pod vnější kamenné schodiště**

JKSO 801 39 12

EČO

Místo

Trutnov

IČO

DIČ

Objednatel Královehradecký kraj, Hradec Králové

Projektant ATIP a.s., Trutnov

Zhotovitel Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracoval

70889546

25261568

25275062

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	26 380,20	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	12 181,88	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	1 221,99	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	8 238,76	11		0,00		16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		48 022,83	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 48 022,83

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižovaná	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	48 022,83	10 084,79

Cena s DPH 58 107,62

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt: ZL 53 - základové konstrukce pod vnější kamenné schodiště

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: Trutnov

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

37 086,54

2 Zakládání

27 124,63

1	011	273321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,900	2 980,80	2 682,72
			"NOVÁ POLOŽKA				
			"Oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/2 x index 0,92				
			"betonová deska pod schodištěm				
			1,8*2,5*0,2		0,900		
2	011	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	0,924	361,00	333,56
			"TENDROVA POLOŽKA				
			(2,5+1,8+0,32)*0,2		0,924		
3	011	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	0,924	103,00	95,17
			"TENDROVA POLOŽKA				
			0,924		0,924		
5	011	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,026	30 000,00	780,00
			"TENDROVA POLOŽKA				
			(2,5*1,8)*1,3*4,44/1000		0,026		
6	011	279113144	Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm	m2	5,262	1 407,60	7 406,79
			"NOVÁ POLOŽKA				
			"Oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/2 x index 0,92				
			0,68*1,18+1,8*1,18/2		1,864		
			1,3*1,18		1,534		
			0,68*1,18+1,8*1,18/2		1,864		
			Součet		5,262		
7	011	279361221	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebor z betonářské oceli 10 216 (E)	t	0,342	46 276,00	15 826,39
			"NOVÁ POLOŽKA				
			"Oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/2 x index 0,92				
			"50 kg/m2"				
			5,262*50*1,3/1000		0,342		

3 Svislé a kompletní konstrukce

3 560,25

42	011	311113132	Nadzákladové zdi z tvárnice ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm	m2	2,338	1 021,20	2 387,57
			"NOVÁ POLOŽKA				
			"Oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/2 x index 0,92				
			0,68*1,48+1,8*1,48/2		2,338		

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
28	231	348272613	Platy z tvárnic betonových plotová stříška lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek broušených, plochých přírodních, tloušťka zdiva 195 mm	m	2,650	442,52	1 172,68
			"NOVÁ POLOŽKA				
			"Oceněno dle URS, CU 2021/2 x index 0,92				

0,7+1,95

2,650

4 Vodorovné konstrukce**1 786,00**

30	R	411321616	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hříbových stropů včetně hlavic hříbových sloupů tř. C 30/37	m3	0,144	4 000,00	576,00
			"TENDROVÁ POLOŽKA				

"podesta" 0,6*1,2*0,2

0,144

31	R	411351011	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení	m2	0,720	650,00	468,00
			"Tendrová položka				

"podesta" 1,2*0,6

0,720

32	R	411351012	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění	m2	0,720	150,00	108,00
			"Tendrová položka				

0,72

0,720

33	R	411354311	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm zřízení	m2	0,720	150,00	108,00
			"Tendrová položka				

0,72

0,720

34	R	411354312	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm odstranění	m2	0,720	50,00	36,00
			"Tendrová položka				

0,72

0,720

35	R	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trémových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hříbových včetně hlavic hříbových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,014	35 000,00	490,00
			"TENDROVÁ POLOŽKA				

0,177*80/1000

0,014

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování**výplní****2 748,66**

38	R	622511111	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrná stěn	m2	2,338	550,00	1 285,90
			"TENDROVÁ POLOŽKA				

0,68*1,48+1,8*1,48/2

2,338

8	R	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	4,394	55,90	245,62
			"TENDROVÁ POLOŽKA				
			"stávající pískovcové schodišťové stupně"				

6*(0,3+0,2)*1,3

3,900

1,3*0,38

0,494

Součet

4,394

g	R	629995215	Očištění vnějších ploch tryskáním křemičitým pískem nesusušeným (metodou torbo tryskání), povrchu kamenného přírodního měkkého	m2	4,394	277,00	1 217,14
			"TENDROVÁ POLOŽKA				

4,394

4,394

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

998 Přesun hmot 1 867,00

11	R	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	7,468	250,00	1 867,00
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

PSV Práce a dodávky PSV 9 460,75

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 701,99

39	711	711192102	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše svislé S jednovrstvá na zdivu	m2	2,338	181,24	423,74
			"NOVÁ POLOŽKA				
			"Oceněno dle URS, CU 2021/2 x index 0,92				

0,68*1,48+1,8*1,48/2 2,338

40	111	11163001	stěrka hydroizolační asfaltová dvousložková do spodní stavby	kg	14,145	86,39	1 221,99
			"NOVÁ POLOŽKA				
			"Oceněno dle URS, CU 2021/2 x index 0,92				

"spotřeba při utěsnění proti hromadící se spodní vodě - 5,5 kg/m2" 2,338*5,5*1,1 14,145

41	R	998711203	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m	%	16,450	3,42	56,26
----	---	-----------	---	---	--------	------	-------

767 Konstrukce zámečnické 6 001,16

36	R	767.5301	M+D schodišť. madla u kamenného schodiště	kplt	1,000	5 930,00	5 930,00
			"NOVÁ POLOŽKA				
			"oceněno dle nabídky dodavatele + 10% obchodní marže				

1 1,000

37	R	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	59,300	1,20	71,16
----	---	-----------	---	---	--------	------	-------

783 Dokončovací práce - nátěry 1 757,60

10	R	783827221R	Ochranný nátěr pískovcového soklu	m2	4,394	400,00	1 757,60
			"TENDROVÁ POLOŽKA				
			"nátěr pískovcových schodišťových stupňů"				

6*(0,3+0,2)*1,3 3,900

1,3*0,38 0,494


Součet 4,394

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 475,54

14	R	R.0010	Jiné VRN ve výši 3,17%	%	465,470	3,17	1 475,54
----	---	--------	------------------------	---	---------	------	----------

Celkem 48 022,83


Vypracoval: B. Šolc



Datum: 7.12.2021

CENOVÁ NABÍDKA

Průmstav Náchod s.r.o.
Kateřina Meierová
Dobrošovská 1776
547 01 Náchod



Akce : PPP Trutnov

		mj	množ.	Kč/mj	Kč
1.	nerez zábradlí kotvené na stěnu	kpl	1	5390,91	5390,91

Nabídka platí do 31.1.2022





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL : 54
Název projektu:	Poradenské a vzdělávací centrum Královéhradeckého kraje při PPP v Trutnově, reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0011193	
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., IČ: 25275062	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, IČ : 70889546	
Změnový list vystavil:	Ing. Kateřina Meierová	
Datum:	10.12.2021	
Předmět změny: SDK pohled v m.č. 1.13		
Popis a zdůvodnění změny: Obvodové zdívo m.č. 1.13 je stávající, přilehlé stěny nesvírají pravé úhly a protilehlé nejsou rovnoběžné. To způsobuje hlavně estetický problém při montáži akustického kazetového podhledu. Proto bude po obvodu místnosti provedena pomocná konstrukce ze SDK pohledu (viz. nákres).		
Přílohy změnového listu: rozpočet - ZL 54 náčrt nového řešení		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-25 154,22,- Kč	22 510,49,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-2 643,73,- Kč	bez dopadu do termínu	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele: Veronika Jander	Za zhotovitele:	
Datum:		
Za autorský dozor: Martin Just – AT		
Datum:		

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov	JKSO	801 39 12
Název objektu	ZL 54 - SDK podhled v m.č. 1.13	EČO	
		Místo	Trutnov
Objednatel	Královohradecký kraj, Hradec Králové	IČO	70889546
Projektant	ATIP a.s., Trutnov		25261568
Zhotovitel	Průmstav Náchod s.r.o.		25275062
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	-81,22	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	-13 221,74	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	10 659,23	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00%
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-2 643,73	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel			D Celkem bez DPH			-2 643,73
			DPH	%	Základ daně	DPH celkem
			snižovaná	15,0	0,00	0,00
			základní	21,0	-2 643,73	-555,18
			Cena s DPH			-3 198,91
			E Přípočty a odpočty			
			Dodá zadavatel			0,00
			Klouzavá doložka			0,00
			Zvýhodnění			0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt: ZL 54 - SDK pohled v m.č. 1.13

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: Trutnov

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV -2 562,51

763 Konstrukce suché výstavby -2 562,51

9	763	763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	17,370	689,08	11 969,32
			"NOVÁ POLOŽKA				
			"Oceněno dle URS, CU 2021/2 x index 0,92				

0,6*(4,3-1,0)	1,980
0,2*(6,5+7,0)	2,700
0,54*(6,5+7,0)	7,290
(0,2+0,2)*(6,5+7,0)	5,400
Součet	17,370

12	763	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	17,370	15,40	267,50
			"TENDROVÁ POLOŽKA				

0,6*(4,3-1,0)	1,980
0,2*(6,5+7,0)	2,700
0,54*(6,5+7,0)	7,290
(0,2+0,2)*(6,5+7,0)	5,400
Součet	17,370

11	763	763131712	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek napojení na jiný druh podhledu	m	56,780	110,40	6 268,51
			"NOVÁ POLOŽKA				
			"Oceněno dle URS, CU 2021/2 x index 0,92				

7,0+6,52-0,6	12,920
4,3-1,0	3,300
6,52+7,0	13,520
(6,52+7,0)*2	27,040
Součet	56,780

13	763	763131722	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu přes 0,5 m	m	13,520	296,24	4 005,16
			"NOVÁ POLOŽKA				
			"Oceněno dle URS, CU 2021/2 x index 0,92				

6,52+7,0	13,520
----------	--------

4	R	763135102	Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce polozapuštěné	m2	-18,468	390,00	-7 202,52
			"TENDROVÁ POLOŽKA				
			"tendr - odpočet				
			"SDK P3"				

-(6,5*4,3+6,5*0,54)	-31,460
---------------------	---------

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"SDK P2"				
			-(7*4,3+7*0,54)		-33,880		
			Mezisoučet		-65,340		
			"nové řešení"				
			"SDK P3"				
			(6,52-0,6)*3,0+6,52*0,6		21,672		
			"SDK P2"				
			7*(3,0+0,6)		25,200		
			Mezisoučet		46,872		
			Součet		-18,468		
5		59030570R1	podhled kazetový dle knihy specifikací AR277.0003	m2	-5,145	1 300,00	-6 688,50
			"TENDROVÁ POLOŽKA				
			"1,13"				
			"SDK P2"				
			"tendr - odpočet" -(7*4,3)*1,05		-31,605		
			"nové řešení" 7*(3+0,6)*1,05		26,460		
			Součet		-5,145		
6		59030570R2	podhled kazetový dle knihy specifikací AR277.0002	m2	-6,592	1 100,00	-7 251,20
			"TENDROVÁ POLOŽKA				
			"1,13"				
			"SDK P3"				
			"tendr - odpočet" -(6,5*4,3)*1,05		-29,348		
			"nové řešení" (6,52-0,6)*3,0*1,05+6,52*0,6*1,05		22,756		
			Součet		-6,592		
7		59030570R3	podhled kazetový dle knihy specifikací AR277.0001	m2	-7,655	500,00	-3 827,50
			"TENDROVÁ POLOŽKA				
			"1,13"				
			"tendr odpočet - svislá část podhedu"				
			-(6,5*0,54)*1,05		-3,686		
			-(7*0,54)*1,05		-3,969		
			Součet		-7,655		
8	R	998763403	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	-24,590	4,20	-103,28

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

-81,22

14	R	R.0010	Jiné VRN ve výši 3,17%	%	-25,620	3,17	-81,22
----	---	--------	------------------------	---	---------	------	--------

Celkem

-2 643,73

AKUSTICKÉ DESKY

SDK DESKY


OKNA

13200

1.13



H230

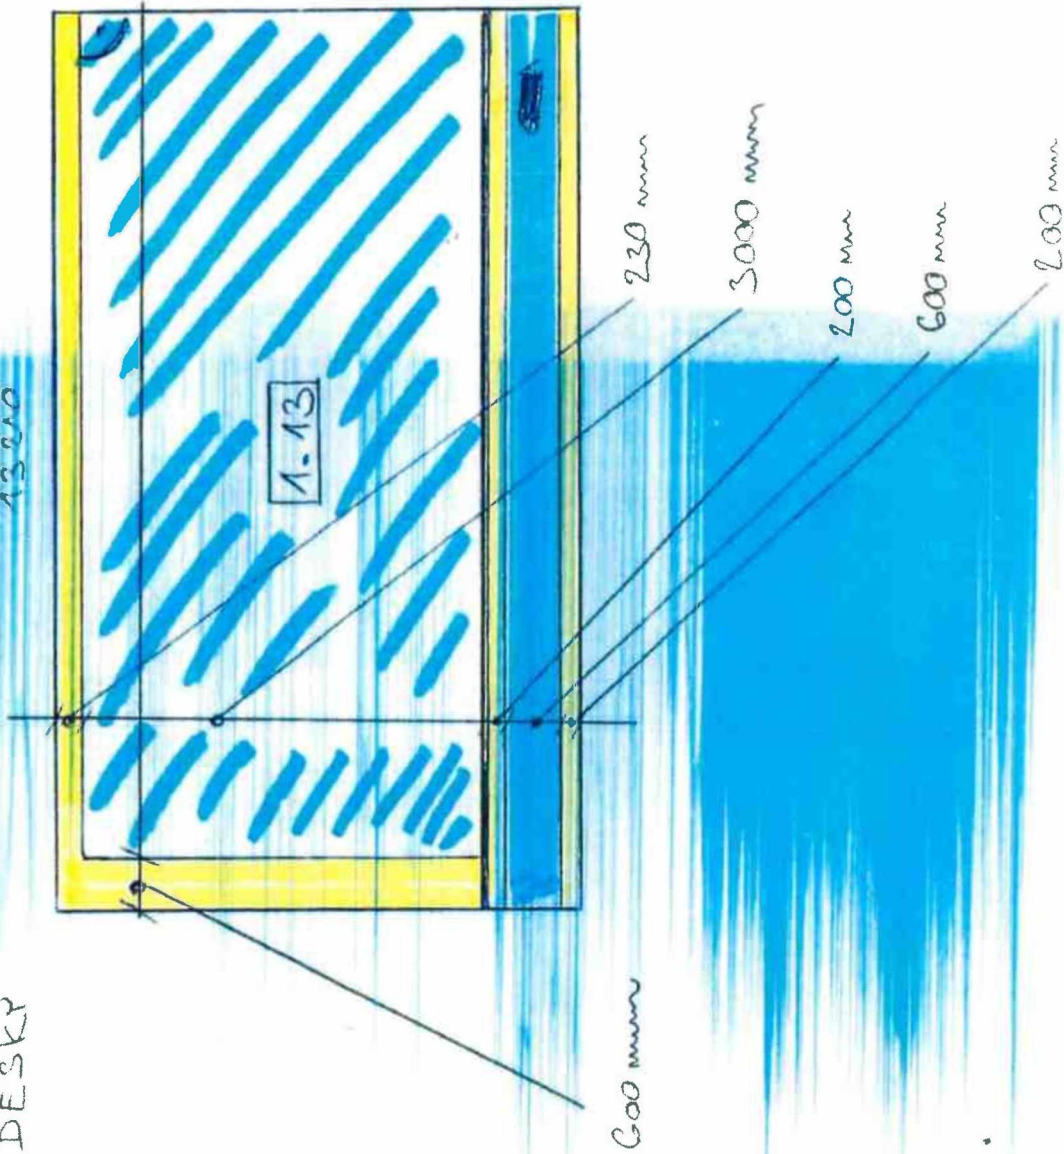



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL : 55
Název projektu:	Poradenské a vzdělávací centrum Královéhradeckého kraje při PPP v Trutnově, reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0011193	
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., IČ: 25275062	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, IČ : 70889546	
Změnový list vystavil:	Ing. Kateřina Meierová	
Datum:	10.12.2021	
Předmět změny: žaluzie		
Popis a zdůvodnění změny: V rekonstruovaném objektu je v místech stávajících ostění oken nedostatek prostoru a to neumožňuje zapsanou montáž vertikálních žaluzií . Osadí se proto horizontální žaluzie. Budou doplněny také žaluzie ke 2 nově vytvořeným oknům ve 2.NP.		
Přílohy změnového listu: rozpočet - ZL 55 CN dodavatele (použito s obchodní marží 10%)		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-76 588,60,- Kč	78 656,33,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
2 067,73,- Kč	bez dopadu do termínu	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele: Veronika Janderová	Za zhotovitele:	
Datum: 14.12.		
Za autorský dozor: Martin Just – ATIP		
Datum: 14.12.		

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov**

JKSO

801 39 12

Název objektu **ZL 55 - žaluzie**

EČO

Místo

Trutnov

IČO

DIČ

Objednatel **Královehradecký kraj, Hradec Králové**

70889546

Projektant **ATIP a.s., Trutnov**

25261568

Zhotovitel **Průmstav Náchod s.r.o.**

25275062

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	2 067,73	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		2 067,73	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH

2 067,73

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	2 067,73	434,22

Cena s DPH

2 501,95

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt: ZL 55 - žaluzie

Objednatel: Královohradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: Trutnov

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D1 Interiér

2 004,20

D3 002: Stínící technika

-76 588,60

1	R	Pol140	VZ1.01 - Vertikální žaluzie 1040x1590mm	ks	-5,000	1 524,60	-7 623,00
2	R	Pol141	VZ1.02 - Vertikální žaluzie 1040x1590mm	ks	-3,000	1 525,34	-4 576,02
3	R	Pol142	VZ1.03 - Vertikální žaluzie 1040x1570mm	ks	-5,000	1 524,60	-7 623,00
4	R	Pol143	VZ1.04 - Vertikální žaluzie 1250x2260mm	ks	-1,000	2 609,20	-2 609,20
5	R	Pol144	VZ2.01 - Vertikální žaluzie 1040x1570mm	ks	-14,000	925,02	-12 950,28
6	R	Pol145	VZ2.02 - Vertikální žaluzie 1370x2250mm	ks	-2,000	1 747,90	-3 495,80
7	R	Pol146	VZ2.03 - Vertikální žaluzie 1170x2120mm	ks	-1,000	1 467,40	-1 467,40
8	R	Pol147	VZ2.04 - Vertikální žaluzie 1020x2170mm	ks	-1,000	1 252,90	-1 252,90
9	R	Pol148	VZ2.05 - Vertikální žaluzie 1040x1570mm	ks	-14,000	925,02	-12 950,28
10	R	Pol149	VZ2.06 - Vertikální žaluzie 1100x2260mm	ks	-2,000	1 408,00	-2 816,00
11	R	Pol150	VZ2.07 - Vertikální žaluzie 1250x2260mm	ks	-1,000	1 602,70	-1 602,70
12	R	Pol151	VZ2.08 - Vertikální žaluzie 1250x2260mm	ks	-1,000	1 602,70	-1 602,70
13	R	Pol152	VZ2.09 - Vertikální žaluzie 1250x2250mm	ks	-3,000	1 593,54	-4 780,62
14	R	Pol153	VZ2.10 - Vertikální žaluzie 1120x2120mm	ks	-2,000	1 345,30	-2 690,60
15	R	Pol154	VZ2.11 - Vertikální žaluzie 1040x1470mm	ks	-6,000	865,70	-5 194,20
16	R	Pol155	VZ2.12 - Vertikální žaluzie 830x1065mm	ks	-3,000	500,50	-1 501,50
17	R	Pol156	VZ2.13 - Vertikální žaluzie 1040x1570mm	ks	-2,000	926,20	-1 852,40

D3 002: Stínící technika

78 592,80

19	R	Pol140.1	VZ1.01 - horizontální žaluzie 920x1470 mm	ks	5,000	1 135,20	5 676,00
			"okna ozn. 06, rozměr 1120x1670 mm"				
			"1.NP" 5		5,000		
20	R	Pol141.1	VZ1.02 - horizontální žaluzie 920x1470 mm	ks	3,000	1 135,20	3 405,60
			"okna ozn. 06, rozměr 1120x1670 mm"				
			"1.NP" 3		3,000		
21	R	Pol142.3	VZ1.03 - horizontální žaluzie 920x1450 mm	ks	5,000	1 135,20	5 676,00
			"okna ozn. 05, rozměr 1120x1650 mm"				
			"1.NP" 5		5,000		
22	R	Pol143.1	VZ1.04 - horizontální žaluzie 1000x2000 mm	ks	1,000	1 304,40	1 304,40
			"okna ozn. 16, rozměr 1200x2200 mm"				
			"3.NP" 1		1,000		
23	R	Pol144.1	VZ2.01 - horizontální žaluzie 920x1450 mm	ks	14,000	1 135,20	15 892,80
			"okna ozn. 05, rozměr 1120x1650 mm"				
			"2.NP" 6+8		14,000		
24	R	Pol145.1	VZ2.02 - horizontální žaluzie 1050x2000 mm	ks	2,000	1 376,40	2 752,80
			"okna ozn. 13, rozměr 1250x2200 mm"				
			"2.NP" 2		2,000		
25	R	Pol146.1	VZ2.03 - horizontální žaluzie 800x2000 mm	ks	1,000	1 164,00	1 164,00
			"okna ozn. 15, rozměr 1000x2200 mm"				
			"2.NP" 1		1,000		
26	R	Pol147.1	VZ2.04 - horizontální žaluzie 800x2050 mm	ks	1,000	1 191,60	1 191,60

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"okna ozn. 14, rozměr 1000x2250 mm"				
			"2.NP" 1		1,000		
27	R	Pol148.1	VZ2.05 - horizontální žaluzie 920x1450 mm	ks	14,000	1 135,20	15 892,80
			"okna ozn. 05, rozměr 1120x1650 mm"				
			"3.NP" 6+8		14,000		
28	R	Pol149.1	VZ2.06 - horizontální žaluzie 1000x2000 mm	ks	2,000	1 304,40	2 608,80
			"okna ozn. 16, rozměr 1200x2200 mm"				
			"3.NP" 2		2,000		
29	R	Pol150.1	VZ2.07 - horizontální žaluzie 1000x2000 mm	ks	1,000	1 304,40	1 304,40
			"okna ozn. 16, rozměr 1200x2200 mm"				
			"3.NP" 1		1,000		
30	R	Pol151.1	VZ2.08 - horizontální žaluzie 1000x2000 mm	ks	1,000	1 304,40	1 304,40
			"okna ozn. 16, rozměr 1200x2200 mm"				
			"3.NP" 1		1,000		
31	R	Pol152.1	VZ2.09 - horizontální žaluzie 1000x2000 mm	ks	3,000	1 304,40	3 913,20
			"okna ozn. 16, rozměr 1200x2200 mm"				
			"3.NP" 3		3,000		
32	R	Pol153.1	VZ2.10 - horizontální žaluzie 1000x2000 mm	ks	4,000	1 304,40	5 217,60
			"okna ozn. 16, rozměr 1200x2200 mm"				
			"2.NP" 2		2,000		
			"3.NP" 2		2,000		
			Součet		4,000		
33	R	Pol154.1	VZ2.11 - horizontální žaluzie 920x1350 mm	ks	6,000	1 100,40	6 602,40
			"okna ozn. 19, rozměr 11200x1550 mm"				
			"4.NP" 6		6,000		
34	R	Pol155.1	VZ2.12 - horizontální žaluzie 700x900 mm	ks	3,000	805,20	2 415,60
			"okna ozn. 20, rozměr 900x1100 mm"				
			"4.NP" 3		3,000		
35	R	Pol156.1	VZ2.13 - horizontální žaluzie 920x1450mm	ks	2,000	1 135,20	2 270,40
			"okna ozn. 05, rozměr 1120x1650 mm"				
			"1.NP" 2		2,000		
VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				63,53
36	R	R.0010	Jiné VRN ve výši 3,17%	%	20,040	3,17	63,53

Celkem

2 067,73

Akce : PPP Trutnov

Výpis horizontálních žaluzií

rozměr žaluzie (mm)	Počet kusů
VZ1.01 - 1kř. Okno - ozn. O06 - celkový rozměr 1120x1670 mm 920 x 1470 mm	5
VZ1.02 - 1kř. Okno - ozn. O06 - celkový rozměr 1120x1670 mm 920 x 1470 mm	3
VZ1.03 - 1kř. Okno - ozn. O05 - celkový rozměr 1120x1650 mm 920x1450	5
VZ1.04 - 1kř. Okno - ozn. O16 - celkový rozměr 1200x2200 mm 1000x2000	1
VZ2.01 - 1kř. Okno - ozn. O05 - celkový rozměr 1120x1650 mm 920x1450	14
VZ2.02 - 1kř. Okno - ozn. O13 - celkový rozměr 1250x2200 mm 1050x2000	2
VZ2.03 - 1kř. Okno - ozn. O15 - celkový rozměr 1000x2200 mm 800x2000	1
VZ2.04 - 1kř. Okno - ozn. O14 - celkový rozměr 1000x2250 mm 800x2050	1
VZ2.05 - 1kř. Okno - ozn. O05 - celkový rozměr 1120x1650 mm 920x1450	14

výskyt v m.č.	cena za 1 ks	cena pozice
1.13 - 5 ks	1 032,00 Kč	5 160,00 Kč
1.12 - 3 ks	1 032,00 Kč	3 096,00 Kč
1.20 - 5 ks	1 032,00 Kč	5 160,00 Kč
3.26 - 1 ks	1 185,82 Kč	1 185,82 Kč
2.03 - 2 ks, 2.04 - 3 ks, 2.05 - 1 ks, 2.19-2.25 - 8 ks	1 032,00 Kč	14 448,00 Kč
2.11 - 2 ks	1 251,27 Kč	2 502,55 Kč
2.18 - 1 ks	1 058,18 Kč	1 058,18 Kč
2.17 - 1 ks	1 083,27 Kč	1 083,27 Kč
3.11-3.13 - 6 ks, 3.03-3.10 - 8 ks	1 032,00 Kč	14 448,00 Kč

VZ2.06 - 1kř. Okno - ozn. O16 - celkový rozměr 1200x2200 mm

1000x2000 2

3.25 - 2 ks

1 185,82 Kč 2 371,64 Kč

VZ2.07 - 1kř. Okno - ozn. O16 - celkový rozměr 1200x2200 mm

1000x2000 1

3.25 - 1 ks

1 185,82 Kč 1 185,82 Kč

VZ2.08 - 1kř. Okno - ozn. O16 - celkový rozměr 1200x2200 mm

1000x2000 1

3.24 - 1 ks

1 185,82 Kč 1 185,82 Kč

VZ2.09 - 1kř. Okno - ozn. O16 - celkový rozměr 1200x2200 mm

1000x2000 3

3.19 - 3 ks

1 185,82 Kč 3 557,45 Kč

VZ2.10 - 1kř. Okno - ozn. O16 - celkový rozměr 1200x2200 mm

1000x2000 4

3.19 - 2 ks

1 185,82 Kč 4 743,28 Kč

VZ2.11 - 1kř. Okno - ozn. O19 - celkový rozměr 1120x1550 mm

920x1350 6

4.08-4.14 - 6 ks

1 000,36 Kč 6 002,18 Kč

VZ2.12 - 1kř. Okno - ozn. O20 - celkový rozměr 900x1100 mm

700x900 3

4.02-4.04 - 3 ks

732,00 Kč 2 196,00 Kč

VZ2.13 - 1kř. Okno - ozn. O05 - celkový rozměr 1120x1650 mm


920x1450 2

1.14 - 1 ks, 1.15 - 1 ks

1 032,00 Kč 2 064,00 Kč

68

71 448,01 Kč





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL : 56
Název projektu:	Poradenské a vzdělávací centrum Královéhradeckého kraje při PPP v Trutnově, reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0011193	
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., IČ: 25275062	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, IČ : 70889546	
Změnový list vystavil:	Ing. Kateřina Meierová	
Datum:	10.12.2021	
Předmět změny: penetrace pod plovoucí podlahy		
Popis a zdůvodnění změny: Ve skladbách povlakových podlah bude doplněna penetrace UZIN eliminující prostupy zbytkové vlhkosti pod nivelační stěrky povlakových konstrukcí.		
Přílohy změnového listu: rozpočet - ZL 56 část normy ČSN 49 2120 měření protokol o měření vlhkosti podkladu TL Uzin PE 400		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	151 424,97,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
151 424,97,- Kč	bez dopadu do termínu	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele: Veronika Jandera		
Datum:		
Za autorský dozor: Martin Just – AT		
Datum: 14.12.		

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby
Název objektu

Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov
ZL 56 - penetrace pod plovoucí podlahy - eliminace přebytečné vlhkosti

JKSO 801 39 12

EČO

Místo Trutnov

IČO

DIČ

Objednatel Královéhradecký kraj, Hradec Králové

Projektant ATIP a.s., Trutnov

Zhotovitel Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracoval

70889546

25261568

25275062

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	4 652,67	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	146 772,30	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		151 424,97	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 151 424,97

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	151 424,97	31 799,24

Cena s DPH 183 224,21

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt: ZL 56 - penetrace pod plovoucí podlahy - eliminace přebytečné vlhkosti

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: Trutnov

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

146 772,30

776 Podlahy povlakové

146 772,30

3	R	77624.R01	M+D 2-násobná disperzní penetrace UZIN PE 400 pro uzavření vlhkosti	m2	1 096,300	133,20	146 027,16
			"NOVÁ POLOŽKA				
			"oceněno dle nabídky dodavatele + 10% obchodní marže				
			"pod vinylové podlahy"				

"0.09"	7	7,000
"1.02"	19,9	19,900
"1.01"	35,1	35,100
"2.01"	78,9	78,900
"3.01"	79,3	79,300
"1.12"	35,8	35,800
"1.13"	59,1	59,100
"1.14"	8,8	8,800
"1.15"	10,5	10,500
"1.20"	44,1	44,100
"2.11"	30	30,000
"2.15"	4,3	4,300
"2.16"	13,6	13,600
"2.10"	6,4	6,400
"3.13"	8,8	8,800
"3.18"	6,5	6,500
"3.19"	31,5	31,500
"3.23"	6,8	6,800
"3.26"	22	22,000
"4.01"	32,7	32,700
"4.05"	32,2	32,200
"4.06"	44,2	44,200
"4.08"	10,7	10,700
"4.11"	6,3	6,300
Mezisoučet		649,600

			"pod sametový vinyli"				
--	--	--	-----------------------	--	--	--	--

"2.18"	31,6	31,600
"3.25"	28,8	28,800
"4.12"	17	17,000
Mezisoučet		77,400

			"pod koberce"				
--	--	--	---------------	--	--	--	--

"2.04"	22,2	22,200
"2.03"	22	22,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"2.05" 9		9,000		
			"2.19" 12,8		12,800		
			"2.20" 12,4		12,400		
			"2.21" 12,4		12,400		
			"2.22" 12,2		12,200		
			"2.23" 12,3		12,300		
			"2.24" 12,4		12,400		
			"2.25" 24,3		24,300		
			"3.03" 11,8		11,800		
			"3.04" 12,4		12,400		
			"3.05" 12,3		12,300		
			"3.06" 12,5		12,500		
			"3.07" 12,2		12,200		
			"3.08" 12,3		12,300		
			"3.09" 12,3		12,300		
			"3.10" 12,7		12,700		
			"3.11" 22		22,000		
			"3.12" 22,9		22,900		
			"3.24" 15,1		15,100		
			"4.02" 11,9		11,900		
			"4.03" 12,3		12,300		
			"4.04" 12,2		12,200		
			"4.13" 10,9		10,900		
			"4.14" 11,5		11,500		
			Mezisoučet		369,300		

--	--	--	--	--	--	--	--

Součet 1 096,300

2	R	998776203	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1 490,270	0,50	745,14
---	---	-----------	---	---	-----------	------	--------

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 4 652,67

4	R	R.0010	Jiné VRN ve výši 3,17%	%	1 467,720	3,17	4 652,67
---	---	--------	------------------------	---	-----------	------	----------

Celkem 151 424,97

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 79.080, 91.060.30

Březen 2021

**Dřevěné podlahy – Požadavky na montáž
a posuzování**

ČSN 49 2120

Wooden floors – Requirements for installation and assessments

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 49 2120 ze září 2012.

a staveniště při nízkých venkovních teplotách a pokud je to předepsáno dodavatelem podlahové izolace, její délky a vhodnosti aktuální vlhkosti podlahoviny k zahájení montáže by měla být stanovena v závislosti na vlhkosti podlahoviny (měření viz čl. 7). Příklad závislosti rovnovážné vlhkosti dřeva při teplotě a relativní vlhkosti vzduchu je uvedena v tabulce č. 2.

Tabulka 2 – Závislost rovnovážné vlhkosti dřeva na relativní vlhkosti vzduchu (při 20°C)

vlhkost vzduchu [%]	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75
rovnovážná vlhkost dřeva [%]	4,3	5,0	5,9	6,7	7,6	8,3	9,0	9,8	10,5	11,6	13,0	14,7

Při montáži by se měla ověřit vlhkost podlahoviny a materiál s odlišnou vlhkostí od předpokladané rovnovážné vlhkosti by se neměl instalovat. Při instalaci podlahoviny s nízkou rovnovážnou vlhkostí hrozí vážné riziko poškození podlahy vlivem zvýšení vlhkosti podlahoviny v průběhu užívání (bobtnání dřeva). V případě podlahy s vysokou rovnovážnou vlhkostí může být nutné zajistit vhodná opatření k zabránění vzniku vad (propočítané přiznané spáry v době montáže, které se uzavřou po dosažení střední rovnovážné vlhkosti apod.).

Při montáži a kontrole dokončené podlahy se má dokončit do 7 dnů.

Montážní postup musí být s dostatečným předstihem představen na obrázku 1.

Výsledky karbidové metody (pro přepočítání CM hodnoty byl použit vztah podle článku 7.14 ČSN 74 4505).


Tabulka 3 – Nejvyšší dovolená vlhkost cementového potěru nebo potěru na bázi síranu vápenatého v hmotnostních % a hodnotách CM v době pokládky nášlapné vrstvy, pro podlahy jejichž součástí není systém podlahového vytápění

Nášlapná vrstva	Cementový potěr, beton		Potěr na bázi síranu vápenatého
	Hmotnostní %	CM hodnota	Hmotnostní % a CM hodnota
Kamenná nebo keramická dlažba	5,0 %	3,20	0,5 %
Lité podlahoviny na bázi cementu	5,0 %	3,20	Nelze provádět
Syntetické lité podlahoviny	4,0 %	2,42	0,5 %
Paropropustná textilia	5,0 %	3,20	1,0 %
PVC, linoleum, guma, korek	3,5 %	2,03	0,5 %
Dřevěné podlahy, parkety, laminátové podlahoviny	2,5 %	1,25	0,5 %

Tabulka 4 – Nejvyšší dovolená vlhkost cementového potěru nebo potěru na bázi síranu vápenatého v hmotnostních % a hodnotách CM v době pokládky nášlapné vrstvy, pro podlahy jejichž součástí je systém podlahového vytápění

Nášlapná vrstva	Cementový potěr, beton		Potěr na bázi síranu vápenatého
	Hmotnostní %	CM hodnota	Hmotnostní % a CM hodnota
Kamenná nebo keramická dlažba	4,5 %	2,90	0,3 %
Lité podlahoviny na bázi cementu	4,5 %	2,90	Nelze provádět
Syntetické lité podlahoviny	3,5 %	2,03	0,3 %
Paropropustná textilia	4,5 %	2,90	0,8 %
PVC, linoleum, guma, korek	3,0 %	1,64	0,3 %
Dřevěné podlahy, parkety, laminátové podlahoviny	2,0 %	0,85	0,3 %

TEPLO TOPNÉHO MEDIA (°C)

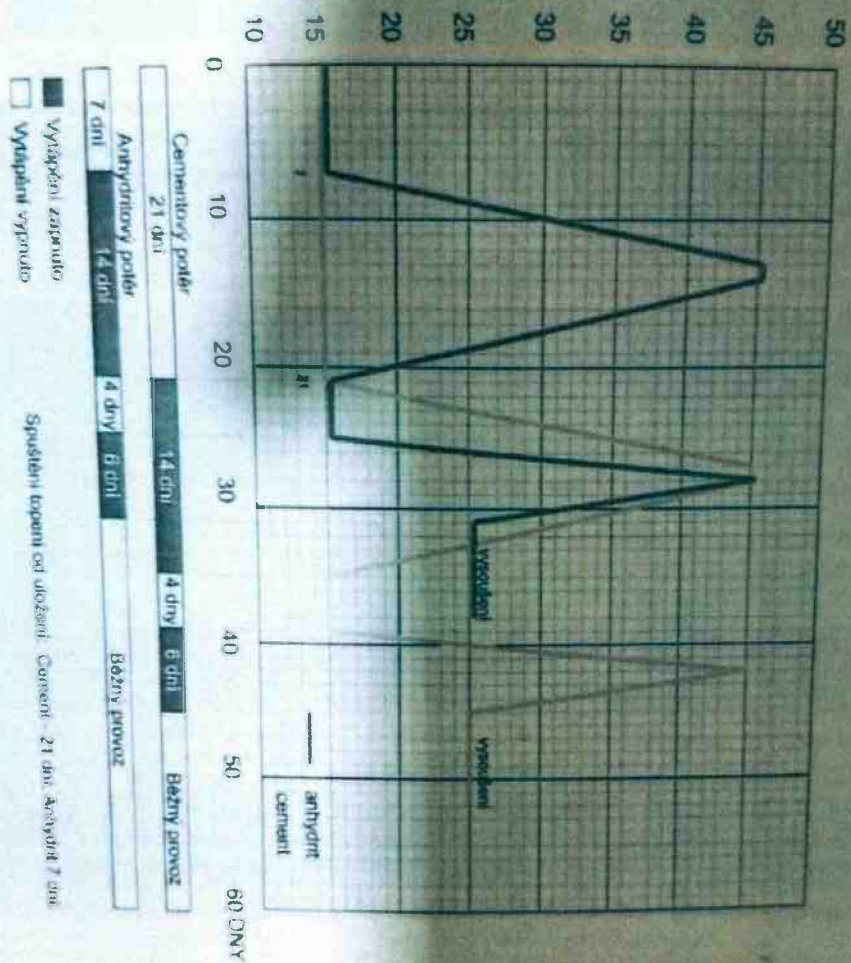

☒ Vypálen zapnul
☐ Vypálen vypnul

Spustění topení od uložení Cement 21 dní Anhydrit 7 dní





Protokol o měření vlhkosti podkladu

(UZIN info : 602 / 212 314)

(Razítko firmy)

Uzin s.r.o.
Českomoravská 12
190 00 Praha 9

(Zákazník / Navrhovatel smlouvy)

Jméno: PETR FAKTOR

Ulice: 5. května 2399

PSČ: 59401 Obec: Dvůr Králové nad Labem

Tel / Fax: 

Kontaktní osoba: Petr Faktor

Architekt / Vedoucí stavby

Jméno, Adresa: PRIMISTAV NÁCHOD s.r.o.

Objekt stavby / Stanoviště

Adresa: TRUTNOV, 61. POŘ. 223

Datum měření: 18.11.2021 Přítomni: PETR FAKTOR, ZOUŠL

Druh podkladu: BETON (CEMFLOW) Tloušťka: 4-8 cm (cm)

Typ konstrukce: BETONOVÝ POTĚR PROVLOUCI

Měření vlhkosti

☐ Měřicí přístroj CM

☐ Elektronický měřicí přístroj typu:

Měřicí bod (místnost)	Hloubka (měření cm)	Navážené množství (g)	Tlak (bar)	Doba měření (min.)	Hodnota vlhkosti : % CM	Elektronicky naměřená hodnota
1. <u>3 NP</u>	<u>4,5 cm</u>	<u>50 g</u>	<u>2,4</u>	<u>30 min</u>	<u>3,3 CM</u>	<u>21,4 CM</u>
2. <u>4 NP</u>	<u>6,2 cm</u>	<u>50 g</u>	<u>1,9</u>	<u>25 min</u>	<u>3,8 CM</u>	<u>3,0 CM</u>
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						

Měřicí protokol vystavil : 

Datum: 18.11.2021

Podpis zákazníka / Vedoucí stavby :

Datum :

UZIN PE 400



Disperzní penetrace pro rychlé uzavření nevytápěných cementových potěrů až do maximální zbytkové vlhkosti 3 CM %

Oblasti použití:

UZIN PE 400 je uzavírací disperzní penetrace na bázi polyvinylidenchloridu, která se používá k uzavření plovoucích nebo na oddělovací vrstvě ležících, vlhkosti odolných cementových potěrů až do maximální zbytkové vlhkosti 3 CM %. Pro vnitřní prostředí.

Jako uzavírací penetrace:

- ▶ na uzavření zvýšené zbytkové vlhkosti do 3 CM % u nevytápěných cementových potěrů

Jako přídržná penetrace:

- ▶ na cementové potěry
- ▶ před následujícím stěrkováním UZIN stěrkovacími cementovými nebo kalciumsulfátovými hmotami
- ▶ před následujícím stěrkováním s UZIN stěrkovacími hmotami pro parkety před lepením parket
- ▶ pro vysoké namáhání v obytných, podnikatelských a průmyslových prostorech
- ▶ pro namáhání kolečkovými židlemi podle DIN EN 12 529



UZIN PE 400 nabízí největší možnou jistotu před emisí a zajišťuje při použití zdravé klima. Je označena „Modrým andělem“ pro podlahové materiály, které mají velmi malé emise dle RAL-UZ 113.



UZIN ÖKOLINE



www.blauer-engel.de

Přednosti výrobku / vlastnosti:

UZIN PE 400 přesvědčuje jednoduchým způsobem zpracování a dobrou uzavírací schopností proti vlhkosti.

Složení: polymerové disperze, aditiva a voda

- ▶ Jednoduchá manipulace
- ▶ Velmi rychle schnoucí
- ▶ Uzavírající do 3 CM %
- ▶ Bez posypu křemičitým pískem
- ▶ GISCOD D 1 / bez rozpouštědel
- ▶ EMICODE EC 1 / velmi malý obsah emisí
- ▶ RAL UZ 113 / šetrná k okolí, neboť velmi nízké emise

Technická data:

Druh balení:	plastový kanýstr
Dodávané balení:	12 kg
Skladovatelnost:	nejméně 12 měsíců
Barva mokrá / suchá:	běžová / transparentní
Spotřeba 1. vrstva:	60 – 70 g/m ² (1 : 1 zředěná)
Spotřeba 2. vrstva:	120 – 130 g/m ² (neředěná)
Celkové množství spotřeby:	ca. 200 g/m ²
Teplota při zpracování:	nejméně 10 °C na podlaze
Doba schnutí zředěná:	ca. 1 hodina *
Doba schnutí neředěná:	ca. 2 hodiny * před stěrkováním

* Při 20 °C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu. Viz také „tabulku použití“.

Příprava podkladu:

Podklad musí být rovný, pevný, nosný, bez trhlin, čistý a zbavený látek (špína, olej, mastnota), které omezují přilnavost. Cementové potěry musí být obroušeny a dobře vysáty. Podklad musí být zkontrolován podle souvisejících norem a doporučení a při nedostatcích musí být oznámeny pochyby.

Přilnavost snižující nebo labilní vrstvy (např. separační prostředky, volné zbytky lepidla, stěrky, podlahové krytiny nebo nátěrů) odstranit odkartáčováním, odbroušením, ofrézováním nebo otryskáním. Volné části a prach musí být důkladně vysáty. Nanesenou penetraci nechat vždy dobře proschnout. Savost podkladu by měla být nejdříve otestována, protože na nepropustných podkladech by UZIN PE 400 nemohla dostatečně vniknout do podkladu. Potěry hlazené křídlem musí být ofrézovány nebo lehce otryskány.

Dbát na informace v technických listech použitých výrobků.

Při přípravě podkladu dbejte ČSN 74 45 05 / STN 74 45 05!

Zpracování:

1. Nádobu před upotřebením nechat aklimatizovat na prostorovou teplotu a dobře protřepat.
2. Penetraci nanášet na podklad pěnovým válečkem UZIN (výr.čís.: 9394) rovnoměrně sytě, celoplošně a tak, aby byly vyplněny póry. Zamezit tvorbě kaluží. První vrstvu zředit vodou 1 : 1. Druhou vrstvu nanášet po době schnutí ca. 1 hodinu neředit do kříže.
3. Nářadí ihned po použití očistit vodou.

Tabulka použití:

Nechat vyschnout do transparentního a pochůzného filmu.

	Ředění	Spotřeba	Doba schnutí
1. vrstva	1 : 1 vodou	60 – 70 g/m ²	ca. 1 hodina *
2. vrstva	neředit	120 – 130 g/m ²	ca. 2 hodiny *

* Při 20 °C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu.

Důležitá upozornění:

- Originální balení je při mírně chladném uskladnění nejméně 12 měsíců skladovatelné. Mrazuvzdorné do – 4°C. Načaté balení pečlivě těsně uzavřít a obsah rychle spotřebovat. Penetraci nechat před zpracováním aklimatizovat na teplotu v prostoru.
- Nejlépe zpracovatelná při 15 – 25 °C, teplotě podlahy nad 15 °C a relativní vlhkosti vzduchu pod 65 %. Nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu prodlužují, vysoké teploty a nízká vlhkost vzduchu zkracují dobu schnutí.
- Při vícevrstevném stěrkování nejdříve nechat zpracovávanou stěrku kompletně vyschnout, pak mezipenetrovat penetrací UZIN PE 360 a po dostatečném proschnutí provést následné stěrkování.
- Při stěrkování nad 10 mm tloušťky vrstvy je nutno použít epoxidovou pryskyřičnou penetraci jako UZIN PE 460 nebo UZIN PE 480 s posypem křemičitým pískem.
- U potěrových konstrukcí ve styku se zemí, betonů nebo cementových potěrů s vlhkostí nad 3 CM % je nutno použít epoxidovou pryskyřičnou penetraci, jako UZIN PE 460 nebo UZIN PE 480 s posypem křemičitým pískem.
- Zohledněte všeobecně uznávaná pravidla oboru a techniky pro kladení podlahoviny, stejně tak dodržujte platné národní normy (např. B, EN, DIN, VOB, OE, SIA, ČSN atd.). Dbejte mimo jiné na následující normy, směrnice a doporučení:
 - DIN 18 365 „Podlahářské práce“, O-Norm B 2236
 - DIN 18 356 „Práce s parketami a dřevěnou dlažbou“ O-Norm B 2218
 - TKB směrnice „Posuzování a příprava podkladů pro podlahářské a parketářské práce“
 - BEB směrnice „Posuzování a příprava podkladů“
 - směrnice ZDB „Elastické podlahoviny, textilní odlahoviny a parkety na vytápěných podlahových konstrukcích“

Ochrana práce a životního prostředí:

GISCODE D 1 – Bez rozpouštědel podle TRGS 610. Při zpracování se zásadně doporučuje používání ochranného krému na pokožku. Uložit mimo dosah dětí. Během práce a po aplikaci/vyschnutí zajistit dokonalé větrání. Během zpracování produktu nejíst, nepít a nekouřit. Při zasažení očí nebo kůže okamžitě důkladně omýt vodou. Nenechat vytéci do kanalizace, vodních toků nebo země. Nářadí okamžitě po upotřebení omýt vodou a mýdlem.

Po vytvrzení pachově neutrální jakož i ekologicky a fyziologicky nezávadná. Základní předpoklady pro nejlepší možnou kvalitu vzduchu v místnosti po podlahářských pracích jsou normalizované podmínky kladení a dobře vyschlé podklady, penetrace a stěrka hmoty. Produkt obsahuje isothiazolinon.

Informace pro alergiky na tel. číslo +420283083314.

EMICODE EC 1 PLUS – Velmi malý obsah emisí.

Likvidace:

Zbytky výrobku pokud možno shromáždit a dále použít. Zabránit úniku do kanalizace, vod nebo do země. ... Nádoby vyprázdněné, vyškrabané případně vyčištěné jsou recyklovatelné. Nádoby s tekutým zbytkem obsahu a rovněž shromážděné, tekuté zbytky výrobku jsou zvláštní odpad. Nádoby s vytvrzeným zbytkem obsahu jsou stavební odpad.





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL : 57
Název projektu:	Poradenské a vzdělávací centrum Královéhradeckého kraje při PPP v Trutnově, reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0011193	
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., IČ: 25275062	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, IČ : 70889546	
Změnový list vystavil:	Ing. Kateřina Meierová	
Datum:	10.12.2021	
Předmět změny: doplnění palisád kolem lípy		
Popis a zdůvodnění změny: Aby byl dostatečně ochráněn kořenový bal stávající vzrostlé lípy, bude kolem kořenového balu navýšen terén a provedena konstrukce z betonových palisád, kořeny se dosypou vrstvou zeminy.		
Přílohy změnového listu: rozpočet - ZL 57		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	45 035,01,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
45 035,01,- Kč	bez dopadu do termínu	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele: Veronika Jandercová	Za zhotovitele:	
Datum:		
Za autorský dozor: Martin Just – ATIL		
Datum:	14.12.2021	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov**

JKSO

801 39 12

Název objektu **ZL 57 - doplnění palisád kolem lípy**

EČO

Místo

Trutnov

IČO

DIČ

Objednatel **Královehradecký kraj, Hradec Králové**

70889546

Projektant **ATIP a.s., Trutnov**

25261568

Zhotovitel **Průmstav Náchod s.r.o.**

25275062

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	30 121,07	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	14 913,94	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		45 035,01	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 45 035,01

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	45 035,01	9 457,35

Cena s DPH 54 492,36

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt: ZL 57 - doplnění palisád kolem lípy

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: Trutnov

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

43 651,27

1 Zemní práce

4 875,55

6	R	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	4,560	667,00	3 041,52
			"TENDROVA POLOŽKA				

19*0,6*0,4

4,560

7	R	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	4,560	160,00	729,60
			"TENDROVA POLOŽKA				

19*0,6*0,4

4,560

8	R	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	4,560	17,20	78,43
			"TENDROVA POLOŽKA				

4,56

4,560

9	R	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	8,208	125,00	1 026,00
			"TENDROVA POLOŽKA				

4,56*1,8

8,208

3 Svislé a kompletní konstrukce

29 903,40

1	231	339921132	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm	m	19,000	573,00	10 887,00
			"TENDROVA POLOŽKA"				

19

19,000

4		59228413R	palisáda betonová z vibrolisovaného betonu obdélníkový průřez 120 x 180 x 600 mm	kus	106,000	179,40	19 016,40
			"TENDROVA POLOŽKA				

106

106,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 475,20

10	221	916991121	Lože pod obručnický, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m3	2,280	2 840,00	6 475,20
			"TENDROVA POLOŽKA				

19*0,6*0,2

2,280

998 Přesun hmot

2 397,12

3	R	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	12,485	192,00	2 397,12
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

1 383,74

5	R	R.0010	Jiné VRN ve výši 3,17%	%	436,510	3,17	1 383,74
---	---	--------	------------------------	---	---------	------	----------

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Celkem

45 035,01



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL : 58
Název projektu:	Poradenské a vzdělávací centrum Královéhradeckého kraje při PPP v Trutnově, reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0011193	
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., IČ: 25275062	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, IČ : 70889546	
Změnový list vystavil:	Ing. Kateřina Meierová	
Datum:	10.12.2021	
Předmět změny: sešívání pracovních spár v podlaze, přechodové lišty		
Popis a zdůvodnění změny: Trhliny ve stávajících podlahách a přechody mezi původními a novými podlahami budou zajištěny sešitím ocelovými sponkami po 15 cm. Přechody mezi různými podlahovými povrchy budou opatřeny přechodovými lištami.		
Přílohy změnového listu: rozpočet - ZL 58 doložení obvyklé ceny přechodové lišty		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	49 879,70,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
49 879,70,- Kč	bez dopadu do termínu	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Veronika Jand		
Datum:		
Za autorský do		
Martin Just – A		
Datum:		

KRYCI LIST ROZPOCTU


Název stavby	Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov	JKSO	801 39 12
Název objektu	ZL 58 - ZL 58 - sešívání pracovních spár v podlaze, přechodové lišty	EČO	
		Místo	Trutnov
		IČO	DIČ
Objednatel	Královehradecký kraj, Hradec Králové	70889546	
Projektant	ATIP a.s., Trutnov	25261568	
Zhotovitel	Průmstav Náchod s.r.o.	25275062	
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				B				C			
Základní rozp. náklady				Doplňkové náklady				Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	12 098,02	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	19 793,70	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	12 042,87	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	5 945,11	11		0,00		16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN	0.00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		49 879,70	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel			D Celkem bez DPH			49 879,70
			DPH	%	Základ daně	DPH celkem
			snižovaná	15,0	0,00	0,00
			základní	21,0	49 879,70	10 474,74
			Cena s DPH			60 354,44
			E Přípočty a odpočty			
			Dodá zadavatel			0,00
			Klouzavá doložka			0,00
			Zvýhodnění			0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt: ZL 58 - sešívání pracovních spár v podlaze, přechodové lišty

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: Trutnov

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 30 359,12

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 30 359,12

1	014	632683112	Sešívání trhlín v betonových podlahách ocelovými sponkami se zálivkou pryskyřicí vzdálenosti sponek přes 10 do 15 cm	m	48,960	620,08	30 359,12
			"NOVÁ POLOŽKA				
			"Oceněno dle ÚSR , CÚ 2021/2 x index 0,92				
			"2.NP" 1,7*7+3,73+1,97		17,600		
			"3.NP" 1,7*6+3,76+1,94		15,900		
			"4.NP" 1,7*5+6,96		15,460		
			Součet		48,960		

PSV Práce a dodávky PSV 17 987,98

776 Podlahy povlakové 17 987,98

2	776	776421311	Montáž lišt přechodových samolepících	m	61,200	95,68	5 855,62
			"NOVÁ POLOŽKA"				
			"Oceněno dle ÚSR , CÚ 2021/2 x index 0,92				
			"vinyl - PUR stěrka"				
			"1.NP" 1*0,9		0,900		
			"2.NP" 1*0,9		0,900		
			"3.NP" 1*0,9		0,900		
			"4.NP" 1*0,9		0,900		
			"vinyl - dlažba"				
			"2.NP" 5*0,9		4,500		
			"3.NP" 5*0,9		4,500		
			"4.NP" 2*0,9		1,800		
			"vinyl - vinyl"				
			"1.NP" 7*0,9		6,300		
			"2.NP" 6*0,9		5,400		
			"3.NP" 6*0,9		5,400		
			"4.NP" 4*0,9		3,600		
			"vinyl - koberec"				
			"2.NP" 10*0,9		9,000		
			"3.NP" 12*0,9		10,800		
			"4.NP" 5*0,9		4,500		
			"koberec - koberec"				
			"2.NP" 2*0,9		1,800		
			Součet		61,200		
3	553	55343.R	přechodová lišta samolepící oblá	m	67,320	178,89	12 042,87
			"NOVÁ POLOŽKA"				

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"aktuální nákupní cena : 140,-/0,9m = 155,56 Kč/ m + 15% doprava + marže = 178,89 Kč/m				
			"vinyl - PUR stěrka"				
			"1.NP" 1*0,9		0,900		
			"2.NP" 1*0,9		0,900		
			"3.NP" 1*0,9		0,900		
			"4.NP" 1*0,9		0,900		
			"vinyl - dlažba"				
			"2.NP" 5*0,9		4,500		
			"3.NP" 5*0,9		4,500		
			"4.NP" 2*0,9		1,800		
			"vinyl - vinyl"				
			"1.NP" 7*0,9		6,300		
			"2.NP" 6*0,9		5,400		
			"3.NP" 6*0,9		5,400		
			"4.NP" 4*0,9		3,600		
			"vinyl - koberec"				
			"2.NP" 10*0,9		9,000		
			"3.NP" 12*0,9		10,800		
			"4.NP" 5*0,9		4,500		
			"koberec - koberec"				
			"2.NP" 2*0,9		1,800		
			Součet		61,200		
4	R	998776203	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	178,980	0,50	89,49
VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				1 532,60
5	R	R.0010	Jiné VRN ve výši 3,17%	%	483,470	3,17	1 532,60

Celkem

49 879,70

AP4 PŘECHODOVÁ LIŠTA SAMOLEPÍCÍ ACARA, HLINÍK ELOX INOX, 40 MM, 0,9 M



170 Kčs DPH 140 Kčbez DPH

1 ks
KOUPIT

Varianty

Barva elox

KT - kartáčovaný titan

Šířka 40 mm

40 mm

Délka 0,9 m

0,9 m

Skladem > 20ks

pondělí 13.12

[\(více o dopravě\)](#)

Balení: 1 ks

Dotaz na produktDo oblíbenýchPorovnatTiskSdílet



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL : 59

Název projektu:	Poradenské a vzdělávací centrum Královéhradeckého kraje při PPP v Trutnově, reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0011193
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., IČ: 25275062
Objednatel:	Královéhradecký kraj, IČ : 70889546
Změnový list vystavil:	Ing. Kateřina Meierová
Datum:	10.12.2021

Předmět změny: drobné zámečnické konstrukce – dokončovací práce

Popis a zdůvodnění změny:

Ve 4.NP v prostoru půdy budou malá okénka doplněna o protidešťové žaluzie, které zajistí sezónní větrání půdních prostor. Původní skla zůstávají dodána pro období bez nutnosti větrání. Ke 3 ks konzol u umyvadlových desek bude doplněna stolní noha, zajišťující stabilitu konstrukce. Navrženo s ohledem na možné poškození při nadměrném zatížení umyvadlových desek.

Přílohy změnového listu:

rozpočet - ZL 59

doložení obvyklé ceny stolové nohy

Cena méněpráci bez DPH:	Cena vícepráci bez DPH:
0,- Kč	9 210,03,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
9 210,03,- Kč	bez dopadu do termínu

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:

Za objednatele:
Veronika Jandová

Za zhotovitele:

Datum:

Za autorský do
Martin Just – A

Datum:

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

JKSO

801 39 12

Název objektu

ZL 59 - drobné zámečnické konstrukce - dokončovací práce

EČO

Místo

Trutnov

IČO

DIČ

Objednatel

Královehradecký kraj, Hradec Králové

70889546

Projektant

ATIP a.s., Trutnov

25261568

Zhotovitel

Průmstav Náchod s.r.o.

25275062

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	7 491,24	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	1 072,95	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00%
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		8 564,19	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		645,84	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 9 210,03

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	9 210,03	1 934,11

Cena s DPH 11 144,14

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt: ZL 59 - drobné zámečnické konstrukce - dokončovací práce

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: Trutnov

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

610: 4. Větrání denních místností a

D4 kuchyněk

7 208,25

3	R	4.14	Protidešťová žaluzie se sitem do čtyřhranného potrubí 560/250 mm, V= 980 m3/h, barva podle požadavku architekta	ks	5,000	1 441,65	7 208,25
			"TENDROVÁ POLOŽKA				
			"protidešťová žaluzie pro sezónní větrání na půdě, do půdních okének"				
5					5,000		

PSV Práce a dodávky PSV

1 072,95

767 Konstrukce zámečnické

1 072,95

1	R	mat01	stolová noha pro nábytek - pomocná konstrukce k umyvadlovým deskám	ks	3,000	357,65	1 072,95
			"NOVÁ POLOŽKA				
			"cena obvyklá : 311,-/ks + 15% doprava , marže				
3					3,000		

HZS Hodinové zúčtovací sazby

645,84

2	HZS	HZS2122	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí truhlář odborný	hod	1,500	430,56	645,84
			"NOVÁ POLOŽKA				
			"oceněno dle URS, CU 2021/2 x ndex 0,92				
"montáž noh k umyvadlovým deskám " 3*0,5					1,500		

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

282,99

4	R	R.0010	Jiné VRN ve výši 3,17%	%	89,270	3,17	282,99
---	---	--------	------------------------	---	--------	------	--------

Celkem

9 210,03

STRONG Stolová noha 820/60 mm

0.250676
6 Sadnocení
Způsob: Strong



376 Kč / ks 376 Kč bez DPH

Objednáno

Varianta

Barva/Provedení: nerez - Objednáno (376 Kč)

1

Přidat do košíku

[Detailní informace](#)

VISKREFTAT SEHLI DATSMLT

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Poradenské a vzdělávací centrum Královéhradeckého kraje při PPP v Trutnově – stavební práce.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	48 448 718,51 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 6	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 7	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 8	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH		
a) (Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)	0 Kč ≤ 137 366 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 %	0,00 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	48 448 718,51 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 6	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 7	ANO

Měněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 7	ANO
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH		
c) (Změna ZsS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6			
Smluvní cena	48 448 718,51 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 236 389,45 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Měněpráce (6) související s vícepracemi	- 20 903,59 Kč bez DPH		
Měněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Vícepráce (k odst. 6)	+ 1 403 460,63 Kč bez DPH		
Měněpráce (6) související s vícepracemi	Kč bez DPH		
Měněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Vícepráce (k odst. 6)	+ 908 118,29 Kč bez DPH		
Měněpráce (6) související s vícepracemi	- 208 480,12 Kč bez DPH		
Měněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Vícepráce (k odst. 6)	+ 4 257 916,51 Kč bez DPH		
Měněpráce (6) související s vícepracemi	- 2 283 058,13 Kč bez DPH		
Měněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Vícepráce (k odst. 6)	+ 1 021 942,67 Kč bez DPH		
Měněpráce (6) související s vícepracemi	- 101 928,06 Kč bez DPH		
Měněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 6	ANO
Vícepráce (k odst. 6)	+ 2 120 411,50 Kč bez DPH		
Měněpráce (6) související s vícepracemi	- 157 109,33 Kč bez DPH		
Měněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 7	ANO
Vícepráce (k odst. 6)	+ 696 321,58 Kč bez DPH		
Měněpráce (6) související s vícepracemi	- 132 609,64 Kč bez DPH		
Měněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 10 644 560,63 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 2 904 088,87 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	13 548 649,50 Kč bez DPH		
c) (Změna ZsS / Smluvní cena) ≤ 50 %	27,96 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6			
Smluvní cena	48 448 718,51 Kč bez DPH		
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 10 644 560,63 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 2 904 088,87 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6		7 740 471,76 Kč bez DPH	

(vícepráce po odečtení méněprací)	1 740 471,70 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	15,98 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	24 663,24 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	POSUDEK OK
Cena nových položek	24 663,24 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	24 663 Kč ≥ 24 663 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč	Dodatek č. 3	POSUDEK OK
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	929 731,42 Kč bez DPH		
Cena nových položek	929 731,42 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
POSOUZENÍ:	929 731 Kč ≥ 929 731 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 6	ANO
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč	Dodatek č. 7	ANO
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 7	ANO
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	7
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 696 321,58 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 132 609,64 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	563 711,94 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	48 448 718,51 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	48 664 204,37 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	50 067 665,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	50 767 303,17 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 4	52 742 161,55 Kč bez DPH

Cena po navýšení z dodatku č. 5	53 662 176,16 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 6	55 625 478,33 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 7	56 189 190,27 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	56 189 190,27 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Veronika Janderová
