

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 01.03.2023
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtnanem Mgr. Martinem Červíčkem

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK – 30373/MJ/2022 ze dne 01.09.2022:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

IČO: 275 02 988

DIČ: CZ27502988

osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:

[REDACTED]

a

(2) PRODIN a.s.

K Vápence 2745, 530 02 Pardubice

IČO: 252 92 161

DIČ: CZ25292161

Zastoupený předsedou představenstva Ing. Leošem Jelínkem

zapsaný v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2532

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na:

Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce
„II/327 Skřivany - Smidary“

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Mění se **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)** následujícím způsobem:

Upravuje se ujednání 22.1 a zní následovně

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
Záborový elaborát <u>v konceptu</u> vč. <u>konceptu</u> diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí (PAU))	do 40 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – <u>vše v konceptu</u>	do 86 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně záborového elaborátu, diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí (PAU) – <u>v čístopise</u> Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – <u>v konceptu</u>	do 8 týdnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP)
PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – <u>vše v konceptu</u>	do 8 týdnů od vydání pravomocného společného povolení
PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – <u>vše v čístopise</u>	do 5 týdnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu PDPS
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace PDPS)

*Koncept – úplná dokumentace/projektová dokumentace včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění dle zadávací dokumentace, ve které budou zapracovány veškeré připomínky projednané v průběhu přípravy.

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/193/2024 ze dne 05.02.2024.

05. 08. 2024

V Hradci Králové dne

22 -07- 2024

V Hradci Králové dne

.....

Objednatel
Mgr. Martin Červíček
hejtman

PRUDIN...Info@prudin.cz...www.prudin.cz

Zhotovitel
Ing. Leoš Jelínek
předseda představenstva

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY PD

Číslo změny:

1

Číslo stavby/JU:

32917.3

Název akce:

Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „II/327 Skřivany - Smidary“

Objednatel:

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Zástupce objednatele:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Zhotovitel:

PRODIN, a.s., K Vápence 2745, 530 02 Pardubice

Datum uzavření Smlouvy o dílo:

01.03.2023

Datum uzavření posledního Dodatku a jeho označení:

Popis a zdůvodnění změny:

Důvodem změny předmětu díla je posun termínu předání Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění (v konceptu) z důvodu nesouhlasného stanoviska VAKu HK a.s. ze dne 5.1.2024, koordinace projektu „Cyklostezka Nový Bydžov - Smidary“, investorem projektu je Dobrovolný svazek obcí POCIDLINSKO a nesoulad v délkách požadované opravy komunikace s provozním staničením ŘSD uvedených ve smlouvě.

Ceny uvedeny v Kč bez DPH:

Cena dle SoD:	Cena dle posledního dodatku:	Méněpráce:	Vícepráce:	Nová cena po změně:
1 794 900,00 Kč	1 794 900,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 794 900,00 Kč

Termíny:

Popis částí Díla	Termín dle SoD nebo posledního dodatku:	Termíny po změně:
Záborový elaborát v konceptu vč. konceptu diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zatřídění asfaltových směsí (PAU)	do 40 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo (nejpozději do 10.12.2023)	x
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 52 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo (nejpozději do 10.3.2024)	do 86 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo (nejpozději do 31.10.2024)
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně záborového elaborátu, diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zatřídění asfaltových směsí (PAU) - v čistopise a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – v konceptu	do 8 týdnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP)	x
PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 8 týdnů od vydání pravomocného společného povolení	x
PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čistopise	do 5 týdnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu PDPS	x

Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace PDPS)	x
----------------	--	---

Přílohy evidenčního listu :

1.	Žádost dodavatele o dodatek ze dne 10.1.2024
2.	Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. - vyjádření ze dne 5.1.2024
3.	
4.	
5.	

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			



VAŠE VIZE.
NÁŠ PROJEKT.

PRODIN a.s.

K Vápence 2745
530 02 Pardubice

IČO 25292161
DIČ CZ25292161

tel. +420 466 055 111
info@prodin.cz

ID datové schránky: wrjftqq

Údržba silnic Královéhradeckého kraje
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

Váš dopis / ze dne

Naše značka
31/23/4009

Vyřizuje / linka

V Pardubicích dne
10.01.2024

Věc: Žádost o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. stavby 32917

Vážený objednateli,

touto cestou Vás žádáme o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 1. 3. 2023 na **Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „II/327 Skřivany - Smidary“** a to z níže uvedených důvodů.

- Nesouhlasné stanovisko VAKu HK a.s. o navýšení kapacity odvodu dešťových vod do stávající kanalizace (viz. příloha)
- Nesoulad v délkách požadované opravy komunikace s provozním staničením ŘSD uvedených ve smlouvě.
- Koordinace projektu „Cyklostezka Nový Bydžov - Smidary“, investorem projektu je Dobrovolný svazek obcí POCIDLINSKO.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi Vás žádáme o souhlas s aktualizací Zvláštních obchodních podmínek (ZOP-D) uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo. Navrhujeme termín předání Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu do 31. 10. 2024.

Prosíme o Vaše stanovisko.

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

S pozdravem

Investor:
Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245/2
50003 Hradec Králové

Vaše značka:

Číslo jednací: **VAKHK/VHR/KT/23/4866**

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

Žadatel:
PRODIN a.s.

K Vápence 2745
53002 Pardubice

Název akce: **II/327 Skřivany - Smidary**

Typ žádosti: **Jiné důvody (např. vyjádření z titulu vlastníka pozemku)**

Typ řízení: **jiný dokument**

Zájemové území:

Datum vydání vyjádření: **05.01.2024**

Platnost tohoto vyjádření: **05.01.2025 (12 měsíců)**

Obdrželi jsme Vaši žádost o vyjádření k záměru umožnění navýšení kapacity odvádění dešťových vod do kanalizace rámci stavby „II/327 Skřivany-Smidary“ zpracované Bc. Lenkou Ledvinkovou, společnost PRODIN, a.s. K předložené žádosti sdělujeme následující:

1. Předmětem projektové dokumentace je návrh rekonstrukce komunikace v obci Skřivany. Projektant žádá o umožnění navýšení kapacity odváděných dešťových vod do kanalizační sítě v areálu společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. a v provozování Královéhradecké provozní, a.s. v intravilánu obce v místě pravé části komunikace Nový Bydžov-Smidary v délce 220 m – odhadovaná plocha 680 m². V zájemové oblasti se vyskytuje podloží nevhodné k zasakování dešťových vod. U stávající komunikace v tomto úseku není obrubník, srážkové vody nyní odtékají do stávajícího přilehlého příkopu.

2. V zájemové lokalitě stavby se nachází stávající kanalizační síť v majetku společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. a v provozování Královéhradecké provozní, a.s., viz přiložená situace. Do této kanalizace jsou již napojeny stávající uliční vpusti v obci Skřivany.

V obci Skřivany plánuje naše společnost stavbu „Kanalizace Skřivany - Dr. Vojtěcha a Nádražní“, která v zájemové oblasti navrhuje výstavbu nové kanalizace funkčně nahrazující stávající rušenou kanalizaci. V rámci stavby nové kanalizace budou obnoveny stávající uliční vpusti.

3. Do kanalizační sítě v obci Skřivany jsou již nyní zaústěny dešťové vody ze značné části zpevněných ploch intravilánu obce. Veškeré odpadní vody v kanalizační síti ve Skřivanech jsou svedeny do čerpacích stanic „Sloupenská 1 a 2“ a výtakem čerpány do kanalizační sítě v Novém Bydžově, odkud tečou na místní ČOV.

Dešťové vody při větších srážkových událostech způsobují přetěžování kanalizační sítě, které může vést k vyvěrání vody skrze kanalizační šachty na povrch nebo zpětnému vzdouvání odpadní vody do kanalizačních přípojek. Dále způsobují nadměrné odlehčování odpadních vod na odlehčovacích komorách a přetěžování čistírny odpadních vod.

Z výše uvedených důvodů nesouhlasíme s navrženým navýšením kapacity odvádění dešťových vod do kanalizace ve Skřivanech (tzn. následně i v Nové Bydžově) oproti stávajícímu stavu. Naopak je žádoucí maximální množství dešťových vod likvidovat mimo kanalizační síť.

4. Tyto podklady nenahrazují vyjádření k projektu pro jakýkoliv stupeň územního, stavebního, případně jiného řízení.

5. Kompletní projektovou dokumentaci na rekonstrukci komunikace ve Skřivanech požadujeme předložit naší společnosti k vyjádření.

6. Toto vyjádření je současně stanoviskem provozovatele vodovodu a kanalizace, kterým je společnost Královéhradecká provozní, a.s.

Toto vyjádření pozbývá platnosti:

- uplynutím doby platnosti vyjádření
- změnou rozsahu vyznačeného území
- změnou účelu vyjádření uvedeného v žádosti

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok ode dne vydání.


technicko - provozní náměstek
Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s.

Přílohy:

počet: 2

- Situace sítí v provozování KHP, a.s.
- Situace záměru

Situace sítí v provozování KHP, a.s.

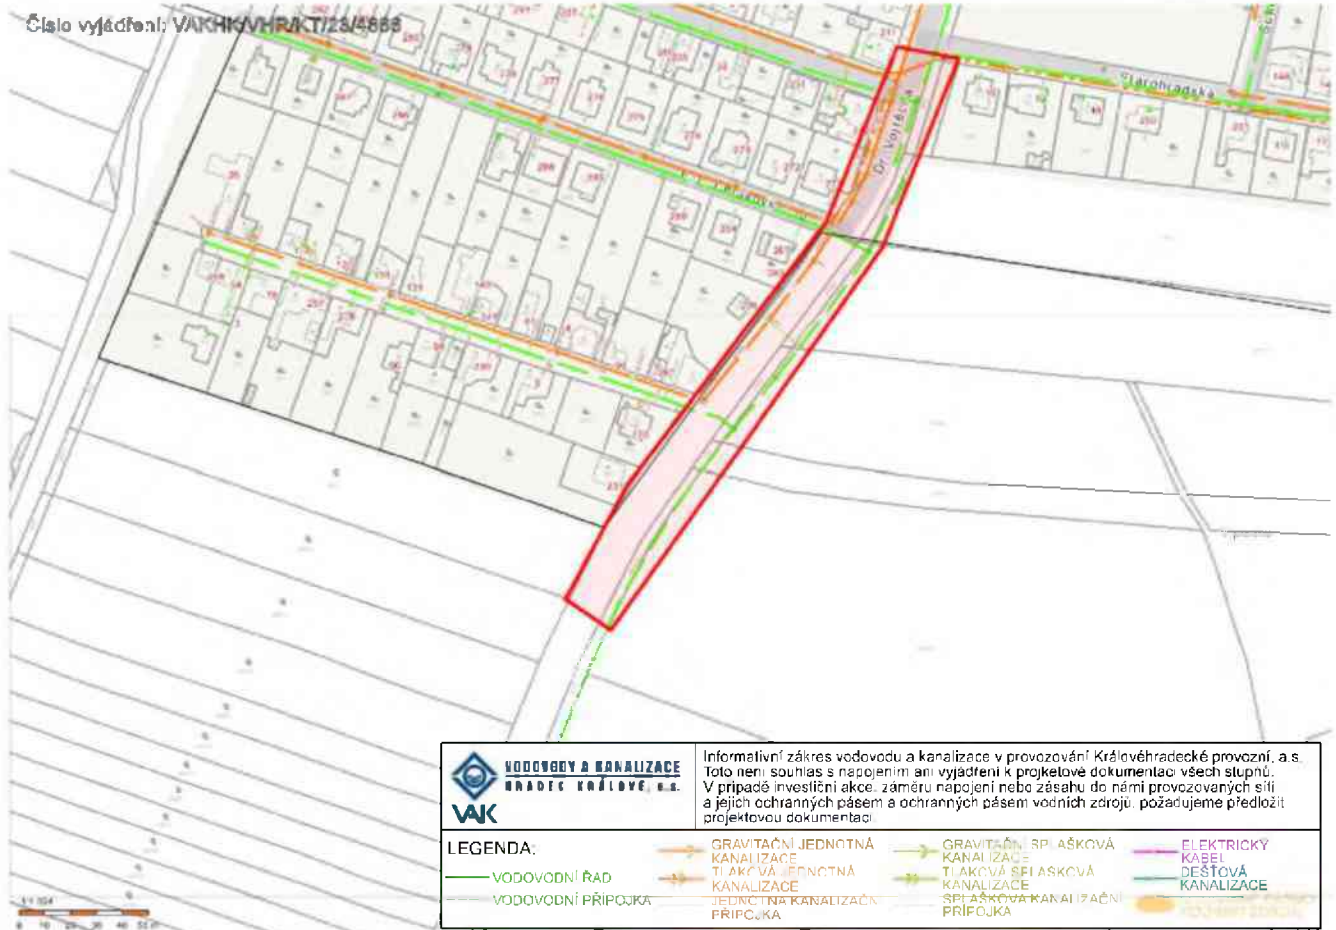

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové

Tel: +420 491 512 784
Fax: +420 495 406 323


IČO: 48172898
DIČ: CZ48172898

e-mail: vakhk@vakhk.cz
www.vakhk.cz

Společnost byla založena podle právního řádu České republiky jako akciová společnost a je zapsána v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 064



Situace záměru

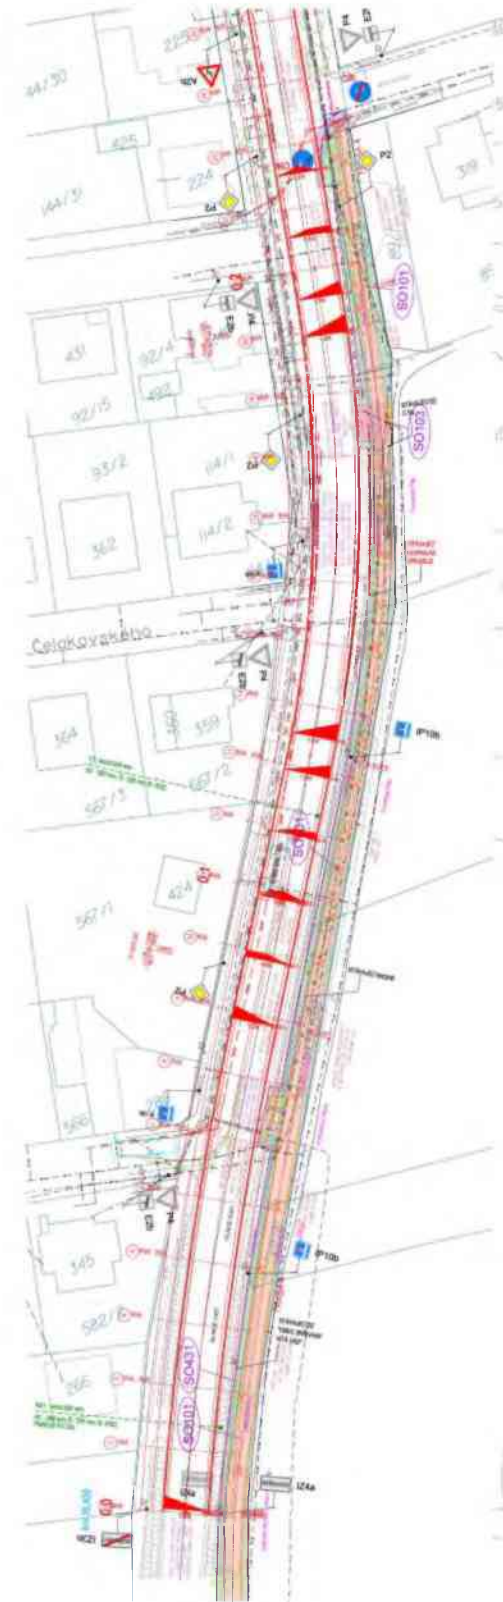

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., Vítá Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové

Tel.: +420 491 512 784
Fax: +420 495 406 323

IČO: 48172898
DIČ: CZ48172898

e-mail: vakhk@vakhk.cz
www.vakhk.cz

Společnost byla založena podle právního ládu
Česká republika jako akciová společnost
a je zapsána v Obchodním rejstříku
Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 984.
