

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo ze dne 16. 2. 2024

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zástupce: Mgr. Martin Červíček, hejtman
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
dále též „objednatel“

a

**Společnost / podnikatel Společnost GEOSAN – BAK – Urgent Náchod
Vedoucí společník GEOSAN GROUP a.s.**

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 12459

se sídlem: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín
zastoupený: Luděk Kostka, předseda představenstva
Ivan Havel, člen představenstva
Ing. Kamil Vykydal, výkonný ředitel, na základě plné moci
JUDr. Ing. Karel Kutnohorský, ředitel závodu pozemních staveb Čechy, na
základě plné moci
IČO: 28169522
DIČ: CZ28169522
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Společník BAK stavební společnost a.s.

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 14336

se sídlem: Žitenická 871/1, Prosek, 190 00 Praha 9
zastoupený: Ing. Radek Mrázek, MBA, místopředseda představenstva
IČO: 28402758
DIČ: CZ28402758

(dále jen „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)

(objednatel a zhotovitel jednotlivě také jako „smluvní strana“, společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 4 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 16. 2. 2024, ve znění předešlých dodatků, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky nazvané: „**Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod**“ (dále jen „veřejná zakázka“).

I. Účel dodatku

1. Tento dodatek je dále uzavírán dle čl. 6 odst. 6.3 a odst. 6.4 a čl. 16 odst. 16.2 původní smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon“) v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací – víceprací, méněprací a nutných změn:

a) Jedná se o změny dle § 222 odst. 4 zákona, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné pro zhotovení díla – práce podle Změnového listu č. 21, č. 22, č. 24, č. 29, č. 30, č. 32, č. 33, č. 36, č. 39, č. 40, č. 41, č. 48 a č. 50

vícepráce: 2 903 710,36 Kč bez DPH

méněpráce: - 2 765 066,93 Kč bez DPH

b) Jedná se o změny dle § 222 odst. 5 zákona, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jsou nezbytné pro zhotovení díla, změna v osobě dodavatele není možná a způsobila by objednateli zvýšení nákladů – práce podle Změnového listu č. 23

vícepráce: 136 404,93 Kč bez DPH

méněpráce: -- Kč bez DPH

c) Jedná se o změny podle § 222 odst. 6 zákona, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky – práce podle Změnového listu č. 19, č. 20, č. 25, č. 26, č. 27, č. 28, č. 31, č. 34, č. 35, č. 37, č. 38, č. 42, č. 43, č. 44, č. 45, č. 46, č. 47 a č. 49

vícepráce: 2 623 421,39 Kč bez DPH

méněpráce: - 478 878,33 Kč bez DPH

2. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou změnové listy č. 19 až 50, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

3. Změny podle odst. 1 tohoto článku činí:

vícepráce: 5 663 536,68 Kč bez DPH

méněpráce: - 3 243 945,26 Kč bez DPH

4. Celková smluvní cena ve smlouvě o dílo ze dne 16. 2. 2024 ve znění předešlých dodatků se tedy **navyšuje o 2 419 591,42 Kč bez DPH.**

II.

Vymezení rozsahu změn

1. Čl. 6 odst. 6.2 původní smlouvy se mění a nově zní takto:

Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí

cena celkem bez DPH 92 135 836,64 Kč

DPH samostatně 19 348 525,69 Kč

cena celkem s DPH 111 484 362,33 Kč

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek je ve smyslu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje na jejím jednání konaném dne 23. 9. 2024.

Přílohy:

Změnové listy č. 19 až č. 50

Seznam změnových listů

Změny závazků ze smlouvy

Za objednatele:



.....

Mgr. Martin Červíček, hejtman
Královéhradecký kraj

Za zhotovitele:



.....

Luděk Kostka, předseda představenstva
GEOSAN GROUP a.s.



.....

Ivan Havel, člen představenstva
GEOSAN GROUP a.s.



.....

Ing. Radek Mrázek, MBA,
místopředseda představenstva
BAK stavební společnost a.s

ZMĚNOVÝ LIST

019

Odstranění plotové zídky v místě schodiště SCH1

Stavba:	Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod		
Objekt:	SO-00 - Příprava staveniště		
Předkládá:	Společnost GEOSAN - BAK - Urgent Náchod	Datum:	10.08.2024

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou	☐	1) Položkový rozpočet změny	1 list
e-mailem	☒	2) Projektové podklady	0 list
osobně	☒	3) Fotodokumentace a ostatní přílohy	2 list

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

Obsaženo v projektové dokumentaci pro provádění stavby, nebylo zahrnuto v soupisu stavebních prací

1.2 Popis nového řešení:

Doplnění položek bouracích prací plotové zídky

2 Zdůvodnění změny:

Předmětem změnového listu je doplnění opomenutých položek týkajících se odstranění plotové zídky v místě napojení schodiště s ozn. SCH1 na veřejný chodník v ulici Purkyňova a Bartoňova.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:

ANO

NE

4 Dopad do smluvních termínů:

ANO

(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)

NE

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek

odst.

6

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	—	0,00	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	92 745,40	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		92 745,40	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Lukáš Laštovička, DiS.	Jan Čejchan	Ing. René Hubka	Bůžek Miroslav	Franišek Mrázek, DiS.

GEOSAN GROUP a.s.	CE-NG s.r.o.	Proxion s.r.o.	ON Náchod a.s.	Královéhradecký kraj
-------------------	--------------	----------------	----------------	----------------------

SOUPIS PRACÍ - ZL 19 Odstranění plotové zídky v místě schodiště SCH1

Stavba: ON Náchod Urgentní příjem

Objekt: SO-00 - Příprava staveniště

Místo: Náchod

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel: Společnost GEOSAN – BAK – Urgent Náchod

Datum: 10.08.2024

Projektant:

Zpracovatel: Společnost GEOSAN – BAK – Urgent Náchod

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							92 745,40	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				92 745,40	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				62 696,87	
27	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého Základ vxšxd 0,8*0,7*18	m3	10,080	4 390,44	44 255,64	SOD
					10,080			
28	K	961055111	Bourání základů z betonu železového ZB vxšxd (0,7*0,5*2)+(0,92*0,5*1,3)	m3	1,718	6 036,85	10 371,31	SOD
					1,718			
N	K	962022491	Bourání zdiva naozákladováno kamenného na MC přes 1 m3 Před vxšxd 0,75*0,5*13,5	m3	5,063	1 593,90	8 069,92	CS ÚRS 2024_01*0,99
		W	Součet		5,063			
D		997	Přesun sutě				30 048,53	
16	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezuskládku do 1 km se složením 16,861*2,2	t	37,094	219,52	8 142,92	SOD
					37,094			
17	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 37,094*0,7	t	222,565	25,25	5 619,77	SOD
		W	Přepočtené koeficientem množství		222,565			
18	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	37,094	439,04	16 285,84	SOD
		W						

ZMĚNOVÝ LIST

020

Zemní práce pro komunikaci s ozn. úsek 1

Stavba:	Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod		
Objekt:	SO-03 Komunikace a zpevněné plochy		
Předkládá:	Společnost GEOSAN - BAK - Urgent Náchod	Datum:	10.08.2024

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem	☒	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy	1 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

Dle projektové dokumentace pro provádění stavby odkopávky (zemní práce) pro provedení silničního tělesa příjezdové komunikace s ozn. úsek 1

1.2 Popis nového řešení:

Doplnění položek týkajících se zemních prací pro předmětnou komunikaci

2 Zdůvodnění změny:

Předmětem změnového listu je doplnění opomenutých položek zemních prací včetně odvozu, ukládky a polatku za uložení přebytečné zeminy do soupisu stavebních prací.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	☐	ANO	☒	NE
---	--------------------------	-----	-------------------------------------	----

4 Dopad do smluvních termínů:	☐	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	☒	NE
-------------------------------	--------------------------	--	-------------------------------------	----

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	6
---	-------	---

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	172 163,89	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		172 163,89	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za TDS - specialistu:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Ing. Laštovička, DiS.	Jan Čejchan		Ing. René Hubka	Miroslav Bůžek	František Mrázek, DiS.

GEOSAN GROUP a.s.	CE-ING s.r.o.	Proxion s.r.o.	ON Náchod a.s.	Královéhradecký kraj
-------------------	---------------	----------------	----------------	----------------------

SOUPIS PRACÍ - ZL 20 Zemní práce pro komunikaci s ozn. úsek 1

Stavba:

ON Náchod Urgentní příjem

Objekt:

SO-03 - Komunikace a zpevněné plochy

Soupis:

01 - Komunikace a plochy

Místo: Náchod
Zadavatel: Královéhradecký kraj
Uchazeč: Společnost GEOSAN – BAK – Urgent Náchod

Datum: 10. 8. 2023
Projektant:
Zpracovatel: Společnost
GEOSAN – BAK –
Urgent Náchod

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							172 163,89
D	HSV		Práce a dodávky HSV				172 163,89
D	1		Zemní práce				172 163,89
10	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	216,705	143,79	31 160,01
	W		obsah z podélného řezu				
	W		30,53*4,5		137,385		
			Svahování z příčného řezu obsah x délka				
			1,2*7		8,4		
	W		(1,8+2,14)*18		70,92		
			Součet		218,705		
16	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	216,705	208,55	45 193,83
17	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 300,230	5,49	7 138,26
	W		216,705*6 "Přepočtené koeficientem množství		1 300,230		
	W		Součet		1 300,230		
18	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	i	346,728	241,47	83 724,41
	W		216,705*1,6 "Přepočtené koeficientem množství		346,728		
	W		Součet		346,728		
13	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	216,705	22,83	4 947,38



ZMĚNOVÝ LIST

021

Provizorní přepojení vodovodu

Stavba:	Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod		
Objekt:	IO-01 Přeložky vodovodů		
Předkládá:	Společnost GEOSAN - BAK - Urgent Náchod	Datum:	16.05.2024

Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů	
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem	☒	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy	1 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

Neobsaženo

1.2 Popis nového řešení:

Zřízení provizorního přepojení vodovodu v délce 35 m pomocí nadzemního trubního bypassu

2 Zdůvodnění změny:

Při provádění zemních a pilotovacích prací byly ověřeny skutečné polohy areálového rozvodu a přípojky vodovodu do pavilonu B v místě budoucí markýzy, které vyvolali nutnost provizorního propojení pomocí dočasných nadzemních bypassů stávajícího areálového vodovodu tak, aby byla zajištěna posloupnost prací dle HMG a toto řešení minimalizuje lhůtu odstávky pavilonů od dodávky vody. Toto dočasné řešení dále eliminuje možné případné havárie při pojezdu pilotovací soupravy na nově překládaném podzemním potrubí.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:

ANO

NE

4 Dopad do smluvních termínů:

ANO

(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)

NE

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek

odst.

4

5 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	27 224,55	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		27 224,55	bez DPH

6 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Lukáš Laštovička, DiS.	Jan Čejchan	Ing. René Hubka	Miroslav Bůžek	František Mrázek, DiS.

GEOSAN - BAK s.r.o.

CE-ING s.r.o.

Proxion s.r.o.

ON Náchod a.s.

Královéhradecký kraj

170 00 Praha 7
DIČ: CZ28169522

SOUPIS PRACÍ - ZL 21 - Provizorní přepojení vodovodu

Stavba: ON Náchod Urgentní příjem

Objekt: 02 - Stoka B

Misto: Náchod

Datum: 16.05.2024

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel: Společnost GEOSAN – BAK – Urgent Náchod

Zpracovatel: Společnost GEOSAN – BAK – Urgent Náchod

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 27 224,55

D HSV Práce a dodávky HSV 27 179,30

D 8 Trubní vedení 27 179,30

40	K	857262122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	3,000	908,82	2 726,46	SOD
W			1+2 *1x šoupě + 2x slepá příruba		3,000			
W			Součet		3,000			
N	M	55253696	příruba zaslepovací litinová vodovodní s vnitřním závitem 2" PN10/16 XG-kus DN 100	kus	2,000	2 534,40	5 068,80	ÚRS 2024_01*0,99_
N	K	871211141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm	m	35,000	111,87	3 915,45	ÚRS 2024_01*0,99_
N	M	28613113	trubka vodovodní PE100 RC PN 16 SDR11 63x5,8mm	m	35,525	129,69	4 607,24	ÚRS 2024_01*0,99_
W			35 * 1,015		35,525			
N	K	871251811	Demontáž potrubí z polyethylenu D přes 50 do 90 mm	kus	35,000	57,32	2 006,24	ÚRS 2024_01*0,99_
N	K	877211101	Montáž tvarovek na vodovodním potrubí z PE trub d 63	kus	4,000	285,12	1 140,48	ÚRS 2024_01*0,99_
N	M	28653083	vložka přechodová PE/mosaz pro vodovodní potrubí PN16 plyn PN10 vnější závít 63-2"	kus	2,000	1 098,90	2 197,80	ÚRS 2024_01*0,99_
N	M	28614946	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 63mm	kus	2,000	577,17	1 154,34	ÚRS 2024_01*0,99_
N	K	877211113	Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE trub d 63	kus	1,000	342,99	342,99	ÚRS 2024_01*0,99_
N	M	28614958	elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 63mm	kus	1,000	572,22	572,22	ÚRS 2024_01*0,99_
N	K	891261811	Demontáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	1,000	789,03	789,03	ÚRS 2024_01*0,99_
48	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	35,000	22,13	774,55	SOD
49	K	892353122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	m	35,000	53,82	1 883,70	SOD
D 998			Přesun hmot				45,25	
62	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,053	861,40	45,25	SOD



ZMĚNOVÝ LIST

22

Záměna technologie provádění omítek

Stavba:	Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod		
Objekt:	SO-01 - Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B		
Předkládá:	Společnost GEOSAN - BAK - Urgent Náchod	Datum:	01.06.2024

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem	☒	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy	1 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

Opravy a nové omítky vápenocementové a štukové v rozsahu výkazu výměr soupisu stavebních prací

1.2 Popis nového řešení:

Omítky sádrové a stěrkové včetně instalace sklovláknitého pletiva do opravovaných ploch stávajících stěn, narovnání výměr oprav na skutečnost

2 Zdůvodnění změny:

Po dokončení odstranění obkladů, odstranění omyvatelných nátěrů a po zasekání nových a demontáži stávajících TZB instalací je vyhodnocen skutečný stav stěn a rozsah nutných oprav omítek. Za účelem zajištění soudržnosti podkladu a srovnání povrchů stěn před finální vrstvou omítek je generálním dodavatelem navržen technologický postup oprav s dopadem do změny typu omítek tj. z klasických vápenocementových a štukových za omítky a stěrky sádrové včetně použití sklovláknitého pletiva. Tato změna zajistí celistvou pohledovost stěn bez viditelných přechodů a případných trhlin v omítkách, které při použití vápenocementových štukových by nastaly na opravovaných stěnách. Tak aby byla zajištěna jednotná pohledovost a struktura omítek v daných prostorech (místnostech), bude provedena záměna typu omítek i na nových vyzdívkách.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:

ANO

NE

4 Dopad do smluvních termínů:

ANO

(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)

NE

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek

odst.

4

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	—	-1 932 018,37	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	2 117 554,96	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		185 536,59	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Lukáš Laštovička, DiS.	Jan Čejchan	Ing. René Hubka	Miroslav Bůžek	František Mrázek, DiS.

GEOSAN GROUP a.s.

CE-ING s.r.o.

Proxion s.r.o.

ON Náchod a.s.

Královéhradecký kraj

GEOSAN GROUP a.s.
U Průhonu 1516/32
170 00 Praha 7
DIČ: CZ28169522

SOUPIS PRACÍ - ZL 022 Záměna technologie provádění omítek

Stavba:

ON Náchod Urgentní příjem

Objekt:

SO-01 - Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B

Soupis:

02 - Nový stav

Místo:

Náchod

Datum:

01.06.2024

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:



Uchazeč:

Společnost GEOSAN – BAK – Urgent Náchod

Zpracovatel:

Společnost GEOSAN – BAK – Urgent Náchod

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							185 536,59	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				185 536,59	
D	6		Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní				185 536,59	
51	K	612001R	Zatření spár stěrkovou hmotou vnitřních stěn	m2	-2 156,076	61,62	-132 857,40	SOD
	W		stěny*0,3-obklad		478,382			
	W		Mezisoučet		478,382			
	W		(40,982+46,424+184,792+566,649)*2		1 677,694			
	W		Součet		2 156,076			
52	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	-2 156,076	205,76	-443 634,20	SOD
	W		stěny*0,3-obklad		478,382			
	W		Mezisoučet		478,382			
	W		(40,982+46,424+184,792+566,649)*2		1 677,694			
	W		Součet		2 156,076			
54	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	-1 607,082	384,16	-617 376,62	SOD
	W		stěny*0,1		274,497			
	W		(40,982+46,424+184,792+566,649)*2		1 677,694			
	W		-obklad		-345,109			
	W		Součet		1 607,082			
55	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	-2 744,971	268,91	-738 150,15	SOD
	W		stěny		2 744,971			
N	K	978013191	Odlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	159,000	108,90	17 315,10	ÚRS 2024_01*0,99
	W		osekání perlinky 159 m2					
N	K	978035117	Odstanění tenkovrstvé omítky tl do 2 mm obroušením v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	641,680	122,76	78 772,64	ÚRS 2024_01*0,99
	W		osekání štukové vrstvy 641,68 m2					
N	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený křídlem	m2	3 721,109	69,70	259 346,41	ÚRS 2024_01*0,99
	W		stěny*0,1 stěny 1688 m2 Před vyrovnávkou s perlinkou a před sádkovou stěrkou		3 376,000			
	W		obklad		345,109			
	W		Součet		3 721,109			
N	K	612325402	Oprava vnitřní vápenocementové omítky hrubé stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	1 688,000	216,79	369 317,52	ÚRS 2024_01*0,99
	W		vyrovnání podkladu před instalací perlinky					
N	K	612142001	Plátno sklovláknité vnitřních stěn vtažené do tmelu	m2	1 688,000	277,20	467 913,60	ÚRS 2024_01*0,99
	W		stěny*0,1 stěny 1688 m2		1 688,000			
	W		Součet		1 688,000			
N	K	612341121	Sádková nebo vápenosádková omítka hladká nepropisiva vnitřních stěn nanášená ručně	m2	1 607,082	362,34	582 310,09	ÚRS 2024_01*0,99
	W		stěny*0,1		274,497			
	W		(40,982+46,424+184,792+566,649)*2		1 677,694			
	W		-obklad		-345,109			
	W		Součet		1 607,082			
N	K	612181001	Stěrka stěrka tl do 3 mm vnitřních stěn	m2	1 688,000	202,95	342 579,60	ÚRS 2024_01*0,99
	W		oprava stěn 1688 m2		1 688,000			
	W		Součet		1 688,000			

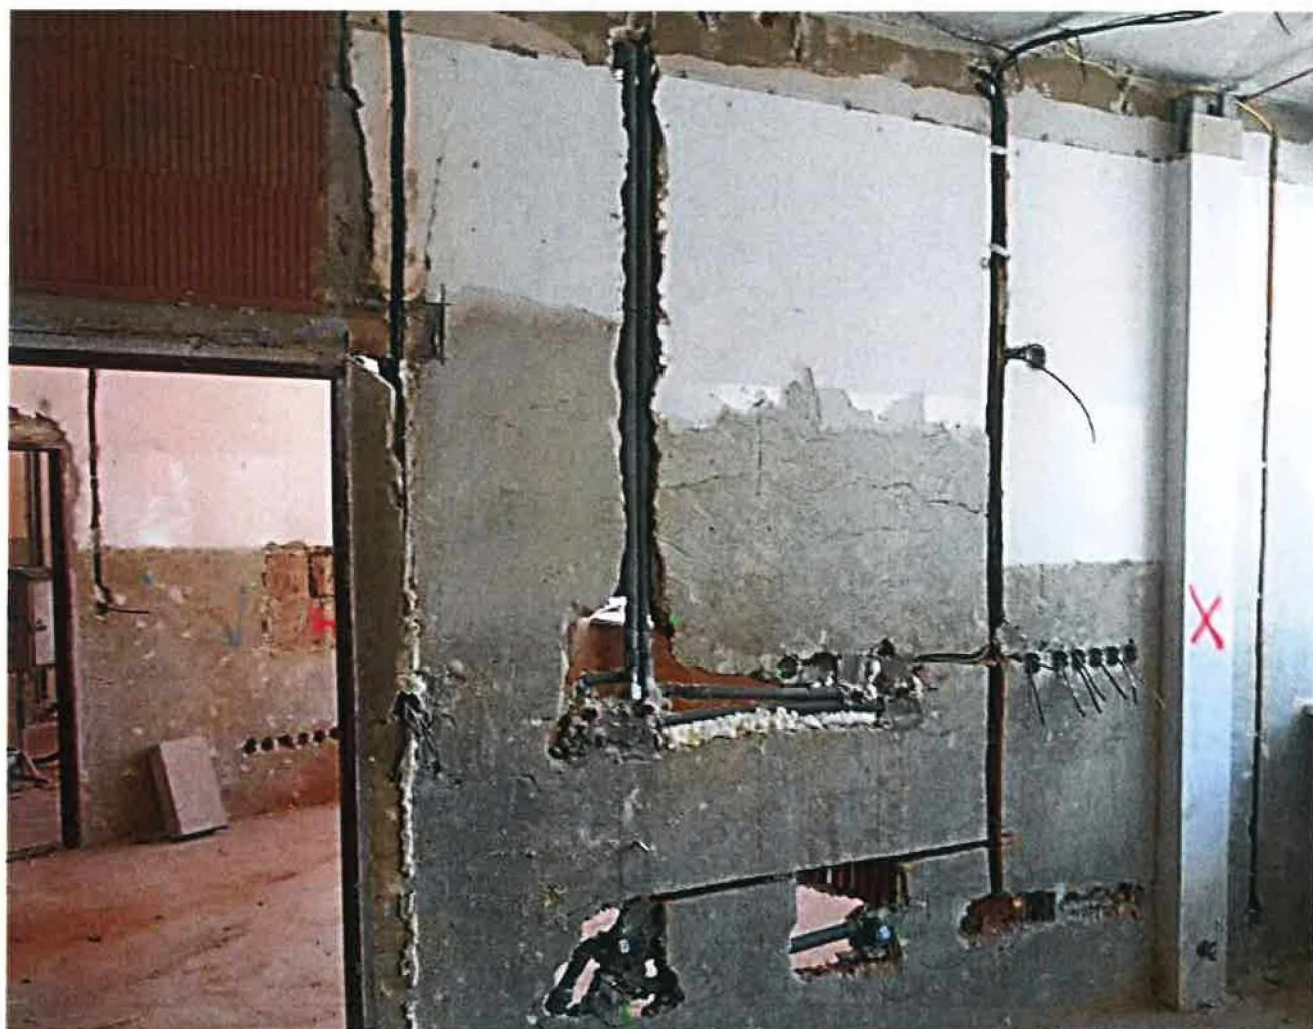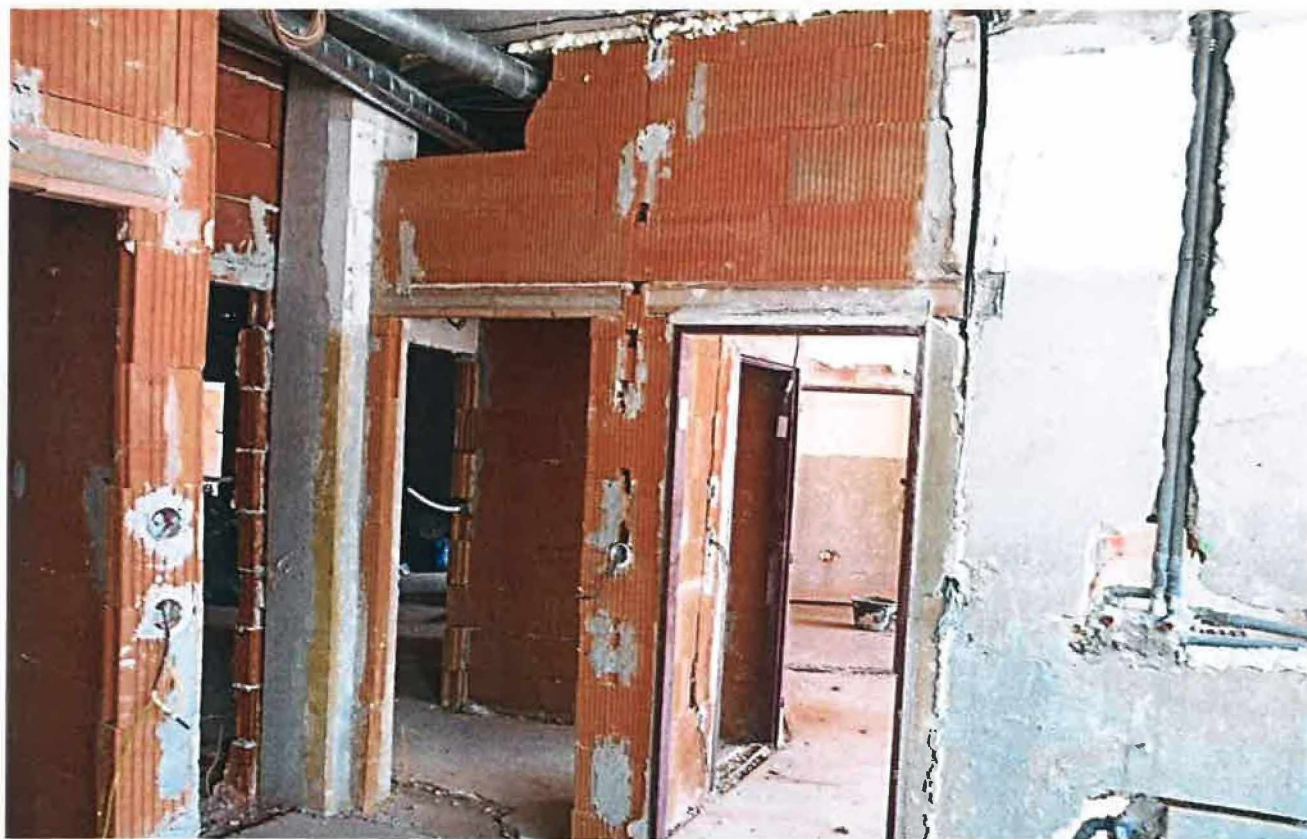



ZMĚNOVÝ LIST			023
Doplnění EPS a kabeláž odvětrání CHUC Pavilon A a B			
Stavba:	Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod		
Objekt:	SO-01 Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B		
Předkládá:	Společnost GEOSAN - BAK - Urgent Náchod	Datum:	14.05.2024

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů
poštou	1) Položkový rozpočet změny 1 listů
e-mailem	2) Projektové podklady 1 listů, výkresů
osobně	3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 0 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:
EPS dle projektové dokumentace pro provádění stavby

1.2 Popis nového řešení:
Rozšíření nového systému EPS o hlásiče, tlačítka a a další funkční prvky, doplnění kabeláže pro odvětrání chráněných únikových cest dle PD změny stavby před jejím dokončením vzniklé v rámci projektových prací 2 etapa - demolice a novostavba pavilonu D, Viz sezma PDZSPD, která je přílohou tohoto ZL

2 Zdůvodnění změny:

V rámci souběžné akce s názvem 2 etapa ON Náchod (demolice a novostavba pavilonu D) vznikla nutnost na vydání rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením na urgentní příjem. Toto rozhodnutí bylo podmiňujícím rozhodnutím pro vydání stavebního povolení na novostavbu pavilonu D. V rámci plánované demolice pavilonu D došlo k potřebě vzniku dvou chráněných únikových cest (dále jen CHUC) v pavilonu B a A včetně zajištění nuceného odvětrání a zajištění central a total stopu. Předmětem změnového listu je doplnění stavebních prací o doplnění komponentů EPS včetně kabeláže do schodišť 1NP pavilonu B a A (otevírání vstupních dveří do přístavby vstupu pavilonu B na signál EPS, doplnění EPS hlásičů, sirény a kouřových čidel, vše dle PBR změny stavby před jejím dokončením) a dále doplnění central a total stopu včetně zhotovení kabelážových tras v rekonstruovaných prostorech urgentu - příprava pro komponenty VZT zajišťující odvětrání schodišť CHUC. Tyto dodatečné stavební práce je nutné provést v rámci zakázky urgent z důvodu slučitelnosti s novými instalacemi TZB urgentu (EPS a silnoproud). Dodatečné stavební práce zajišťované jiným dodavatelem by vyvolaly objednateli dodatečné další práce, zvýšené náklady za opětovné práce a provozní a koordinační obtíže (tj v nových prostorech demontáže a opětovné montáže nových kazetových podhledů, instalace kabeláže nástěnných prvků EPS do nových omítek s opětovným zapravením, kabelové úpravy na nových obvodech systému EPS 1 NP pavilonu A a B, dodatečné úpravy vstupních automatických posuvných dveří, úpravy v rozvaděčích, omezení provozu urgentu a také dotčení záruky na celkové dílo).

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	☐ ANO	☒ NE
4 Dopad do smluvních termínů:	☐ ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	☒ NE
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	5

5 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	—	0,00	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	136 404,93	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		136 404,93	bez DPH

6 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za TDS - specialistu:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:

GEOSAN GROUP a.s.	CE-ING s.r.o.	Proxion s.r.o.	ON Náchod a.s.	Královéhradecký kraj
-------------------	---------------	----------------	----------------	----------------------

170 00 Praha 7
DIČ: CZ28169522

REK ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - ZL 23 Doplnění EPS a kabeláž odvětrání CHUC Pavilon A a B

Stavba:

ON Náchod Urgentní příjem

Objekt:

SO-01 - Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B

Soupis:

08 - Slabaproud rozvody + elektrická požární signalizace

Úroveň 3:

08 - elektrická požární signalizace + příprava CHUC

Místo:

Náchod

Datum:

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							136 404,93
1	K	001R	Doplnění EPS koncových prvků včetně kabeláže do CHUC pavilonu A a B viz. samostatný rozpočet	kpl	1,000	58 133,51	58 133,51
2	K	002R	Odvětrání CHUC pavilon A a B - KABELOVÁ PŘÍPRAVA viz. samostatný rozpočet	kpl	1,000	78 271,42	78 271,42

Urgentní příjem oblastní nemocnice Náchod
Vnitřní slaboproudé rozvody - EPS

Doplnění EPS koncových prvků včetně kabeláže do CHUC pavilonu A a B

Rekapitulace rozpočtu

HLAVA III. Základní rozpočtové náklady			
Dodávky a materiál celkem			38 187,52 Kč
Montáže celkem			15 026,07 Kč
Mimostav. Doprava			3 335,54 Kč
Spotřební materiál			677,53 Kč
Zkušební provoz, Zaškolení obsluhy			646,26 Kč
Celkem			57 872,92 Kč
HLAVA XI. Náklady hrazené z provozních prostředků			
Revize			260,59 Kč
Celkem			260,59 Kč
Celkem bez DPH			58 133,51 Kč
Daň z přidané hodnoty			
Základní sazba DPH	21 %	58 133,51 Kč	12 208,04 Kč
Celkem s DPH			70 341,55 Kč

Rozpočet

Dodávka EPS ESSER

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
057633	Montážní plech IQ8Control C/M pro koppler nebo AWUG DS 7500 nebo DS 8800	4	ks	186,59 Kč	746,36 Kč
766235	Multifunkční siréna červená 10-28 V DC, IP 54, 105 dB	1	ks	828,02 Kč	828,02 Kč
788603	Skříň pro Koppler 4/2 montáž na C listu DIN	4	ks	340,97 Kč	1 363,88 Kč
802373	OT-multisenzor. hlásič PAM série IQ8Quad - G 205070	2	ks	2 030,53 Kč	4 061,06 Kč
781590	Sokl hlásiče v základním ver. pro hlásiče Serie 9000 a 9200	2	ks	164,17 Kč	328,34 Kč
804970	Tlačítkový hlásič standardní - kompak se sklíčkem	7	ks	2 057,24 Kč	14 400,68 Kč
Celkem					21 728,34 Kč

Dodávka ostatních zařízení a materiálu

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
PC009100	Protipožární ucpávková pěna INTUMEX MW	2	ka	335,02 Kč	670,04 Kč
PC009400	Kabel JE-H(St)H FE 180/E30 2x2x0,8 bezhalogen. ohniodolný	156	m	23,81 Kč	3 714,36 Kč
PC009390	Kabel J-H(St)H Bd 2x2x0,8 bezhalogen. oheň retardující	82	m	19,79 Kč	1 622,78 Kč
PC024660	Protipožární kotva (Šroub OBO Bettermann) MMS-ST M6 6x60 Č. schválení Z-21.1-1503	520	ks	20,10 Kč	10 452,00 Kč
Celkem					16 459,18 Kč

Montáže dle ceníku C22M

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
PC231880	Montáž kovové požární příchytky	520	ks	6,58 Kč	3 421,60 Kč
PC234460	Montáž Koppleru a skříně	4	ks	493,73 Kč	1 974,92 Kč
220 330121	Montáž podložky pod zásuvku	2	ks	82,29 Kč	164,58 Kč
220 330113	Montáž zásuvky aut.hlásiče do zavěšeného stropu(podh.)	2	ks	90,52 Kč	181,04 Kč
220 330102	Montáž tlačítkového hlásiče pod omítku	7	ks	329,15 Kč	2 304,05 Kč
220 330166	Montáž poplachové sirény	1	ks	246,86 Kč	246,86 Kč
220 281651	Kabel	238	m	28,28 Kč	6 733,02 Kč
Celkem					15 026,07 Kč

Odvětrání CHUC pavilon A a B - KABELOVÁ PŘÍPRAVA

Rekapitulace rozpočtu

HLAVA III. Základní rozpočtové náklady			
Dodávky a materiál celkem			47 071,90 Kč
Montáže celkem			24 575,31 Kč
Mimostav. Doprava			4 491,00 Kč
Spotřební materiál			912,23 Kč
Zkušební provoz, Zaškolení obsluhy			870,13 Kč
Celkem			77 920,56 Kč
HLAVA XI. Náklady hrazené z provozních prostředků			
Revize			350,86 Kč
Celkem			350,86 Kč
Celkem bez DPH			78 271,42 Kč
Daň z přidané hodnoty			
Základní sazba DPH	21 %	78 271,42 Kč	16 437,00 Kč
Celkem s DPH			94 708,42 Kč

Dodávka ostatních zařízení a materiálu

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
N 34111368	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční schopností při požáru 180min a P60-R třída reakce na oheň B2cas1d0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) 5x4mm2	77	m	122,76 Kč	9 452,52 Kč
N 34111351	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční schopností při požáru 180min a P60-R třída reakce na oheň B2cas1d0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) 4x1,5mm2	33	m	46,83 Kč	1 545,29 Kč
N 34111378	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční schopností při požáru 180min a P60-R třída reakce na oheň B2cas1d0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) 7x1,5mm2	83	m	89,50 Kč	7 428,17 Kč
N 34111366	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční schopností při požáru 180min a P60-R třída reakce na oheň B2cas1d0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) 5x1,5mm2	44	m	59,50 Kč	2 617,96 Kč
N 34111366R	Krabice rozbočná 120x110x51 - požární	1	ks	630,56 Kč	630,56 Kč
N PC024660	Protipožární kotva (Sroub OBO Bettermann) MMS-ST M6 6x60	790	ks	20,10 Kč	15 879,00 Kč
N 00942	ovládač T.S. a C.S. 1 H pod sklem, plast skříň IP54	2	ks	1 879,20 Kč	3 758,40 Kč
N PC02466R	Úprava rozvadeče RH a R-PD	1	ks	5 760,00 Kč	5 760,00 Kč
Celkem					47 071,90 Kč

Montáže dle ceníku C22M

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
210813063	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého pevně	77	ks	56,93 Kč	4 383,23 Kč
210813031	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x1,5 až 4 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého pevně	33	ks	53,36 Kč	1 760,91 Kč
210813071	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 7x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého pevně	83	ks	53,36 Kč	4 428,96 Kč
N 210140431	Total a Central Stop - ovladač pom. obvodu tlačítkový	2	ks	204,06 Kč	408,12 Kč
210813061	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého pevně	44	ks	53,36 Kč	2 347,88 Kč
Celkem					13 329,11 Kč

Montáže ostatní

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
N PC231880	Montáž kovové požární příchytky	790	ks	6,58 Kč	5 198,20 Kč
N	Úprava rozvadeče RH a R-PD, montážní práce	1	ks	6 048,00 Kč	6 048,00 Kč
Celkem					11 246,20 Kč

Seznam projektové dokumentace změny stavby před jejím dokončením

OZN.ČÁSTI PROJEKTU	NÁZEV
PBŘ	POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - dodatek k PBŘ na urgentní příjem
	Technická zpráva
	Půdorysné výkresy 1-4NP - zakres konc prvků
D	DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
SO-01	Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B
D.1.4.3	Vdouchotechnika
1	ONN_VZT_objekt A+B_1 D.1.4.2.-001 Technická zpráva
	ONN_VZT_objekt A+B_1 D.1.4.2.-01 PŮDORYS 1.NP
	ONN_VZT_objekt A+B_2 D.1.4.2.-02 PŮDORYS 2.NP
	ONN_VZT_objekt A+B_3 D.1.4.2.-03 PŮDORYS 3.NP
VZT 2	ONN_VZT_objekt A+B_4 D.1.4.2.-04 PŮDORYS 4.NP
VZT 3	ONN_VZT_objekt A+B_5 D.1.4.2.-05 PŮDORYS STŘECHY
VZT 4	ONN_VZT_Tabulky výkonů_ OBJEKTY A+B
D.1.4.5	Elektroinstalace
1	D.1.4.6. 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA
2	D.1.4.6. 02 PŮDORYS 1.N.P. A 4.N.P. - ELEKTROROZVODY PRO PBZ
3	D.1.4.6. 03 SCHÉMATA ROZVÁDĚČŮ R.PBZ-A, R.PBZ-B
4	D.1.4.6. 04 SCHÉMA ROZVÁDĚČE R-PO
5	D.1.4.6. 05 STÁVAJÍCÍ ROZVÁDĚČ RH - ÚPRAVY A DOPLNĚNÍ

ZMĚNOVÝ LIST

024

Změna zdravotnické technologie dle požadavku uživatele

Stavba:	Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod		
Objekt:	SO-01 - Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B		
Předkládá:	Společnost GEOSAN - BAK - Urgent Náchod	Datum:	12.08.2024

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem	☒	2) Projektové podklady	3 listů, výkresů
osobně		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy	0 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

Specifikace zdravotnického vybavení dle Specifikace zdravotní technologie pevně spojené se stavbou _ část B

1.2 Popis nového řešení:

Specifikace zdravotnického vybavení dle Specifikace zdravotní technologie pevně spojené se stavbou _ část B rev 4 viz Příloha ZL

2 Zdůvodnění změny:

Na základě požadavku uživatele nemocnice Náchod dochází k úpravě rozsahu zdravotní technologie pevně spojené se stavbou včetně doplnění kotveného nerezového vybavení.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	☐	ANO	☒	NE
---	--------------------------	-----	-------------------------------------	----

4 Dopad do smluvních termínů:	☐	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	☒	NE
-------------------------------	--------------------------	--	-------------------------------------	----

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	4
---	-------	---

5 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	—	-240 584,53	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	279 390,95	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		38 806,42	bez DPH

6 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Lukáš Laštovička, DiS.	Jan Čejchan	Ing. René Hubka	Miroslav Bůžek	František Mrázek, DiS.

Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Urgentní příjem
Přístavba a stavební úpravy části pavilonu A a pavilonu B
Soupis prací - zdravotnická technologie pevně spojené se stavbou revize 4

IC	Název	MJ	Mn.	Cena bez DPH / ks	Cena bez DPH / kusy
420012a	linka pracovní, dolní+horní skříňky, trezor na opláty, skříň/lékována <i>Viz Specifikace zdravotnická technologie revize 4</i>	ks	1	47 665	47 665 Kč
420012b	linka pracovní vč. včetně umyvadla, dolní+horní skříňky <i>Viz Specifikace zdravotnická technologie revize 4</i>	ks	1	50 162	50 162 Kč
420001	linka pracovní - Dodávka a instalace vestavěného ohřívací zásuvky x box - na infuzní roztoky <i>Viz Specifikace zdravotnická technologie revize 4</i>	ks	1	45 000	45 000 Kč
420025	linka kuchyňská vč. dřezu, dolní+horní skříňky <i>Viz Specifikace zdravotnická technologie</i>	ks	-1	24 235 -	24 235 Kč
420026	linka kuchyňská vč. dřezu, dolní+horní skříňky <i>Viz Specifikace zdravotnická technologie</i>	ks	-1	20 529 -	20 529 Kč
420022	linka kuchyňská rohová vč. dřezu, umyvadla, dolní + horní skříňky <i>Viz Specifikace zdravotnická technologie</i>	ks	-1	47 804 -	47 804 Kč
420022A	linka kuchyňská rohová vč. dřezu, dolní + horní skříňky <i>Viz Specifikace zdravotnická technologie revize 4</i>	ks	1	76 804	76 804 Kč
420008	linka pracovní vč. dřezu, dolní + horní skříňky <i>Viz Specifikace zdravotnická technologie</i>	ks	-1	20 529 -	20 529 Kč
460809	sestava skříňová <i>Viz Specifikace zdravotnická technologie</i>	ks	-1	74 937 -	74 937 Kč
420024	linka kuchyňská vč. dřezu, dolní+horní skříňky <i>Viz Specifikace zdravotnická technologie</i>	ks	-1	20 529 -	20 529 Kč
420015	linka pracovní - dolní+horní skříňky <i>Viz Specifikace zdravotnická technologie</i>	ks	-1	32 021 -	32 021 Kč
446207	Nerezová skříň pro ukládání podlahových míst - kotvená <i>Viz Specifikace zdravotnická technologie revize 4</i>	ks	1	59 760	59 760 Kč
446115	Skříňka nástěnná uzavřená s jednou polici - nerez <i>Viz Specifikace zdravotnická technologie revize 4</i>	ks	1	v ceně položky 4451020	4451020
				Cena celkem	38 806 Kč

4

[illegible]

[illegible]

A

ZMĚNOVÝ LIST					025	
Změna rozsahu provedení přeložky splaškové kanalizace - Stoka B						
Stavba:		Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod				
Objekt:		IO 02 - Přeložky kanalizací				
Předkládá:		Společnost GEOSAN - BAK - Urgent Náchod			Datum:	11.06.2024
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů				
poštou		1) Položkový rozpočet změny			5	listů
e-mailem	☒	2) Projektové podklady			0	listů, výkresů
osobně		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy			0	listů
1 Technický popis změny:						
1.1 Popis původního řešení:						
Přeložka areálové kanalizace – stoky B v délce 39 m ukončená kanalizační šachtou Š2B						
1.2 Popis nového řešení:						
Vypuštění kanalizační šachty Š2B , výměna stávající šachty s ozn. SŠ5 včetně výměny kanalizačního potrubí DN 400 k místu rušené šachty s ozn. Š v délce 15 m.						
2 Zdůvodnění změny:						
Při provádění přeložky předmětné kanalizace je zjištěna skutečná hloubka uložení trasy kanalizace, která umožnila napojení nového potrubí na stávající bez šachty Š2B. Dále předmětem změnového listu je prodloužení přeložky kanalizace - stoky B o 15 m s ohledem na zjištěný nevyhovující stav kanalizace zjištěný při její pasportizaci kamerovou zkouškou. Tyto vícepráce a méněpráce vznikly v důsledku výše uvedených okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Dále vypuštěním šachty Š2B odpadlo omezení příjezdové a zásobovací přístupové komunikace k pavilonu K, A, E, D komunikace při vlastním osazování této šachty.						
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		☐ ANO			☒ NE	
4 Dopad do smluvních termínů:		☐ ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)			☒ NE	
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek					odst.	6
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	—	-64 854,45		bez DPH	
	Cena víceprací (přípočet):	+	212 239,64		bez DPH	
	Výsledná ceny změny:		147 385,19		bez DPH	
7 Schválil:						
za zhotovitele:		za TDS:		za AD:		za uživatele:
Lukáš Lašovička, DiS.		Jan Čejchan		Ing. René Hubka		Miroslav Bůžek
						František Mrázek, DiS.
GEOSAN GROUP a.s. U Průhonu 1516/32 170 00 Praha 7 DIČ: CZ28169522						
GEOSAN GROUP a.s.		CE-ING s.r.o.		Proxion s.r.o.		Královéhradecký kraj

SOUPIS PRACÍ - ZL 25 Změna rozsahu provedení přeložky splaškové kanalizace - Stoka B

Stavba:

ON Náchod Urgentní příjem

Objekt:

02 - Stoka B

Místo: Náchod

Datum:

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel: Společnost GEOSAN – BAK – Urgent Náchod

Zpracovatel: Společnost GEOSAN
Náchod

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							147 385,19
D	HSV		Práce a dodávky HSV				147 385,19
D	1		Zemní práce				35 128,09
1	K	113106023	Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby	m2	-10,000	119,33	-1 193,30
	W		10		-10,000		
	W		Součet		-10,000		
2	K	113107183	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	-15,000	90,09	-1 351,35
	W		"DN400" 15		-15,000		
	W		Součet		-15,000		
5	K	131251204	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	-15,900	298,73	-4 749,81
	W		"šachta SŠ 5 _"3,5*3,5*3,6		44,100		
	W		Součet		44,100		
	W		"šachta Š2"1*(5*5*4,8)		-120,000		
	W		Součet		-120,000		
	W		"50% horniny tř. těžitelnosti I" 120*0,5		-60,000		
	W		Součet		-60,000		
	W		Součet		-15,900		
6	K	131351204	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	-60,000	397,51	-23 850,60
	W		"šachta Š2" 1*(5*5*4,8)		120,000		
	W		Součet		120,000		
	W		"50% hornina tř. těžitelnosti II" 120*0,5		60,000		
	W		Součet		60,000		
7	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	48,353	414,90	20 061,66
	W		"rýha" (14-3,5)*((3,34+2,6)/2+0,1)*1,5		48,353		
	W		Součet		48,353		
9	K	139001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	4,300	467,05	2 008,32
7	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	90,000	197,57	17 781,30
	W		15*3*2		90,000		
9	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	90,000	98,78	8 890,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	151101301	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m	m3	-96,000	50,26	-4 824,96
	W		(5*4,80*4)		96,000		
	W		Součet		96,000		
13	K	151101311	Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení příložného, hloubky do 4 m	m3	-96,000	11,54	-1 107,84
	W		96		96,000		
	W		Součet		96,000		
14	K	162251102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	32,343	36,51	1 180,84
	W		44,1+48,353		92,453		
	W		šachta Š2 (120,22)/2		-60,110		
	W		Součet		32,343		
15	K	162251122	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	-60,110	52,08	-3 130,53
	W		(120,22)/2		-60,110		
	W		Součet		-60,110		
16	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	24,056	222,86	5 361,12
	W		15*pi*0,4*0,4/4+pi*(3,4+2,7)*pi*1,24*1,24/4 "trubky + šachty		24,056		
			Součet		24,056		
20	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	24,056	128,03	3 079,89
22	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	24,056	44,45	1 069,29
	W		"uložení zeminy"		24,056		
	W		Součet		24,056		
23	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	48,112	207,45	9 980,83
	F		"násobeno váhovým koeficientem 2"		48,112		
	W		Součet		48,112		
24	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	-21,203	123,28	-2 613,91
			"výkopy" 44,1+48,353 - 24,056		68,397		
			"zásyp"		-89,600		
			Součet		-21 203		
25	M	58344197	šterkodrť frakce 0/63	t	4,446	380,12	1 690,01
	W		(3,5*3,5 + 8*1,5)*0,2		9,700		
	W		7,36		-7,360		
	W		Součet		2,340		
			"násobeno váhovým koeficientem 1,9"		4,446		
26	M	58341364	kamenivo drcené drobné frakce 2/4	t	-5,168	590,34	-3 050,88
	W		2,72*1,90		-5,168		
	W		Součet		-5,168		
27	K	175151101	Obsypání potrubí strojné sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	12,600	180,18	2 270,27
	W		15*1,2*0,7		12,600		
	W						
	W		Součet		12,600		
28	M	58337303	šterkopísek frakce 0-8	t	25,200	302,68	7 627,54
	W		"násobeno váhovým koeficientem 2" 12,6*2		25,200		
	W		Součet		25,200		
	D	4	Vodorovné konstrukce				1 595,89
30	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	1,756	908,82	1 595,89
	W		1,6*1,6*0,1 "pod šachty		0,256		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		15*1*0,1 "rýha potrubí		1,500		
			Součet		1,756		
	D	5	Komunikace pozemní				-12 843,30
31	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	-15,000	354,84	-5 322,60
	W		"DN400" 15		15,000		
	W		Součet		15,000		
32	K	573211109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	-15,000	10,12	-151,80
	W		"DN400" 15		15,000		
	W		Součet		15,000		
33	K	573311511	Prolití podkladu nebo krytu z kameniva asfaltem, v množství 2,50 kg/m2	m2	-15,000	46,86	-702,90
	W		"DN400" 15		15,000		
	W		Součet		15,000		
34	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	-15,000	245,78	-3 686,70
	W		"DN400" 15		15,000		
	W		Součet		15,000		
35	K	596211211	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	-10,000	297,93	-2 979,30
	W		10		10,000		
	W		Součet		10,000		
	D	8	Trubní vedení				116 736,40
N	K	810391811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 do 400	m	14,000	286,11	4 005,54
45	K	871393121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 400	m	16,500	168,33	2 777,45
			"DN400"15+1,5				
37	M	ELM.400126S	Trubka kanalizační ULTRA SOLID PVC SN 12 DN/OD 400x6000 mm PVC-U	kus	2,000	14 817,72	29 635,44
38	M	ELM.400123S	Trubka kanalizační ULTRA SOLID PVC SN 12 DN/OD 400x3000 mm PVC-U	kus	1,000	12 371,28	12 371,28
N	M	ELM.400123SR	Trubka kanalizační ULTRA SOLID PVC SN 12 DN/OD 400x1000 mm PVC-U	kus	2,000	2 436,52	4 873,03
N	K	877390310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 400	kus	3,000	692,01	2 076,03
N	K	PPL.QKGB40015	QUANTUM koleno 15° DN400 tvarovka k plnostěnnému odpadnímu potrubí	kus	1,000	3 877,24	3 877,24
N	M	PPL.MKGB40045	QUANTUM koleno 45° DN400 tvarovka k plnostěnnému odpadnímu potrubí	kus	2,000	5 579,89	11 159,78
N	K	877390330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 400	kus	2,000	692,01	1 384,02
N	M	PPL.QKGU400	spojka přesuvná kanalizační DN 400	kus	1,000	3 837,64	3 837,64
	M	28617239R	manžeta flexseal (guma + nerez) DN 400 + redukční gumy	kus	1,000	8 985,00	8 985,00
40	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	15,000	37,62	564,30
N	K	359901212	Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci	m	14,000	122,76	1 718,64
41	K	452112112	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámců pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	0,000	704,93	0,00
42	M	PFB.1120104OZ	Prstenec šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q.1 63/12	kus	2,000	332,86	665,72
	W		SŠ5		2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
50	M	PFB.1120103OZ	Prstěnek šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q.1 63/10	kus	-1,000	294,75	-294,75
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
51	M	PFB.1120102OZ	Prstěnek šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q.1 63/8	kus	-1,000	262,55	-262,55
N	K	890211851	Bourání šachet z prostého betonu strojné obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	4,000	3 049,20	12 196,80
47	K	892392121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníci vaky ucpávkovými DN 400	úsek	1,000	1 043,17	1 043,17
48	K	892442111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN přes 300 do 600	kus	1,000	16 595,85	16 595,85
49	K	894410232	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží přechodová (konus) DN 1000	kus	0,000	1 296,06	0,00
	W		-1		-1,000		
	W		SŠ5		1,000		
	W		Součet		1,000		
52	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	0,000	924,63	0,00
57	M	PFB.1122193A	Skruž výšky 1000 mm TBS-Q.1 100/100/10 PS	kus	0,000	3 653,87	0,00
	W		-2		-2,000		
	W		SŠ5		2,000		
58	M	PFB.1122183A	Skruž výšky 500 mm TBS-Q.1 100/50/10 PS	kus	-1,000	1 929,67	-1 929,67
38	M	PFB.1122173A	Skruž výšky 250 mm TBS-Q.1 100/25/10 PS	kus	1,000	1 269,09	1 269,09
53	M	PFB.1121115A	Konus TBR-Q.1 100-63/58/10 KPS	kus	0,000	2 370,17	0,00
	W		-1		-1,000		
	W		SŠ5		1,000		
	W		Součet		0,000		
46	M	PFB.1131001GR	Dno TBZ-Q.1 100/775 KOM tl. 15c	kus	0,000	9 878,48	0,00
	W		-1		-1,000		
	W		SŠ5		1,000		
62	K	R899304111	Osazení těsnění	kus	0,000	197,57	0,00
55	M	PFB.0006002OZ	Těsnění elastomerové pro spojení šachtových dílů EMT DN 1000	kus	0,000	190,66	0,00
	W		-4+4 SŠ5		0,000		
60	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	0,000	2 963,54	0,00
63	M	PFB.0001011OZ R	Poklop D400 GU-B-1 BEGU bez odvětv. D400	kus	0,000	1 481,77	0,00
61	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC	m	15,000	12,49	187,35
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-3 651,00
69	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	-30,000	121,70	-3 651,00
	W		"DN400" 15+15		-30,000		
	W		Součet		-30,000		
D	997		Přesun sutě				7 582,57
70	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 2 km	t	11,520	44,02	507,11
71	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	69,120	10,43	720,92
	W		"příplatek za dalších 6km" 11,52*6		69,120		
	W		Součet		69,120		
72	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	11,520	144,62	1 666,02
73	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	11,520	406,99	4 688,52
D	998		Přesun hmot				2 836,54

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
74	K	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	2,427	307,42	746,06
75	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	2,427	861,40	2 090,48

ZMĚNOVÝ LIST

026

Demontáž, přesun a montáž stávající jednotky chlazení

Stavba:	Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod		
Objekt:	SO-01 Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B - CHL		
Předkládá:	Společnost GEOSAN - BAK - Urgent Náchod	Datum:	02.07.2024

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou	☐	1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem	☒	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně	☐	3) Fotodokumentace a ostatní přílohy	1 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

Neobsaženo

1.2 Popis nového řešení:

Demontáž, přesun a montáž stávající venkovní jednotky chlazení v místě mezi 1.NP pavilonu A a pavilonu B.

2 Zdůvodnění změny:

Stávající venkovní jenotka chlazení je osazena v místě, kde dle nového řešení PD mají být nové venkovní dveře na volné prostranství. Z tohoto důvodu musí dojít k přesunu této jednotky. Tyto uvedené vícepráce vznikly v důsledku výše uvedených okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	☐	ANO	☒	NE
---	--------------------------	-----	-------------------------------------	----

4 Dopad do smluvních termínů:	☐	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	☒	NE
-------------------------------	--------------------------	--	-------------------------------------	----

5 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	–	0,00	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	22 869,25	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		22 869,25	bez DPH

6 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	6
---	-------	---

7 Schválil:


za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Lukáš Laštovíčka, DiS.	Jan Čejchan	Ing. René Hubka	Miroslav Bužek	Franišek Mrázek, DiS.

GEOSAN GROUP a.s.	CE-ING s.r.o.	Proxion s.r.o.	ON Náchod a.s.	Královéhradecký kraj
-------------------	---------------	----------------	----------------	----------------------

U Příhonu 1516/32
170 00 Praha 7
DIČ: CZ28169522

SOUPIS PRACÍ - ZL 26 Demontáž, přesun a montáž stávající jednotky chlazení						
Demontáž, přesun a montáž stávající jednotky chlazení						
Demontáž, přesun a montáž stávající jednotky chlazení				Výr. příkaz číslo	Varianta :	I.
URGENTNÍ PŘÍJEM, SO-01 PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU "A" A PAVILONU "B"					Datum :	02.07.2024
Oblastní nemocnice Náchod						
Pozice	Zařízení - činnost	Jednotky	Množství	Jednotková cena D	Jednotková cena M	Celková cena
	Demontáž, přesun a montáž jednotky CHL					
IZS321	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení	hod	34		497,97	16 930,98
	montážní práce: odsáti venkovní jednotky, odpojení od technologického vedení, ukotvení konzolí, demontáž lišt, přemístění klimatizace, připojení tech. vedení, naplnění chladivem					
31	Drobný a pomocný kotvicí materiál	ks	1	700,00		700,00
32	Ocelové nebo měděné potrubí 15x1 včetně tvarovek spojované lisováním (nebo tenkostěnn	bm	3	475,34	161,74	1 911,24
33	Provozní zkoušky, tlakové zkoušky	soubor	1		150,00	150,00
34	Revize	soubor	1		1 035,00	1 035,00
6	6 Kopos 170 x 70 Žlab	ks	3	301,80	215,70	1 552,50
7	Krabice Mini obo	ks	2	30,00	39,00	138,00
8	Kabel CYKY 5C x 1.5	m	4	28,34	23,79	208,53
33922	* CYKY 3Cx4mm2 *	m	4	36,96	23,79	243,00
	Celkem část CHL (bez DPH)	Kč				22 869,25

02 037

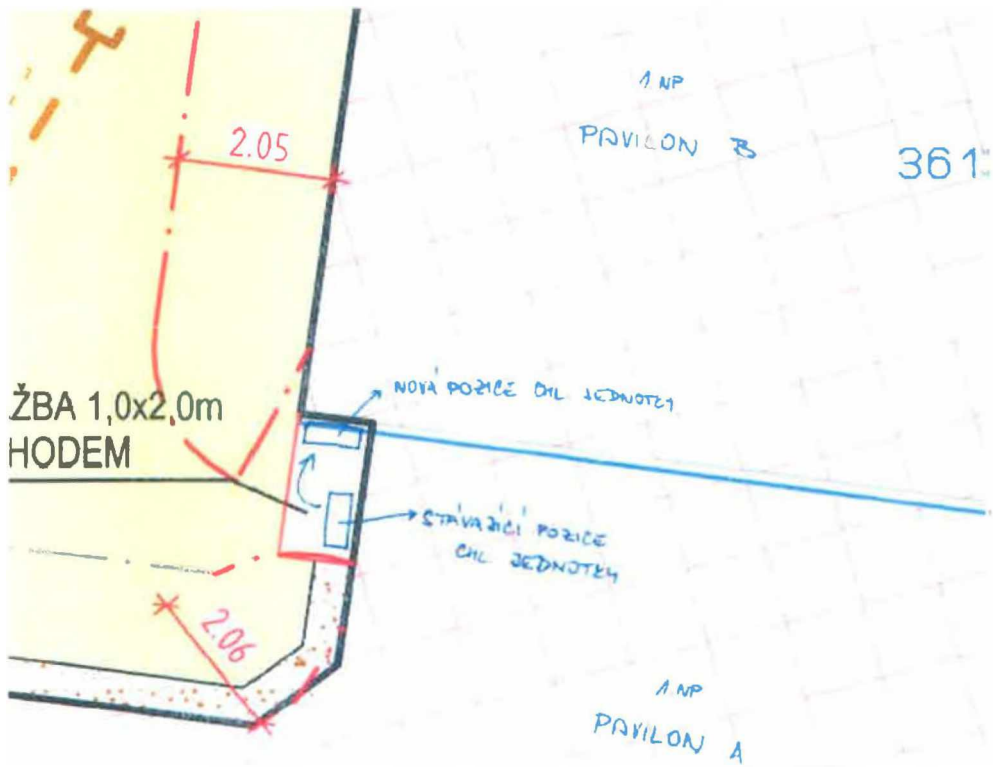

ZMĚNOVÝ LIST

027

Antistatika přístavba pavilonu A

Stavba:	Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod		
Objekt:	SO-01 Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B - Elektromontáže		
Předkládá:	Společnost GEOSAN - BAK - Urgent Náchod	Datum:	02.07.2024

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou	☐	1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem	☒	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně	☐	3) Fotodokumentace a ostatní přílohy	0 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

V projektové dokumentaci pro provádění stavby neobsaženo v místnosti 1.77 zemnění pro elektrostatickou epoxidovou stěrku

1.2 Popis nového řešení:

Doplnění uzemňovací soustavy do předmětné místnosti

2 Zdůvodnění změny:

Předmětem změnového listu je doplnění chybějícího uzemnění do předmětné místnosti. Tyto uvedené práce vznikly v důsledku výše uvedených okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	☐	ANO	☒	NE
---	--------------------------	-----	-------------------------------------	----

4 Dopad do smluvních termínů:	☐	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	☒	NE
-------------------------------	--------------------------	--	-------------------------------------	----

5 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	–	0,00	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	7 309,79	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		7 309,79	bez DPH

6 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	6
---	-------	---

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Lukáš Lašpovička, DiS.	Jan Čejchan	Ing. René Hubka	Miroslav Bužek	František Mrázek, DiS.

GEOSAN GROUP a.s.	CE-ING s.r.o.	Proxion s.r.o.	ON Náchod a.s.	Královéhradecký kraj
-------------------	---------------	----------------	----------------	----------------------

170 00 Praha 7
DIČ: CZ28169522

C21M - Elektromontáže

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
7	210010321	krab.odboč.s.víčkem.svor.(1903;KR 68) kruh.vč.zap.	95,16	5,00 ks	475,80 SOD
13	210100002	ukonč.vod.v.rozv.vč.zap.a.konc.do 6mm2	23,79	10,00 ks	237,90 SOD
34	210800527	CY 6 mm2 zelenožlutý (VU)	22,20	138,00 m	3 063,60 SOD
	741110001	Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm uložená pevně	57,42	8,00 m	459,36 ÚRS 2024_02*0,99

Materiály

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
18	00318	* krabice KU 68/2 - 1903 *	59,67	5,00 ks	298,35 SOD
33	33746	* CY 6mm2 zelenožlutý H07V-U *	19,71	138,00 m	2 719,98 SOD
	PC001720	Trubka MONOFLEX # 23 1423/1 ohebná nárazuvzdor	6,85	8,00 m	54,80 SOD

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
Celkem bez DPH:					7 309,79

Antistatická podlaha místnost 1.77

ZMĚNOVÝ LIST

028

SDK podhledy dle kladečského plánu

Stavba:	Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod		
Objekt:	SO-01 Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B		
Předkládá:	Společnost GEOSAN - BAK - Urgent Náchod	Datum:	22.08.2024

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem	☒	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy	1 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

Typy podhledů dle soupisu nebyly v projektu pevně stanoveny

1.2 Popis nového řešení:

Provedení sádkartobnových podhledů na základě předloženého kladečského plánu montovaných podhledů

2 Zdůvodnění změny:

Na základě skutečného zaměření a tvorbě kladečského plánu montovaných sádkartobnových podhledů, který měl zhotovitel v předmětu díla, byly upřesněny typy a rozměry podhledů v jednotlivých prostorech, které v projektové dokumentaci nebyly v podrobnosti soupisu rozčleněny.

Předmětem změnového listu je narovnání soupisu položek SDK na kladečský plán SDK podhledů.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:

ANO

NE

4 Dopad do smluvních termínů:

ANO

(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)

NE

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek

odst.

6

5 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	-351 963,33	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	529 124,39	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		177 161,06	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:		za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Lukáš Laštovíčka, DiS.	Jan Čejchan		Ing. René Hubka	Bůžek Miroslav	Franišek Mrazek, DiS.

GEOSAN - BAK s.r.o.

CE-ING s.r.o.

Proxion s.r.o.

ON Náchod a.s.

Královéhradecký kraj

IČO: CZ28169522

SOUPIS PRACÍ - ZL 28 SDK podhledy dle kladečského plánu

ON Náchod Urgentní příjem

02 - Nový stav

Náchod

05 08 2024

Královéhradecký kraj

Společnost GEOSAN – BAK – Urgent Náchod

Společnost GEOSAN – BAK – Urgent Náchod

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
Náklady soupisu celkem							177 161,06	
D		763	Konstrukce suché výstavby				177 161,06	
111	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12.5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	45,790	789,48	36 150,75	SOD
N		763131451	SDK podhled deska 1xH2 12.5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	45,790	909,81	41 660,20	URS 2024_02*0.99
112	K	763131712	SDK podhled napojení na jiný druh podhledu (<i>chodby</i>)	m	180,000	480,09	86 416,20	SOD
114	K	763164791	Montáž SDK obkladu kci jednoduché opláštění	m2	54,000	618,78	33 414,66	SOD
			180*0.3		54,000			
116	K	763431012	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. přes 0,36 do 0,72 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt	m2	102,890	288,06	29 638,49	SOD
			Dopočet místnosti 64.44		64.440			
			Upřesnění typu SDK dle kladečského plánu montovaných podhledu 38.45*1.1		38.450			
			Součet		102,890			
252	M	3610002R	Kazeta podhledová polozapuštěná 600*1200 mm (380.3*1.1) Přepočtené koeficientem množství	m2	389,091	864,17	336 240,77	SOD
			250.9090909091*1.1 Přepočtené koeficientem množství		276,000			
			Dopočet místnosti 64.36*1.1		70,796			
			upřesnění typu SDK dle kladečského plánu montovaných podhledu 38.45*1.1		42,295			
			Součet		389,091			
119	M	3610001R	Kazeta podhledová polozapuštěná 600*600 mm	m2	-276,000	842,83	-232 621,06	SOD
			250.9090909091*1.1 Přepočtené koeficientem množství		-276,000			
254	K	76343R	Montáž SDK podhledu skryté profily	m2	-38,450	426,75	-16 408,54	SOD
			380*1		-380,000			
			dle kladečského plánu montovaných podhledu 34.1.55		341,550			
			Součet		-38,450			
255	M	R30536	deska SDK akustická děrovaná s čistícím efektem bezesparé podhledy tl. 12.5mm (45*1.1) Přepočtené koeficientem množství (velkoformátová)	m2	-42,295	1 578,98	-66 762,96	SOD
			38.45*1.1 Přepočtené koeficientem množství		42,295			
			(380-180-49)*1.1					
121	K	598763401	Přesun hmoty pro sádkkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,000	1 754,07	1 754,07	SOD

ZMĚNOVÝ LIST

Přívod vody k prodejním automatům

029

Stavba:	Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod		
Objekt:	SO-01 Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B _ 03 ZTI		
Předkládá:	Společnost GEOSAN - BAK - Urgent Náchod	Datum:	23.08.2024

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem	☒	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy	0 listů

1 Technický popis změny:
1.1 Popis původního řešení: V projektové dokumentaci neobsaženo
1.2 Popis nového řešení: Vyveden přívodního vodovodního potrubí do místností čekáren - místnosti 1.14 a 1.15 a 2.50 pro napojení prodejních automatů.

2 Zdůvodnění změny:
Na základě požadavku nemocnice bude doplněna příprava pro napojení prodejních automatů do čekáren pro návštěvníky nemocnice pro občerstvení .

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	☐ ANO	☒ NE
--	------------------------------	--

4 Dopad do smluvních termínů:	☐ ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	☒ NE
--------------------------------------	---	--

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	4
--	--------------	----------

5 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	–	0,00	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	8 844,94	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		8 844,94	bez DPH

7 Schválil:					
za zhotovitele:	za TDS:		za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Lukáš Lašovička, DiS.	Jan Čejchan		Ing. René Hubka	Bůžek Miroslav	Franišek Mrázek, DiS.

GEOSAN GROUP a.s.	CE-ING s.r.o.	Proxion s.r.o.	ON Náchod a.s.	Královéhradecký kraj
-------------------	---------------	----------------	----------------	----------------------

170 00 Praha 7
DIČ: CZ28169522

SOUPIS PRACÍ - ZL 29 Přívod vody k prodejním automatům

Poř.	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
SO_01: Zdravotní instalace					8 844,94	
713: Izolace tepelné					1 007,60	
1.	Izolace potrubí TUBEX 22/10	m	20,0	50,38	1 007,60	SOD
722: Vnitřní vodovod					7 837,34	
1.	Uzavření vodovodu, vypuštění, napuštění	hod	1,0	296,35	296,35	SOD
6.	Potrubí z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) - D 20x3,4	m	20,0	205,97	4 119,40	SOD
12.	Opravy vodovodního potrubí - propojení dosavadního potrubí	soubor	3,0	274,13	822,39	SOD
13.	Opravy vodovodního potrubí - vsazení odbočky do potrubí	soubor	3,0	539,37	1 618,11	SOD
14.	Opravy vodovodního potrubí - zazátkování vývodu	soubor	3,0	21,49	64,47	SOD
25.	Vyvedení a upevnění výpustek - do DN 25	kus	3,0	179,29	537,87	SOD
26.	Armatury plastové s jedním závitem - nástěnka - 20x1/2"	kus	3,0	48,90	146,70	SOD
27.	DG Přechodka PPr - pozink vnější - 20x1/2"	kus	3,0	48,16	144,48	SOD
31.	Přesun hmot pro vnitřní vodovod - výška do 6 m	%	1,0	87,57	87,57	SOD

ZMĚNOVÝ LIST

030

Doplnění zásuvkového podparapetního žlabu

Stavba:	Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod		
Objekt:	SO-01 Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B - Slaboproud a silnoproud		
Předkládá:	Společnost GEOSAN - BAK - Urgent Náchod	Datum:	02.07.2024

Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů	
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem	☒	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy	0 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

Zásuvky na stěnách

1.2 Popis nového řešení:

Provedení zásuvkového podparapetního žlabu v místnosti č. 1.21, 1.22, 1.23 INP. pavilon B

2 Zdůvodnění změny:

Na základě upřesnění uživatele na umístění vybavení - pracovních stolů dochází ke změně v umístění zásuvek v předemných místostech

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:

ANO

☒ NE

4 Dopad do smluvních termínů:

ANO

(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)

☒ NE

5 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	—	0,00	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	6 137,04	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		6 137,04	bez DPH

6 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek

odst.

4

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:		za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Laštovka L.	Čechová J.		Hrabka R.	Byžek M.	Hrázek F.

GEOSAN GROUP a.s.

CE-ING s.r.o.

Proxion s.r.o.

ON Náchod a.s.

Královéhradecký kraj

U Průhonů 1110/32

170 00 Praha 7

DIČ: CZ28169522

Zakázkové č.: z93020

SKS Urgentní příjem oblastní nemocnice Náchod
Vnitřní slaboproudé rozvody (SKS, IPTV, EKV, CTV, JČ, Vyvolávací systém)
Rozpočet č: RZ23022

ZL 30 Doplnění zásuvkového podparapetního žlabu

Rekapitulace rozpočtu

HLAVA III.	Základní rozpočtové náklady			
	Dodávky a materiál celkem			5 877,80 Kč
	Montáže celkem			259,25 Kč
	Celkem bez DPH			6 137,04 Kč
Daň z přidané hodnoty				
	Základní sazba DPH	21 %	6 137,04 Kč	1 288,78 Kč
	Celkem s DPH			7 425,82 Kč

Rozpočet

Demontáže

Dodávka ostatních zařízení a materiálu

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
PK 140/70	Parapetní kanál PK 140/70	10,5	m	559,79 Kč	5 877,80 Kč
	Celkem				5 877,80 Kč

Montáže ostatní

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
PC234300	Montáž parapetního žlabu s víkem	10,5	m	24,69 Kč	259,25 Kč
	Celkem				259,25 Kč

ZMĚNOVÝ LIST

031

Opravy stávajících rozvodů chlazení

Stavba:	Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod		
Objekt:	SO-01 Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B - ZTI, CHL		
Předkládá:	Společnost GEOSAN - BAK - Urgent Náchod	Datum:	02.07.2024

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem	☒	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy	3 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

Stávající bez úprav

1.2 Popis nového řešení:

- Přeizolování vodorovného potrubí chlazení včetně zhotovení nátěru v místnostech 1.57 a 1.60
- Oprava stávajícího potrubí chlazení - stoupací potrubí do 3 NP pavilonu A - výměna

2 Zdůvodnění změny:

Při provádění stavebních prací a po odkrytí konstrukcí jsou zjištěny úkapy kondenzátu na stávajícím potrubí chlazení v rekonstruovaných prostorech a to v m.č. 1.57 a 1.60. Je nutné provést úpravu potrubí (očištění, nátěr) a novou izolaci potrubí.

Po rozkrytí šachty v 2 NP pav A byl zjištěn havarijný stav stoupacího potrubí chlazení. Obě trubky musí být v celé své délce vyměněny včetně nových izolací.

Tyto uvedené práce vznikly v důsledku výše uvedených okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	☒	ANO	☒	NE
---	-------------------------------------	-----	-------------------------------------	----

4 Dopad do smluvních termínů:	☒	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	☒	NE
-------------------------------	-------------------------------------	--	-------------------------------------	----

5 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	—	0,00	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	107 939,25	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		107 939,25	bez DPH

6 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	6
---	-------	---

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Lišková L.	Čechová J.	Huska R.	Štěpánek M.	Hájek F.

GEOSAN GROUP a.s.	CE-ING s.r.o.	Proxion s.r.o.	ON Náchod a.s.	Královéhradecký kraj
-------------------	---------------	----------------	----------------	----------------------

U Průhonu 1516/32
170 00 Praha 7
DIČ: CZ28169522

SOUPIS PRACÍ - ZL 031 Opravy stávajících rozvodů chlazení

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
SO_01: Oprava chlazení v místnosti 1.57, 1.60						48 761	
000: Společné práce						48 761	
44.		Tepelná izolace návleková min. tl. 20 mm, pro potrubí DN80, kaučuková, Al polep	m	30,0	1 468,62	44 059	SOD
		demontáž tepelných izolací ze stávajícího potrubí	m	30,0	35,19	1 408	SOD
		odvoz staré izolace na řízenou skládku	ks	1,0	391,02	391	SOD
N	783607760	Provedení krycího dvojnásobného nátěru potrubí přes DN 50 do DN 100 mm - URS 783607760	m	30,0	70,19	2 106	URS 24_02 *0,99
N	783601729	Odstranění koroze na potrubí DN 80	m	30,0	10,49	315	URS 24_02 *0,99
60.		Přesun hmot	%	1,0	482,78	483	SOD

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
SO_01: Oprava stávajícího chlazení						59 179	
000: Společné práce						59 179	
	P1_00142	vypuštění a napuštění vody do topného systému v průběhu - topenářských prací	ks	2,0	742,94	1 486	SOD
15.	P1_00023_02	Kulový uzávěr DN32	ks	2,0	389,24	778	SOD
23.	P1_00035_01	Ocelové potrubí DN50 včetně tvarovek spojované lisováním (tenkostěnná uhlíková ocel)	bm	10,0	3 847,71	38 477	SOD
28.	P1_00042_01	Tepelná izolace návleková min. tl. 20 mm, pro potrubí DN50, kaučuková, Al polep	bm	10,0	1 302,57	13 026	SOD
41.	P1_00045_03	Provozní zkoušky, tlakové zkoušky	soubo	0,05	16 244,61	812	SOD
38.	P1_00059_01	Závěsy, objímky a konzole pro instalaci rozvodů včetně spojovacího materiálu	bm	10,0	113,33	1 133	SOD
N	733120819	Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 38 do 60,3	m	10,0	76,82	768	URS 24_02 *0,99
14.	P1_00053_01	Návarky a přechodky pro napojení na stávající rozvody chlazení	ks	4,0	527,95	2 112	SOD
39.	P1_00060_01	Přesun hmot	%	1,0	585,93	586	SOD

Celkem ZL bez DPH

107 939







ZMĚNOVÝ LIST

032

Změna v umístění datových zásuvek

Stavba:	Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod		
Objekt:	SO-01 Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B - Slaboproud		
Předkládá:	Společnost GEOSAN - BAK - Urgent Náchod	Datum:	27.07.2024

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem	☒	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy	0 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

Zásuvky dle projektu

1.2 Popis nového řešení:

Zásuvky umístěné pod okny dle požadavku uživatele v místnosti č. 2.55 včetně natažení SKS KABELÁŽ - 4x45m

2 Zdůvodnění změny:

Na základě požadavku uživatele s ohledem na aktuální provozní potřeby je předmětem změnového listu ocenění změny umístění datových zásuvek v místnosti 2.55 pod okno, obsahuje opravu početní chyby ZL 11

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	☐ ANO	☒ NE
---	------------------------------	--

4 Dopad do smluvních termínů:	☐ ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	☒ NE
-------------------------------	---	--

5 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	-12 060,00	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	24 370,20	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		12 310,20	bez DPH

6 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	4
---	-------	---

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Laštovka L.	Čížek J.	Hrbek R.	Bříček M.	Hrbek F.

GEOSAN - BAK - Urgent Náchod	CE-ING s.r.o.	Proxion s.r.o.	ON Náchod a.s.	Královéhradecký kraj
------------------------------	---------------	----------------	----------------	----------------------

170 00 Praha 7
DIČ: CZ28169522

78

Zakázkové č.: z93020

SKS Urgentní příjem oblastní nemocnice Náchod
Vnitřní slaboproudé rozvody (SKS, IPTV, EKV, CTV, JČ, Vyzvolávací systém)

Rozpočet č.: RZ23022

ZL 32 změna v umístění datových zásuvek**Rekapitulace rozpočtu**

HLAVA III.	Základní rozpočtové náklady	
	Dodávky a materiál celkem	2 111,40 Kč
	Montáže celkem	10 198,80 Kč
	Celkem bez DPH	12 310,20 Kč

Daň z přidané hodnoty

Základní sazba DPH	21 %	12 310,20 Kč	2 585,14 Kč
Celkem s DPH			14 895,34 Kč

Rozpočet**Dodávka SKS**

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
lex-001050	UTP Cat. 6A 4x2x24 AWG, LSOH požár. odolnost B2caS1d1	180	m	11,73 Kč	2 111,40 Kč SOD
	Celkem				2 111,40 Kč

Montáže ostatní

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
PC002870	Montáž datového kabelu UTP 4*2 v trubce liště	180	m	16,46 Kč	2 962,80 Kč SOD
	<i>Oprava ZL 11</i>				
PC024660	Protipožární kotva (Šroub OBO Bettermann) MMS-ST M6 6x60	660	ks	20,10 Kč	-12 060,00 Kč SOD
PC024660	Protipožární kotva (Šroub OBO Bettermann) MMS-ST M6 6x60	960	ks	20,10 Kč	19 296,00 Kč SOD

Celkem **10 198,80 Kč**

ZMĚNOVÝ LIST

033

Doplnění zásuvek pro prodejní automaty a vyvol. systém

Stavba:	Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod		
Objekt:	SO-01 Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B - Silnoproud,		
Předkládá:	Společnost GEOSAN - BAK - Urgent Náchod	Datum:	24.07.2024

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou	☐	1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem	☒	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně	☐	3) Fotodokumentace a ostatní přílohy	0 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

Neobsaženo

1.2 Popis nového řešení:

Místnost 2.64 El přívod pro nápojový automat j3x2,5mm - 24m, ku 68 2ks, zásuvka 2ks,
Místnost 2.64 El přívod pro vyvolávací systém j3x2,5mm - 60m, ku 68 4ks, zásuvka 4ks
Místnost 1.14 El přívod pro 2ks nápojový automat j3x2,5mm - 34m, ku 68 4ks, zásuvka 4ks

2 Zdůvodnění změny:

Na základě požadavku nemocnice budou doplněny zásuvky pro napojení prodejních automatů do čekáren pro návštěvníky nemocnice pro občerstvení a dále zásuvky pro vyvolávací systém

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	☐	ANO	☒	NE
---	--------------------------	-----	-------------------------------------	----

4 Dopad do smluvních termínů:	☐	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	☒	NE
-------------------------------	--------------------------	--	-------------------------------------	----

5 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	12 301,08	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		12 301,08	bez DPH

6 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	4
---	-------	---

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
<i>Loštovský Karel</i>	<i>Čechová J.</i>	<i>Hájek R.</i>	<i>Bůžek M.</i>	<i>Bůžek F.</i>

GEOSAN GROUP s.r.o.	CE-ING s.r.o.	Proxion s.r.o.	ON Náchod a.s.	Královéhradecký kraj
---------------------	---------------	----------------	----------------	----------------------

170 00 Praha 7
DIČ: CZ28169522

C21M - Elektromontáže

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
5	210010301	krab.přístrojová (1901; KP 68, KZ 3) bez zapojení	71,37	10,00 ks	713,70 SOD
23	210111011	zás.jednoduchá polozap /zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z	103,09	10,00 ks	1 030,90 SOD
39	210810006	CYKY-CYKYm 3Cx2.5 mm2 750V (VU)	22,20	118,00 m	2 619,60 SOD

Materiály

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
17	00313	* krabice KU 68/1 *	8,13	10,00 ks	81,30 SOD
20	00766	zásuvka 230V 16A zapuštěná - barevné značení dle legendy zařízení	170,89	10,00 ks	1 708,90 SOD
38	33918	* CYKY 3Cx2.5mm2 *	22,26	118,00 m	2 626,68 SOD

Dodávky zařízení (specifikace)

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
		Rozvaděč RS (doplnění D+M - jističe 10A pro nové vývody a zásuvky)	3 520,00	1,00 sada	3 520,00

Celkem bez DPH:

12 301,08

Místnost 2.64 EI přívod pro nápojový automat j3x2,5mm - 24m, ku 68 2ks, zásuvka 2ks,

Místnost 2.64 EI přívod pro vyvolávací systém j3x2,5mm - 60m, ku 68 4ks, zásuvka 4ks

Místnost 1.14 EI přívod pro 2ks nápojový automat j3x2,5mm - 34m, ku 68 4ks, zásuvka 4ks

ZMĚNOVÝ LIST

Doplnění elektroinstalačních prací

034

Stavba:	Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod		
Objekt:	SO-01 Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B - Silnoproud,		
Předkládá:	Společnost GEOSAN - BAK - Urgent Náchod	Datum:	24.07.2024

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem		2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy	0 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

1.2 Popis nového řešení:

2NP medicální plyn pospojení zž 6mm - 18m
1NP medicální plyn pospojení zž 6mm - 14m
Místnost 2.51 medicální plyn jednotka j3x2,5 - 20m, jistič 10A 1ks
Místnost 1.70 medicální plyn jednotka j3x2,5 - 12m, jistič 10A 1ks
Místnost 1.10 medicální plyn jednotka j3x2,5 - 28m, jistič 10A 1ks,
Doplnění demontážních prací

2 Zdůvodnění změny:

Předmětem zmenového listu je doplnění opomenutých demontážních prací veškerých stávajících elektroinstalací včetně doplnění elektro vývodů a zemnění pro medicální plynové jednotky.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO	NE
---	-----	----

4 Dopad do smluvních termínů:	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	NE
-------------------------------	--	----

5 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	39 427,58	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		39 427,58	bez DPH

6 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	6
---	-------	---

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Lukáš Laštovíčka, DiS.	Jan Čejchan	Ing. René Hubka	Miroslav Bužek	František Mrázek, DiS.

GEOSAN GROUP a.s.	CE ING s.r.o.	Proxion s.r.o.	ON Náchod a.s.	Královéhradecký kraj
-------------------	---------------	----------------	----------------	----------------------

170 00 Praha 7
DIČ: CZ28169522

C21M - Elektromontáže

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
11	210100001	ukonč vod.v rozv vč zap a konc do 2.5mm2	9,52	3,00 ks	28,56 SOD
13	210100002	ukonč vod v rozv vč.zap a konc do 6mm2	23,79	2,00 ks	47,58 SOD
34	210800527	CY 6 mm2 zelenožlutý (VU)	22,20	32,00 m	710,40 SOD
39	210810006	CYKY-CYKYm 3Cx2.5 mm2 750V (VU)	22,20	60,00 m	1 332,00 SOD
251	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	384,16	92,00 hod	35 342,72 SOD
		Demontáže obj. A 2NP			
		Demontáže obj. A 1NP			
		Demontáže obj. B 1NP			

Materiály

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
33	33746	* CY 6mm2 zelenožlutý H07V-U *	19,71	32,00 m	630,72 SOD
38	33918	* CYKY 3Cx2.5mm2 *	22,26	60,00 m	1 335,60 SOD

Celkem bez DPH: **39 427,58**

Pzn. Uchazeč v jednotlivých položkách ocení veškerý pomocný a kotvící materiál

2NP medicíální plyn pospojení zž 6mm - 18m

1NP medicíální plyn pospojení zž 6mm - 14m

Místnost 2.51 medicíální plyn jednotka j3x2,5 - 20m, jistič 10A 1ks 20

Místnost 1.70 medicíální plyn jednotka j3x2,5 - 12m, jistič 10A 1ks 12

Místnost 1.10 medicíální plyn jednotka j3x2,5 - 28m, jistič 10A 1ks 28

ZMĚNOVÝ LIST

035

Odvodnění střechy a drenáž základů garáže

Stavba:	Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod		
Objekt:	SO-01 - Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B		
Předkládá:	Společnost GEOSAN - BAK - Urgent Náchod	Datum:	10.08.2024

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem	☒	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy	1 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

V projektové dokumentaci pro provádění stavby řešena drenáž kolem přístavby pavilonu A

1.2 Popis nového řešení:

Odvodnění střechy garáže pavilonu A včetně zřízení drenáže a napojení do kanalizační šachty

2 Zdůvodnění změny:

Předmětem změnového listu je doplnění drenáže základů, odvodnění střechy a napojení do kanalizační šachty. V projektu je zakreslena drenáž v řezu, ale chybí v soupisu stavebních prací. Odvodnění střechy chybí v PD

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	☐	ANO	☒	NE
---	--------------------------	-----	-------------------------------------	----

4 Dopad do smluvních termínů:	☐	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	☒	NE
-------------------------------	--------------------------	--	-------------------------------------	----

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	6
---	-------	---

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	35 741,60	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		35 741,60	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Lukáš Laštovička, DiS.	Jan Čejchan	Ing. René Hubka	Miroslav Bůžek	František Mrázek, DiS.

GEOSAN GROUP a.s.	CE-ING s.r.o.	Proxion s.r.o.	ON Náchod a.s.	Královéhradecký kraj
-------------------	---------------	----------------	----------------	----------------------

GEOSAN GROUP a.s.
U Průhonu 1516/32
170 00 Praha 7
DIČ: CZ28169522

SOUPIS PRACÍ ZL 35 Odvodnění střechy a drenáž základů garáže

Stavba:

ON Náchod Urgentní příjem

Objekt:

SO-01 - Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B

Soupis:

Drenáž kanalizace

Místo:

Náchod

Datum:

10. 8. 2023

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

Uchazeč:

Společnost GEOSAN – BAK – Urgent Náchod

Zpracovatel:

Společnost GEOSAN – BAK – Urgent Náchod

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

35 741,60

D HSV

Práce a dodávky HSV


35 741,60

D 1

Zemní práce

12 456,01

2	K	132151102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	3,068	495,02	1 518,47	SOD
VV					drenáž délka x šířka x hloušťka" 20,9*0,30*0,25	1,568		
					Kanalizace délka x šířka x hloušťka" 6*0,50*0,5	1,500		
					Součet	3,068		
5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3,068	208,55	639,73	SOD
N	K	167151101	Nakládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	3,068	162,36	498,04	ÚRS 2024_02*0,99_
13	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky	m3	3,068	22,83	70,03	SOD
19	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	5,522	207,45	1 145,44	SOD
VV					MNOŽSTVÍ*1,8 Přepočtené koeficientem množství	5,522		
20	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	7,770	123,28	957,89	SOD
VV					"délka x šířka x hloušťka" 20,9*0,60*0,5 "	6,270		
					Zásyp přípojky	1,500		
					Součet	7,770		
22	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	15,540	490,76	7 626,41	SOD
VV					násobeno váhovým koeficientem 2"	15,540		
D 8					Trubní vedení		7 283,80	
N	K	212755214	Trativody z drenážních trubek DN 100 bez lože	m	20,900	73,85	1 543,55	ÚRS 2024_01*0,99_
N	K	721249116	Montáž lapače střešních splavenin z PP DN 125 ostatní typ	kus	1,000	383,13	383,13	ÚRS 2024_02*0,99_
N	K	HLE.HL660E	Lapač střešních splavenin DN125/110, s košem pro zachytávání nečistot, ZU - suchá klapka, s čistícím víčkem a těsnicím kroužkem pr. 75/90/100/110/120mm	kus	1,000	573,56	573,56	ÚRS 2024_02*0,99_
N	K	721173315	Potrubi kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 110	m	6,000	518,76	3 112,56	ÚRS 2024_02*0,99_
N	K	131111333R	Jádrový odvrť do betonové šachty včetně utěsnění	soub	1,000	1 671,00	1 671,00	vlastní
D 9					Ostatní konstrukce a práce, bourání		2 598,71	
40	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	41,800	62,17	2 598,71	SOD
VV					20,9*2	41,8		
998					Přesun hmot		13 403,08	
52	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	15,560	861,40	13 403,08	SOD

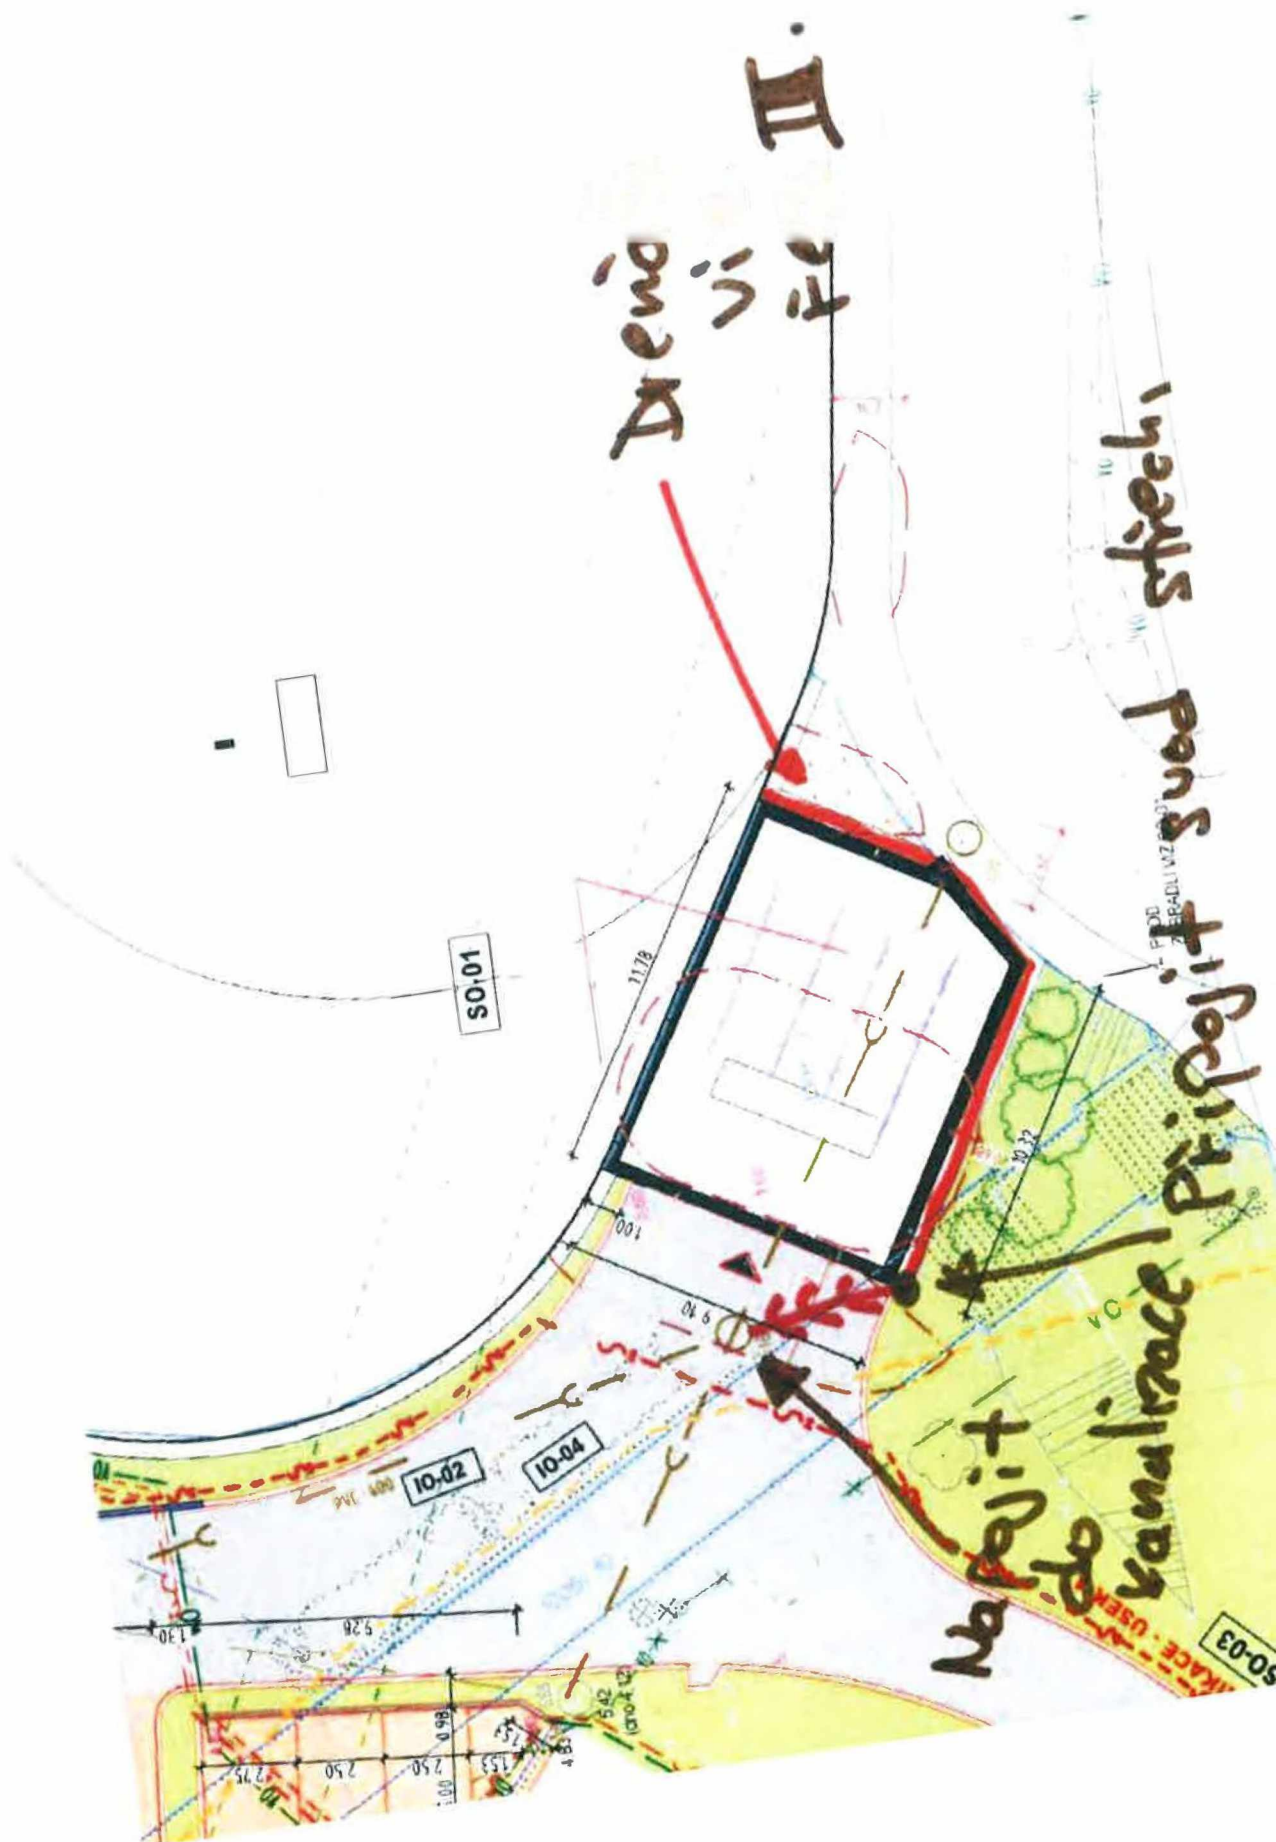

ZMĚNOVÝ LIST

Prodloužení přeložky plynovodu

036

Stavba:	Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod		
Objekt:	IO-04 Přeložka areálového STL plynovodu		
Předkládá:	Společnost GEOSAN - BAK - Urgent Náchod	Datum:	10.08.2024

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem	☒	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy	1 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

V projektové dokumentaci přeložka areálového plynovodu ukončena u stávajícího zděného redukčního pilíře s vyraženým obchodním měřením.

1.2 Popis nového řešení:

Prodloužení přeložky areálového plynovodu v délce 3 m - od stávajícího zděného redukčního pilíře včetně jeho zrušení až k hlavnímu páteřnímu uzávěru plynu vysazeného na odbočce veřejného plynovodu.

2 Zdůvodnění změny:

Na základě požadavku uživatele došlo k prodloužení přeložky stávajícího areálového plynovodu až k hlavnímu páteřnímu uzávěru plynu. Tato změna zajistí kompletní přeložku včetně 3 m zbývajících areálového potrubí k uzávěru.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	☐	ANO	☒	NE
---	--------------------------	-----	-------------------------------------	----

4 Dopad do smluvních termínů:	☐	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	☒	NE
-------------------------------	--------------------------	--	-------------------------------------	----

5 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	-26 261,35	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	19 371,69	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		-6 889,66	bez DPH

6 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	4
---	-------	---

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Lukáš Laštoníčka, DiS.	Jan Čejchan	Ing. René Hubka	Bůžek Miroslav	Franišek Mrázek, DiS.

GEOSAN GROUP a.s.	CEHNG s.r.o.	Proxion s.r.o.	ON Náchod a.s.	Královéhradecký kraj
-------------------	--------------	----------------	----------------	----------------------

DIČ: CZ28169522

SOUPIS PRACÍ - ZL 36 Prodloužení přeložky plynovodu

Stavba:

URGENTNÍ PŘÍJEM - Oblastní nemocnice Náchod - přístavba a stavební úpravy části pavilonu „A“ a pavilonu „B“

Objekt:

223014 - Přeložka areálového STL plynovodu

Místo:

Datum: 10.08.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost GEOSAN – BAK – Urgent Náchod

Zpracovatel:

Společnost GEOSAN – BAK – Urgent Náchod

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-6 889,66	
D HSV Práce a dodávky HSV							9 111,86	
D 1 Zemní práce							2 628,27	
3	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 stacion	m3	3,120	532,65	1 661,87	son
10	K	162251102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	3,120	36,51	113,91	son
15	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m3	2,016	123,26	248,53	son
16	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypáním bez prohození, uložené do 3 m	m3	0,864	474,17	409,66	son
17	K	175111108	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypání, uložené do 3 m	m3	0,864	226,02	195,28	son
D 4 Vodorovná konstrukce							218,12	
18	K	451573111	Lože pod potrubí otevlý výkop z pisku - včetně přesunu	m3	0,240	908,82	218,12	son
D 8 Trubní vedení							169,05	
23	K	899722111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí - CYY 2,5	m	3,000	43,07	129,21	son
24	K	899722113	Krytí potrubí z plestí výstražnou fólií z PVC - perforované - žlutá š 300 mm	m	3,000	13,28	39,84	son
D 9 Oslatní konstrukce a práce, bourání							5 520,00	
N	K	129511121	Odstranění stávajícího zeleňého redukčního pilíře s vyřazeným obchodním mělením	ks	1,000	4 100,00	4 100,00	vlastní
N	K	129551121R	Vyřezání stávajícího odvodňovače z areálového potrubí včetně likvidace	ks	1,000	1 420,00	1 420,00	vlastní
D 998 Přesun hmot							575,42	
36	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevlý výkop	l	0,868	661,40	575,42	son
D M Práce a dodávky M							-16 001,52	
D 23-M Montáže potrubí							-16 001,52	
37	K	23002408	Montáž trubní díly přivařovací Ø.11-13 do 50 kg D 159 mm tl 4,5 mm	kus	-2,000	1 260,25	-2 560,50	son
38	M	319R01	Tvarovka - přesuvka SCHUCK SMI PN 16 DN 150 + izolace SERVIVRAF	kus	-1,000	7 221,17	-7 221,17	son
39	M	319R02	Redukce ocelové DN 150/DN 50 + izolace	kus	-1,000	3 935,54	-3 935,54	son
50	K	230205042	Montáž potrubí plastového svařované na lupu nebo elektrospojkou dn 63 mm tl 5,8 mm	m	3,000	116,17	348,51	son
51	M	26613514	potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 63x5,8mm	m	3,000	128,82	386,46	son
52	K	230205242	Montáž trubního dílu PE elektrosvárky nebo svařovaného na lupu dn 63 mm tl 5,8 mm	kus	-1,000	250,82	-250,82	son
55	M	266R003	elektrosvárka - přechodka PE - oceli zemní - D 63/DN 50 - včetně zaizolování páskou FATRAFAL S21 nebo S22 s provedení liškové zkoušky	kus	-1,000	5 038,03	-5 038,03	son
60	K	230230016	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 50	m	3,000	11,62	34,86	son
66	K	230200R02	Nápojení na stávající areálový STL plynovod PE D 63 - elektroredukce - koleno, včetně propojení stávajícího signalizačního vodiče	soubor	-1,000	7 211,29	-7 211,29	son
N	K	230200R02	Nápojení na stávající areálový STL plynovod PE D 110 - elektroredukce - včetně propojení stávajícího signalizačního vodiče	soubor	1,000	9 450,00	9 450,00	vlastní

STÁVAJÍCÍ HLAVNÍ
UZÁVĚR PLYNU
- ZEMNÍ UZÁVĚR PE 110

STÁVAJÍCÍ PILÍŘ
ZBOURÁN, OCEĚ
VTŘEZNÁ

STÁVAJÍCÍ ZDĚNÝ
PILÍŘ PRO OBCHODNÍ
STL MĚŘENÍ PLYNU

STÁVAJÍCÍ ZEMNÍ
UZÁVĚR PLYNU

NAPOJIT NA STÁVAJÍCÍ AREÁLOVÝ
STL PLYNOVOD OCEĚ DN 150
V MÍSTĚ STÁVAJÍCÍHO UZÁVĚRU
- PŘESUVKA 8CHUCK DN 150
- REDUKCE DN 150/50
- ELEKTROTVAROVKA - PŘECHODKA
PE-OCEĚ dn 63/DN 50

POVRCH

PE-RC 63 - BUDE VTAŽENO

STÁVAJÍCÍ

ZMĚNOVÝ LIST					037	
Výměna podružných rozvaděčů						
Stavba:		Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod				
Objekt:		SO-01 Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B - Silnoprůd				
Předkládá:		Společnost GEOSAN - BAK - Urgent Náchod			Datum:	06.09.2024
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů				
poštou		1) Položkový rozpočet změny			1	listů
e-mailem	☒	2) Projektové podklady			0	listů, výkresů
osobně		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy			1	listů
1 Technický popis změny:						
1.1 Popis původního řešení: V projektové dokumentaci dozbrojení rozvaděčů RS 2.1, R1 a R2						
1.2 Popis nového řešení: Dodávka a montáž nových podružných rozvaděčů RS 2.1, R1 a R2						
2 Zdůvodnění změny: Na základě kontroly revizním technikem, je zjištěn nevyhovující stav předmětných rozvaděčů, které obsahují dožitá stávající komponenty výzbroje, s nevhodnými postupnými zásahy v průběhu provozování. Po dozbrojení novými komponenty výzbroje již by byly nerevidovatelné. Z důvodu těchto zjištění je nutné instalovat nové rozvaděče s kompletní novou výzbrojí, které budou splňovat současnou legislativu a normy. Přílohou ZL je obranné vyjádření ke stavu rozvodnic.						
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:			ANO		☒	NE
4 Dopad do smluvních termínů:			ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		☒	NE
5 Náklady:		Cena méněprací (odpočet):	–	-59 366,52 bez DPH		
		Cena víceprací (přípočet):	+	212 273,00 bez DPH		
		Výsledná ceny změny:		152 906,48 bez DPH		
6 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek					odst.	6
7 Schválil:						
za zhotovitele:		za TDS:		za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Lukáš Laštovík, DiS.		Jan Čejchan		Ing. René Hubka	Bůžek Miroslav	František Mrázek, DiS.
171 GEOSAN GROUP a.s.		CE-ING s.r.o.		Proxion s.r.o.	ON Náchod a.s.	Královéhradecký kraj

ZL 37 Výměna podružných rozvaděčů

Dodávky zařízení (specifikace)

poř. č.	číslo pol.	pops položky	jedn. cena	množství jedn.	celkem [Kč]
O 3		Dozbrojení rozvaděče RS 2.1	38 647,53	-1,00 sad	-38 647,53
				a	
O 4		Úprava a dozbrojení rozvaděčů RH, R1 a R2	32 373,42	-0,64 sad	-20 718,99
				a	
N		Rozvaděč R1	101 092,00	1,00 ks	101 092,00
N		Rozvaděč R2	38 468,00	1,00 ks	38 468,00
N		Rozvaděč RS2.1	72 713,00	1,00 ks	72 713,00
Celkem bez DPH:					152 906,48



Vyjádření ke stavu rozvodnic na projektu realizace Urgentního příjmu ON Náchod

V projektové dokumentaci jsou rozvaděče R1, RS 2.1 a R2 pouze dozbrojeny a ponechány ve stavbě. Nicméně po odborné kontrole bylo zjištěno, že aktuální stav těchto rozvaděčů neumožňuje řádné doplnění dalších prvků, protože v kombinaci se starými (více jak 20 let) a často již značně opotřebovanými prvky by nebylo možné rozvaděče jako celek zrevidovat. Navíc i technický stav samotných skříní rozvaděčů je velmi špatný. Z těchto důvodů je nutné tyto rozvaděče dodat nové.

V Hradci Králové 6.9.2024



ZMĚNOVÝ LIST

038

Doplnění potrubní pošty protihlukovou izolací

Stavba:	Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod		
Objekt:	SO-01 Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B - Potrubní pošta		
Předkládá:	Společnost GEOSAN - BAK - Urgent Náchod	Datum:	02.07.2024

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem	☒	2) Projektové podklady	2 listů, výkresů
osobně		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy	0 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

V projektové dokumentaci pro provádění stavby obsaženy protihlukové izolace na potrubní poště DN 110

1.2 Popis nového řešení:

Doplnění soupisu stavebních prací o položky dodávky a montáže protihlukové izolace

2 Zdůvodnění změny:

Předmětem změnového listu je doplnění položek souvisejících s provedením protihlukových izolací na potrubí pr. 110 mm do soupisu stavebních prací. Tyto uvedené práce vznikly v důsledku výše uvedených okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO	☒	NE
---	--	-----	-------------------------------------	----

4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	☒	NE
-------------------------------	--	--	-------------------------------------	----

5 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	–	0,00	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	40 592,00	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		40 592,00	bez DPH

6 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	6
---	-------	---

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
<i>Laštovík R.</i>	<i>Čejchová</i>	<i>Hrubá R.</i>	<i>Božek M.</i>	<i>Hlázek F.</i>

Zakázka

Stupeň

URGENTNÍ PŘÍJEM - PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI PAVILONU "A" A PAVILONU "B"

DPS

D.1.9 - Potrubní pošta

Kapitola

Datum

Soupis_VÍCEPRÁCE_izolace potrubí

07/2024

Číslo


Zpracovatel technologické části: PROFITUBE PROCZECH

D.1.9

Číslo položky	Položka	Množství	Jednotky	Cena za jednotku	Cena celkem
JÍZDNÍ POTRUBÍ - 110mm					
N	Izolace trasy jízdního potrubí plastového vnější průměr 110 mm, oblouky poloměr 650mm	32	m	929,0 Kč	29 728,0 Kč
24					
48	Doprava materiálu včetně nakládky a vykládky, doprava a ubytování techniků/montážníků	1	kpl	10 000,0 Kč	10 000,0 Kč
49	Manipulační technika - manipulační technika pro rozvoz materiálu v areálu nemocnice	1	kpl	864,0 Kč	864,0 Kč

Cena celkem bez DPH bez stavební připravenosti**40 592,00 Kč**

2028AH ZVUK IZOLACE POTRUBÍ M10

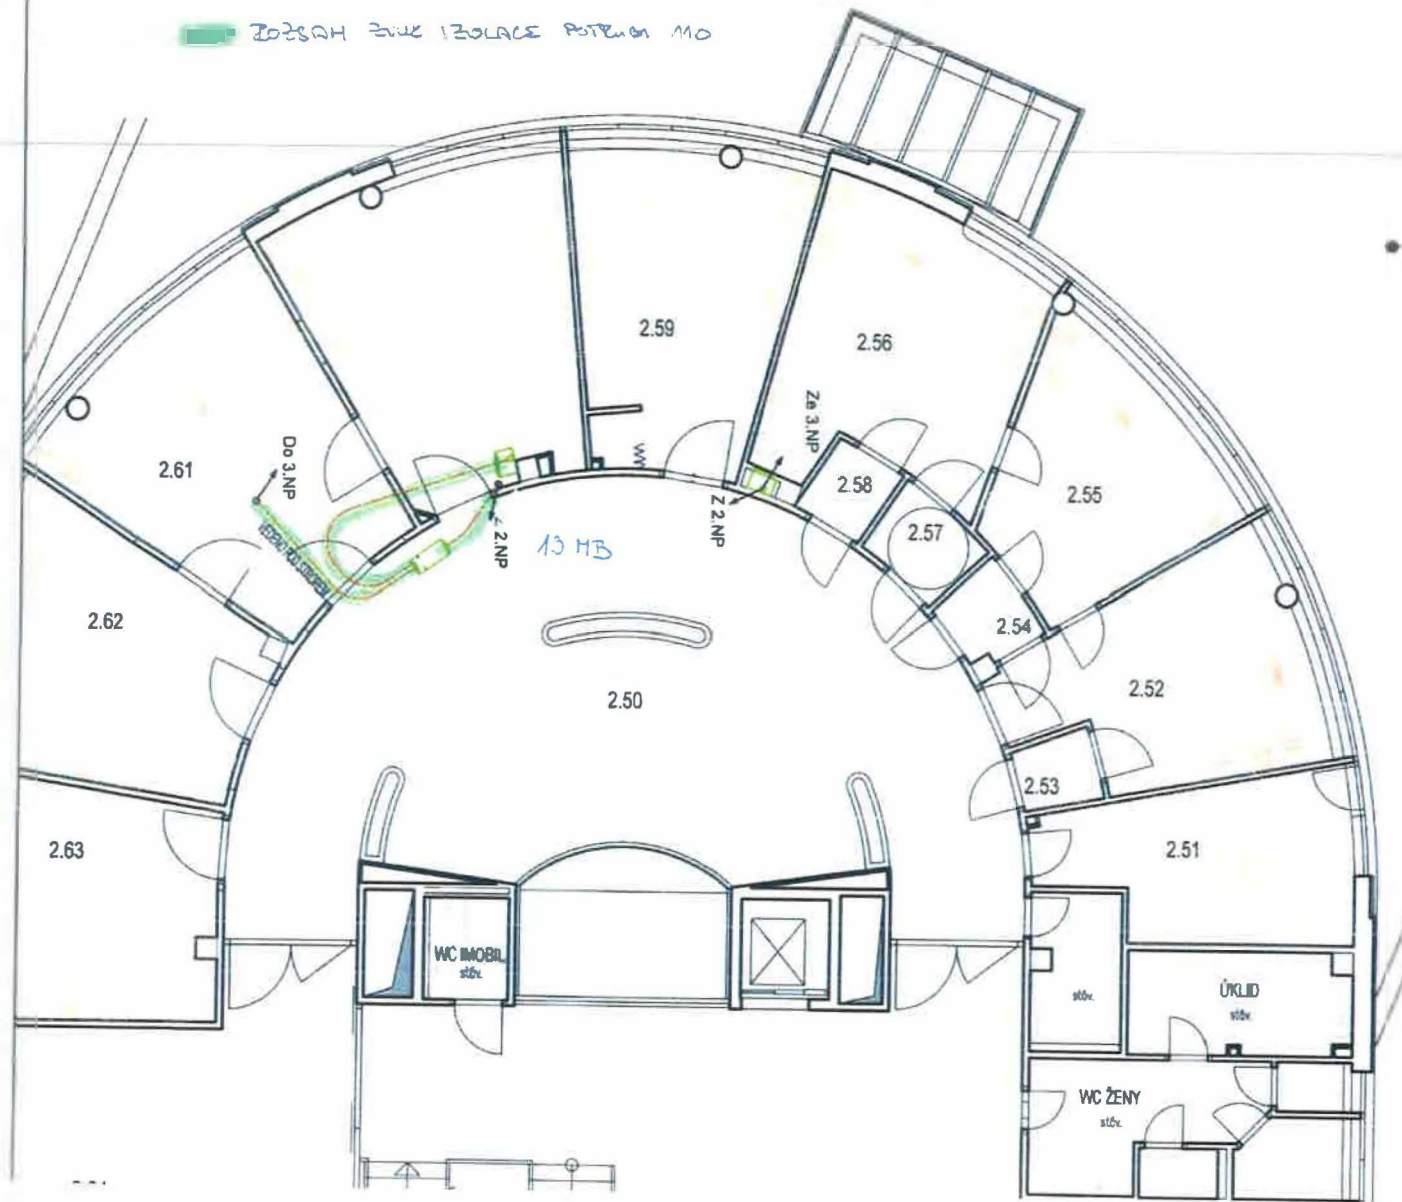

ZMĚNOVÝ LIST					039	
Prodloužení potrubní pošty do 2NP pavilonu B						
Stavba:		Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod				
Objekt:		SO-01 Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B - Potrubní pošta				
Předkládá:		Společnost GEOSAN - BAK - Urgent Náchod			Datum: 01.09.2024	
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů				
poštou		1) Položkový rozpočet změny			2 listů	
e-mailem	☒	2) Projektové podklady			0 listů, výkresů	
osobně		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy			1 listů	
1 Technický popis změny:						
1.1 Popis původního řešení:						
Neobsaženo						
1.2 Popis nového řešení:						
Dodávka a instalace výhybky na upravované rozvody potrubní pošty včetně prodloužení potrubí a osazení potrubní stanice do 2 NP pavilonu B.						
2 Zdůvodnění změny:						
Na základě požadavku nemocnice je předmětem změnového listu dodávka a instalace výhybky na upravované rozvody 1 NP pavilonu B včetně prodloužení potrubí do 2 NP pavilonu B do prostoru ambulancí ORL (dočasně umístěné po dobu výstavby pavilonu D) s instalací koncové stanice potrubní pošty. Stanici potrubní pošty poskytne uživatel nemocnice. Potrubní stanice pro ORL je nezbytná a její instalace proběhne v čase úprav a zprovoznění potrubní pošty v pavilonu A a B.						
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		☐ ANO			☒ NE	
4 Dopad do smluvních termínů:		☐ ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)			☒ NE	
5 Náklady:		Cena méněprací (odpočet):		–	0,00	bez DPH
		Cena víceprací (přípočet):		+	147 406,53	bez DPH
		Výsledná ceny změny:			147 406,53	bez DPH
6 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek					odst.	4
7 Schválil:						
za zhotovitele:		za TDS:		za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Lukáš Laštovička, DiS.		Jan Čejchan		Ing. René Hubka	Bůžek Miroslav	Franišek Mrázek, DiS.
[Redacted Signature Area]						
GEOSAN GROUP a.s.		CE-ING s.r.o.		Proxion s.r.o.	ON Náchod a.s.	Královéhradecký kraj
170 00 Praha 1 DIČ: CZ28169522						

ZL 39 Potrubní pošta doplnění

Zakázka

Stupeň

URGENTNÍ PŘÍJEM - PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI PAVILONU "A" A PAVILONU "B"

DPS

D.1.9 - Potrubní pošta

Kapitola

Datum

Soupis_VÍCEPRÁCE_ montáž stanice včetně dodávky a osazení výhybky

08/2024

Číslo

D.1.9

Zpracovatel technologické části: PROFITUBE PROCZECH

Číslo položky	Položka	Množství	Jednotky	Cena za jednotku	Cena celkem
STANICE 110mm					
1	Nemocniční stanice včetně příslušenství (signalizace, koš, držák pouzder) - autorizovaná montáž (veškeré komponenty dodá nemocnice)	1	ks	13 240,1 Kč	13 240,1 Kč
2	Koncový díl stanice včetně klapky	1	ks	6 784,5 Kč	6 784,5 Kč
3	Polstrování do záchytného koše	1	ks	780,4 Kč	780,4 Kč
4	Montážní a instalační materiál pro kotvení stanic a příslušenství	1	ks	516,6 Kč	516,6 Kč
5	Značení komponentů	1	ks	74,1 Kč	74,1 Kč
VÝHYBKY - 110mm					
N	Třicestná elektronická výhybka 110 mm - autorizovaná dodávka a montáž	1	ks	35 769,0 Kč	35 769,0 Kč
11	Koncový díl k výhybce 110 mm, se 2 vzduchovými klapkami	1	ks	5 393,7 Kč	5 393,7 Kč
12	Montážní a instalační materiál pro kotvení výhybek	1	kpl	3 174,9 Kč	3 174,9 Kč
13	Značení komponentů	1	ks	74,1 Kč	74,1 Kč
SYSTÉMOVÁ KABELAŽ					
18	Systémový kabel pro napájení a přenos dat, stíněný	10	m	191,6 Kč	1 916,4 Kč
19	Kabel pro napojení signalizace vč. elektromontážní lišty	5	m	92,9 Kč	464,3 Kč
20	Montážní a instalační materiál pro kotvení kabelů	1	kpl	12 280,9 Kč	12 280,9 Kč
JÍZDNÍ POTRUBÍ - 110mm					
N	Úpravy stávající trasy pro instalaci výhybky	1	kpl	4 232,0 Kč	4 232,0 Kč
22	Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 110 mm, tloušťka stěny 2,3 mm, včetně spojek, šedé	5	m	940,4 Kč	4 702,2 Kč
23	Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 110 mm, tloušťka stěny 2,3 mm, poloměr oblouku min. 650 mm, včetně spojek, šedé	3	ks	2 093,3 Kč	6 279,8 Kč
27	Montážní a instalační materiál pro kotvení a montáž trasy potrubí (objímky, kabelové stahovací pásky, lepidlo, závitové tyče, čističe, rozpouštědla)	1	kpl	7 148,4 Kč	7 148,4 Kč
24	Nerezová spojka pro napojení stanic	2	ks	369,5 Kč	738,9 Kč
24					
43	Autorizované parametrování a spuštění systému, naprogramování dle požadavků zákazníka, odstávky technologie	1	kpl	5 856,0 Kč	5 856,0 Kč

URGENTNÍ PŘÍJEM - PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI PAVILONU "A" A PAVILONU "B"

DPS

D.1.9 - Potrubní pošta

Kapitola

Datum

Soupis_VÍCEPRÁCE_ montáž stanice včetně dodávky a osazení výhybky

08/2024

Číslo

Zpracovatel technologické části: PROFITUBE PROCZECH

D.1.9

Číslo položky	Položka	Množství	Jednotky	Cena za jednotku	Cena celkem
45	Individuální zkoušky včetně provádění potřebných měření, zajištění atestů a revizí za účelem prokázání kvality a funkčnosti díla. O ukončení individuálních zkoušek bude sepsán závěrečný protokol s celkovým vyhodnocením celého díla.	1	kpl	3 840,0 Kč	3 840,0 Kč
46	Školení obsluhy (včetně požadované dokumentace)	1	kpl	1 980,0 Kč	1 980,0 Kč
47	Zařízení staveniště	1	kpl	516,0 Kč	516,0 Kč
48	Doprava materiálu včetně nakládky a vykládky, doprava a ubytování techniků/montážníků	1	kpl	24 489,2 Kč	24 489,2 Kč
50	Ekologická likvidace a odvoz odpadů	1	kpl	1 980,0 Kč	1 980,0 Kč
51	Projektová dokumentace skutečného stavu v tištěné i digitální podobě na CD - rozšíření o nové části	4	paré	1 293,8 Kč	5 175,0 Kč

Cena celkem bez DPH bez stavební připravenosti**147 406,53 Kč**

DA

FORMAČNÍ STANICE POTRUBÍ

STY SYSTÉMU 110mm

STĚŽNÝA VÝHYBA

TRUBNÍ POUŠTÝ SYSTÉMU 110mm

FORMAČNÍ STANICE POTRUBÍ

STY SYSTÉMU 160mm - NEOSAZENO


STĚŽNÝA VÝHYBA

TRUBNÍ POUŠTÝ SYSTÉMU 160mm

ANALÝZA ZACHOVANÉ JÍZDNÍ POTRUBÍ 110mm

ANALÝZA RUŠENÉ JÍZDNÍ POTRUBÍ 110mm

NEIZOLOVANÉ JÍZDNÍ POTRUBÍ 110mm

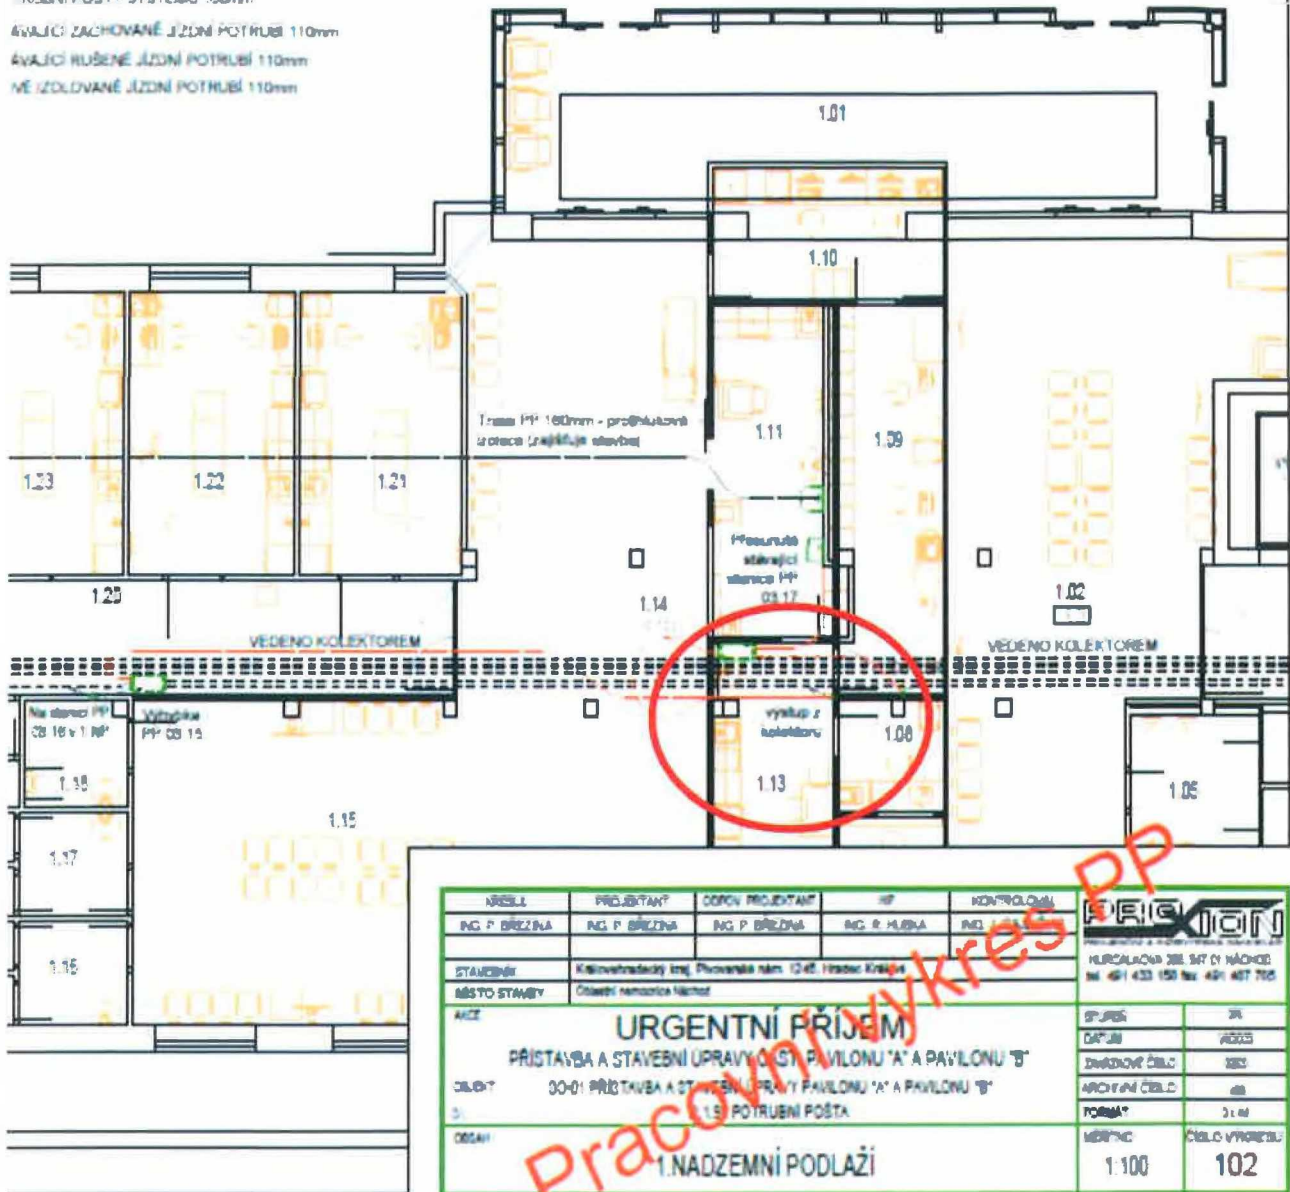

KRESL	PROJEKTANT	DOPOV. PROJEKTANT	HP	KONTROLOVA	PRAXION PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ FIRMÁ, s.r.o. KURČALOVÁ 208, 547 01 NÁCHOD TEL: 481 433 150 FAX: 481 487 705	
ING. P. BŘEZINA	ING. P. BŘEZINA	ING. P. BŘEZINA	ING. P. HUBKA	ING. P. HUBKA		
STAVEBNÍK	Kališvratelský ústř. Pivovarské nám. 1248, Písek, Králové					
MÍSTO STAVBY	Oblastí nemocnice Náchod					
ACE	URGENTNÍ PŘÍJEM PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ST. PAVILONU "A" A PAVILONU "B" ČÍSLO? 00-01 PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU "A" A PAVILONU "B" D? 1.5. POTRUBNÍ POŠTA OBSAH? 1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ				STUPEŇ	3A
					ČÍSLO	100/03
					INŽENÝRSKÉ ČÍSLO	102
					ARCHIVNÍ ČÍSLO	08
					FORMÁT	3:40
OBSAH					MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
					1:100	102

ZMĚNOVÝ LIST

040

Změna vstupní prosklené přístavby pavilonu B

Stavba:	Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod		
Objekt:	SO-01 - Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B		
Předkládá:	Společnost GEOSAN - BAK - Urgent Náchod	Datum:	20.08.2024

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem	☒	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy	1 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

V projektové dokumentaci pro provádění stavby prosklená přístavba o 13 modulech, jižní strana bez požární odolnosti

1.2 Popis nového řešení:

V projektové dokumentaci změny stavby před jejím dokončením prosklená přístavba o 14 modulech, jižní strana s požární odolností EI 30. Viz seznam PDZSPD, která je přílohou tohoto ZL

2 Zdůvodnění změny:

Předmětem změnového listu je docenění jednoho kusu modulu prosklené vstupní přístavby včetně doplnění požární odolnosti jižní strany přístavby dle vydané projektové dokumentace pro provádění stavby s ozn. rev 1 (dokumentace změny stavby před jejím dokončením), vzniklé v koordinaci se souběžnými projektovými akcemi (2 etapa, změna v provozování pavilonu B, C - lékarna). Realizaci těchto změn se předejde budoucím úpravám na novostavbě přístavby včetně zmařeným konstrukcím.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	☐ ANO	☒ NE
---	------------------------------	--

4 Dopad do smluvních termínů:	☐ ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	☒ NE
-------------------------------	---	--

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	4
---	-------	---

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	177 803,73	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		177 803,73	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:		za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Lukáš Laštovička, DiS.	Jan Čejchan		Ing. René Hubka	Bůžek Miroslav	Franišek Mrázek, DiS.

GEOSAN GROUP a.s.
U Průhonu 1516/32
170 00 Praha 7
DIČ: CZ28169522

CE-ING s.r.o.

Proxion s.r.o.

ON Náchod a.s.

Královéhradecký kraj

SOUPIS PRACÍ - ZL 40 Změna vstupní prosklené přístavby pavilonu B

Stavba: ON Náchod Urgentní příjem
Objekt: SC-01 - Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B
Soupis: 02 - Nový stav

Místo: Náchod Datum: 20.08.2024
Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: Společnost GEOSAN
Uchazeč: Společnost GEOSAN – BAK – Urgent Náchod Zpracovatel: – BAK – Urgent Náchod

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							177 803,73	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				167 803,73	
D	767		Konstrukce zámečnické				167 803,73	
169	K	008R	D+M prosklené zádveží, nosná ocelová konstrukce vč. spojovacích prostředků - rozšíření ocelové konstrukce o jeden modul	kpl	1,000	102 448,89	102 448,89	VLASTNÍ
rozšíření přístavby o jeden modul								
N	K	008R1	Dopčet požární odolnosti konstrukce boku na EI 30	m2	13,845	4 367,45	60 467,35	VLASTNÍ
202	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	3,000	1 629,16	4 887,49	SOD
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				10 000,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				10 000,00	
1	K	001R	Dílešská dokumentace OK+AL prosklené stěny přístavby pavilonu B	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	SOD
Úprava dílešské dokumentace - rev 1								

Seznam projektové dokumentace

OZN.ČASTI PROJEKT U	NÁZEV
POŽ	POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - dopatek k POŽ na urgentní příjem
	Technická zpráva
	Půdorysné výkresy 1-4NP - zakres konc prvků
SO-01	Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B
D.1.1 AST	Architektonicko-stavební řešení
	D.1.1.3 1.NP - pavilon B rev1
	D.1.1.4 2.NP - pavilon A rev1
	D.1.1.10 Pohledy-přístavba pavilonu B rev1
	D.1.1.14 Výpis zámečnických výrobků rev1

ZMĚNOVÝ LIST					041	
Záměna materiálu lišt u keramických obkladů						
Stavba:		Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod				
Objekt:		SO-01 - Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B				
Předkládá:		Společnost GEOSAN - BAK - Urgent Náchod			Datum:	10.08.2024
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů				
poštou		1) Položkový rozpočet změny			1	listů
e-mailem	☒	2) Projektové podklady			0	listů, výkresů
osobně		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy			0	listů
1 Technický popis změny:						
1.1 Popis původního řešení: Ukončovací lišty plastové u keramických obkladů						
1.2 Popis nového řešení: Ukončovací lišty nerezové u keramických obkladů						
2 Zdůvodnění změny: Na základě požadavku uživatele z důvodu zvýšení odolnosti ukončovacích lišt dojde k materiálové záměně plastových lišt za nerezové						
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		☐ ANO			☒ NE	
4 Dopad do smluvních termínů:		☐ ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)			☒ NE	
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek					odst.	4
6 Náklady:		Cena méněprací (odpočet):		-	-5 938,76	bez DPH
		Cena víceprací (přípočet):		+	35 630,76	bez DPH
		Výsledná ceny změny:			29 692,00	bez DPH
7 Schválil:						
za zhotovitele:		za TDS:		za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Lukáš Laštovička, DiS.		Jan Čejchan		Ing. René Hubka	Miroslav Bůžek	František Mrázek, DiS.
GEOSAN GROUP a.s. CH-ING s.r.o. Proxion s.r.o. ON Náchod a.s. Královéhradecký kraj						

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ON Náchod Urgentní příjem

Objekt:

SO-01 - Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B

Soupis:

ZL 41 Záměna materiálu lišt u keramických obkladů

Místo:

Náchod

Datum:

10. 8. 2023

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

Uchazeč:

Společnost GEOSAN – BAK – Urgent Náchod

Zpracovatel:

Společnost
GEOSAN – BAK –
Urgent Náchod

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

29 692,00

w PSV

Práce a dodávky PSV

29 692,00

D 781

Dokončovací práce - obklady

29 692,00

238	M	28342001	lišta ukončovací z PVC 8mm	m	-180,345	32,93	-5 938,76	SOD
	vv		163,95*1,1 'Přepočtená koeficientem množství		180,345			
240	M	19416014	lišta ukončovací nerezová 8mm	m	180,345	197,57	35 630,76	SOD
	vv		163,95*1,1 'Přepočtená koeficientem množství		180,345			

ZMĚNOVÝ LIST

Změna stoupačka V1

042

Stavba:	Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod		
Objekt:	SO-01 Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B - ZTI		
Předkládá:	Společnost GEOSAN - BAK - Urgent Náchod	Datum:	05.08.2024

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem	☒	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy	1 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

Stoupačka s ozn. V1 zachována u sloupu

1.2 Popis nového řešení:

Stávající stoupačka s ozn. V1 se přeloží pod stopem 1NP. v místnostech 1.14 a 1.13 do soupačky V2 v pavilonu B.

2 Zdůvodnění změny:

Na základě zjištění skutečné polohy stávající stoupačky V1, která byla v kolizi s novými konstrukcemi prosklené sestavy příček, dojde k přeložení tohoto stávajícího potrubí do stoupačky s ozn. V2. Tyto uvedené práce vznikly v důsledku výše uvedených okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	☐	ANO	☒	NE
---	--------------------------	-----	-------------------------------------	----

4 Dopad do smluvních termínů:	☐	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	☒	NE
-------------------------------	--------------------------	--	-------------------------------------	----

5 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	50 419,39	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		50 419,39	bez DPH

6 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	6
---	-------	---


7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Lukáš Laštovička, DiS.	Jan Čejchan	Ing. René Hubka	Miroslav Bůžek	František Mrázek, DiS.

GEOSAN BAK - Urgent Náchod a.s.	CE-NG s.r.o.	Proxion s.r.o.	ON Náchod a.s.	Královéhradecký kraj
---------------------------------	--------------	----------------	----------------	----------------------

SOUPIS PRACÍ - ZL 42 Změna stoupačka V1

Poř	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
SO_01: Zdravotní instalace						50 419	
713: Izolace tepelné						5 272	
5	10-000022	Izolace potrubí TUBEX 35/10	m	8,0	52,60	421	SOD
N	722181234	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 63	m	16,0	129,69	2 075	
N	713463133	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace přes 50 do 100	m	16,0	163,35	2 614	URS 2024_02*0.99_
11	10-000000P-00	Přesun hmot pro tepelné izolace	%	3,19	51,09	163	SOD
722: Vnitřní vodovod						45 147	
8	531ln6170-008	Potrubí z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) - D 32x5,4	m	8,0	298,58	2 389	SOD
N	7221740007R	Potrubí z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) - D 63x10,5	m	16,0	1 059,30	16 949	URS 2024_02*0.99_
N	722220236	Přechodka dGK PPR PN 20 D 63 x G 2" s kovovým vnitřním závitem	kus	8,0	1 079,10	8 633	URS 2024_02*0.99_
N	722220233	Přechodka dGK PPR PN 20 D 32 x G 1" s kovovým vnitřním závitem	kus	4,0	247,50	990	URS 2024_02*0.99_
23	531lw4010-006	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí - potrubí závitové, do DN 50	m	24,0	17,78	427	SOD
23	531lw4020-002	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí - do DN 80	m	24,0	11,85	284	SOD
N	722232048 GCM	Kohout kulový Giacomini R250D přímý G 2" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,0	2 025,54	8 104	URS 2024_02*0.99_
N	734220114 IMI	Ventil závitový Heimeier STAD regulační přímý G 1 PN 25 do 120°C vyvažovací bez vypouštění - URS 734220114 IMI	kus	2,0	2 471,93	4 944	URS 2024_02*0.99_
N	722224115 GCM	Kohout plnicí nebo vypouštěcí Giacomini R608 G 1/2" PN 10 s jedním závitem	kus	6,0	330,17	1 981	URS 2024_02*0.99_
31	531Az0030-002	Přesun hmot pro vnitřní vodovod - výška do 6 m	%	1,0	447,00	447	SOD

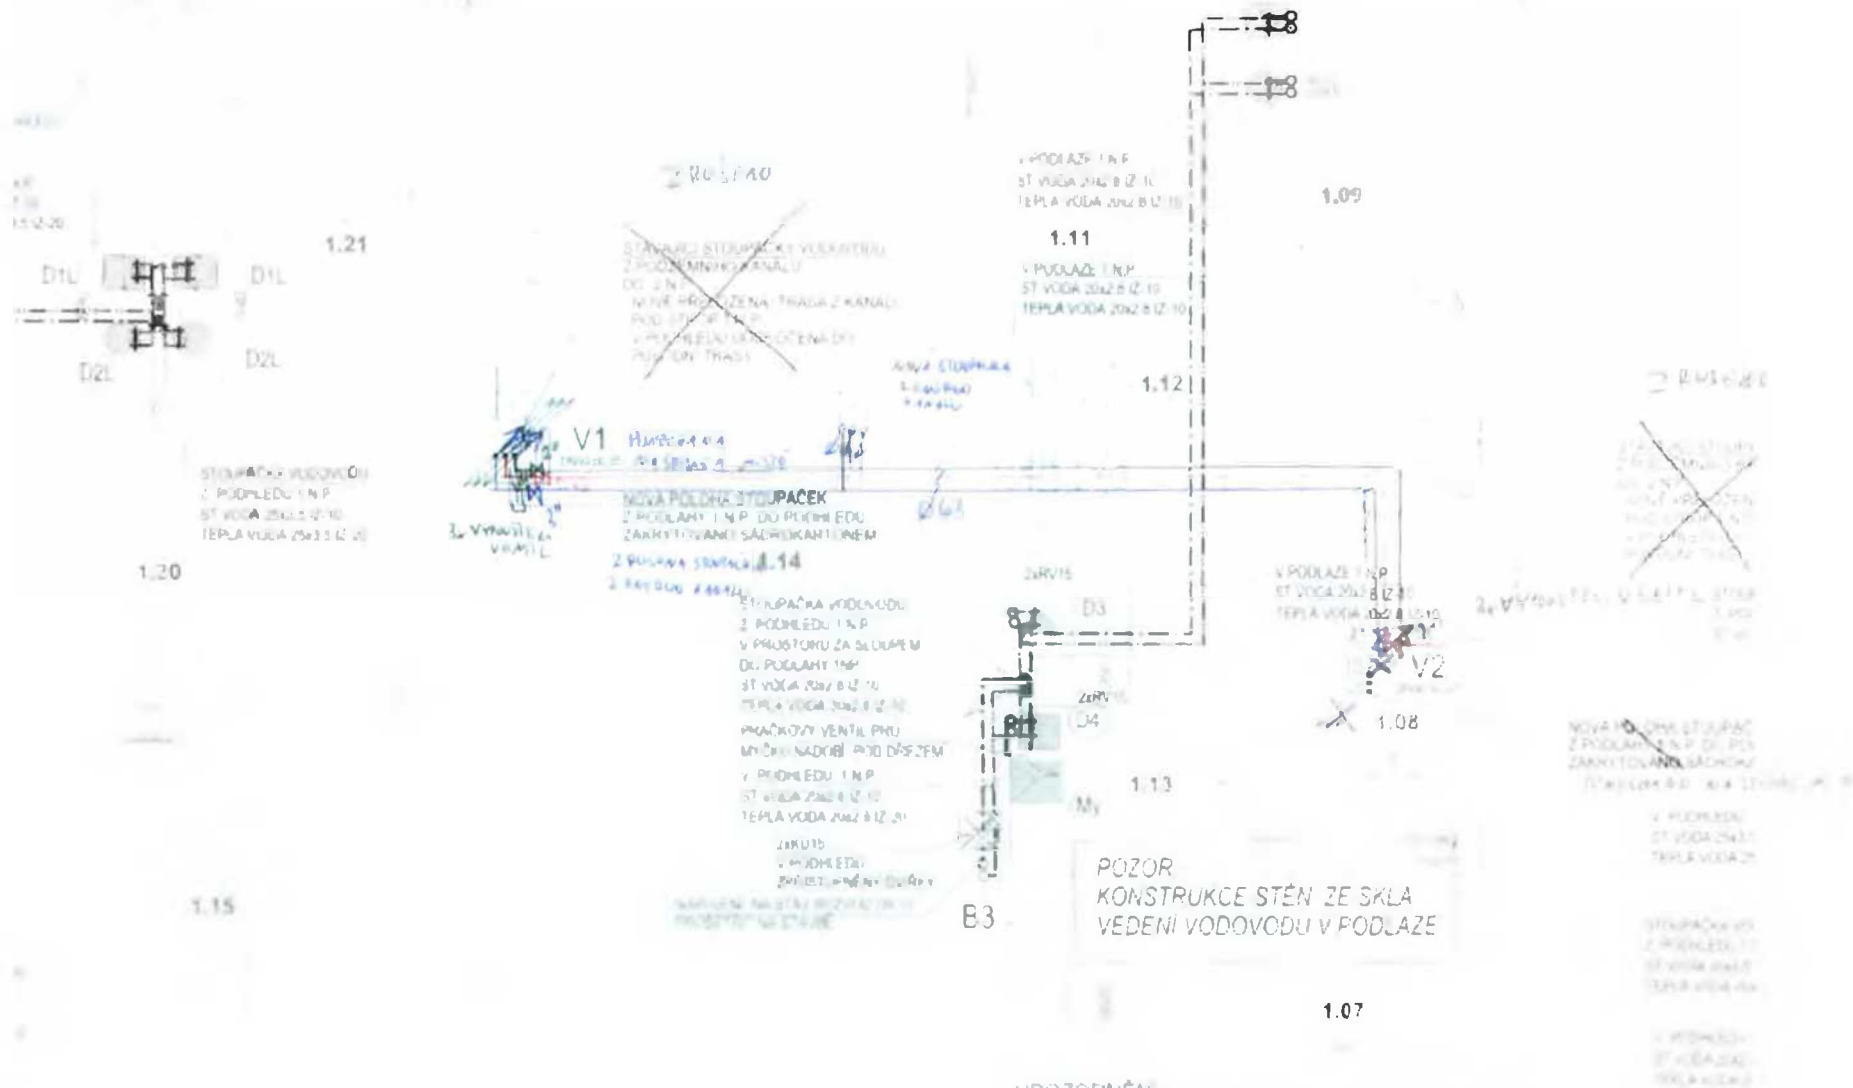

ZMĚNOVÝ LIST

043

Výměna vnitřního přívodu vody do pavilonu B

Stavba:	Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod		
Objekt:	SO-01 Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B - ZTI		
Předkládá:	Společnost GEOSAN - BAK - Urgent Náchod	Datum:	05.08.2024

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem	☒	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy	1 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

Stávající vodorovné potrubí uložené do podlahového kanálu bez úprav

1.2 Popis nového řešení:

Výměna vodovodního potrubí DN 80 v délce 10 m

2 Zdůvodnění změny:

Při provádění stavebních výměn a oprav stávajících betonových podlah v pavilonu B je zjištěn dožitý stav vodorovného potrubí - hlavního přívodu do pavilonu B. Na základě tohoto zjištění je potřeba ho vyměnit. Tato uvedená práce vznikla v důsledku výše zmíněné okolnosti, kterou zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	☐	ANO	☒	NE
---	--------------------------	-----	-------------------------------------	----

4 Dopad do smluvních termínů:	☐	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	☒	NE
-------------------------------	--------------------------	--	-------------------------------------	----

5 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	–	0,00	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	21 654,96	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		21 654,96	bez DPH

6 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	6
---	-------	---

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Lukáš Laštovíčka, DiS.	Jan Čejchan	Ing. René Hubka	Miroslav Bůžek	František Mrázek, DiS.

SOUPIS PRACÍ - ZL 43 Výměna vnitřního přívodu vody do pavilonu B

SOUPIS PRACÍ

Por.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO_01: Zdravotní instalace Hlavní přívod vody do B						21 654,96
722: Vnitřní vodovod						21 654,96
1	X60762	Uzavření vodovodu, vypuštění, napuštění	hod	1,0	296,35	296,35 SOD
3	X60764	Demontáž části stávajícího rozvodu vodovodu	hod	2,0	296,35	592,70 SOD
32	722130238	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 80	m	10,0	1 514,70	15 147,00 URS 24_02 *0,99
33	X3	HAWLE 8100 příruba DN80 závitová vnitřní závit 3" litina - Nová položka	kus	1,0	1 707,00	1 599 SOD
34	734109116	Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 8 DN 80	soubor	1,0	2 178,00	2 178,00 URS 24_02 *0,99
35	734181946	Zpětná montáž armatury přírubové se dvěma přírubami bez navaření protipřírub DN 80	soubor	1,0	1 098,90	1 098,90 URS 24_02 *0,99
36	MLT100002100	izolace potrubí Mirelon Pro 89x13mm	m	10,0	52,86	528,56 URS 24_02 *0,99
31	531Az0030-002	Přesun hmot pro vnitřní vodovod - výška do 6 m	%	1,0	214,41	214,41 SOD

HLAVNÍ PŘÍVOD VODY DO PRV. B' 1.01

PRVILON 'B'
1 NP

NAPOJENÍ
NA MOKU
VENK. PŘÍPOJEK

STOUPAČKA VODOVODU
Z PODLAHY 1 N.P.
ST. VODA 20x2,8 IZ-10
TEPLÁ VODA 20x2,8 IZ-10

1.10

D1L

D2L

1.09

V PODLAZE 1 N.P.
ST. VODA 20x2,8 IZ-10
TEPLÁ VODA 20x2,8 IZ-10

1.11

V PODLAZE 1 N.P.
ST. VODA 20x2,8 IZ-10
TEPLÁ VODA 20x2,8 IZ-10

1.12

ODOVODU

SA Z KANÁLU

NA DO

SK
OHLEDU
ARTONEM

20xV16

V PODLAZE 1 N.P.
ST. VODA 20x2,8 IZ-10

ODST. ZÁST. POTRUBÍ DO BD
VČ. TEPL. IZOLACE
(VĚŠENO V PODLAZE)

1.03

1.02
0 200

NAPOJENÍ NA
MOKU
(V ENERGOKANÁLU)

STAVAJÍCÍ STOUPAČKY VODOVODU
Z PODLAHY 1 N.P.
DO 2 N.P.
NOVĚ PŘELOŽENA TRASA Z KANÁLU
POD STROP 1 N.P.
V PODHLEDU ODSKOČENA DO
PŮVODNÍ TRASY

1.04

STOUPAČKA VODOVODU

20xV20
V PODHLEDU
ZPŘÍSTUPNĚNÝ DVÍŘKY

ZMĚNOVÝ LIST

044

Narovnání hydroizolace, mazanin a fasády přístavby A a B

Stavba:	Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod		
Objekt:	SO-01 - Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B		
Předkládá:	Společnost GEOSAN - BAK - Urgent Náchod	Datum:	05.08.2024

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	2 listů
e-mailem	☒	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy	0 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

Provedení dle PD

1.2 Popis nového řešení:

Narovnání chybějících výměr a položek soupisu stavebních prací s projektovou dokumentací

2 Zdůvodnění změny:

Předmětem změnového listu je doplnění chybějících výměr a položek týkající se bet. mazanin v přístavbě B včetně vodorovných hydroizolací, dále doplnění svislých hydroizolací a fasádní omítky na přístavbě pavilonu A a u vstupu 2 NP pavilonu A.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	☐	ANO	☒	NE
---	--------------------------	-----	-------------------------------------	----

4 Dopad do smluvních termínů:	☐	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	☒	NE
-------------------------------	--------------------------	--	-------------------------------------	----

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	6
---	-------	---

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	—	0,00	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	282 656,49	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		282 656,49	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za TDS - specialistu:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Lustavický L.	Božek J.		Kuška R.		Mrazek F.

GEOSAN BAK a.s.
Oprávněný zástupce

CE-ING s.r.o.

Proxion s.r.o.

ON Náchod a.s.

Královéhradecký kraj

SOUPIS PRACÍ - ZL 44 Narovnání hydroizolace, mazanin a fasády přístavby A a B

Stavba:

ON Náchod Urgentní příjem

Objekt:

SO-01 - Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B

Soupis:

02 - Nový stav

Místo:

Náchod

Datum:

05 08 2024

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

Společnost GEOSAN – BAK – Urgent Náchod

Uchazeč:

Společnost GEOSAN – BAK – Urgent Náchod

Zpracovatel

Náchod

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							282 656,49	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				199 032,80	
D	6		Úpravy povrchu podlahy a osazování výplní				175 465,56	
62	K	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř C 20/25	m3	6,288	7 957,66	50 040,63 SOD	
	VV		přístavba pavilonu B Betonová mazanina 15 36*4 15=63 744 m2 * 0 065- rozpočet SODm3		4 143			
	VV		přístavba pavilonu B Betonová mazanina: 1 5*2 2*0 65		2 145			
66	K	631319222	Příplatek k mazaninám za přidání polymerových makrovláken pro objemové vyztužení 3 kg/m3	m3	6 288	410,17	2 579,30 SOD	
N	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	106,253	57,62	6 122,30 CS URS 2024_02*0 99_	
N	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích zacíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	60,250	49,40	2 976,35 CS URS 2024_02*0 99_	
	VV		1 8*2+2 2*(1 8*2+3 2)*2+(1 8*2+4 2)*3+1 8*2+2 2+1 8*2+5 25 +1 8+1		60,250			
N	M	28342205	profil zacíšťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostení ETICS	m	63,263	42,77	2 705,74 CS URS 2024_02*0 99_	
57	K	622221021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 80 do 120 mm	m2	39 540	1 198,86	47 402,92 SOD	
	VV		Pavilon A 2 NP 15*3 1-(odpočet oken a dveří)		32 276			
	VV		špalety 0 4/(2 24+1 8*2+2 2*2 8*2)		7 264			
59	M	63151563	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélně vlákno λ=0 038 tl 100mm	m2	41,517	279,89	11 620,19 SOD	
	VV		*1 05 Přepočtené koeficientem množství					
N	K	622531022	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 2 0 mm vnějších stěn	m2	99 799	466,29	46 535,28 CS URS 2024_02*0 99	
	VV		Fasáda pav A _ 9 12*4 1+(10 32*4 1)/2+5 7*4 1-6 75*3 1-2 2*1 8-sokl 2 554		54 479			
	VV		špalety 2*3 1*0 4+1 9*2*0 1+6 75*0 4+2 2*0 1		5 780			
	VV		Fasáda pavilon A 2 NP vstup 15*3 1-špalety		39 540			
	VV		Součet		99 799			
N	K	622511112	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková střednězrná stěn	m2	6 454	688,05	4 440,67 ZL 15	
	VV		Sokl pav A _ (1 42+0 95+1 1+9 3)*0 2		2 554			
	VV		Fasáda pav C (6 5+6 5)*0 3		3 900			
	VV		Součet		6 454			
N	K	629991011	Zakrytí výplní otvoru a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	24 885	41,88	1 042,18 CS URS 2024_02*0 99	
	VV		výplně otvorů		24 885			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 825,60	
N	K	941221111	Montáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	54 479	71,58	3 899,61 CS URS 2024_02*0 99_	
N	K	941221211	Příplatek k lešení řadovému rámovému těžkému š 1 2 m v do 25 m za gruní a ZKD den použití	m2	1 089 580	2,14	2 331,70 CS URS 2024_02*0 99_	
N	K	941221811	Demontáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	54 479	47,62	2 594,29 CS URS 2024_02*0 99_	
D	998		Přesun hmot				14 741,64	
82	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	17 141	860,00	14 741,64 SOD	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				83 623,69	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				83 623,69	
N	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena lakem asfaltovým	m2	58 368	15,15	884,28 CS URS 2024_02*0 99	
21	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0 088	79 576,65	6 967,09 SOD	
83	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	58 368	126,23	7 367,79 SOD	
	VV		přístavby pavilonu B Vodorovná hydroizolace 15 360*3 8=58 368 m2		58 368			

M

PC	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	Součet		58 368			
84	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrným minerálním posypem tl 3 5mm	m2	68 028	184 40	12 544,36	SOD
		VV	plocha** 1655 Přepočtená koeficientem množství					
N	K	71111200	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svisle za studena náterem penetračním	m2	93 732	27 23	2 551 85	CS URS 2024_02°C 99
21	M	11163150	lak penetrační asfaltový	l	0 141	79 576 65	11 188 32	SOD
N	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svisle NAIP	m2	93 732	148 50	13 919 20	CS URS 2024_02°C 99
		VV	přístavby pavilonu B Svislá hydroizolace (15 36+3 65+3 65)*0 3=11 406 m2		6 798			
		VV	přístavba objektu A Svislá hydroizolace 2 85*1 2+2 79*0 9+(1 6/2)*2 79+0 5*4 35+4 1*4 35+10 32*(14 35+0 5/2)+(0 95+1 42)*0 5+6 75*0 2 =55 73 m2		55 734			
		VV	přístavba objektu C Svislá hydroizolace (6 5+6 5)*2 4		31 200			
		VV	Součet		93 732			
84	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrným minerálním posypem tl 3 5mm	m2	109 245	184,40	20 144,71	SOD
		VV	plocha** 1655 Přepočtená koeficientem množství					
N	K	711161212	Provedení izolace proti zemní vlhkosti napovou fólií svislá, opak v 8 0 mm tl do 0 6 mm	m2	55 734	129 69	7 228 14	CS URS 2024_02°C 99
		VV	přístavba objektu A Svislá plocha 2 85*1 2+2 79*0 9+(1 6/2)*2 79+0 5*4 35+4 1*4 35+10 32*(14 35+0 5/2)+(0 95+1 42)*0 5+6 75*0 2 =55 73 m2		55 734			
89	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	1 000	827 96	827 96	SOD

ZMĚNOVÝ LIST

045

Doplnění vnitřního bezprašného nátěru do přístavby pav A

Stavba:	Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod		
Objekt:	SO-01 - Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B		
Předkládá:	Společnost GEOSAN - BAK - Urgent Náchod	Datum:	19.08.2024

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem	☒	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy	0 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

V projektové dokumentaci uveden uzavíratelný nátěr, v soupisu neobsažen

1.2 Popis nového řešení:

Provedení bezprašného uzavíratelného nátěru čm 1.77 Krytý příjezd přístavba pavilonu A

2 Zdůvodnění změny:

Doplnění opomenutých položek týkající se povrchové úpravy v přístavbě pavilonu A. Bezprašný nátěr zakonzervuje a uzavře betonové konstrukce a bude chránit povrch před vodou a nečistotami.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	☐ ANO	☒ NE
---	------------------------------	--

4 Dopad do smluvních termínů:	☐ ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	☒ NE
-------------------------------	---	--

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	6
---	-------	---

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	27 244,04	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		27 244,04	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Lukáš Laštovíčka, DiS.	Jan Čejchan	Ing. René Hubka	Miroslav Bůžek	František Mrázek, DiS.

GEOSAN GROUP a.s.	CE-ING s.r.o.	Proxion s.r.o.	ON Náchod a.s.	Královéhradecký kraj
-------------------	---------------	----------------	----------------	----------------------

SOUPIS PRACÍ - OZ 45-Doplnění vnitřního bezprašného nátěru do přístavby pav A

Stavba ON Náchod Urgentní příjem
Objekt: SO-01 - Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B
Soupis: 02 - Nový stav

Místo: Náchod Datum: 19.08.2023
Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant:
Uchazeč: Společnost GEOSAN – BAK – Urgent Náchod Zpracovatel: Společnost GEOSAN – BAK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							27 244,04	
w PSV Práce a dodávky PSV							27 244,04	
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							27 244,04	
N	K	783805120	Provedení funkčního nátěru antigrffiti: protikarbonátového, fotokatalytického hydrofobizačního aj. nátěru omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	166,902	91,58	15 284,04	URS 2024_02*0,99
vv					166,902			
N	M	24551514R	ZERO Hydrogrund SLF. Acid-Hydrosol, silikon, 10 l, transparentní	ks	4 000	2 990,00	11 960,00	vlastní

[Handwritten signature]


ZMĚNOVÝ LIST					046		
Předláždění chodníku u OS5, u vstupu 2.NP a u záporové stěny							
Stavba:		Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod					
Objekt:		SO-03 - Komunikace a zpevněné plochy					
Předkládá:		Společnost GEOSAN - BAK - Urgent Náchod			Datum: 19.08.2024		
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů					
poštou		1) Položkový rozpočet změny			2 listů		
e-mailem		2) Projektové podklady			0 listů, výkresů		
osobně		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy			1 listů		
1 Technický popis změny:							
1.1 Popis původního řešení: Detailně neřešeno							
1.2 Popis nového řešení: 1) Rozebrání dlažby stávajícího chodníku podél plánované OS5. Po geodetickém vytyčení začíná hrana OS5 zároveň s krajem chodníku. Pro hloubení nových základových pasů do hloubky cca 1,5m pod úroveň chodníku je potřeba chodník rozebrat. 2) Z důvodu provádění záporové stěny u přístavby pavilonu A bylo nutné demontování zámkové dlažbu pěšího chodníku a její následné pokládky nazpět po zasypání této záporové stěny. 3) U vstupu do 2.NP pavilonu A, kde byla provedena nová vyzdívka obvodového zdiva, bylo nutné rozebrat zámkovou dlažbu pěšího chodníku, provést výkop rýhy podél nového zdiva, provést napojení svislé hydroizolace na nové zdivo, nalepit extrudovaný polystyren zateplení, osadit novou folii, provést zpětný zásyp rýhy a zpětnou pokládku zámkové dlažby.							
2 Zdůvodnění změny:							
PD neuvažovala s výše popsány pracemi. Tyto práce jsou nezbytné pro řádné provedení díla							
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO			☒ NE		
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)			☒ NE		
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek					odst. 6		
6 Náklady:		Cena méněprací (odpočet):		-	0,00	bez DPH	
		Cena víceprací (přípočet):		+	90 389,58	bez DPH	
		Výsledná ceny změny:		90 389,58		bez DPH	
7 Schválil:							
za zhotovitele:		za TDS:		za AD:		za uživatele:	
Lukáš Laštovička, DiS.		Jan Čejchan		Ing. René Hubka		Miroslav Bůžek	
						František Mrázek, DiS.	
Upraveno 19.8.2024 17.08.2024		GEOSAN GROUP a.s.		CEJING s.r.o.		Proxion s.r.o.	
						ON Náchod a.s.	
						Královéhradecký kraj	

SOUPIS PRACÍ - ZL 046 Předláždění chodníku u OS5, u vstupu 2.NP pavilon A a u záporové stěny - vícenáklady

Stavba	ON Náchod Urgentní příjem	Datum:	19 08 2024
Objekt:	SO-03 - Komunikace a zpevněné plochy	Projektant:	
Soupis:	01 - Komunikace a plochy	Zpracovatel	Společnost GEOSAN – BAK – Urgent Náchod
Misto:	Náchod		
Zadavatel:	Královéhradecký kraj		
Uchazeč:	Společnost GEOSAN – BAK – Urgent Náchod		

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem							90 389,58	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				57 757,41	
C	1		Zemní práce				22 355,20	
N	K	113106023	Rozebrání dlažeb při překopecích komunikací pro pěši ze zámkové dlažby ručně	m2	47 620	153,45	7 307,29	CS URS 2024_01
			"os5" 7*1 0		7 000			
			"vstup 2 NP pav. A" 15*0 8+3 5*1		15 500			
			záporová stěna" 15 7*1 6		25 120			
			CELKEM		47 620			
7	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	3 000	156,96	470,88	SOD
1	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	8 750	136,10	1 190,88	SOD
			"vedle OS5" 7*1*1 25		8 750			
N	K	132212132	Hloubení nezapažených rýh šířka do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	5 400	1 623,60	8 767,44	CS URS 2024_02 * 0 99
			"vstup 2 NP pav. A" 15*0 6*0 6		5 400			
3	K	181951112	Uprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuťněním strojně	m2	47 620	27,22	1 296,22	SOD
16	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2 820	208,55	588,11	SOD
17	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	16 920	5,49	92,89	SOD
18	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadů 17 05 04	t	4 512	241,47	1 089,51	SOD
8	K	174151101	Zásyp jam šachet rýh nebo kolem objektu sypaninou se zhuťněním	m3	11 330	136,98	1 551,98	SOD
			"vedle OS5" 7*1*(25-C 06-C 15;		7 280			
			"vstup 2 NP pav. A" 15*0 6*0 6-C 15;		4 050			
D	5		Komunikace pozemní				30 718,24	
9	K	564851111	Podklad ze štěrkodrté SD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	47 620	187,69	8 937,80	SOD
N	K	596211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši ručně tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	47 620	457,38	21 780,44	CS URS 2024_02*0 99
D	9		Ostatní konstrukce a práce bourání				2 074,50	
31	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	3 000	207,45	622,35	SOD
32	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	3 000	484,05	1 452,15	SOD
D	998		Přesun hmot				2 609,47	
42	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	26 417	98,78	2 609,47	SOD
D	PSV		Práce a dodávky PSV				11 508,64	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				5 771,31	
N	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena náterem penetračním	m2	10 500	27,23	285,86	CS URS 2024_02*0 99
21	M	11163150	lak penetrační asfaltový	l	0 003	79 576,65	250,67	SOD
N	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá NAIP	m2	10 500	148,50	1 559,25	CS URS 2024_02*0 99
VV			15*0 7		10 500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
84	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrným minerálním posypem tl 3 5mm	m2	12 238	184 40	2 256 64	SOD
	VV		množství: 165 Přepočtené koeficientem množství					
N	K	711161212	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vopovou fólií svislá, nápek v 8 0 mm tl do 0 6 mm	m2	10 500	129 69	1 361 75	CS URS 2024_02*0 99
89	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	1 000	57 14	57 14	SOD
	D	713	Tepelná izolace				5 737 33	
N	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn lepením celoplošně z desek	m2	10 500	228 69	2 401 25	CS URS 2024_02*0 99
	VV		15*0 7		10 500			
N	M	28376421	deska z polystyrénu XPS 300 tl 80 mm	m2	11 550	281 16	3 247 40	CS URS 2024_02*0 99
N	K	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné	%	1 570	56 49	88 68	CS URS 2024_02
	D	VRN1	Pružkové, geodetické a projektové práce				21 123 53	
5	K	002R	Poplatek zábor veřejného prostranství (chodník, přeložka vodovodu a VO)	m2	11 735	1 800 00	21 123 53	SOD
	VV		prodloužení o 6 týdnů		11 735			

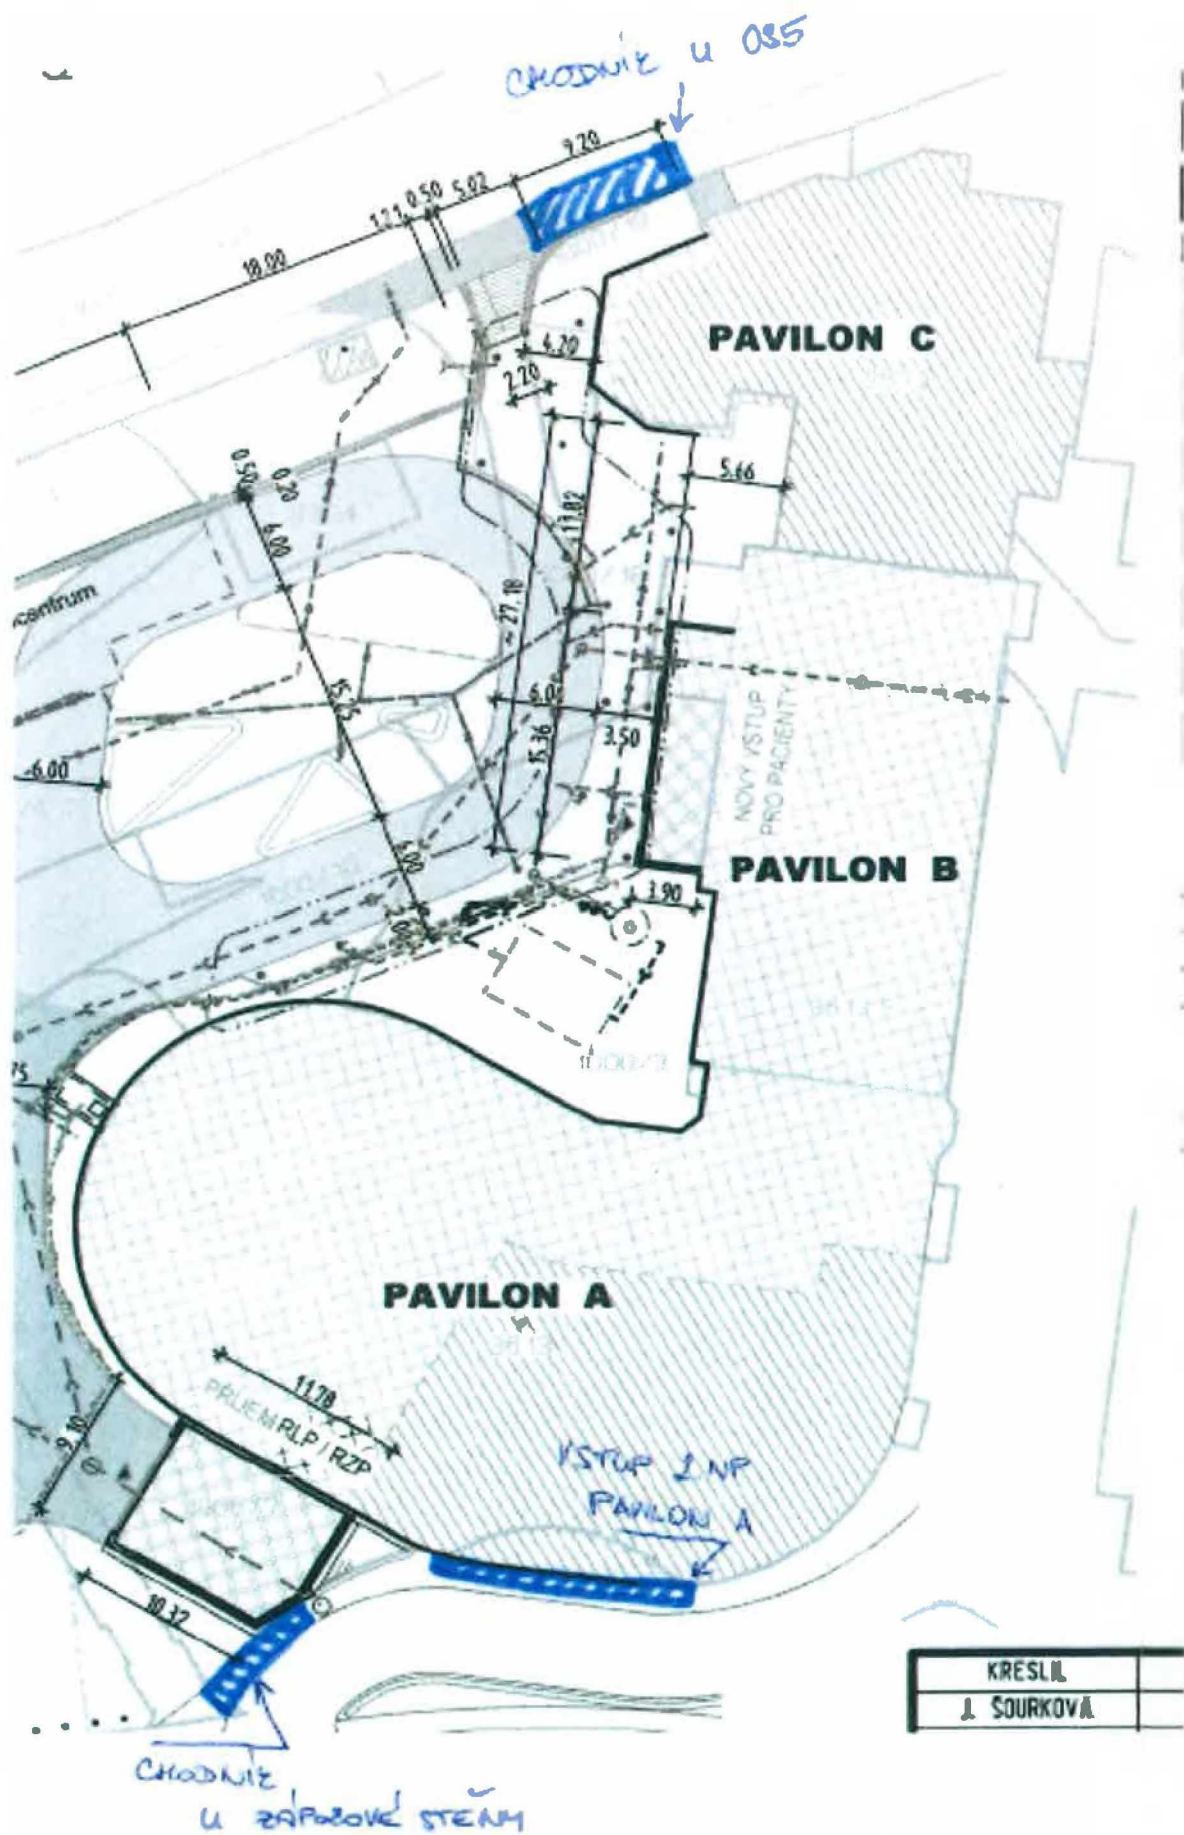

ZMĚNOVÝ LIST

Dopočet obkladů

047

Stavba:	Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod		
Objekt:	SO-01 Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B		
Předkládá:	Společnost GEOSAN - BAK - Urgent Náchod	Datum:	10.08.2024

Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů	
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem	☒	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy	1 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

Množství obkladu dle výkazu výměr

1.2 Popis nového řešení:

Množství obkladu dle PD

2 Zdůvodnění změny:

Na základě zjištěné skutečnosti dopočítána skutečná výměra plochy keramického obkladu. Dochází k narovnání výkazu s projektovou dokumentací

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	☐	ANO	☒	NE
---	--------------------------	-----	-------------------------------------	----

4 Dopad do smluvních termínů:	☐	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	☒	NE
-------------------------------	--------------------------	--	-------------------------------------	----

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	6
---	-------	---

5 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	-2 694,03	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	329 334,62	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		326 640,59	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Lukáš Laštovička, DiS.	Jan Čejchan	Ing. René Hubka	Bůžek Miroslav	Franišek Mrázek, DiS.

SOUPIS PRACÍ - ZL 047 Dopčet obkladů

Stavba:

ON Náchod Urgentní příjem

Objekt:

SO-01 - Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B

Soupis:

02 - Nový stav

Místo:

Náchod

Datum:

10 8 2023

Zadavatel

Královéhradecký kraj

Projektant:

Společnost GEOSAN – BAK – Urgent Náchod

Uchazeč:

Společnost GEOSAN – BAK – Urgent Náchod

Zpracovatel

Náchod

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

326 640,59

D PSV

Práce a dodávky PSV

326 640,59

D 781

Dokončovací práce - obklady

329 334,62

230	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	268,094	10,98	2 943,67	SOD
231	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	268,094	32,93	8 828,34	SOD
234	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	268,094	740,89	198 628,16	SOD
	VV		obklad		345,109			
	VV		skutečnost dle PD		658,381			
	VV		Odpčet sociálek 1 NP pavilon B		-85,178			
	VV		celkem		268,094			
235	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	294,903	379,77	111 995,46	SOD
	VV		268,094*1,1 Přepočtené koeficientem množství		294,903			
236	K	781477112	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za omezený prostor	m2	67,024	54,88	3 678,25	SOD
	VV		obklad*0,25		67,024			
241	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	1,000	3 260,74	3 260,74	SOD
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				-2 694,03	
244	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	-37,758	10,98	-414,58	SOD
	VV		Předpoklad		2 705,071			
	VV		skutečnost dle ZL omítky oprava stěn		1 688,000			
	VV		skutečnost dle ZL omítky nové stěny		1 677,654			
	VV		odpočet obklady		658,381			
	VV		celkem		-37,758			
246	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	-37,758	60,37	-2 279,45	SOD

1.NP B	m2
mč 1.03	85,178
mč 1.05	
mč 1.06	
mč 1.11	6
mč 1.13	1,86
mč 1.16	32,698
mč 1.17	32,698
mč 1.18	17,547
mč 1.19	16,366
mč 1.21	4
mč 1.22	4
mč 1.23	4
1.NP A	
mč 1.55	0
mč 1.56	16,101
mč 1.57	0
mč 1.59	15,181
mč 1.62	15,066
mč 1.63	7,5
mč 1.64	7
mč 1.65	6
mč 1.66	7
mč 1.67	49,408
mč 1.68	42,033
mč 1.70	18,5
mč 1.71	24,602
mč 1.73	29,727
mč 1.74	6
mč 1.78	6
mč 1.79	17,852
mč 1.80	34,558
mč 1.82a	4
mč 1.85	47
mč 1.86	33,946
mč 1.88	70,56
mč 1.89	vč
2.NP A	
mč 2.52	2
mč 2.55	4
mč 2.56	2
mč 2.59	5
mč 2.60	5
mč 2.61	6
mč 2.62	6
mč 2.63	6
CELKEM	698,381

ZMĚNOVÝ LIST

048

Odpočet sociálního zařízení v pavilonu B

Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod

Objekt:

SO-01 Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B

Předkládá:

Společnost GEOSAN - BAK - Urgent Náchod

Datum:

02.08.2024

Odesláno / předáno:

poštou

e-mailem

osobně

Přílohy / počet listů

1) Položkový rozpočet změny

6 listů

2) Projektové podklady

0 listů, výkresů

3) Fotodokumentace a ostatní přílohy

0 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

Sociální zázemí v 1 NP pavilonu B

1.2 Popis nového řešení:

Na základě projekční změny revize 1 se neprovede sociálního zařízení v 1, NP budovy B - stavebí část, elektro, ZTI, VZT

2 Zdůvodnění změny:

Předmětem změnového listu je vypuštění sociálního zařízení na základě požadavku objednatele. Předmětné zázemí se nachází v místě budoucí propojovací chodby do novostavby pavilonu D (2 etapa ON Náchod), při novostavbě pavilonu D by došlo k jeho odstranění, tím by se jednalo o zmařené náklady. *✓ sociální zařízení je pro provoz urgentu vyhodnoceno jako zbytečné, v rámci stavby pavilonu D bude sociální zařízení na jiném místě.*

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:

ANO

NE

4 Dopad do smluvních termínů:

ANO

(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)

NE

5 Náklady:

Cena méněprací (odpočet):

-

-540 550,08

bez DPH

Cena víceprací (přípočet):

+

3 308,03

bez DPH

Výsledná ceny změny:

-537 242,05

bez DPH

6 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek

odst.

4

7 Schválil:

za zhotovitele:

za TDS:

za AD:

za uživatele:

za objednatele:

Lukáš Laštojička, DiS.

Jan Čejchan

Ing. René Hubka

Miroslav Bůžek

František Mrázek, DiS.

GEOSAN GROUP a.s.

CE-ING s.r.o.

Proxion s.r.o.

ON Náchod a.s.

Královéhradecký kraj

REKAPITULACE OBJEKTŮ SOUPISŮ PRACÍ -ZL 48 Odpočet sociálního zařízení v pavilonu B

Kód: 2023-09-12

Stavba: ON Náchod Urgentní příjem

Místo: Náchod

Datum: 10. 8. 2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Zp. Společnost GEOSAN – BAK – Urgentní Náchod

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-543 858,11	-658 068,32
SO-01	Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B	-543 858,11	-658 068,32
02	Nový stav	-350 439,97	-424 032,36
03	ZTI	-145 357,59	-175 882,69
05	VZT	-28 263,84	-34 223,45
07	Silnoproud rozvody	-19 776,71	-23 929,82

SOUPIS PRACÍ - ZL 48 Odpočet sociálního zařízení v pavilonu B

Stavba

ON Náchod Urgentní příjem

Objekt:

SO-01 - Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B

Soupis:

02 - Nový stav

Místo: Náchod

Datum: 10 08 2024

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant:

Uchazeč: Společnost GEOSAN – BAK – Urgent Náchod

Zpracovatel Společnost GEOSAN – BAK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-350 439,97

D	HSV	Práce a dodávky HSV	-70 759,01
---	-----	---------------------	------------

D	3	Svislé a kompletní konstrukce	-54 849,91
---	---	-------------------------------	------------

20	K	317168012	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm	kus	-2,000	395,12	-790,24 SOD
----	---	-----------	--	-----	--------	--------	-------------

VV "viz 1 NP, 2 NP - pavilon A B" 26

30	K	342244201	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 80 mm	m2	-22,136	825,34	-18 269,52 SOD
----	---	-----------	--	----	---------	--------	----------------

VV odpočet "1 NP - pavilon B" 3,13*(2,575+2,5+0,5+1,25*2)-
(0,7*1,97*5)
Součet

31	K	342244311	Příčka zvukově izolační pevnosti P15 z broušených cihel na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm	m2	-35,191	1 017,04	-35 790,15 SOD
----	---	-----------	---	----	---------	----------	----------------

VV odpočet "1 NP - pavilon B" 3,13*(6,2+2,375+3,675)
(0,8*1,97*2)
Součet

D	6	Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní	-15 909,10
---	---	--	------------

67	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2 5 m2 na MC	kus	-7,000	403,22	-2 822,54 SOD
----	---	-----------	---	-----	--------	--------	---------------

69	M	55331486	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	-5,000	1 872,08	-9 360,40 SOD
----	---	----------	---	-----	--------	----------	---------------

VV "viz výpis výrobků" 22

70	M	55331487	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	-2,000	1 863,08	-3 726,16 SOD
----	---	----------	---	-----	--------	----------	---------------

VV "viz výpis výrobků" 26

D	PSV	Práce a dodávky PSV	-80 886,41
---	-----	---------------------	------------

D	766	Konstrukce truhlářské	-84 194,44
---	-----	-----------------------	------------

149	K	766660051	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m masivní dřevo s polodrážkou do ocelové zárubně	kus	-7,000	720,69	-5 044,83 SOD
-----	---	-----------	---	-----	--------	--------	---------------

151	M	611005R	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plně 700x1970-2100mm vč kování	kus	-5,000	9 430,94	-47 154,70 SOD
-----	---	---------	--	-----	--------	----------	----------------

152	M	611006R	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plně 800x1970-2100mm vč kování	kus	-2,000	14 771,32	-29 542,64 SOD
-----	---	---------	--	-----	--------	-----------	----------------

164	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	3,000	-817,42	-2 452,27 SOD
-----	---	-----------	---	---	-------	---------	---------------

D	776	Podlahy povlakové	3 308,03
---	-----	-------------------	----------

204	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	2,729	45,44	124,02 SOD
-----	---	-----------	---	----	-------	-------	------------

205	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	2,729	30,29	82,67 SOD
-----	---	-----------	------------------------------------	----	-------	-------	-----------

206	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	2,729	40,39	110,24 SOD
-----	---	-----------	--	----	-------	-------	------------

207	K	776141112	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	2,729	187,77	512,49 SOD
-----	---	-----------	--	----	-------	--------	------------

208	K	776141114	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2	2,729	187,77	512,49 SOD
-----	---	-----------	---	----	-------	--------	------------

211	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	2,729	233,53	637,39 SOD
-----	---	-----------	--	----	-------	--------	------------

214	M	28411151	PVC vinyl heterogenní zátěžová tl 2 00mm nášlapná vrstva 0 70mm hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43 útlum 4dB, bodová zátěž ≤ 0 10mm, protiskluznost R10	m2	3,002	442,57	1 328,73 SOD
-----	---	----------	---	----	-------	--------	--------------

Obklady a omítky řešeny v rámci skutečnosti v ZL 22 a 47

D	767	Konstrukce zámečnické	-198 794,55
---	-----	-----------------------	-------------

191	K	767640222	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlových s nadsvětlíkem	kus	-1,000	4 390,44	-4 390,44 SOD
-----	---	-----------	--	-----	--------	----------	---------------

VV "viz výpis zámečnických výrobků - 11/Z

192	M	11/Z	dveře dvoukřídlé AL prosklené 2600x2930 mm	kus	-1 000	194 404,11	-194 404,11 SOD
-----	---	------	--	-----	--------	------------	-----------------

VV "11/Z" 1

VV "viz výpis zámečnických výrobků - 11/Z

ZL 48 Odpočet sociálního zařízení v pavilonu B

Poř.	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO_01: Zdravotní instalace					- 145 358
1	Izolace potrubí TUBEX 22/10	m	- 10,0	50,38	504
2	Izolace potrubí TUBEX 22/20	m	- 4,0	68,90	276
3	Izolace potrubí TUBEX 28/10	m	- 9,0	50,38	453
4	Izolace potrubí TUBEX 28/20	m	- 5,0	77,05	385
721: Vnitřní kanalizace					- 13 724
11	Potrubí hrdlové z trub z plastických hmot - materiál PVC, KG Systém, rozměry 100×3,0 mm, ležaté	m	- 5,0	369,70	1 849
12	Potrubí hrdlové z trub z plastických hmot - materiál PVC, KG Systém, rozměry 125×3,0 mm, ležaté	m	- 6,0	408,97	2 454
14	Potrubí hrdlové z trub z plastických hmot - materiál PP, HT Systém, přípojovací, DN 40	m	- 2,0	259,31	519
15	Potrubí hrdlové z trub z plastických hmot - materiál PP, HT Systém, přípojovací, DN 50	m	- 1,0	284,50	285
17	Potrubí hrdlové z trub z plastických hmot - materiál PP HT Systém, odpadní, DN 100	m	- 12,0	448,24	5 379
20	Čistící kus na kanalizační potrubí - HT kruhový uzávěr, DN 110	kus	- 3,0	146,70	440
31	HL 900N	kus	- 1,0	1 180,23	1 180
32	Zřízení přípojek na potrubí, vyvedení a upevnění odpadních výpustek - Dxt 40×1,8 mm	kus	- 4,0	81,50	326
33	Zřízení přípojek na potrubí, vyvedení a upevnění odpadních výpustek - Dxt 50×1,8 mm	kus	- 2,0	92,61	185
34	Zřízení přípojek na potrubí, vyvedení a upevnění odpadních výpustek - Dxt 110×2,3 mm	kus	- 5,0	140,77	704
35	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech - podle ČSN 73 6760 - vodou, do DN 125	m	- 26,0	15,56	405
722: Vnitřní vodovod					- 9 929
6	Potrubí z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) - D 20×3,4	m	- 14,0	205,97	2 884
7	Potrubí z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) - D 25×4,2	m	- 14,0	251,90	3 527
23	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí - potrubí závitové do DN 50	m	- 28,0	17,78	498
24	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí - do DN 80	m	- 28,0	11,85	332
25	Vyvedení a upevnění výpustek - do DN 25	kus	- 15,0	179,29	2 689
725: Zařizovací předměty					- 120 086
4	Montáž ventilu - rohový bez přípojovací trubičky, G 1/2 "	soubo	- 8,0	109,65	877
5	Ventil rohový	kus	- 8,0	105,95	848
12	U4 - umývadlo keramické š. 550 mm s otvorem pro baterii - stojánková páková baterie chrom, s keramickou kartuší bez výpusti, 2x rohový ventil 1/2 x 3/8" / chromovaný umývadlový sifon DN 40, uzávěr výpusti pro umývadlo s přepadem, chrom - nerezový nástěnný dávkovač tekutého mýdla	kus	- 4,0	6 186,40	24 746
17	Pi - pisoár keramický s automatickým splachovačem - kompakt - přívod vody vnitřní 1/2", odpad vnitřní D 50, sifon DN 50 pisoárový / zdroj pro 1 pisoár	kus	- 2,0	10 768,78	21 538
22	Kz - klozet závěsný keramický standard, klozetové sedátko duroplast - montážní modul standard pro závěsné wc s ovládáním zpředu, pro zazdění nádržka 6/9 l / ovládací deska bílá, rohový ventil, nerezový odpadkový koš kulatý 3 l - nerezový zásobník na toaletní papír D 290x100, závěs wc štětka	kus	- 5,0	14 225,01	71 125
28	Přesun hmot pro zařizovací předměty - výška do 6 m	%	0,80	-1 191,33	- 953

C21M - Elektromontáže

poř.č.	číslo pol	popis položky	jedn.cena	množství jedn	celkem [Kč]
5	210010301	krab přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení	71,37	-8,00 ks	-570,96
11	210100001	ukonč vod v rozv vč.zap a konc.do 2.5mm2	9,52	-8,00 ks	-76,16
18	210110041	spín.zápust.vč zap 1-pólový - řazení 1	71,37	-7,00 ks	-499,59
27	210200040	svít. LED nástěnné nouzové Palas - N1, N2, N3	391,85	-2,00 ks	-783,70
28	210201032	svít. LED stropní Fox - D, E	373,19	-7,00 ks	-2 612,33
37	210810005	CYKY-CYKYm 3Cx1 5 mm2 750V (VU)	22,20	-109,00 m	-2 419,80
39	210810006	CYKY-CYKYm 3Cx2 5 mm2 750V (VU)	22,20	-18,00 m	-399,60

Materiály

poř.č.	číslo pol	popis položky	jedn.cena	množství jedn	celkem [Kč]
O 8		D - stropní 1 x LED, 37W, 4622 lm, Ra80, OK, IP40	1 317,83	-2,00 ks	-2 635,66
O 9		E - stropní 1 x LED, 24W, 2827 lm, Ra80, OK, IP40	1 002,46	-5,00 ks	-5 012,30
O 12		N1 - nouzové nástěnné 1 x LED, 5,8W, 141 lm, Ra90, 5700K, 3h, IP65	757,57	-2,00 ks	-1 515,14
17	00313	* krabice KU 68/1 *	8,13	-8,00 ks	-65,04
36	33914	* CYKY 3Cx1 5mm2 *	13,50	-109,00 m	-1 471,50
38	33918	* CYKY 3Cx2 5mm2 *	22,26	-18,00 m	-400,68
42	34628	* spínač velkoplošný 230V/10A, řazení 1	187,75	-7,00 ks	-1 314,25

Celkem bez DPH:

-19 776,71

Pzn. Uchazeč v jednotlivých položkách ocení veškerý pomocný a kotvicí materiál

VZDUCHOTECHNIKA						Výr. příkaz číslo	Varianta	L.
URGENTNÍ PŘÍJEM, SO-01 PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU "A" A PAVILONU "B"							Datum	03.08.2023
ZL 48 Odpověď: sociálního zařízení v pavilonu B								
Pozice	Zařízení - činnost	Výrobce	Jed. jednotky	Množství	Jednotková cena D	Jednotková cena M	Celková cena	
Zařízení č.1: Část sociálního zázemí								
1	Potrubní ventilátor pr 160 výkon 360-440 m3/hod , Pext - 150Pa, opatřeny hlukovou izolací, nastavitelný dočáhový spínač chodu		ks	-1	6 917,89	2 161,84	-9 079,73	
2	Průžna manžeta (objímka) pr 160		ks	-1	215,38	67,31	282,69	
3	Zpětná klapka těsná pr 160		ks	-1	289,48	90,46	-379,94	
7	Tarifový ventil bílý kovový pr 125 s regulací, instalace do spiro rozvodu nátrubek přes pohled		ks	-8	95,89	29,96	-1 006,80	
10	Žaluzie se sítím 200x200 barva RAL dle fasady, napojovací nátrubek		ks	-1	655,23	204,76	-859,99	
11	Spiro potrubí včetně tvarovek pr 160 (včetně průchodek)		bm	-15	444,03	79,29	-7 849,80	
12	Spiro potrubí včetně tvarovek pr 125 (včetně průchodek)		bm	-5	388,71	69,41	-2 290,60	
15	Teplná (hluková) izolace vnitřní s parozábranou kaučuková samolepicí tl.20 mm (obalení ventilátorů a odvodní část VZT sloupáčky)		m2	-5	639,25	85,61	-3 624,30	
16	Drobná kabeláž pro dopojení dočáhových čidel (rezerva) soubor		ks	-1	219,52	450,02	-669,54	
17	Hrnaté pozink tvarovky, přechody a doměrky		m2	-1	516,32	92,20	-304,26	
18	Oplechování, hydroizolace a utěsnění stavebního prostupu fasádou, chlazení		sada	-1	1 475,19	461,00	-1 936,19	
Celkem část VZT (bez DPH)			Kč				-28 283,84	



ZMĚNOVÝ LIST

049

Navýšení vedlejších rozpočtových nákladů

Stavba:	Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod		
Objekt:	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		
Předkládá:	Společnost GEOSAN - BAK - Urgent Náchod	Datum:	04.09.2024

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem	☒	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy	0 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

Vedlejší rozpočtové náklady dle lhůt dle SOD

1.2 Popis nového řešení:

Navýšení VRN vzhledem k prodloužení termínu realizace díla dle dodatku č. 2 a 3

2 Zdůvodnění změny:

Předmětem změnového listu jsou vícenáklady související s prodloužením smluvních lhůt, které zohledňují vícenáklady za provoz zařízení staveniště o 6 týdnů, které byly způsobeny realizací záporové stěny (ZL 10) a dále v souvislosti s provedením opravy fasády (ZL 015A). Prodloužení lhůty k dokončení stavby je způsobeno něvě zjištěnými skutečnostmi, které zadavatel jednající s náležitostí nemohl předpokládat. Tyto vícenáklady a prodloužení stavby vznikly v důsledku zjištěných okolností v průběhu stavby, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:

ANO

NE

4 Dopad do smluvních termínů:

ANO

(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)

NE

5 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	–	0,00	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	349 296,52	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		349 296,52	bez DPH

6 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek

odst.

6

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:		za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Lukáš Laštovička, Dis.	Jan Čejchan		Ing. René Hubka	Miroslav Bůžek	František Mrázek, Dis.

SOUPIS PRACÍ - ZL 49 Navýšení vedlejších rozpočtových nákladů

Stavba:

ON Náchod Urgentní příjem

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Náchod

Datum:

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel: Společnost GEOSAN – BAK – Urgent Náchod

Zpracovatel:

Společnost
GEOSAN – BAK –
Urgent Náchod

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

349 296,52

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

349 296,52

D VRN2 Příprava staveniště

3 882,35

10 K 004R Dopravní značky pro přechodné dopravní značení včetně pronájmu

soubor

0,176

22 000,00

3 882,35

prodloužení o 6 týdnů

0,176

D VRN3 Zařízení staveniště

345 414,17

11 K 030001000

Zařízení staveniště

soubor

0,176

1 897 907,00

334 924,76

VV (Montáž a demontáž stavební buňky stavba a objednatel přípojky elektro+vody chemické wc apod)

0,176

prodloužení o 6 týdnů

0,176

12 K 034103000

Oplocení staveniště vč. 2 vjezdových 2kř bran

soubor

0,176

59 440,00

10 489,41

prodloužení o 6 týdnů

0,176

ZMĚNOVÝ LIST					050	
Doplnění šoupat a výměna hydrantu						
Stavba:		Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod				
Objekt:		IO-01 Přeložky vodovodů				
Předkládá:		Společnost GEOSAN - BAK - Urgent Náchod			Datum: 25.08.2024	
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů				
poštou	☐	1) Položkový rozpočet změny			1	listů
e-mailem	☒	2) Projektové podklady			0	listů, výkresů
osobně	☐	3) Fotodokumentace a ostatní přílohy			1	listů
1 Technický popis změny:						
1.1 Popis původního řešení:						
V projektové dokumentaci přeosazení stávajícího hydrantu, napojení stávajícího řadu bez šoupat						
1.2 Popis nového řešení:						
Doplnění 3 ks šoupat a výměna 1 ks hydrantu na areálovém vodovodu						
2 Zdůvodnění změny:						
Předmětem změnového listu je výměna nefunkčního a dožitého hydrantu a doplnění 3 ks šoupat, které umožní uzavření přípojek do budovy B a C						
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		☐	ANO		☒	NE
4 Dopad do smluvních termínů:		☐	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		☒	NE
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek						odst. 4
6 Náklady:		Cena méněprací (odpočet):		-	-7 653,84 bez DPH	
		Cena víceprací (přípočet):		+	44 365,90 bez DPH	
		Výsledná ceny změny:			36 712,06 bez DPH	
7 Schválil:						
za zhotovitele:		za TDS:		za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Lukáš Laštovička, DiS.		Jan Čejchan		Ing. René Hubka	Miroslav Bůžek	František Mrázek, DiS.
GEOSAN GROUP a.s.		CE-ING s.r.o.		Proxion s.r.o.	ON Náchod a.s.	Královéhradecký kraj

SOUPIS PRACÍ

Vícepráce vodovod řad B šoupata navíc+ výměna hydrantu

k ú Náchod

25. 8. 2023

Královéhradecký kraj


Lucie Brandová, DiS

Společnost GEOSAN – BAK – Urgent Náchod

Společnost
GEOSAN – BAK –
Urgent Náchod

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							36 712,06	
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	8		Trubní vedení					
33	M	AVK 12*380125	AVK hydrant podzemní 12*3, jednoduše ušitý DN 80, 1250 mm	kus	1,000	11 011,92	11 011,92	SOD
34	M	4227359	Hydrantová drenáž	ks	1,000	328,95	328,95	SOD
42	K	857264122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	3,000	1 201,22	3 603,66	SOD
43	M	AVK 31100	AVK šoupátko 3 1 DN 100 stavební délka F4 PN 10/16	kus	3,000	7 032,99	21 098,97	SOD
45	K	881247112	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,000	932,53	932,53	SOD
46	M	AVK 7217	AVK podkladová deska hydrantová 7 2 17	kus	1,000	366,99	366,99	SOD
47	M	AVK 7220	AVK podkladová deska ventilková šoupatová 7 2 20	kus	3,000	186,70	560,10	SOD
51	K	898121101R	Osazení podkladové desky	kus	4,000	32,60	130,40	SOD
52	M	AVK 7561050	AVK zemní teleskopická souprava 7 5 opt. šoupé DN 100-150 rozsah 0,85-1,45 m	kus	3,000	1 792,94	5 378,82	SOD
54	K	898121102	Osazení poklopů plastových šoupátkových	kus	3,000	293,19	879,57	SOD
57	K	89820001R	Výšková úprava slávajícího poklopu zemního uzavíracího šoupěte vč. případného nastavení ovládací tyče	kus	4,000	1 913,46	7 653,84	SOD
D	998		Přesun hmot					
61	K	998273102	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,153	482,07	73,99	SOD

Ukončení arediového vodovodu je navrženo podzemním hydrantom pro účely odkalení a odvzdušnění. Konkrétní ukončení bude upřesněno po obnovení potrubí a zjištění skutečného způsobu (armatur) ukončení rušeného vodovodu.

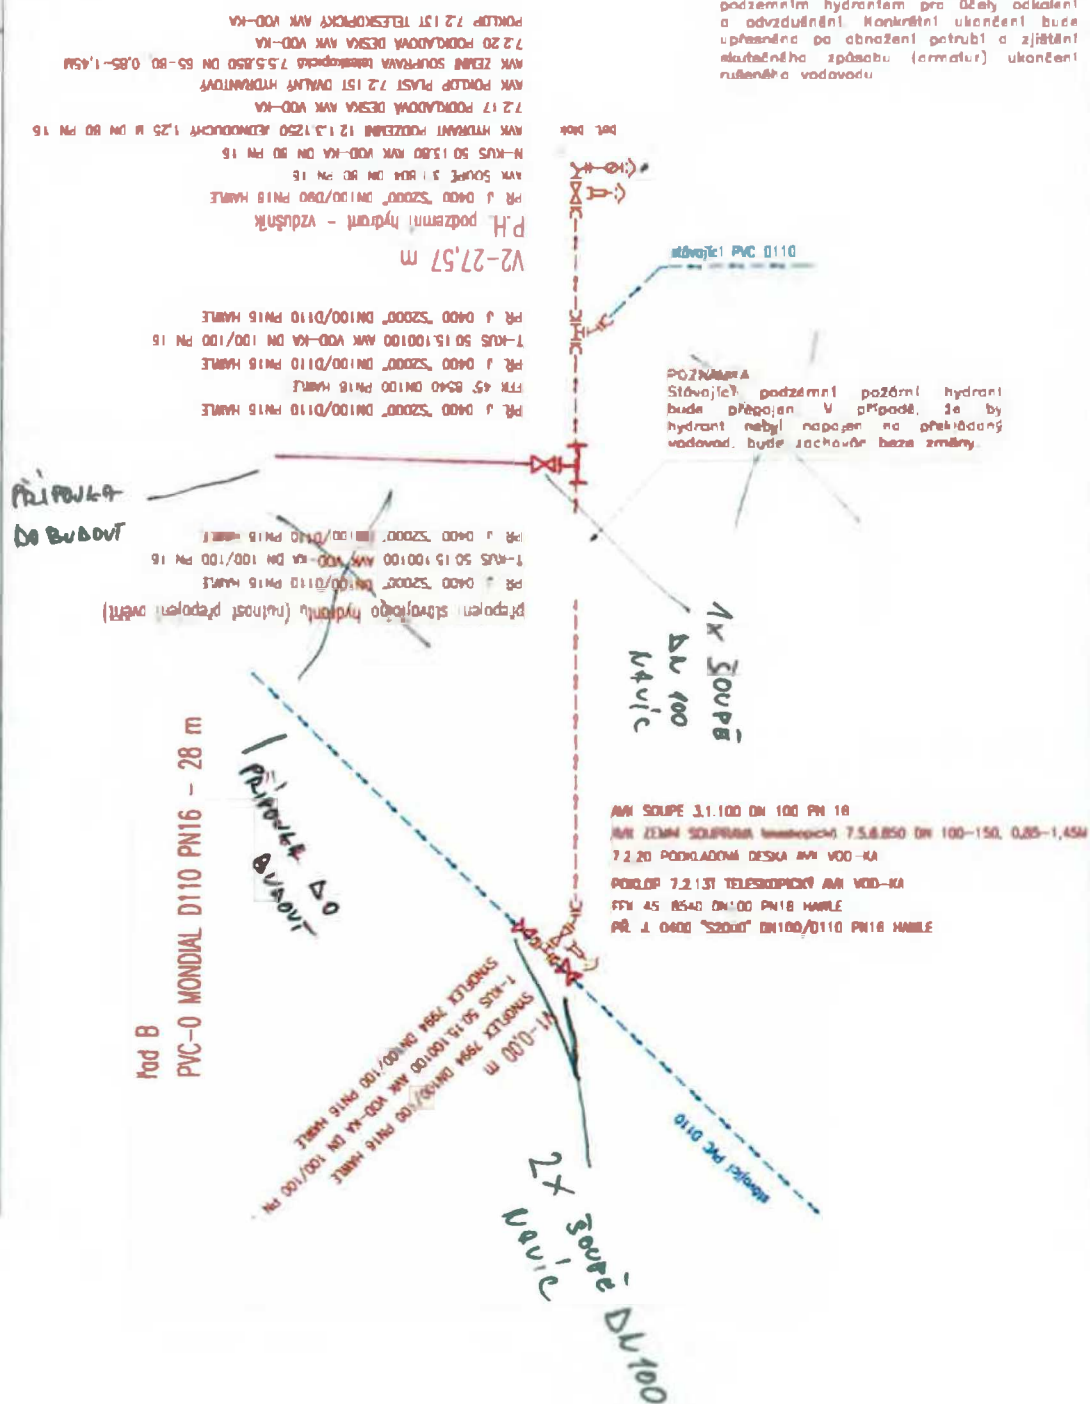

Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod

<i>SOD</i>	<i>86 400 728,41</i>	<i>Bez DPH</i>
<i>D.č.1</i>	<i>0,000</i>	<i>Bez DPH</i>
<i>D.č.2</i>	<i>2 058 394,70</i>	<i>Bez DPH</i>
<i>D.č.3</i>	<i>1 257 122,11</i>	<i>Bez DPH</i>
<i>D.č.4</i>	<i>2 419 591,42</i>	<i>Bez DPH</i>
<i>Celkem</i>	<i>92 135 836,64</i>	<i>Bez DPH</i>

<i>Číslo ZL</i>	<i>Název změnového listu</i>	<i>Cena víceprací bez DPH</i>	<i>Cena méněprací bez DPH</i>	<i>Celkem ZL Kč bez DPH</i>
	Celkem změnové listy bez DPH pro dodatek č. 4			2 419 591,42
019	Odstranění plotové zídky v místě schodiště SCH1	92 745,40	0,00	92 745,40
020	Zemní práce pro komunikaci s ozn. úsek 1	172 163,89	0,00	172 163,89
021	Provizorní přepojení vodovodu	27 224,55	0,00	27 224,55
022	Záměna technologie provádění omítek	2 117 554,96	-1 932 018,37	185 536,59
023	Doplnění EPS a kabeláž odvětrání CHUC Pavilon A a B	136 404,93	0,00	136 404,93
024	Změna zdravotnické technologie dle požadavku uživatele	279 390,95	-240 584,53	38 806,42
025	Změna rozsahu provedení přeložky splaškové kanalizace - Stoka B	212 239,64	-64 854,45	147 385,19
026	Demontáž, přesun a montáž stávající jednotky chlazení	22 869,25	0,00	22 869,25
027	Antistatika přístavba pavilonu A	7 309,79	0,00	7 309,79
028	SDK podhledy dle kladečského plánu	529 124,39	-351 963,33	177 161,06
029	Přívod vody k prodejním automatům	8 844,94	0,00	8 844,94
030	Doplnění zásuvkového podparapetního žlabu	6 137,04	0,00	6 137,04
031	Opravy stávajících rozvodu chlazení	107 939,25	0,00	107 939,25
032	Změna v umístění datových zásuvek	24 370,20	-12 060,00	12 310,20
033	Doplnění zásuvek pro prodejní automaty a vyvol. systém	12 301,08	0,00	12 301,08
034	Doplnění elektroinstalačních prací	39 427,58	0,00	39 427,58
035	Odvodnění střechy a drenáž základů garáže	35 741,60	0,00	35 741,60
036	Prodloužení přeložky plynovodu	19 371,69	-26 261,35	-6 889,66
037	Výměna podružných rozvaděčů	212 273,00	-59 366,52	152 906,48
038	Doplnění potrubní pošty protihlukovou izolaci	40 592,00	0,00	40 592,00
039	Prodloužení potrubní pošty do 2NP pavilonu B	147 406,53	0,00	147 406,53
040	Změna vstupní prosklené přístavby pavilonu B	177 803,73	0,00	177 803,73
041	Záměna materiálu lišt u keramických obkladů	35 630,76	-5 938,76	29 692,00
042	Změna stoupačka V1	50 419,39	0,00	50 419,39
043	Výměna vnitřního přívodu vody do pavilonu B	21 654,96	0,00	21 654,96
044	Narovnání hydroizolace, mazanin a fasády přístavby A a B	282 656,49	0,00	282 656,49
045	Doplnění vnitřního bezprašného nátěru do přístavby pav A	27 244,04	0,00	27 244,04
046	Předláždění chodníku u OS5, u vstupu 2.NP a u záporové stěny	90 389,58	0,00	90 389,58
047	Dopočet obkladů	329 334,62	-2 694,03	326 640,59
048	Odpočet sociálního zařízení v pavilonu B	3 308,03	-540 550,08	-537 242,05
049	Navýšení vedlejších rozpočtových nákladů	349 296,52	0,00	349 296,52
050	Doplnění šoupat a výměna hydrantu	44 365,90	-7 653,84	36 712,06

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)		86 400 728,41 Kč bez DPH			
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?		NE			
Druh veřejné zakázky		stavební práce			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 0,00 Kč bez DPH		Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 212 631,25 Kč bez DPH		Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 41 615,02 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 386 403,56 Kč bez DPH		Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 383 278,87 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 2 903 710,36 Kč bez DPH		Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 2 765 066,93 Kč bez DPH			
				Dodatek č. 5	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)		+ 3 502 745,17 Kč bez DPH		POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)		– 3 189 960,82 Kč bez DPH			
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)		6 692 705,99 Kč bez DPH		Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a)	(Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)	6 692 706 Kč < 140 448 000 Kč			
b)	(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	7,75 % < 15,00 %			

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	86 400 728,41 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 136 404,93 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 136 404,93 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	86 400 728,41 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 1 899 096,84 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 11 718,37 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 1 332 097,85 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 78 100,43 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 2 623 421,39 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 478 878,33 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 5 854 616,08 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 568 697,13 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Smluvní cena		86 400 728,41 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 136 404,93 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 5 854 616,08 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 568 697,13 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		5 422 323,88 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	6,28 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku	4
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 5 663 536,68 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 3 243 945,26 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	2 419 591,42 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní)	86 400 728,41 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	86 400 728,41 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	88 459 123,11 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	89 716 245,22 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 4	92 135 836,64 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	92 135 836,64 Kč bez DPH

