

## Dodatek č. 5

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### Smluvní strany

|                   |                                                |
|-------------------|------------------------------------------------|
| <b>Objednatel</b> | <b>Královéhradecký kraj</b>                    |
| se sídlem         | Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové |
| IČO               | 70889546                                       |
| DIČ               | CZ70889546                                     |
| zástupce          | Petr Koleta, hejtman                           |

dále jako „objednatel“ a

|                                                                                                            |                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Zhotovitel:</b>                                                                                         | <b>KAMI PROFIT, s.r.o.</b>                             |
| společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C36648/B vedená u Městského soudu Bratislava |                                                        |
| registrační číslo                                                                                          | 35943301                                               |
| DIČ                                                                                                        | 2022023872                                             |
| se sídlem                                                                                                  | Bratislava, Při starom letisku 17, Slovenská republika |
| zástupce                                                                                                   | Ladislav Lipka, prokurista                             |

jednající prostřednictvím odštěpného závodu

#### **KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod,**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou A 21539

|           |                                              |
|-----------|----------------------------------------------|
| se sídlem | Spojů 835/2, Porubá, 708 00 Ostrava          |
| IČO       | 05264758                                     |
| DIČ       | CZ683743702                                  |
| zástupce  | Ing. Daniel Rimel, vedoucí odštěpného závodu |

dále jako „zhotovitel,“ objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

## Článek 1

### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 5. 4. 2024 na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky nazvané „**Novostavba DZR v lokalitě Vrchlabí - stavební práce**“, evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2023-050632, smlouvu o dílo (tato smlouva dále jako „smlouva o dílo“ nebo „SOD“ či „smlouva“).
2. Z důvodů uvedených v ZL č. 28, 29, 30 a 32, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné vícepráce a méněpráce.
3. Změny závazku ze smlouvy dle ZL č. 28 nejsou podstatnými změnami závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona.
4. Změny závazku ze smlouvy dle ZL č. 30 nejsou podstatnými změnami závazku ve smyslu § 222 odst. 5 zákona.
5. Změny závazku ze smlouvy dle ZL č. 29 a 32 nejsou podstatnými změnami závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona.

6. V návaznosti na změny dle ZL č. 32 dochází k přiměřenému prodloužení doby realizace díla, a to o 5 týdnů.

## Článek 2

### Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 4 a 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovými listy č. 28, 29, 30 a 32, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
2. Konkrétní termíny dokončení plnění ve smyslu čl. 6.2 smlouvy jsou stanoveny následovně:

|                                                                                                                                                                                                                                     |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Dokončení stavebních prací:                                                                                                                                                                                                         | 1. 12. 2025 |
| Předání řádně dokončeného díla (stavby) včetně předání kolaudačního souhlasu nebo pravomocného kolaudačního rozhodnutí či jiného opatření příslušného stavebního úřadu, na jehož základě bude možné trvale užívat dokončenou stavbu | 5. 1. 2026  |

3. Článek 7 odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena činí:

|                                                           |                       |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Celková cena díla v Kč bez DPH                            | 192.327.997,00        |
| Celková cena díla dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH           | 195.066.037,99        |
| Celková cena díla dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH           | 195.765.658,80        |
| Celková cena díla dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH           | 197.308.712,13        |
| Celková cena díla dle dodatku č. 4 v Kč bez DPH           | 198.031.973,76        |
| Cena víceprací v Kč bez DPH dle dodatku č. 5 v Kč bez DPH | 984.409,20            |
| Cena méněprací v Kč bez DPH dle dodatku č. 5 v Kč bez DPH | 5.600,00              |
| <b>Celková cena díla dle dodatku č. 5 v Kč bez DPH</b>    | <b>199.010.782,96</b> |

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
5. Uzavírá-li se tento dodatek v listinné podobě, vyhotovuje se v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
6. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
7. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své (v případě uzavření dodatku v elektronické podobě, své elektronické) podpisy.
8. O uzavření dodatku rozhodl hejtmán Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/10/664/2025 ze dne 14. 4. 2025.


## **Přílohy**

Příloha č. 1 - Změnové listy č. 28, 29, 30 a 32

Za objednatele  
V Hradci Králové

Za zhotovitele  
V Bratislavě

.....  
Petr Koleta  
hejtman Královehradeckého kraje



Ladislav Lipka  
prokurista

|                                                                                                                                                                                 |  |                                    |  |                                                          |  |                         |  |                                        |  |                |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|--|-------------------------|--|----------------------------------------|--|----------------|--|
| ZMĚNOVÝ LIST                                                                                                                                                                    |  |                                    |  |                                                          |  |                         |  |                                        |  | ZL28           |  |
| Doplnění bodového nočního osvětlení na chodbách.                                                                                                                                |  |                                    |  |                                                          |  |                         |  |                                        |  |                |  |
| Stavba:                                                                                                                                                                         |  | Novostavba DZR v lokalitě Vrchlabí |  |                                                          |  |                         |  |                                        |  |                |  |
| Objekt:                                                                                                                                                                         |  | D.1.4.7 SILNOPROUD                 |  |                                                          |  |                         |  |                                        |  |                |  |
| Předkládá:                                                                                                                                                                      |  | KAMI PROFIT s.r.o                  |  |                                                          |  |                         |  | Datum:                                 |  | 27.8.2025      |  |
| Odesláno / předáno:                                                                                                                                                             |  | Přílohy / počet listů              |  |                                                          |  |                         |  |                                        |  |                |  |
| poštou                                                                                                                                                                          |  | 1) Položkový rozpočet změny        |  |                                                          |  |                         |  | 1                                      |  | listů          |  |
| e-mailem                                                                                                                                                                        |  | 2) Projektové podklady             |  |                                                          |  |                         |  | 4                                      |  | listů, výkresů |  |
| osobně                                                                                                                                                                          |  | 3) Fotodokumentace                 |  |                                                          |  |                         |  |                                        |  | listů          |  |
| 1 Technický popis změny:                                                                                                                                                        |  |                                    |  |                                                          |  |                         |  |                                        |  |                |  |
| 1.1 Popis původního řešení:                                                                                                                                                     |  |                                    |  |                                                          |  |                         |  |                                        |  |                |  |
| VPD bylo uvažováno trvalé svícení 1/3 svítidel na chodbách během noci.                                                                                                          |  |                                    |  |                                                          |  |                         |  |                                        |  |                |  |
| 1.2 Popis nového řešení:                                                                                                                                                        |  |                                    |  |                                                          |  |                         |  |                                        |  |                |  |
| Na chodbách doplněna orientační bodová svítidla, která se budou ovládat pomocí vypínačů v sesternách na 2.NP a 3.NP. Doplněno pohybové čidlo pro svítidla při vstupu do garáže. |  |                                    |  |                                                          |  |                         |  |                                        |  |                |  |
| 2 Zdůvodnění změny:                                                                                                                                                             |  |                                    |  |                                                          |  |                         |  |                                        |  |                |  |
| Změna na základě požadavků Uživatele.                                                                                                                                           |  |                                    |  |                                                          |  |                         |  |                                        |  |                |  |
| 3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:                                                                                                                                   |  |                                    |  | ANO<br>(uvést jaký dokument)                             |  |                         |  | X                                      |  | NE             |  |
| <zde uvést jaký dokument>                                                                                                                                                       |  |                                    |  |                                                          |  |                         |  |                                        |  |                |  |
| 4 Dopad do smluvních termínů:                                                                                                                                                   |  |                                    |  | ANO<br>(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu) |  |                         |  | X                                      |  | NE             |  |
| <zde uvést dopad>                                                                                                                                                               |  |                                    |  |                                                          |  |                         |  |                                        |  |                |  |
| 5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. * Zákona o zadávání veřejných zakázek                                                                                   |  |                                    |  |                                                          |  |                         |  |                                        |  | odst. 4        |  |
| 6 Náklady:                                                                                                                                                                      |  | Cena méněprací (odpočet):          |  | —                                                        |  | -5 600,00 Kč            |  | bez DPH                                |  |                |  |
|                                                                                                                                                                                 |  | Cena víceprací (přípočet):         |  | +                                                        |  | 49 154,00 Kč            |  | bez DPH                                |  |                |  |
|                                                                                                                                                                                 |  | Výsledná ceny změny:               |  |                                                          |  | 43 554,00 Kč            |  | bez DPH                                |  |                |  |
| 7 Schválil:                                                                                                                                                                     |  |                                    |  |                                                          |  |                         |  |                                        |  |                |  |
| za živatele: za objednatele:                                                                                                                                                    |  |                                    |  |                                                          |  |                         |  |                                        |  |                |  |
| [Redacted Signature Area]                                                                                                                                                       |  |                                    |  |                                                          |  |                         |  |                                        |  |                |  |
| Jméno Příjmení<br>Firma                                                                                                                                                         |  | Jméno Příjmení<br>Firma            |  | Jméno Příjmení<br>Firma                                  |  | Jméno Příjmení<br>Firma |  | Jméno Příjmení<br>Královéhradecký kraj |  |                |  |

| Cenová soustava             | P.Č. | KCN | Kód položky   | Popis                                                                                           | MJ  | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|-----------------------------|------|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-------------|
| SoD D1.4.7 SILNOPROUD       | 48   | 741 | 741999301 SPC | D+M CHKE-R 3><1.5- Specifikace dle PD                                                           | m   | 292,000         | 38,00           | 11 096,00   |
|                             |      |     |               | " Kabeláž silnoprůdu " - 1 NP - 84m, 2 NP - 125m, 3.NP - 125m pře NO                            |     | 334,000         |                 |             |
|                             |      |     |               | Zrušení propojil pro střídavé vypínače v m.č. 2 32 a 3.32                                       |     | -42,000         |                 |             |
|                             |      |     |               | " Včetně uložení (montáže a nasunutí do chráničků), zapojení, případného protažení a ukončení " |     |                 |                 |             |
| Nová položka - vlastní cena |      | 741 | 741999114 SPC | D+M Noční osvětlení chodeb - nový typ T                                                         | kus | 13,000          | 763,000         | 9 919,00    |
|                             |      |     |               | " Noční osvětlení chodby. <sup>11</sup>                                                         |     |                 |                 |             |
|                             |      |     |               | *1 NP*                                                                                          |     | 3,000           |                 |             |
|                             |      |     |               | * 2. NP *                                                                                       |     | 5,000           |                 |             |
|                             |      |     |               | *3. NP "                                                                                        |     | 5,000           |                 |             |
|                             |      |     |               | " Včetně montáže, zapojení, zdroje a veškerého příslušenství *                                  |     |                 |                 |             |
| SoD D1.4 7. SILNOPROUD      | 45   | 741 | 741999259 SPC | D+M Pohybové PIR čidlo - Specifikace dle PD - doplnění ke vstupu u garáže                       | kus | 1,000           | 450,00          | 450,00      |
|                             |      |     |               | " Pohybové PIR čidlo. "                                                                         |     |                 |                 |             |
|                             |      |     |               | " 1. PP stříška nad vjezdem do garáže"                                                          |     | 1,000           |                 |             |
|                             |      |     |               | " Včetně instalace, napojení. "                                                                 |     |                 |                 |             |
| SoD D1 4 7 SILNOPROUD       | 40   | 741 | 741999254 SPC | D+M Vypínač řaz. 6 - Specifikace dle PD                                                         | kus | -32,000         | 175,00          | -5 600,00   |
|                             |      |     |               | " Střídavý přepínač. 18x zrušeno a 18x měněno z typu 6 na 1 v 1 38, 2 32,3.32, 3.05 "           |     | -36,000         |                 |             |
|                             |      |     |               | " Střídavý přepínač 2x doplněno a 2x měněno z typu 1 na 6 v 2.41,3.41 "                         |     | 4,000           |                 |             |
| SoD D1.4.7 SILNOPROUD       | 37   | 741 | 741999251 SPC | D+M Vypínač řaz 1 - Specifikace dle PD                                                          | kus | 17,000          | 187,00          | 3 179,00    |
|                             |      |     |               | " Jednopolový vypínač Měněno v 3 32,2.32, 3.05,1 38 z typu 6 na typ 1 ""                        |     | 18,000          |                 |             |
|                             |      |     |               | Měněno z typu 1 na typ 6 v 2 41,3.41                                                            |     | -2,000          |                 |             |

|                             |         |               |                                                                                                 |      |         |          |           |
|-----------------------------|---------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------|
|                             |         |               | Vypínač pro LED pásek - recepční pult                                                           |      | 1,000   |          |           |
| Nová položka - vlastní cena | 741     | 741999301 SPC | D+M CHKE-R 5«1,5 - pro ovládání skupin osvětlení na chodbách                                    | m    | 150,000 | 64,00    | 9 600,00  |
|                             |         |               | " Kabeláž silnoprůdu " - 1 NP - 40m, 2.NP - 55m, 3.NP - 55m                                     |      | 150,000 |          |           |
|                             |         |               | " Včetně uložení (montáže a nasunutí do chrániček), zapojení, případného protažení a ukončení " |      |         |          |           |
| SoD D1.4.7. SILNOPROUD      | 39 741  | 741999253 SPC | D+M Vypínač raz. 5 - Specifikace dle PD - doplnění                                              | kus  | 5,000   | 324,00   | 1 620,00  |
|                             |         |               | " Sériový přepínač pro ovládání nočního osvětlení ze sesteren 3.13 a 2.13. "                    |      |         |          |           |
|                             |         |               | "2. NP - 2.13 "                                                                                 |      | 3,000   |          |           |
|                             |         |               | " 3. NP - 3.13"                                                                                 |      | 2,000   |          |           |
| Nová položka vlastní cena   | 741     | 741999407 SPC | Rozvaděč R-1.2 - doplnění vybavení                                                              | kus  | 1,000   | 2 150,00 | 2 150,00  |
|                             |         |               | ■'Spínací digitální hodiny na DIN lištu"                                                        |      |         |          |           |
| SoDDI.4.7. SILNOPROUD       | 101 741 | 741999705 SPC | D+M Pomocný materiál + úložný materiál                                                          | sada | 1,000   | 4 740,00 | 4 740,00  |
| SoD D1 4.7 SILNOPROUD       | 107 HZS | HZS2231       | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář                                                             | hod  | 8,000   | 800,00   | 6 400,00  |
|                             |         |               |                                                                                                 |      |         |          |           |
|                             |         |               |                                                                                                 |      |         |          | 43 554,00 |

Seznam koncových prvků SILNOPROUD: Novostavba DZR v lokalitě Vrchlabí

Ze dne : 18.8.2025

| Ze dne : 18.8.2025 |        |       |                                                |     |        |    |       |          | Soupis koncových prvků k dodání na stavbu                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                         |        |                        |
|--------------------|--------|-------|------------------------------------------------|-----|--------|----|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|--------|------------------------|
| PČ                 | w/poi. | Prof. | Soupis KP dle W                                | MJ  | Příkon | Im | Barva | Množství | Vizualizace                                                                        | Typ                          | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Příkon | Im                      | Barva  | Produktový list        |
| 25                 | SILNO  | NN    | Noční osvětlení chodeb - nově doplněný typ - T | kus |        |    |       | 13,00    |  | výrobce Panlux<br>PN14100022 | Pevné LED svítidlo SPOTLIGHT IP65 ROUND bodovka, bílá - teplá. Moderní podhledové LED svítidlo s mléčným difuzorem pro příjemný rozptýl světla bez oslnění. Vhodné nejen do obytných prostor v bytech a rodinných domech, ale díky vysokému krytí IP i do prostor se zvýšenou vlhkostí a exteriérů | 5W     | 375 lm<br>ø9cm<br>x 5cm | 3000 K | Příloha PN14100022.pdf |



MODEL: PN14100022 PN14300022  
PN14100023 PN14300023  
PN14100024 PN14300024

## CZE | NÁVOD NA POUŽITÍ

Děkujeme, že jste si vybrali výrobek firmy PANLUX s.r.o.

Před použitím tohoto výrobku si prosím přečtěte návod a postupujte podle bezpečnostních instrukcí. Instalaci světlé kvalifikované osobě nebo hřmě.

**Technické údaje**  
Materiál: plast PC

### Upozornění

Před použitím výrobek zkontrolujte, je-li jakákoliv část poškozena, nepoužívejte jej. Před každou manipulací se ujistěte, že je elektrický přívod odpojený. V případě poruchy zařízení neopravujte ani nerozebírejte. Světelný zdroj v tomto svítidle smí vyměnit pouze výrobce nebo jeho smluvní servisní technik nebo podobně kvalifikovaná osoba.

Nedodržení jakékoliv instrukce uvedené v návodu může způsobit újmu na zdraví i majetku.

Při mechanickém poškození nebo neodborné manipulaci nemůže být uznána záruka.

## SVK | NÁVOD NA POUŽITIE

Ďakujeme, že ste si vybrali výrobok firmy PANLUX SK s.r.o.

Před použitím tohoto výrobku si prosím přečtete návod na použití a postupujte podľa bezpečnostných instrukcí! Inštaláciu zverte kvalifikovanej osobe, alebo firme.

**Technické údaje**  
Materiál: plast PC

### Upozornenie

Před použitím výrobek skontrolujte, ak je ktorákoľvek časť poškodená, nepoužívajte ho. Před každou manipuláciou sa uistite, že je elektrický přívod odpojený. V prípade poruchy zariadenie neopravujte ani nerozoberajte. Světelný zdroj v tom to svetidlesmie vymenť iba výrobca alebo jeho zmluvný servisný technik alebo podobně kvalifikovaná osoba.

Nedodržanie akékoľvek inštrukcie uvedené v návode môže spôsobiť újmu na zdraví a majetku.

Pri mechanickom poškodení alebo neodbornej manipulácii nemôže byť uznaná záruka.

Technické údaje sa môžu změnit bez předchozího upozornění  
Technické údaje sa môžu změnit bez předchozího upozornění

## ENC | INSTRUCTIONS

Thank you for choosing this product from PANLUX s.r.o.

Before using or installing the product, please read the mstructions and follow the safety rules. Installation should be carned out by a qualified professional or company.

**Technical data**  
Materiál: PC plastic

### Notes

Before using, check the product and ensure that it is not damaged in any way; if it is, do not use it. Before any installation ensure that the main electrical supply is disconnected. If the product is damaged, do not attempt to repair or disassemble it. The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.

Failure to follow these instructions can cause damage to health and property.

The warranty is void if the product is damaged or installed incorrectly.

## GER | GE8RAUCHSANWEISUNC

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für ein Produkt der Fa. PANLUX s.r.o. entschieden haben.

Lesen Sie sich bitte vor Gebrauch dieses Produktes die Cebrauchsanweisung genau durch und gehen Sie dann gemäß den Sicherheitsvorkehrungen vor. Vertrauen Sie die Installation nur einer fachkundigen Person oder einem qualifizierten Betrieb an.

**Technische Daten**  
Materiál: Kunststoff PC

### Hinweis

Kontrollieren Sie das Produkt vor dem Gebrauch. Sollte ein Teil beschädigt sein, benutzen Sie das Produkt nicht. Stellen Sie vor jeder Installation bzw. Montage sicher, dass das Produkt nicht am Stromkreis angeschlossen ist. Im Falle einer Störung des Gerätes nehmen Sie das Gerät nicht auseinander und nehmen Sie keine Reparaturen vor. Lichtquelle in dieser Leuchte darf ausschliesslich Hersteller oder sein Servicetechniker oder ähnlich qualifizierte Person austauschen.

Die Nichteinhaltung einer der in der Gebrauchsanweisung genannten Hinweise kann Gesundheits- und Vermögensschäden verursachen.


Bei mechanischer Beschädigung oder bei nicht fachgerechter Montage kann keine Garantie gewährt werden.

Technical data can be changed  
All rights reserved  
Alle Rechte vorbehalten


Instalace | Inštalácia | Installation | Installierung

Model  
PN14100022  
PN14100023  
PN14100024  
PN14300022  
PN14300023  
PN14300024

1000Si  
e1858g8  
-mm

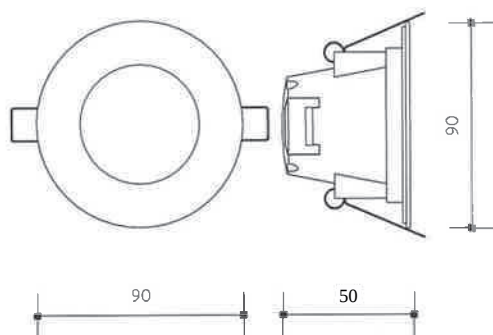


4

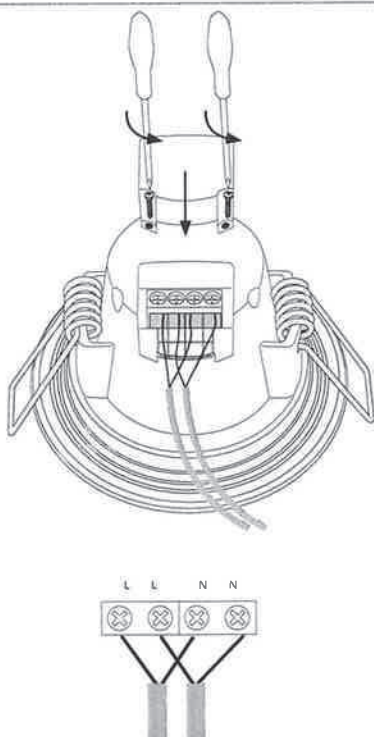


1




2



3

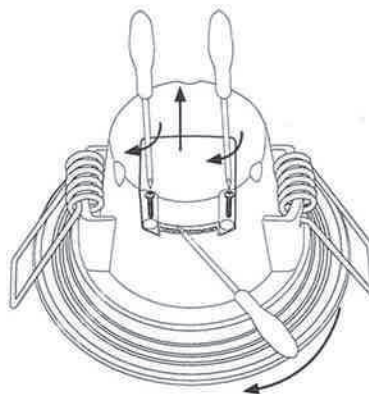

5

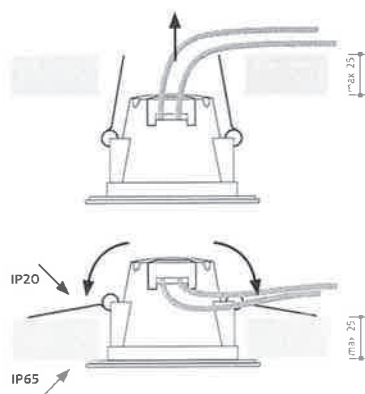

6



Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.  
Technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.


Všetchnu právu vyhrazuje u  
Všetchnu právu vyhrazuje u


Technical data can be changed without previous notice.  
Technische Daten können sich ohne vorherige Hinweis verändern.

All rights reserved  
Alle Rechte vorbehalten






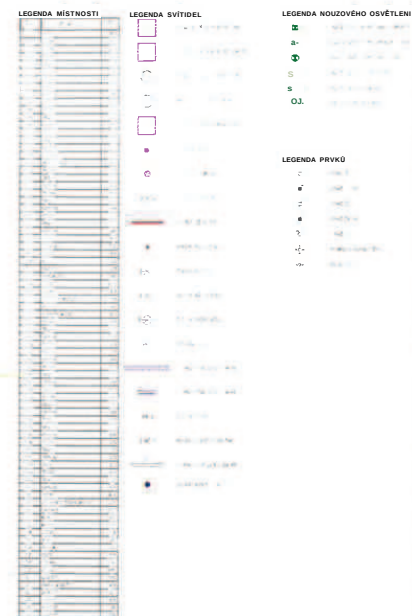

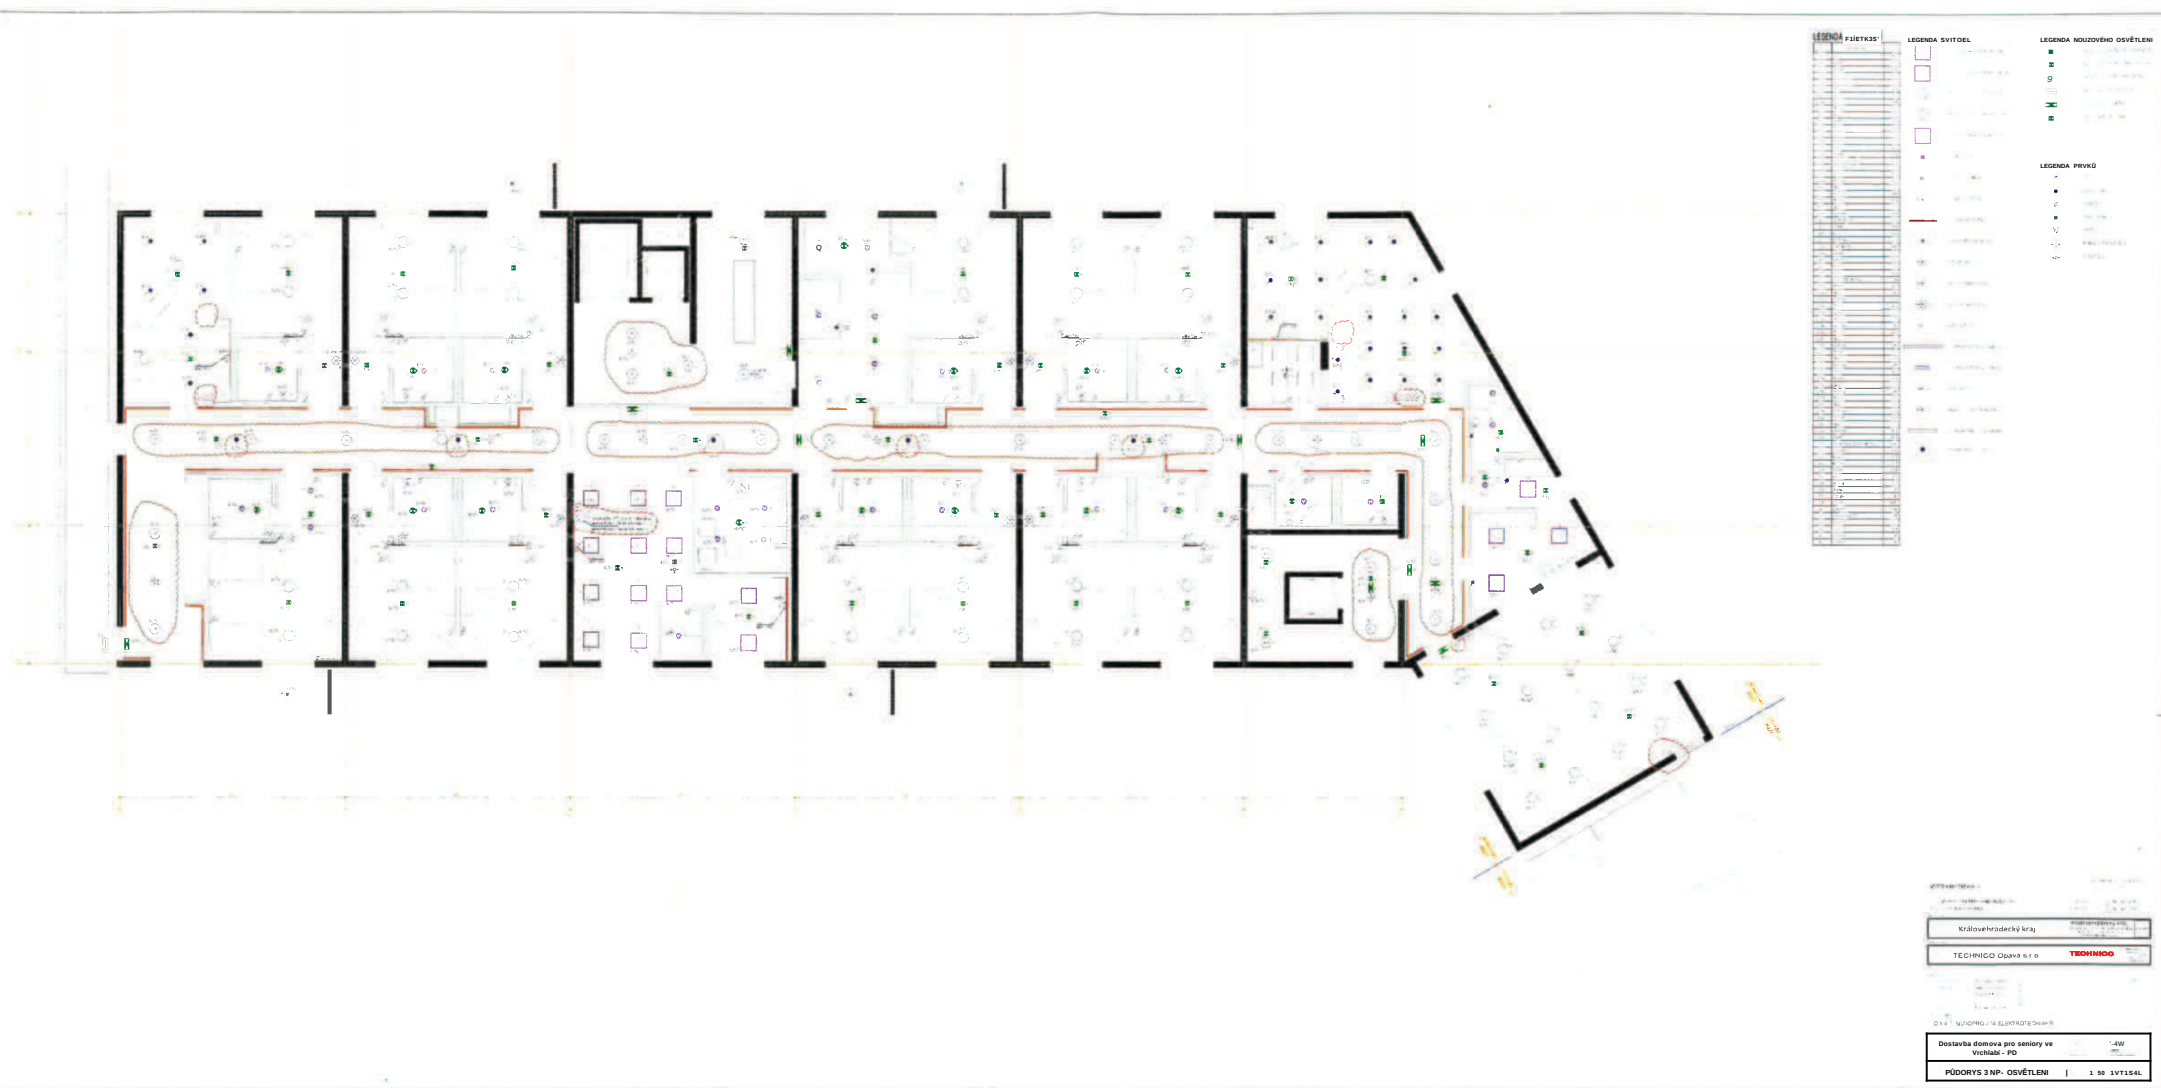

|                                                                                                         |  |                                    |  |                                                          |  |                         |  |                                        |  |                |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|--|-------------------------|--|----------------------------------------|--|----------------|--|
| ZMĚNOVÝ LIST                                                                                            |  |                                    |  |                                                          |  |                         |  |                                        |  | ZL29           |  |
| Doplnění fasádní omítky na stěny nadzemní části strojovny VZT                                           |  |                                    |  |                                                          |  |                         |  |                                        |  |                |  |
| Stavba:                                                                                                 |  | Novostavba DZR v lokalitě Vrchlabí |  |                                                          |  |                         |  |                                        |  |                |  |
| Objekt:                                                                                                 |  | D.01 Novostavba                    |  |                                                          |  |                         |  |                                        |  |                |  |
| Předkládá:                                                                                              |  | KAMI PROFIT s.r.o                  |  |                                                          |  |                         |  | Datum:                                 |  | 12.9.2025      |  |
| Odesláno / předáno:                                                                                     |  | Přílohy / počet listů              |  |                                                          |  |                         |  |                                        |  |                |  |
| poštou                                                                                                  |  | 1) Položkový rozpočet změny        |  |                                                          |  |                         |  | 1                                      |  | listů          |  |
| e-mailem                                                                                                |  | 2) Projektové podklady             |  |                                                          |  |                         |  |                                        |  | listů, výkresů |  |
| osobně                                                                                                  |  | 3) Fotodokumentace                 |  |                                                          |  |                         |  |                                        |  | listů          |  |
| 1 Technický popis změny:                                                                                |  |                                    |  |                                                          |  |                         |  |                                        |  |                |  |
| 1.1 Popis původního řešení:                                                                             |  |                                    |  |                                                          |  |                         |  |                                        |  |                |  |
| Zateplení stěn nadzemní části strojovny VZT v 1PP bez povrchové úpravy.                                 |  |                                    |  |                                                          |  |                         |  |                                        |  |                |  |
| 1.2 Popis nového řešení:                                                                                |  |                                    |  |                                                          |  |                         |  |                                        |  |                |  |
| Doplnění armovací vrstvy se sklotextilní sítí a tenkovrstvé omítky fasády nadzemní části strojovny VZT. |  |                                    |  |                                                          |  |                         |  |                                        |  |                |  |
| 2 Zdůvodnění změny:                                                                                     |  |                                    |  |                                                          |  |                         |  |                                        |  |                |  |
| Doplnění fasádní omítky pro zateplení stěn strojovny, jelikož tyto stěny se nacházejí nad úrovní UT.    |  |                                    |  |                                                          |  |                         |  |                                        |  |                |  |
| 3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:                                                           |  |                                    |  | ANO<br>(uvést jaký dokument)                             |  |                         |  | X                                      |  | NE             |  |
| 4 Dopad do smluvních termínů:                                                                           |  |                                    |  | ANO<br>(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu) |  |                         |  | X                                      |  | NE             |  |
| 5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek           |  |                                    |  |                                                          |  |                         |  | odst.                                  |  | 6              |  |
| 6 Náklady:                                                                                              |  | Cena méněprací (odpočet):          |  | -                                                        |  | 0,00 Kč                 |  | bez DPH                                |  |                |  |
|                                                                                                         |  | Cena víceprací (přípočet):         |  | +                                                        |  | 82 914,00 Kč            |  | bez DPH                                |  |                |  |
|                                                                                                         |  | Výsledná ceny změny:               |  |                                                          |  | 82 914,00 Kč            |  | bez DPH                                |  |                |  |
| 7 Schválil:                                                                                             |  |                                    |  |                                                          |  |                         |  |                                        |  |                |  |
| za zhotovitele:                                                                                         |  | za TDS:                            |  | za AD:                                                   |  | za uživatele:           |  | za objednatele:                        |  |                |  |
|                                                                                                         |  |                                    |  |                                                          |  |                         |  |                                        |  |                |  |
| Jméno Příjmení<br>Firma                                                                                 |  | Jméno Příjmení<br>Firma            |  | Jméno Příjmení<br>Firma                                  |  | Jméno Příjmení<br>Firma |  | Jméno Příjmení<br>Královéhradecký kraj |  |                |  |

[illegible]

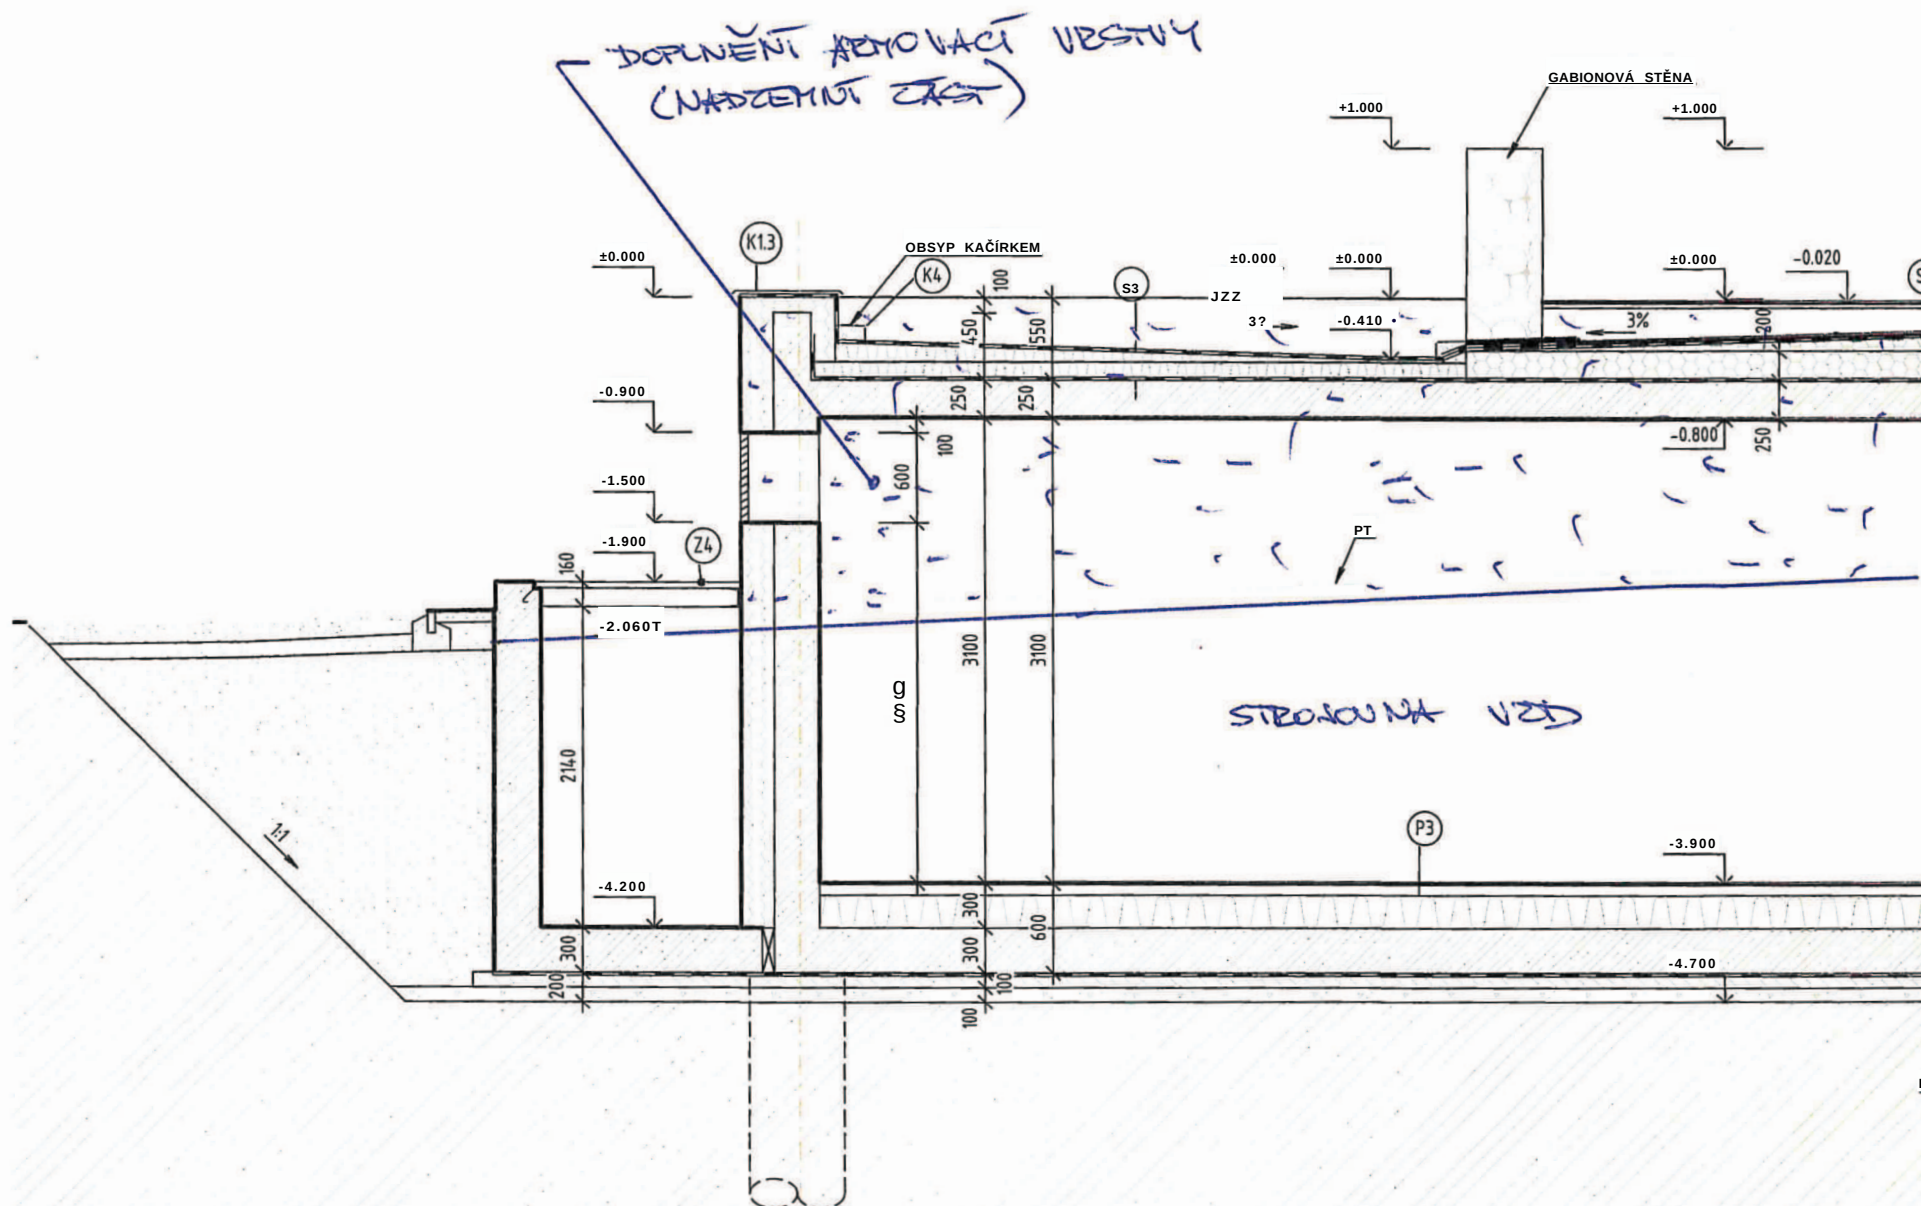

| ZMĚNOVÝ LIST                                                                                                                                                                                                                                |                             |                                                          |                         |                                        | ZL30 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|------|
| Frézování a asfaltování ulice Žižkova po realizaci nových přípojek                                                                                                                                                                          |                             |                                                          |                         |                                        |      |
| Stavba:                                                                                                                                                                                                                                     |                             | Novostavba DZR v lokalitě Vrchlabí                       |                         |                                        |      |
| Objekt:                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                                                          |                         |                                        |      |
| Předkládá:                                                                                                                                                                                                                                  |                             | KAMI PROFIT s.r.o                                        | Datum:                  | 16.9.2025                              |      |
| Odesláno / předáno:                                                                                                                                                                                                                         |                             | Přílohy / počet listů                                    |                         |                                        |      |
| poštou                                                                                                                                                                                                                                      |                             | 1) Položkový rozpočet změny                              | 1                       | listů                                  |      |
| e-mailem                                                                                                                                                                                                                                    | X                           | 2) Projektové podklady                                   | 1                       | listů, výkresů                         |      |
| osobně                                                                                                                                                                                                                                      | "X"                         | 3) Fotodokumentace                                       |                         | listů                                  |      |
| <b>1 Technický popis změny:</b>                                                                                                                                                                                                             |                             |                                                          |                         |                                        |      |
| <b>1.1 Popis původního řešení:</b><br>Původní řešení obsahovalo pouze opravu asfaltových ploch v místě přípojek.                                                                                                                            |                             |                                                          |                         |                                        |      |
| <b>1.2 Popis nového řešení:</b><br>Na základě požadavků stavbeného úřadu města Vrchlabí, je třeba odfrézovat kompletně asfaltovou komunikaci od místa první přípojky až po poslední a nahradit starý povrch novým o celkové tloušťce 50 mm. |                             |                                                          |                         |                                        |      |
| <b>2 Zdůvodnění změny:</b>                                                                                                                                                                                                                  |                             |                                                          |                         |                                        |      |
| Tyto stavební práce nebyly obsaženy ve VV.                                                                                                                                                                                                  |                             |                                                          |                         |                                        |      |
| <b>3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:</b>                                                                                                                                                                                        |                             | ANO<br>(uvést jaký dokument)                             | X                       | NE                                     |      |
| <zde uvést jaký dokument>                                                                                                                                                                                                                   |                             |                                                          |                         |                                        |      |
| <b>4 Dopad do smluvních termínů:</b>                                                                                                                                                                                                        |                             | ANO<br>(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu) | X                       | NE                                     |      |
| <b>5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek</b>                                                                                                                                        |                             | odst.                                                    | 5                       |                                        |      |
| 6 Náklady:                                                                                                                                                                                                                                  | Cena méněprací (odpočet):   | —                                                        | 0,00 Kč                 | bez DPH                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                             | Cena víceprací (přípočet):  | +                                                        | 256 144,96 Kč           | bez DPH                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Výsledná ceny změny:</b> |                                                          | <b>256 144,96 Kč</b>    | <b>bez DPH</b>                         |      |
| <b>7 Schválil:</b>                                                                                                                                                                                                                          |                             |                                                          |                         |                                        |      |
| za zhotovitele:                                                                                                                                                                                                                             | za TDS:                     | za AD:                                                   | za uživatele:           | za objednatele:                        |      |
| <div style="background-color: black; height: 80px; width: 100%;"></div>                                                                                                                                                                     |                             |                                                          |                         |                                        |      |
| Jméno Příjmení<br>Firma                                                                                                                                                                                                                     | Jméno Příjmení<br>Firma     | Jméno Příjmení<br>Firma                                  | Jméno Příjmení<br>Firma | Jméno Příjmení<br>Královéhradecký kraj |      |

[illegible]

3. Povolení zvláštního užívání místní komunikace bude mimo jiné podmíněno tím, že
- konečná obnova konstrukce místní komunikace bude provedena odbornou firmou, osobou zabývající se stavbami, opravami vozovek, chodníků a v časovém období, které zajistí její řádné provedení.
  - konečná obnova krytu místní komunikace ul. Žižkova bude provedena celoplošně, způsobem, že
  - v rozsahu výkopových rýh budou konstrukční vrstvy obnoveny ve skladbě  
asfaltový beton střednězrný ABS II 50 mm  
spojovací postřik asfaltem 0,3 kg/m<sup>2</sup>  
obalované kamenivo střednězrné OKS I 70 mm  
(s přesahem min. 200 mm)  
spojovací postřik asfaltem 0,3 kg/m<sup>2</sup>  
šterkodrt' ŠD 200 mm, hutněná  
šterkodrt' ŠD 170 mm, hutněná
  - se zhutněním zemní pláně na 50 MPa,
  - v délce místní komunikace, kde budou provedeny otevřené výkopy bude vyfrézována (vybourána) poslední vrstva krytu v tl. min. 50 mm a zpětně obnovena z ABS v tl. 50 mm s event. vyrovnávkou z OKS I, s napojením na stávající kryt s přesahem 30 cm na každou stranu, kdy po celoplošné obnově vzniknou na místní komunikaci 2 pracovní spáry kolmé na osu vozovky, které budou ošetřeny zálivkou obsahující elastomery,
  - na náklady žadatele budou v jednotlivých překopecích provedeny zkoušky zhutnění zemní pláně a při předání a převzetí budou dokladovány jejich výsledky,
  - povinností žadatele bude ke kontrole způsobu hutnění a provedení konstrukčních vrstev místní komunikace přizvat zástupce města.
4. Doporučujeme realizovat staveništní dopravu zejména sjezdem ze silnice 111/32551 ul. Dělnická.

Za správnost: [REDACTED]



JOSS

1

DOSTAVBA

&O.MOVA PROSENI

> VÉ"VRCHLABJ\* - PD


idix výška -J\*\*jy.200 \*

JOg  
p m  
tfBWr



| ZMĚNOVÝ LIST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                                    |                                                          | ZL32                                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| Stavební pravý na základe změny projektu PBŘ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                                    |                                                          |                                        |                   |
| Stavba:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            | Novostavba DZR v lokalitě Vrchlabí |                                                          |                                        |                   |
| Objekt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            | D.1.4.7 Silnoproud                 |                                                          |                                        |                   |
| Předkládá:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            | KAMI PROFIT s.r.o                  | Datum:                                                   |                                        | 8.10.2025         |
| Odesláno / předáno:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            | Přílohy / počet listů              |                                                          |                                        |                   |
| poštou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            | 1) Položkový rozpočet změny        | 1                                                        | listů                                  |                   |
| e-mailem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | X                          | 2) Projektové podklady             | 1                                                        | listů, výkresů                         |                   |
| osobně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5C                         | 3) Fotodokumentace                 |                                                          | listů                                  |                   |
| 1 Technický popis změny:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                                    |                                                          |                                        |                   |
| 1.1 Popis původního řešení:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                    |                                                          |                                        |                   |
| Zateplení nadzemní části strojovny I.PP EPS Perimeter. Podle původní PD PBŘ nebylo možné uskutečnit zásah do suterénu I.PP.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                    |                                                          |                                        |                   |
| 1.2 Popis nového řešení:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                                    |                                                          |                                        |                   |
| Na základě kontroly a revize PD část PBŘ byly vyvolány stavební úpravy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                    |                                                          |                                        |                   |
| Tyto stavební úpravy zahrnují:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                                    |                                                          |                                        |                   |
| Doplnění tlačítek pro centrální stop a total stop na fasádě u paty exteriérového schodiště a také v I.PP v místnosti 0.04 odkud bude veden zásah HZS do suterénu. Dále je třeba do fasádních dveří DF10 doplnit reverzní elektrický zámek, který dveře v případě požárního poplachu odblokuje a bude umožněn vstup HZS jednotek. Záměna materiálu zateplení nadzemní části strojovny I.PP za nehořlavý materiál. |                            |                                    |                                                          |                                        |                   |
| 2 Zdůvodnění změny:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                    |                                                          |                                        |                   |
| Stavební práce vyvolané revizí projektu PBŘ, bez kterých nebude možné kolaudovat nový objekt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                    |                                                          |                                        |                   |
| 3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            | ANO<br>(uvést jaký dokument)       | X                                                        | NE                                     |                   |
| <zde uvést jaký dokument>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                                    |                                                          |                                        |                   |
| 4 Dopad do smluvních termínů:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            | X                                  | ANO<br>(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu) | NE                                     |                   |
| 5 týdnů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                    |                                                          |                                        |                   |
| 5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                    |                                                          | odst.                                  | 6                 |
| 6 Náklady:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cena méněprací (odpočet):  | —                                  | 0,00 Kč                                                  | bez DPH                                |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cena víceprací (přípočet): | +                                  | 596 196,24 Kč                                            | bez DPH                                |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Výsledná ceny změny:       |                                    | 596 196,24 Kč                                            | bez DPH                                |                   |
| 7 Schválil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                    |                                                          |                                        |                   |
| za zhotovitele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            | za TDS:                            | za AD:                                                   | za uživatele:                          | za objednatele: . |
| <div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                                    |                                                          |                                        |                   |
| Jméno Příjmení<br>Firma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jméno Příjmení<br>Firma    | Jméno Příjmení<br>Firma            | Jméno Příjmení<br>Firma                                  | Jméno Příjmení<br>Královéhradecký kraj |                   |

| Cenová soustava                                    | P.Č. | KCN | Kód položky   | Popis                                                                                                                                                 | MJ   | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----------------------------------------------------|------|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-----------------|-------------|
|                                                    |      |     |               | Doplnění CS a TS u ocelového schodiště a v 1.PP                                                                                                       |      |                 |                 |             |
| Položka s SoD část D 1.4.7 Silnoproud              | 34   | 741 | 741999207 SPC | D+M Tlačítko "Central STOP" - doplnění                                                                                                                | kus  | 2,000           | 1 423,00        | 2 846,00    |
|                                                    |      |     |               | " Tlačítko "Central STOP". "                                                                                                                          |      |                 |                 |             |
|                                                    |      |     |               | " 1. NP "                                                                                                                                             |      | 1,000           |                 |             |
|                                                    |      |     |               | "1 PP"                                                                                                                                                |      | 1,000           |                 |             |
|                                                    |      |     |               | "Včetně Instalace, napojení, rámečku, krytu a instalačních krabic. "                                                                                  |      |                 |                 |             |
| Položka s SoD část D.1.4.7 Silnoproud              | 35   | 741 | 741999208 SPC | D+M Tlačítko "Total STOP" - doplnění                                                                                                                  | kus  | 2,000           | 1 423,00        | 2 846,00    |
|                                                    |      |     |               | " Tlačítko "Total STOP" "                                                                                                                             |      |                 |                 |             |
|                                                    |      |     |               | " 1. NP "                                                                                                                                             |      | 1,000           |                 |             |
|                                                    |      |     |               | " 1. PP "                                                                                                                                             |      | 1,000           |                 |             |
| Položka s SoD část b.1.4.7 Silnoproud              |      |     |               | " Včetně Instalace, napojení, rámečku, krytu a instalačních krabic. "                                                                                 |      |                 |                 |             |
|                                                    | 56   | 741 | 741999308 SPC | D+M 1-CXKE-V 5*1,5 - doplnění                                                                                                                         | m    | 260,000         | 87,00           | 22 620,00   |
|                                                    |      |     |               | " Kabeláž silnoproudu - s funkční integritou. "                                                                                                       |      |                 |                 |             |
|                                                    |      |     |               | " Včetně uložení (montáže a nasunutí do chrániček), zapojení, případného protažení a ukončení "                                                       |      |                 |                 |             |
| Položka s SoD část D.1.4.7 Silnoproud              | 100  | 742 | 742998891 SPC | D+M Úložný materiál trasy NN                                                                                                                          | sada | 1,000           | 21 594,00       | 21 594,00   |
|                                                    |      |     |               | " úložný materiál pro vedení instalace el. komunikace a NN "                                                                                          |      |                 |                 |             |
| Položka s SoD část D 1.4.7 Silnoproud              | 101  | 742 | 742998892 SPC | D+M Pomocný materiál pro instalaci trasy EPS                                                                                                          | sada | 1,000           | 17 946,20       | 17 946,20   |
|                                                    |      |     |               | " Všechny pomocný materiál pro zajištění veškeré komunikace - spojovací a napájecí materiál, hmoždinky, vruty, sádra, popisové štítky, apod. "        |      |                 |                 |             |
| Položka s SoD část D.1.4.7 Silnoproud              | 60   | HZS | HZS2231       | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář                                                                                                                   | hod  | 8,000           | 560,00          | 4 480,00    |
| Položka s SoD část D.1.4.7 Silnoproud              | 104  | 742 | 742999105 SPC | D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety - Specifikace dle PBŘ                                                                                           | sada | 1,000           | 24 400,00       | 24 400,00   |
| Položka s SoD část D 1.4.7 Silnoproud              | 62   | 741 | 741999411 SPC | D+M Rozvaděč RH - úprava a doplnění pro zapojení                                                                                                      | kpl  | 1,000           | 18 300,00       | 18 300,00   |
|                                                    |      |     |               | Záměna tepelné izolace nadzemní části strojovny.                                                                                                      |      |                 |                 |             |
| Položka s SoD část 0 01 Novostavba                 | 121  | K   | 622221061     | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdívá a betonu tl přes 240mm | m2   | 150,000         | 1 624,00        | 243 600,00  |
| Položka URS 2024 02 x koef.0.68                    |      |     | 63142032      | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélně vlákno A=0,035-0.036 tl 220mm                                                              | m2   | 150,000         | 768,40          | 115 260,00  |
| Položka s SoD část D 01 Novostavba                 | 125  | K   | 622251201     | Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za použití disperzní (organické) armovací hmoty šterkování                                      | m2   | 150,000         | 196,00          | 29 400,00   |
| Položka URS 2024 02 x koef.0.68                    |      |     | 966080107     | Dourání kontaktního zateplení z polystyrénových desek tl přes 180 mm                                                                                  | m2   | 150,000         | 62,83           | 9 424,80    |
| Položka s SoD -bourací práce RD část SO01 RD+kulna | 15a  |     | 997006512     | " - Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km "                                                                                | i    | 2,40            | 40,25           | 96,60       |
| Položka s SoD -bourací práce RD část SO01 RD+kulna | 15b  |     | 997006519     | " - Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km - uvažována skládka ve vzdálenosti do 6 km "                                | t    | 14,40           | 14,95           | 215,28      |
| Položka URS 2024 02 x koef.0.68                    |      |     | 997013814     | Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu izolaci kód odpadu 17 06 04                                                             | t    | 2,400           | 3 386,40        | 8 127,36    |
|                                                    |      |     |               | Doplnění elektrického zámku do dveří DF10                                                                                                             |      |                 |                 |             |
| Nova položka - vlastní cena                        |      |     |               | Demontáž, odvoz a zpětný dovoz dveřního křídla.                                                                                                       | kpl  | 1,000           | 22 650,00       | 22 650,00   |

[illegible]

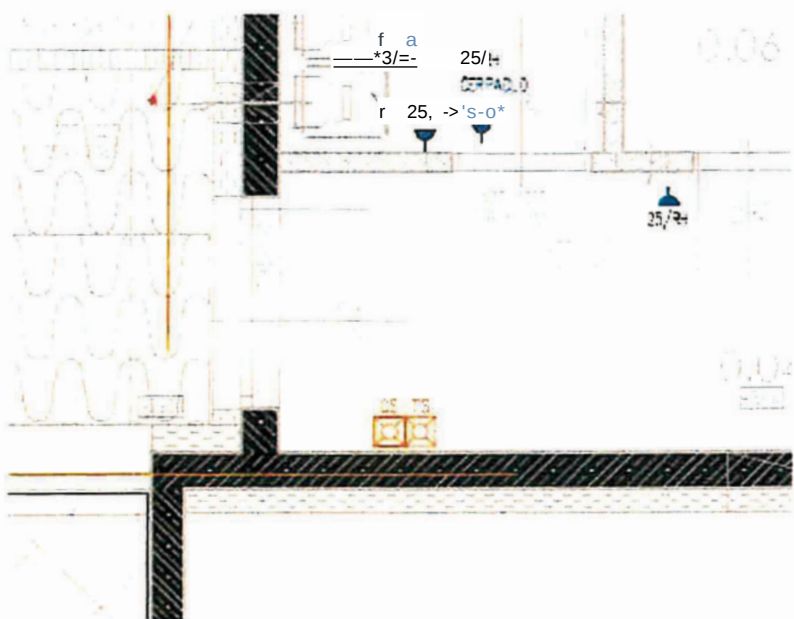

ZL 32

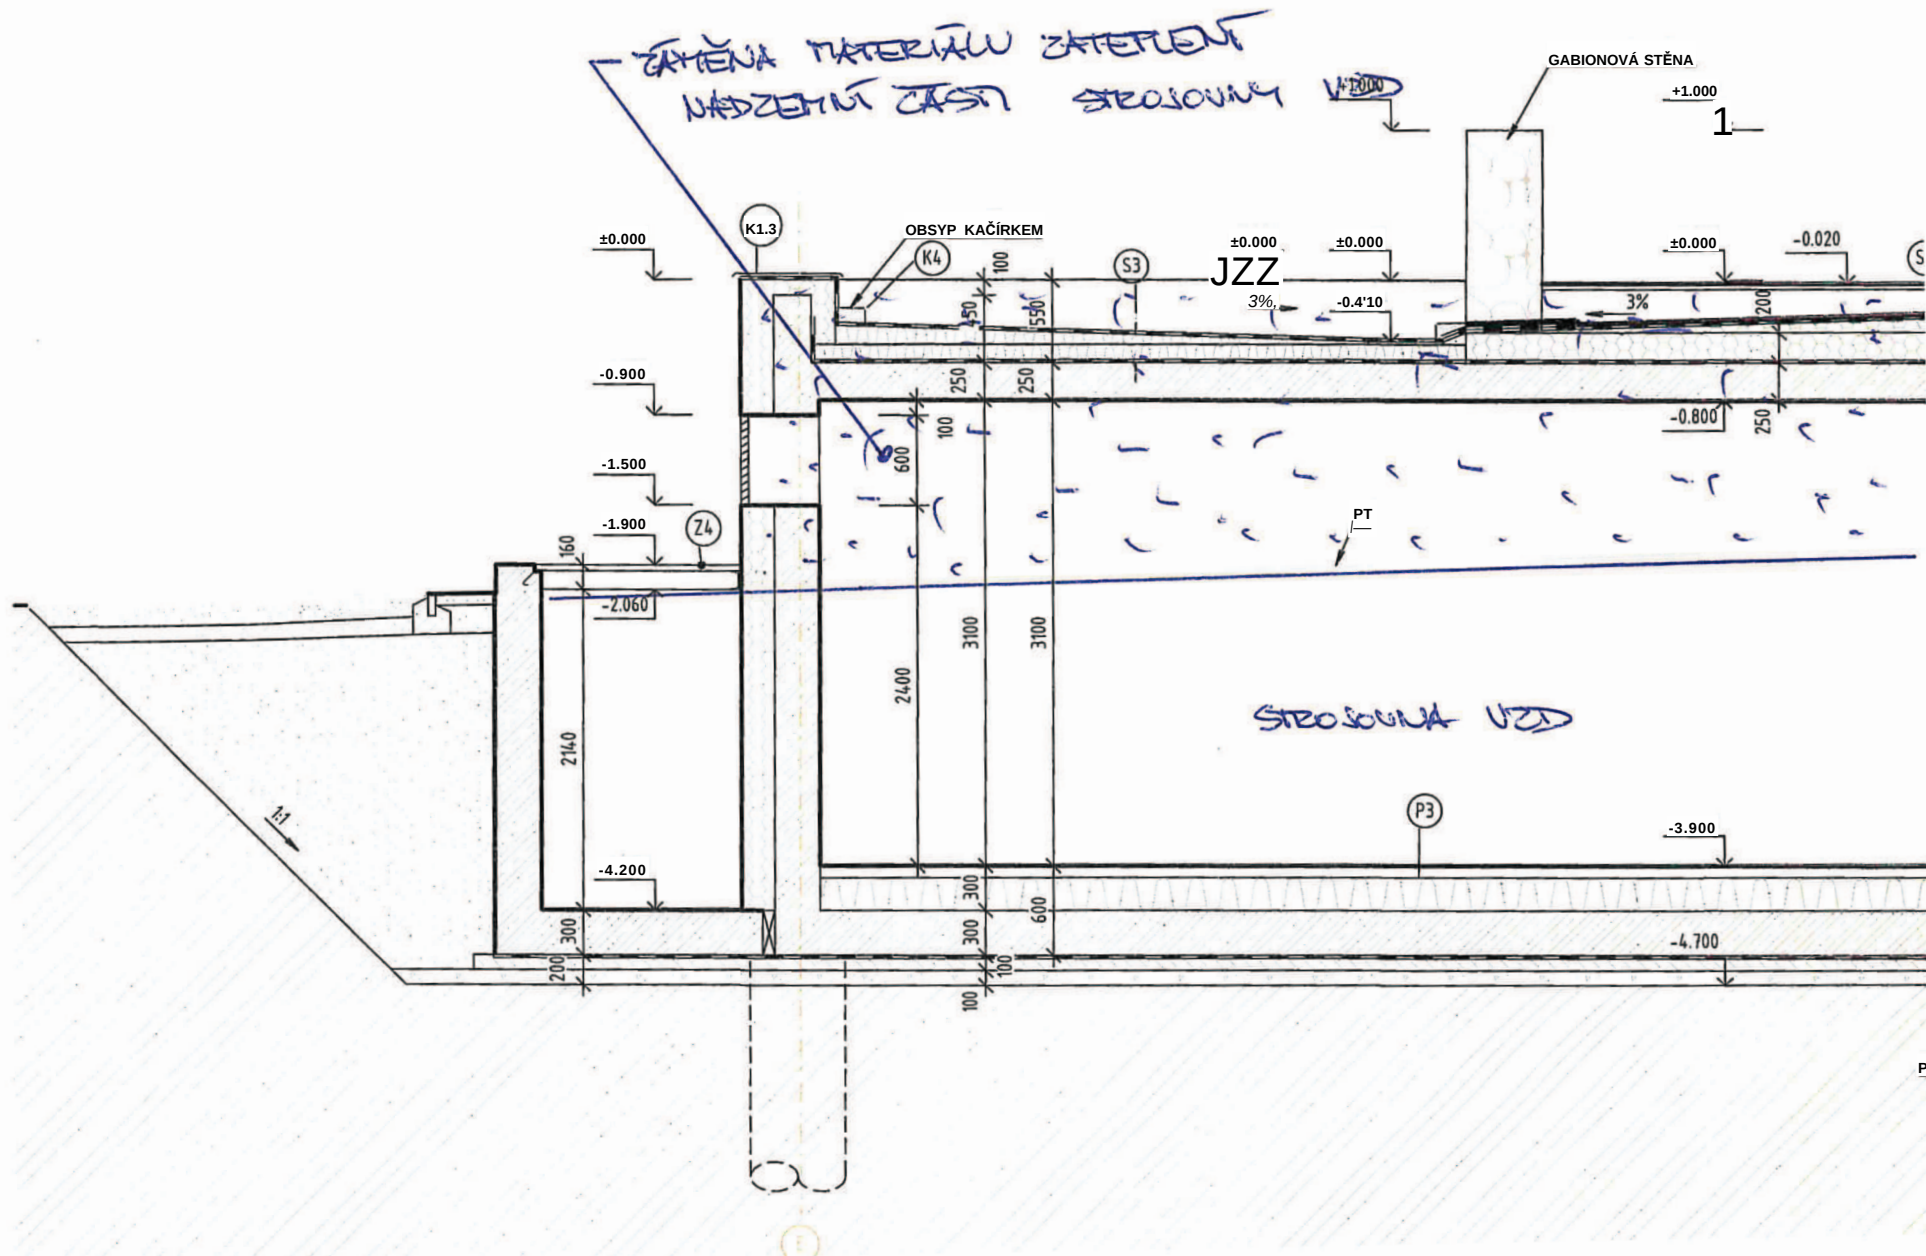

# ZMĚNY ZAVAZKU ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

**Název veřejné zakázky:**

**Novostavba DZR v lokalitě Vrchlabí**

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

|                                                                         |                                         |                                                                        |            |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Původní smluvní cena (vstupní)</b>                                   | <b>192 327 997,00 Kč bez DPH</b>        |                                                                        |            |
| Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?          | <b>NE</b>                               |                                                                        |            |
| Druh veřejné zakázky                                                    | stavební práce                          |                                                                        |            |
| Vícepráce (k odst. 4)                                                   | + 177 473,41 Kč bez DPH                 | <b>Dodatek č. 1</b>                                                    | <b>ANO</b> |
| Méněpráce (k odst. 4)                                                   | - 14 662,07 Kč bez DPH                  |                                                                        |            |
| Vícepráce (k odst. 4)                                                   | + 2 188,36 Kč bez DPH                   | <b>Dodatek č. 2</b>                                                    | <b>ANO</b> |
| Méněpráce (k odst. 4)                                                   | - 0,00 Kč bez DPH                       |                                                                        |            |
| Vícepráce (k odst. 4)                                                   | + 1 057 164,04 Kč bez DPH               | <b>Dodatek č. 3</b>                                                    | <b>ANO</b> |
| Méněpráce (k odst. 4)                                                   | - 852 125,34 Kč bez DPH                 |                                                                        |            |
| Vícepráce (k odst. 4)                                                   | + 250 378,15 Kč bez DPH                 | <b>Dodatek č. 4</b>                                                    | <b>ANO</b> |
| Méněpráce (k odst. 4)                                                   | - 38 700,00 Kč bez DPH                  |                                                                        |            |
| Vícepráce (k odst. 4)                                                   | + 49 154,00 Kč bez DPH                  | <b>Dodatek č. 5</b>                                                    | <b>ANO</b> |
| Méněpráce (k odst. 4)                                                   | - 5 600,00 Kč bez DPH                   |                                                                        |            |
|                                                                         |                                         | <b>Dodatek č. 6</b>                                                    | <b>NE</b>  |
| <b>Součet všech víceprací (k odst. 4)</b>                               | <b>+ 1 536 357,96 Kč bez DPH</b>        | <b>POSOUZENÍ:</b><br><br><b>Nejedná se o podstatnou změnu závazku.</b> |            |
| <b>Součet všech méněprací (k odst. 4)</b>                               | <b>- 911 087,41 Kč bez DPH</b>          |                                                                        |            |
| <b>Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)</b>                     | <b>2 447 445,37 Kč bez DPH</b>          |                                                                        |            |
| <b>a) <math>\frac{(Změna\ ZzS)}{(limit\ nadlimitní\ VZ)}</math></b>     | <b>2 447 445 Kč &lt; 135 348 000 Kč</b> |                                                                        |            |
| <b>IHM <math>\frac{(Změna\ ZzS)}{(Smluvní\ cena)} &lt; 15\ %</math></b> | <b>1,27% &lt; 15,00%</b>                |                                                                        |            |

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

|                                           |                                  |                     |            |
|-------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|------------|
| <b>Smluvní cena</b>                       | <b>192 327 997,00 Kč bez DPH</b> |                     |            |
| Vícepráce (k odst. 5)                     | + 0,00 Kč bez DPH                | <b>Dodatek č. 1</b> | <b>ANO</b> |
| Méněpráce (k odst. 5)                     | - 0,00 Kč bez DPH                |                     |            |
| Vícepráce (k odst. 5)                     | + 648 149,98 Kč bez DPH          | <b>Dodatek č. 2</b> | <b>ANO</b> |
| Méněpráce (k odst. 5)                     | - 0,00 Kč bez DPH                |                     |            |
| Vícepráce (k odst. 5)                     | + 1 794 141,39 Kč bez DPH        | <b>Dodatek č. 3</b> | <b>ANO</b> |
| Méněpráce (k odst. 5)                     | - 456 126,76 Kč bez DPH          |                     |            |
| Vícepráce (k odst. 5)                     | + 64 458,67 Kč bez DPH           | <b>Dodatek č. 4</b> | <b>ANO</b> |
| Méněpráce (k odst. 5)                     | - 21 178,50 Kč bez DPH           |                     |            |
| Vícepráce (k odst. 5)                     | + 256 144,96 Kč bez DPH          | <b>Dodatek č. 5</b> | <b>ANO</b> |
| Méněpráce (k odst. 5)                     | - 0,00 Kč bez DPH                |                     |            |
| <b>Součet všech víceprací (k odst. 5)</b> | <b>+ 2 762 895,00 Kč bez DPH</b> |                     |            |
| <b>Součet všech méněprací (k odst. 5)</b> | <b>- 477 305,26 Kč bez DPH</b>   |                     |            |

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

|                       |                                  |  |  |
|-----------------------|----------------------------------|--|--|
| <b>Smluvní cena</b>   | <b>192 327 997,00 Kč bez DPH</b> |  |  |
| Vícepráce (k odst. 6) | + 2 596 484,41 Kč bez DPH        |  |  |

|                                                                  |                           |              |     |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|-----|
| Méněpráce (6) související s vícepracemi                          | - 21 254,76 Kč bez DPH    | Dodatek č. 1 | ANO |
| Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi                        | - 0,00 Kč bez DPH         |              |     |
| Vícepráce (k odst. 6)                                            | + 49 282,47 Kč bez DPH    |              |     |
| Méněpráce (6) související s vícepracemi                          | - 0,00 Kč bez DPH         | Dodatek č. 2 | ANO |
| Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi                        | - 0,00 Kč bez DPH         |              |     |
| Vícepráce (k odst. 6)                                            | + 0,00 Kč bez DPH         |              |     |
| Méněpráce (6) související s vícepracemi                          | - 0,00 Kč bez DPH         | Dodatek č. 3 | ANO |
| Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi                        | - 0,00 Kč bez DPH         |              |     |
| Vícepráce (k odst. 6)                                            | + 468 303,31 Kč bez DPH   |              |     |
| Méněpráce (6) související s vícepracemi                          | - 0,00 Kč bez DPH         | Dodatek č. 4 | ANO |
| Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi                        | - 0,00 Kč bez DPH         |              |     |
| Vícepráce (k odst. 6)                                            | + 679 110,24 Kč bez DPH   |              |     |
| Méněpráce (6) související s vícepracemi                          | - 0,00 Kč bez DPH         | Dodatek č. 5 | ANO |
| Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi                        | - 0,00 Kč bez DPH         |              |     |
|                                                                  |                           |              |     |
| Součet všech víceprací (k odst. 6)                               | + 3 793 180,43 Kč bez DPH |              |     |
| Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi   | - 21 254,76 Kč bez DPH    |              |     |
| Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi | - 0,00 Kč bez DPH         |              |     |

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

|                                                                                     |                                                            |                                  |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Smluvní cena</b>                                                                 |                                                            | <b>192 327 997,00 Kč bez DPH</b> |                                  |
| (5)                                                                                 | Všechny vícepráce (k odst. 5)                              | + 2 762 895,00 Kč bez DPH        |                                  |
|                                                                                     | Všechny méněpráce (k odst. 5)<br>související s vícepracemi | - 477 305,26 Kč bez DPH          |                                  |
| (6)                                                                                 | Všechny vícepráce (k odst. 6)                              | + 3 793 180,43 Kč bez DPH        |                                  |
|                                                                                     | Všechny méněpráce (k odst. 6)<br>související s vícepracemi | - 21 254,76 Kč bez DPH           | <b>POSOUZENÍ:</b>                |
| <b>Navýšení - souhrn z odst. 5, 6</b><br><b>[(vícepráce po odečtení méněprací)]</b> |                                                            | <b>6 057 515,41 Kč bez DPH</b>   | <b>Navýšení nepřekročí 30 %.</b> |
| (9)                                                                                 | (Navýšení / Smluvní cena) < 30 %                           | <b>3,15% &lt; 30,00%</b>         |                                  |

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

|                                           |                          |                     |            |
|-------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------|
| Cena původních (nahraz.) položek          | 0,00 Kč bez DPH          | <b>Dodatek č. 1</b> | <b>ANO</b> |
| Cena nových položek                       | 0,00 Kč bez DPH          |                     |            |
| <b>POSOUZENÍ:</b>                         | <b>0 Kč &gt; 0 Kč</b>    |                     |            |
| <b>Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)</b>     | <b>- 0,00 Kč bez DPH</b> |                     |            |
| Cena původních (nahraz.) položek          | 0,00 Kč bez DPH          | <b>Dodatek č. 2</b> | <b>ANO</b> |
| Cena nových položek                       | 0,00 Kč bez DPH          |                     |            |
| <b>POSOUZENÍ:</b>                         | <b>0 Kč &gt; 0 Kč</b>    |                     |            |
| <b>Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)</b>     | <b>- 0,00 Kč bez DPH</b> |                     |            |
| Cena původních (nahraz.) položek          | 0,00 Kč bez DPH          | <b>Dodatek č. 3</b> | <b>ANO</b> |
| Cena nových položek                       | 0,00 Kč bez DPH          |                     |            |
| <b>POSOUZENÍ:</b>                         | <b>0 Kč &gt; 0 Kč</b>    |                     |            |
| <b>Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)</b>     | <b>- 0,00 Kč bez DPH</b> |                     |            |
| Cena původních (nahraz.) položek          | 0,00 Kč bez DPH          | <b>Dodatek č. 4</b> | <b>ANO</b> |
| Cena nových položek                       | 0,00 Kč bez DPH          |                     |            |
| <b>POSOUZENÍ:</b>                         | <b>0 Kč &gt; 0 Kč</b>    |                     |            |
| <b>Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)</b>     | <b>- 0,00 Kč bez DPH</b> |                     |            |
| Cena původních (nahraz.) položek          | 0,00 Kč bez DPH          | <b>Dodatek č. 5</b> | <b>ANO</b> |
| Cena nových položek                       | 0,00 Kč bez DPH          |                     |            |
| <b>POSOUZENÍ:</b>                         | <b>0 Kč &gt; 0 Kč</b>    |                     |            |
| <b>Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)</b>     | <b>- 0,00 Kč bez DPH</b> |                     |            |
| <b>Součet všech méněprací (k odst. 7)</b> | <b>- 0,00 Kč bez DPH</b> |                     |            |

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

|                                                           |                                |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Číslo aktuálního dodatku                                  | <b>5</b>                       |
| Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)      | <b>+ 984 409,20 Kč bez DPH</b> |
| Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)      | <b>- 5 600,00 Kč bez DPH</b>   |
| <b>Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)</b> | <b>978 809,20 Kč bez DPH</b>   |

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Původní smluvní cena (vstupní)</b> | <b>192 327 997,00 Kč bez DPH</b> |
| Cena po navýšení z dodatku č. 1       | 195 066 037,99 Kč bez DPH        |
| Cena po navýšení z dodatku č. 2       | 195 765 658,80 Kč bez DPH        |
| Cena po navýšení z dodatku č. 3       | 197 308 712,13 Kč bez DPH        |
| Cena po navýšení z dodatku č. 4       | 198 031 973,76 Kč bez DPH        |

|                                                        |                                  |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Cena po navýšení z dodatku č. 5                        | 199 010 782,96 Kč bez DPH        |
| <b>Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)</b> | <b>199 010 782,96 Kč bez DPH</b> |

Výpočet provedl/a:

