

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 30. 3. 2017
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmánem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

č. účtu: 43-1430860267/0100

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) COLAS CZ, a.s.

Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

IČO: 261 77 005

DIČ: CZ26177005

Zastoupený Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Sever, divize Silniční stavitelství

Zapsaný v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 6556

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú. 7408-201/0100

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**II/301 Trutnov, Poříčí, ul. Petříkovická**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku I. **Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení stavby „**II/301 Trutnov, Poříčí, ul. Petříkovická**“, včetně změny č. 1 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **20 652 923,32 Kč vč. DPH** (slovy dvacetmilionůšestsetpadesátdvatisícdevětsedvacet tři Korun českých třicet dva haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod c) článku II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH

17 068 531,67 korun českých

DPH (21%)

3 584 391,65 korun českých

Cena celkem

20 652 923,32 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 102 Dopravně inženýrská opatření a SO 202 Opěrná zeď ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 102 Dopravně inženýrská opatření a SO 202 Opěrná zeď je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.


Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 7 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 5 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá účinnosti a předmětná smlouva se mění dnem podpisu tohoto dodatku druhou podepisující stranou.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne 05. 06. 2017


Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15


Zhotovitel
Ing. Pavel Keller
oblast Sever
divize Silniční stavitelství
COLAS CZ, a.s.

COLAS CZ, a.s.
Ke Kličovu 9
190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005 (14)
Tel.: 286003511, Fax: 286003500

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

Číslo stavby :	36836
Registrační číslo projektu :	
Smlouva o dílo uzavřena dne :	30.3.2017

1

Název stavby :

„II/301 Trutnov, Poříčí, ul. Petříkovická“

Název objektu :

SO.102 Dopravně inženýrská opatření; SO.202 Opěrná zeď

Objednatel :

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

DiK Janák, s.r.o., Revoluční 207, Trutnov - Ing. Janák

Zhotovitel :

COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9; IČ: 26177005; DIČ: CZ26177005

Popis a zdůvodnění změny :

Při přípravě projektu II/301 Trutnov, Poříčí, ul. Petříkovická byla navržena objízdná trasa přes "poplíkoviště", která je součástí ČEZ, a.s. OJ VT - lokalita Poříčí (elektrárna Trutnov). V projektu se uvažovalo se stavebními úpravami této objízdné trasy, které je částečně panelová, částečně z asfaltobetonu a z části nepevněná, aby byla sjízdná pro dopravní obslužnost obcí Chvaleč, Radeč, Petříkovice a dalších včetně linkových autobusů. Objízdná trasa sníží náklady na náhradní vlakovou dopravu, které činí 223 tisíc týdně. Před zahájením stavby byla provedena pochůzka provizorní objízdné komunikace za účasti zástupců přepravce OSNADO, zhotovitele, AD a investora. Bylo zjištěno, že v současnosti tuto komunikaci navíc využívá těžká doprava zhotovitele kanalizace v ul. Petříkovická. Došlo k vyjetí kolejí, popraskání panelů v komunikaci a vytvoření velkých výtluků, v důsledku čeho se tato komunikace stala nesjízdnou pro osobní vozidla a autobusy. Z těchto důvodů je potřeba provést vyrovnat nerovnosti na objízdné trase z recyklovaného materiálu a vrstev pro obnovu a opravy z asfaltobetonu. Odečítá se položka "vrstvy pro obnovu a opravy krytu z cementobetonu".

Při rekonstrukci kanalizace, její zhotovitel rozšířil průjezdnost komunikace tak, že není třeba instalovat záporové pažení. Dojde k navýšení zemních prací a celkové úspoře na objektu SO 202 Opěrná zeď.

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky.

Přílohy evidenčního listu :

1.	rozpočet
2.	tabulka rekapitulace nabídkové ceny
3.	fotodokumentace komunikace
4.	
5.	
5.	

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č.1:		Nová cena stavby po změně č. 1:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
		méněpráce	vícepráce		
19 839 620,95 Kč	19 839 620,95 Kč	1 371 376,42 Kč	2 184 678,79 Kč	20 652 923,32 Kč	813 302,37 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.1:		1 371 376,42 Kč	2 184 678,79 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zhotovitel :	COLAS CZ, a.s.,	Martin Lazok		
Projektant :	DiK Janák	Ing. Stanislav Janák		
Správce stavby :	SÚS Královéhradeckého kraje a.s.			
Hlavní inženýr :	SÚS Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Martin Jelínek		
Technický dozor :	SÚS Královéhradeckého kraje a.s.	Jiří Kříž		
Supervize :				


Název stavby:
" II/301 TRUTNOV, POŘÍČÍ - UL. PETŘÍKOVICKÁ "


Rekapitulace ceny po změně č. 1

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	
SO.000	VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY	512 936,00	0,00	0,00	512 936,00
SO.101	VOZOVKA	8 974 326,29	0,00	0,00	8 974 326,29
SO.102	DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ	1 087 704,00	1 221 360,00	430 616,70	1 878 447,30
SO.201	KAMENNÁ ROVNANINA	459 288,91	0,00	0,00	459 288,91
SO.202	OPĚRNÁ ZEĎ	2 911 822,20	584 159,66	702 752,24	2 793 229,62
SO.301	DEŠŤOVÁ KANALIZACE	2 450 303,55	0,00	0,00	2 450 303,55
CENA CELKEM bez DPH		16 396 380,95	1 805 519,66	1 133 368,94	17 068 531,67
DPH 21 %		3 443 240,00	379 159,13	238 007,48	3 584 391,65
CENA CELKEM		19 839 620,95	2 184 678,79	1 371 376,42	20 652 923,32

SÚS Královéhradeckého kraje a.s.
 Kutná Hora 59, 500 04 Hradec Králové 4
 IČO: 275 02 988 DIČ: CZ27502988
 (59)

COLAS CZ, a.s.
 Jistá Sever, region Královéhradecký
 Mělnická 41, 503 01 Hradec Králové
 DIČ: CZ2667005 (2)
 495218032-4, fax: 495218036

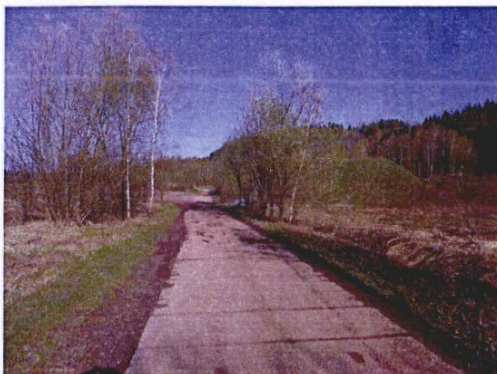




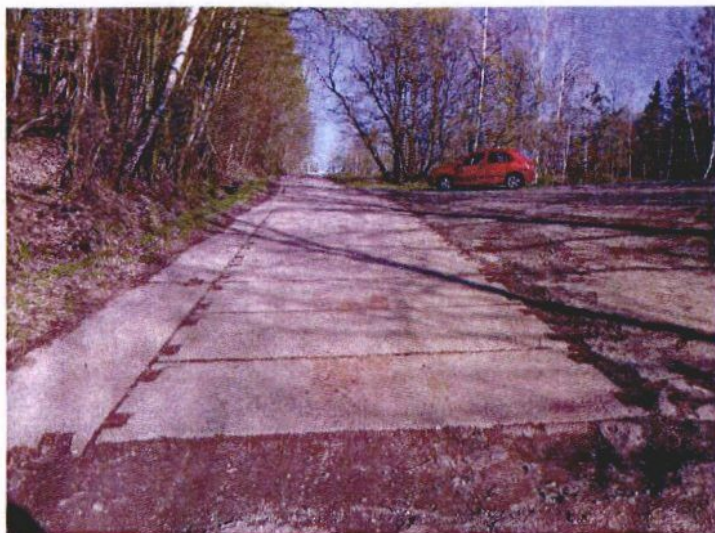


1

Objízdná trasa stavební akce II/301 Trutnov, Poříčí, ul. Petřikovická

STAV JARO 2017

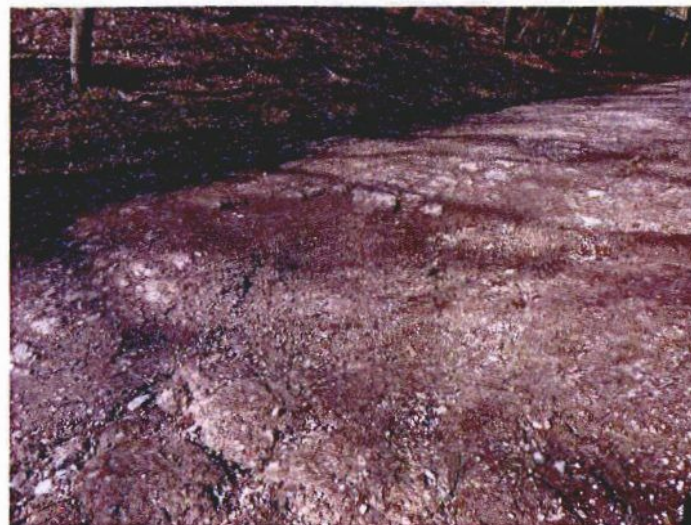

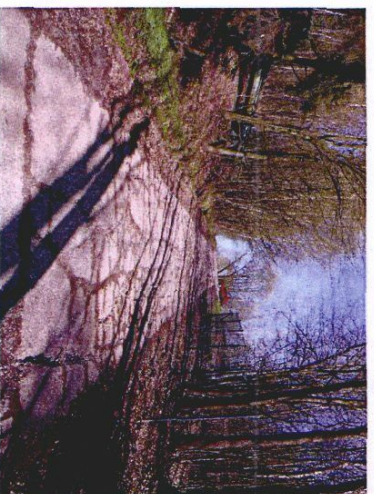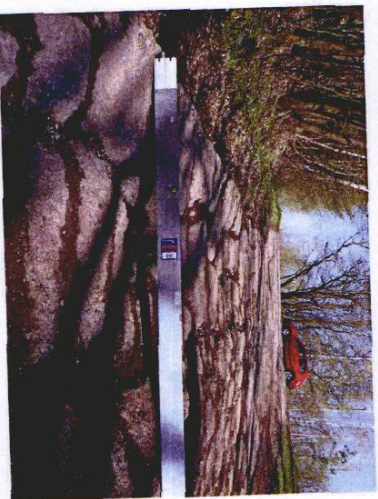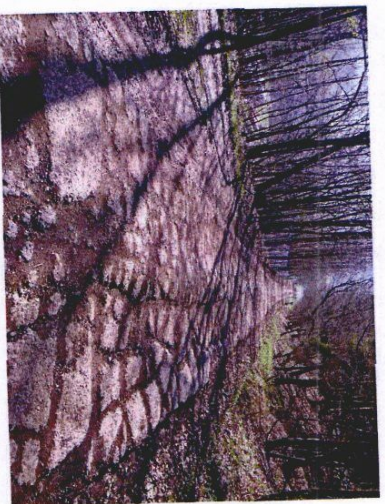

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Název akce:

II/301 Trutnov, Poříčí, ul. Petříkovická

Tabulka k odst. 4, bodu b)

Původní smluvní cena (vstupní)	16 396 380,95 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	16 396 380,95 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
(Změna ZsS / Smluvní cena) < 15 %	0,00 % < 15,00 %	

Tabulka k odst. 5, bodu c)

Původní smluvní cena (vstupní)	16 396 380,95 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 5	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 5	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)	16 396 380,95 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZsS / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	

Tabulka k odst. 6, bodu c)

Původní smluvní cena (vstupní)	16 396 380,95 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 6	+ 1 805 519,66 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 6	- 1 133 368,94 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)	17 068 531,67 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	2 938 888,60 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZsS / Smluvní cena) < 50 %	17,92 % < 50,00 %	

Tabulka k odst. 7, bodu b)

Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	odečítají se (zahrnou se do "navýšení")
Méněpráce zařazené k odst. 7 nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7

Původní smluvní cena (vstupní)	16 396 380,95 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 (vícepráce po odečtení méněprací)	672 151 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	4,10 % < 30,00 %	

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 1 805 519,66 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 1 133 368,94 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU	672 150,72 Kč bez DPH

Předchozí dodatek č. 1		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 2		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 3		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	16 396 380,95 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení se zahrnutím víceprací z předchozích dodatků	0,00 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	0,00 % < 30,00 %	

SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)	
PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)	16 396 380,95 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 1 805 519,66 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 1 133 368,94 Kč bez DPH
SOUČASNÁ CENA	17 068 531,67 Kč bez DPH

Výpočet provedl: Kateřina Vlčková
