

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 13. 4. 2017
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) **Královéhradecký kraj**

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČ: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmánem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové

č. účtu: 27-2031110287/0100

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) **EUROVIA CS, a.s.**

Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČ: 452 74 924

DIČ: CZ45274924

zastoupený (jednající) Ing. Michal Šumpík, ředitel závodu Čechy Východ, dle plné moci

zapsaný v Obchodní rejstříku vedeném při Městském soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., 141370152/0100

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**Zlepšení přeshraniční dostupnosti polsko-českého příhraničí v oblasti Stolových hor – III/30315, III/30317 Bezděkov nad Metují – Machov – Machovská Lhota – státní hranice**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**Zlepšení přeshraniční dostupnosti polsko-českého příhraničí v oblasti Stolových hor – III/30315, III/30317 Bezděkov nad Metují – Machov – Machovská Lhota – státní hranice**“, včetně změny č. 1 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **75 673 202,52 Kč vč. DPH** (slovy sedmdesátpětmilionůšestsetšedesátřitisícdvěstědva Korun českých padesát dva haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

Číslo stavby: 34156

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	62 539 836,79 korun českých
DPH (21%)	13 133 365,73 korun českých
Cena celkem	75 673 202,52 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 001 Všeobecné předběžné položky a SO 107 Silnice III/30317 – Machovská Lhota – státní hranice, ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 001 Všeobecné předběžné položky a SO 107 Silnice III/30317 – Machovská Lhota – státní hranice, je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 7 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 5 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne 03. 08. 2017

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15


.....
Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman


.....
Zhotovitel
Ing. Michal Šumpík, ředitel závodu
Čechy východ, dle plné moci


EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Čechy východ
Přeloucká 498, CZ-503 41 Hradec Králové
IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

Číslo stavby :	34156
Registrační číslo projektu :	CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_014/0000752
Smlouva o dílo uzavřena dne :	13.4.2017

1

Název stavby :

Zlepšení přeshraniční dostupnosti polsko – českého příhraničí v oblasti Stolových hor- III/30315, III/30317 Bezděkov nad Metují – Machov – Machovská Lhota – státní hranice

Název objektu :

SO 001 Všeobecné a předběžné položky
SO 107 Silnice III/30317 - Machovská Lhota - státní hranice

Objednatel :

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové, IČ 27466868

Zhotovitel :

EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1, Nové Město, IČ 45274924

Popis a zdůvodnění změny :

1. Do objektu SO 001 byla doplněna položka OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (odlovení chráněných živočichů). Tato změna vyplynula z požadavků AOPK SCHKO Broumovsko a nebyla součástí veřejné zakázky z důvodu, že nebylo možné předpokládat přesný objem prací na odlovení u mostních objektů, které jsou součástí této stavby. Zhotovitel předložil cenový odhad. Tato částka se bude čerpat po celou dobu výstavby na základě samostatně vystavených faktur od specializované firmy určené k odlovu. Tyto faktury určí přesné objemy prací při odlovení u každého mostního objektu zvlášť. Tím pádem nemusí být odhadnutá částka vyčerpaná do plné výše, protože u každého mostního objektu jsou jiné podmínky a nelze blíže specifikovat objem živočichů určených k odlovení.

2. Na objektu SO 107 byla provedena sanace zemní plně dle PD. Na této sanaci byly provedeny kontrolní statické zatěžovací zkoušky. Dle výsledků zkoušek bylo zjištěno, že sanace zemní plně v rámci SO 107 nedosahuje předepsaných hodnot Ed_{ef2}. Zhotovitel navrhl řešení, kterým se zlepši únosnost zemní plně a bude dosahováno předepsaných hodnot Ed_{ef2}.

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky.






Přílohy evidenčního listu :

1.	rekapitulace ceny
2.	rozpočet
3.	Doklad od zhotovitele o výpočtu ceny nových položek v rozpočtu stavby
4.	zápis z KD
5.	protokoly o výsledcích statických zatěžovacích zkoušek
6.	komentář projektanta ke změně v SO 107

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML. bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML. o dílo a dodatku č.(nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 1:		Nová cena stavby po změně č. 1:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
		méněpráce	vícepráce		
74 843 441,13 Kč	74 843 441,13 Kč	622 681,95 Kč	1 452 443,33 Kč	75 673 202,52 Kč	829 761,38 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.1:		622 681,95 Kč	1 452 443,33 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zhotovitel :	EUROVIA CS, a.s.	Marck Buřval	18.7.2017	
Projektant :	Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.	Ing. Miloš Burianec	18.7.2017	
Správce stavby :	SÚS Královéhradeckého kraje a.s.			
Hlavní inženýr :	SÚS Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Jiří Koutník	18.7.2017	
Technický dozor :	SÚS Královéhradeckého kraje a.s.	Petr Vaněček	18.7.2017	
	SÚS Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Irena Vaněčková	18.7.2017	
Supervize :				



SÚS Královehradeckého kraje
Kutnohorská 59
Hradec Králové
503 41

Váš dopis ZN

Naše značka

Vyřizuje/linka
Buřval Marek, 731/601580


19.7.2017

Věc: výpočet jednotkové ceny nových položek v rozpočtu stavby

Položka č. 21451 – Sanační vrstvy z lomového kamene. Jednotková cena v OTSKP 2016 byla vynásobena koeficientem stavby 0,686561207. Výsledná JC je tedy 553,37,- Kč bez DPH.

Položka č. 02920 – Ostatní požadavky – ochrana životního prostředí, odlovení chráněných živočichů. Tato položka byla v rozpočtu stanovena jako provizorní položka.

Za zhotovitele:

 
EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Čechy východ
Piletská 498, CZ-503 41 Hradec Králové
IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924



Buřval Marek
Hlavní stavbyvedoucí
731/601580



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014–2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

ZÁPIS

z 1. kontrolního dne stavby a koordinátora BOZP na staveništi

„Zlepšení přeshraniční dostupnosti polsko – českého příhraničí v oblasti Stolových hor-
III/30315, III/30317 Bezdčkov nad Metují – Machov – Machovská Lhota – státní hranice“

stavba číslo: 34156

Registrační číslo CZ.11.2.45/0.0/0.0./16_014/0000752

ze dne: 17.7.2017

Přítomni: dle prezenční listiny

I. Kontrola úkolů z minulého KD:

1/1

II. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:

Plnění věcného harmonogramu: harmonogram je plněn

Popis provedených prací: Dopravně inženýrská opatření, frézování stávajících krytových vrstev - SO 106, SO 107, očištění krajnic od nánosů, reprofilace příkopů, výkopové práce pro výměnu materiálů v aktivní zóně a pokladních vrstvách - SO 107, bourání stávajících podélných propustků SO 102, osazování trub propustků SO 102, navážení, rozprostírání a hutnění materiálů pro aktivní zónu a podkladní vrstvy komunikace SO 107

Předpokládané práce na další období: Osazování trub podélných propustků – SO 102, opevňování čel podélných propustků - SO 102, zemní práce + navážení materiálů konstrukce vozovky - SO 107, rozprostírání a hutnění materiálů pro aktivní zónu a podkladní vrstvy komunikace - SO 107, přípravné a bourací práce na SO 201

Dopravní opatření: Úplná uzavírka + pracovní místa, provoz po objízdných trasách, objízdná trasa okolo hasičské zbrojnice v Machovské Lhotě kyvadlově na semaforech

Předávání RDS: není předána

Fotodokumentace: průběžně

III. Finanční plnění:

Smluvní ujednání:

Souhrn smluvních dohod ze dne:	13.4.2017
Datum zahájení prací:	3.7.2017
Termín dokončení prací:	9.9.2018
Termín pro dokončení stavby:	21.10.2018
Doba realizace stavby:	45 týdnů + 6 týdnů (bez zimní přestávky)

Stavební práce jsou prováděny dle schváleného harmonogramu postupu výstavby.

Náklady na stavbu dle souhrnu smluvních dohod (vč. DPH.): 74 843 441,13 Kč

Fakturace stavby (vč. DPH.): zatím není

IV. Na KD bylo projednáno (nové úkoly):

- 1/1 Stavba byla upozorněna na povinnost dodržet harmonogram a termín dokončení stavby, pokud možno zkrátit termín výstavby. Prodloužit pracovní směny.
- 1/2 Zhotovitel byl upozorněn, že případní subdodavatelé musí být předem odsouhlaseni technickým dozorem investora. Prozatím odsouhlaseni:
- 1/3 Zhotovitel předloží objednateli materiálové zdroje včetně výroben s doložením přepravních vzdáleností a doby přepravy k odsouhlasení. - trvá
- 1/4 IZS požaduje maximální zabezpečení průjezdnosti stavby z důvodu přístupu.
- 1/5 Starosta obce Bezděkov nad Metují požaduje zajistit koordinaci stavby obecní kanalizace s předmětnou stavbou. Objednatel doporučuje, aby stavební práce na kanalizaci byly provedeny v měsíci březnu a dubnu 2018.
- 1/7 Požadavek zástupců Městysu Machov je zajistit v prostoru hraničního přechodu snížení rychlosti na 30 km/h. Zástupce investora postoupí k dalšímu jednání na PČR DI Náchod.
- 1/8 Zástupce Městysu Machov upozorňuje na zabezpečení odvodnění na začátku SO 106 cca v km 4,440 (vývěr vody ze skalního masivu).
- 1/9 Zástupci Městysu Machov upozorňují na související stavbu turistického parkoviště s předmětnou stavbou. Stavba parkoviště začne 1.8.2017, tuto stavbu bude realizovat BSS Broumov s.r.o.. Zhotovitel předmětné stavby požaduje koordinační schůzku s dodavatelem parkoviště.
- 1/10 Bude nutné požádat o pokácení dalších 3 ks stromů, které jsou v havarijním stavu (Jasany). Stromy jsou umístěny v SO 107 cca km 6,200 a jsou po zimním období napadeny dřevokaznými chorobami. Tyto stromy jsou nebezpečné pro okolí.
- 1/11 Na objektu SO 106 a SO 107 byly provedeny sanace zemní pláně dle PD. Na těchto sanacích byly provedeny kontrolní statické zatěžovací zkoušky. Dle výsledků zkoušek bylo zjištěno, že sanace zemní pláně v rámci SO 107 nedosahují předepsaných hodnot E_{def2} . Zhotovitel navrhl řešení, kterým se zlepší únosnost zemní pláně a bude dosahováno předepsaných hodnot E_{def2} . Návrh řešení a doplnění soupisu prací bude součástí změnové listu č.1. Zhotovitel předloží veškeré podklady pro změnový list č.1
- 1/12 Dle požadavků AOPK SCHKO Broumovsko musí být proveden pod všemi mostními objekty, které jsou součástí stavby záchranný odlov zvláště chráněných druhů (Vranka obecná, Míhule

potoční). Záchranný odlov musí provést specializovaná firma. Tato skutečnost nebyla součástí veřejné zakázky a proto musí být součástí změnového listu č.1. Zhotovitel předloží cenovou nabídku od specializované firmy a veškeré podklady pro změnový list č.1

V. Kontrola kvality:

Zpráva za uplynulé období:

VI. Zápis koordinátora BOZP na staveništi:

Při veškerých stavebních činnostech, s přihlédnutím k charakteru prací a místním podmínkám, je nutno dodržovat bezpečnost práce a Plán BOZP na staveništi. Pozornost je nutné věnovat používání ochranných pomůcek všech pracovníků stavby i účastníků KD (výstražné vesty, ochranné přilby, atd.), tak jako i bezpečnostním postupům a předpisům s používanou mechanizací.

Koordinátor BOZP na staveništi upozornil zhotovitele na řádné označení staveniště. Toto zajištění staveniště je nutné denně kontrolovat (výstražné tabulky, bezpečný pohyb chodců, atd.).

VII. Připomínky a stanoviska, ostatní:


VIII. Závěr:

Příští kontrolní den je plánován dne 31.7.2017 v 11:30 hod. u úřadu Městysu Machov.

Zapsali dne: 17.7.2017

Za správce stavby a TDS + koo. BOZP na staveništi:


Petr Vaněček



SÚS Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 4
IČO: 275 02 988 DIČ: CZ27502988
(58)

Za hlavního inženýra stavby:

Ing. Jiří Koutník




Za zhotovitele stavby:

Marek Buřval, hlavní stavbyvedoucí



Za autorský dozor stavby:

Ing. Miloš Burianec



Přílohy k zápisu: Prezenční listina

PROTOKOL O STATICKÉ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠCE

strana 1/1

číslo: **663/Z/17**

ZÁKAZNÍK: EUROVIA CS, a.s., závod Čechy východ, Piletická 498, 503 41 Hradec Králové, p. Buřval

DATUM ZKOUŠKY:

04.07.2017

STAVBA: III/30315, III/30317 Bezděkov n. M. - Machov - Mach. Lhota - stát. hr.

MATERIÁL: zahliněný štět

OBJEKT: SO 107

ZKOUŠENÁ KONSTRUKCE:

pláň -0,4m pod niv. vozovky


POČASÍ, TEPLOTA: polojasno 17°C

STANIČENÍ: km 5,830 PP

Č. VZ. U ZÁKAZNÍKA: ---

UMÍSTĚNÍ ZKOUŠKY: kopaná sonda č.2

Bod číslo	Fáze zkoušky	Kontaktní napětí: σ [MPa]	Zatlačení desky y [mm]
1	První zatěžovací cyklus	0,00	0,00
2		0,07	0,80
3		0,14	2,30
4		0,21	4,10
5		0,29	5,45
6		0,36	6,00
7		0,43	7,30
8		0,50	8,50
9	Odlehčení	0,25	8,30
10		0,13	7,90
11		0,00	5,20
12	Druhý zatěžovací cyklus	0,00	5,20
13		0,07	5,90
14		0,14	6,30
15		0,21	7,00
16		0,29	7,40
17		0,36	8,00
18		0,43	8,80

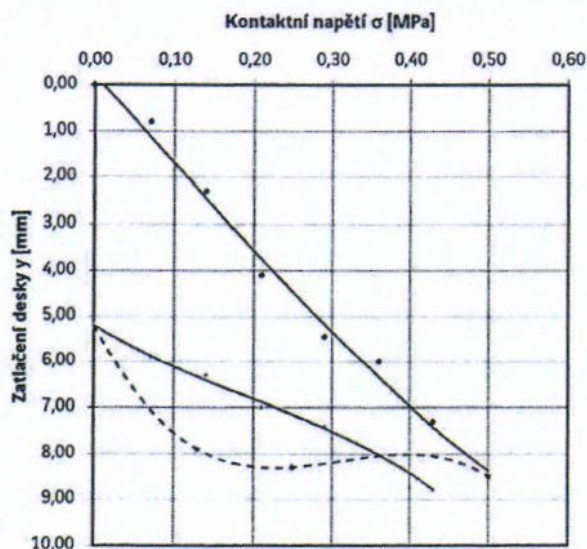

zatěžovací větev		1.	2.
σ_{max}	[MPa]	0,50	0,43
a_1	[mm/MPa]	24,344	7,231
a_2	[mm/MPa]	-12,328	1,699
E_{def}	[MPa]	12,4	28,3
E_{def2} / E_{def1}		2,28	
*u = 5 %			

poznámka 1: *Uváděná nejistota je rozšířená nejistota, která byla vypočtena s použitím koeficientu rozšíření 2, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95%. Odběr vzorku není zahrnut do výpočtu rozšířené nejistoty.

použité zkušební zařízení: statická zatěžovací deska fy Infratest

způsob zkoušení: ČSN 72 1006 /příloha A/

prohlášení: Bez písemného souhlasu laboratoře nesmí být protokol reprodukován jinak než celý.

Výsledky zkoušky platí pouze pro zkoušené místo.

zkoušku provedl: Jan Šolín

protokol kontroloval: Ing. Zdeněk Komínek

datum vyhotovení: 07.07.2017

protokol schválil: Ing. Zdeněk Komínek

vedoucí laboratoře

Laboratoř Čechy východ, Piletická 498, 503 41 Hradec Králové, Tel.: +420 495 859 603, Fax: +420 495 859 602

pracoviště Hradec Králové

EUROVIA Services, s.r.o., Národní 138/10, 110 00 Praha 1, IČ: 61250210, DIČ: CZ61250210, Tel.: +420 224 952 222, Fax: +420 224 951 428

Městský soud v Praze oddíl C, vložka 28988, dne 13.6.1994, Komerční banka, číslo účtu: 0141830198/0100



PROTOKOL O STATICKÉ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠCE

strana 1/1

číslo: **662/Z/17**

ZÁKAZNÍK: EUROVIA CS, a.s., závod Čechy východ, Piletická 498, 503 41 Hradec Králové, p. Buřval

DATUM ZKOUŠKY:

04.07.2017

STAVBA: III/30315, III/30317 Bezděkov n. M. - Machov - Mach. Lhota - stát. hr.

MATERIÁL: zahliněný štět

OBJEKT: SO 107

ZKOUŠENÁ KONSTRUKCE:

pláň -0,4m pod niv. vozovky


POČASÍ, TEPLOTA: polojasno 17°C

STANIČENÍ: krm 6,460 LP

Č. VZ. U ZÁKAZNÍKA: ---

UMÍSTĚNÍ ZKOUŠKY: kopaná sonda č.1

Bod číslo	Fáze zkoušky	Kontaktní napětí: σ [MPa]	Zatlačení desky y [mm]
1	První zatěžovací cyklus	0,00	0,00
2		0,07	0,55
3		0,14	1,69
4		0,21	3,00
5		0,29	4,11
6		0,36	5,19
7		0,43	6,26
8		0,50	6,98
9	Odlehčení	0,25	6,67
10		0,13	6,22
11		0,00	4,02
12	Druhý zatěžovací cyklus	0,00	4,02
13		0,07	4,62
14		0,14	5,33
15		0,21	5,80
16		0,29	6,23
17		0,36	6,76
18		0,43	7,07

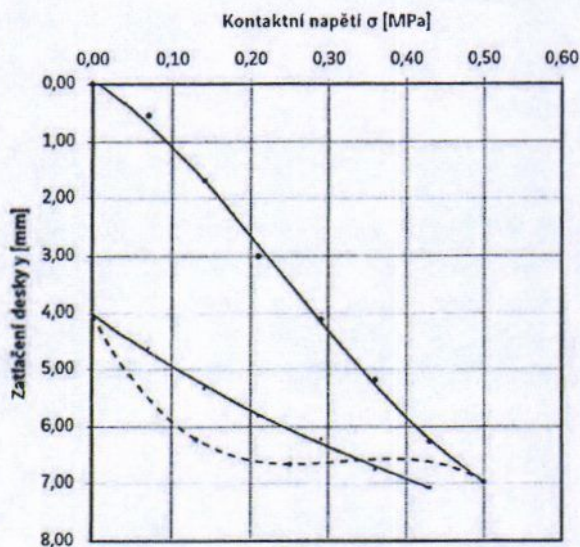

zatěžovací větev		1.	2.
σ_{max}	[MPa]	0,50	0,43
a_1	[mm/MPa]	19,212	9,674
a_2	[mm/MPa]	-7,115	-6,008
E_{def}	[MPa]	14,4	31,7
E_{def2} / E_{def1}		2,21	
		*u = 5 %	

poznámka 1: *Uváděná nejistota je rozšířená nejistota, která byla vypočtena s použitím koeficientu rozšíření 2, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95%. Odběr vzorku není zahrnut do výpočtu rozšířené nejistoty.

použité zkušební zařízení: statická zatěžovací deska fy Infratest

způsob zkoušení: ČSN 72 1006 /příloha A/

prohlášení: Bez písemného souhlasu laboratoře nesmí být protokol reprodukován jinak než celý.

Výsledky zkoušky platí pouze pro zkoušené místo.

zkoušku provedl: Jan Šolín

protokol kontroloval: Ing. Zdeněk Komínek

datum vyhotovení: 07.07.2017

protokol schválil: Ing. Zdeněk Komínek

vedoucí laboratoře

Laboratoř Čechy východ, Piletická 498, 503 41 Hradec Králové, Tel.: +420 495 859 603, Fax: +420 495 859 602

pracoviště Hradec Králové

EUROVIA Services, s.r.o., Národní 138/10, 110 00 Praha 1, IČ: 61250210, DIČ: CZ61250210, Tel.: +420 224 952 222, Fax: +420 224 951 428

Městský soud v Praze oddíl C, vložka 28982, dne 13.6.1994, Komerční banka, číslo účtu: 0141830196/0100



V Hradci Králové 18.7.2017

SÚS Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové-Plačice

Akce: III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE,
SO 107 - Silnice III/30317 – Machovská Lhota – státní hranice

Věc: Stanovisko projektanta k úpravě aktivní zóny

V projektové dokumentaci bylo uvažováno s výměnou zeminy v aktivní zóně za materiál vhodný do násypů v tl. 30cm.

Po provedení zkušebního pole s touto předepsanou úpravou však bylo zjištěno, že předepsané hodnoty stanovené v projektové dokumentaci nelze dosáhnout. Důvodem byla zvodnělá a rozbředlá parapláň vlivem předchozích nepříznivých klimatických podmínek.

Aby bylo dosaženo předepsaných hodnot, bylo třeba zvýšit mocnost výměny zeminy v aktivní zóně cca o 15 cm (celkově na 45cm) a původně uvažovaný materiál nahradit za vrstvu z lomového kamene. Tato úprava byla ověřena na zkušebním poli s uspokojivým výsledkem.

S pozdravem
Ing. Miloš Burianec



Název stavby:

Zlepšení přeshraniční dostupnosti polsko – českého příhraničí v oblasti Stolových hor- III/30315, III/30317 Bezděkov nad Metují – Machov – Machovská Lhota – státní hranice

Rekapitulace ceny

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	
SO 001	Všeobecné předběžné položky	1 610 755,10	150 000,00		1 760 755,10
SO 101	Silnice III/30315 - Na Mýtě - Vysoká Srbská	4 120 356,10			4 120 356,10
SO 102	Silnice III/30315 - Vysoká Srbská - Nizká Srbská	6 356 781,07			6 356 781,07
SO 103	Silnice III/30317 - Bezděkov n/M - Nizká Srbská	9 947 051,78			9 947 051,78
SO 104	Silnice III/30317 - Nizká Srbská - Machov(odb. Bělý)	12 567 282,39			12 567 282,39
SO 105	Silnice III/30317 - Machov(odb. Bělý) - Machov (č.p. 10)	3 481 621,94			3 481 621,94
SO 106	Silnice III/30317 - Machov (č.p. 9) - Machov (č.p. 68)	2 981 746,09			2 981 746,09
SO 107	Silnice III/30317 - Machovská Lhota - státní hranice	3 937 238,53	1 050 366,39	514 613,18	4 472 991,74
SO 201	Most ev. č. 30315-1	2 176 428,45			2 176 428,45
SO 202	Most ev. č. 30315-2	2 174 169,66			2 174 169,66
SO 203	Most ev. č. 30317-1	1 744 815,50			1 744 815,50
SO 204	Most ev. č. 30317-3	1 883 259,48			1 883 259,48
SO 205	Most ev. č. 30317-4	3 882 399,69			3 882 399,69
SO 206	Most ev. č. 30317-5	935 007,73			935 007,73
SO 207	Most ev. č. 30317-6	929 760,82			929 760,82
SO 401	Sdělovací vedení - opatření v průběhu stavebních úprav	0,00			0,00
SO 801	Sadové úpravy	534 867,00			534 867,00
SO 901	Dopravně inženýrská opatření	383 483,00			383 483,00
SO 902	Oprava objízdných tras	2 207 059,25			2 207 059,25
CENA CELKEM bez DPH		61 854 083,58	1 200 366,39	514 613,18	62 539 836,79
DPH 21%		12 989 357,55	252 076,94	108 068,77	13 133 365,73
CENA CELKEM		74 843 441,132	1 452 443,332	622 681,948	75 673 202,516

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Název akce:

Zlepšení přeshraniční dostupnosti polsko - českého příhraničí v oblasti Stolových hor - III/30315, III/30317 Bezděkov nad Metují - Machov - Machovská Lhota - státní hranice

Tabulka k odst. 4, bodu b)

Původní smluvní cena (vstupní)	61 854 083,58 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	61 854 083,58 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy - kontrolní (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	0,00 % < 15,00 %	

Tabulka k odst. 5, bodu c)

Původní smluvní cena (vstupní)	61 854 083,58 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 5	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 5	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)	61 854 083,58 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 6, bodu c)

Původní smluvní cena (vstupní)	61 854 083,58 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 6	+ 1 200 366,39 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 6	- 514 613,18 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)	62 539 836,79 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	1 714 979,57 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	2,77 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 7, bodu b)

Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	odečítají se (zahrnou se do "navýšení")
Méněpráce zařazené k odst. 7 nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7

Původní smluvní cena (vstupní)	61 854 083,58 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 (vícepráce po odečtení méněprací)	685 753,21 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	1,11 % < 30,00 %	

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 1 200 366,39 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 514 613,18 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU	685 753,21 Kč bez DPH

Předchozí dodatek č. 1

		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE
Vícepráce (k odst. 5) z předchozího dodatku		
Méněpráce (k odst. 6) z předchozího dodatku		
Vícepráce z předchozího dodatku		
Méněpráce z předchozího dodatku		

Předchozí dodatek č. 2		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE
Vícepráce (k odst. 5) z předchozího dodatku		
Méněpráce (k odst. 6) z předchozího dodatku		
Vícepráce z předchozího dodatku		
Méněpráce z předchozího dodatku		

Předchozí dodatek č. 3		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE
Vícepráce (k odst. 5) z předchozího dodatku		
Méněpráce (k odst. 6) z předchozího dodatku		
Vícepráce z předchozího dodatku		
Méněpráce z předchozího dodatku		

Předchozí dodatek č. 4		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE
Vícepráce (k odst. 5) z předchozího dodatku		
Méněpráce (k odst. 6) z předchozího dodatku		
Vícepráce z předchozího dodatku		
Méněpráce z předchozího dodatku		

Předchozí dodatek č. 5		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE
Vícepráce (k odst. 5) z předchozího dodatku		
Méněpráce (k odst. 6) z předchozího dodatku		
Vícepráce z předchozího dodatku		
Méněpráce z předchozího dodatku		

Předchozí dodatek č. 6		
Vícepráce (k odst. 5) z předchozího dodatku		
Méněpráce (k odst. 6) z předchozího dodatku		

		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 7		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

ZÁVĚREČNÁ POSOUZENÍ		
Změna závazku ze smlouvy - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	61 854 083,58 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	61 854 083,58 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZsS / Smluvní cena) < 15 %	0,00 % < 15,00 %	

Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	61 854 083,58 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení se zahrnutím víceprací z předchozích dodatků	685 753,21 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	1,11 % < 30,00 %	

SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)	
PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)	61 854 083,58 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 1 200 366,39 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 514 613,18 Kč bez DPH
SOUČASNÁ CENA	62 539 836,79 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Kateřina Vlková
