

DODATEK č. 3
ke Smlouvě o dílo ze dne 20. 5. 2016 ve znění dodatku č. 1 a č. 2
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, PhD.

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

č. účtu: 43-1430860267/0100

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD

K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov

IČO: 48035599

DIČ: CZ48035599

Zastoupený: Zdeňkem Havlem, vedoucím odštěpného závodu VÝCHOD na základě plné moci Milanem Jirouškem, ředitelem oblasti Hradec Králové a Lukášem Novákem, DiS, vedoucím obchodního oddělení

zapsaný u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Bankovní spojení: UniCredit Bank, č. ú. 430201005/2700

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**II/501 Lázně Bělohrad – Dolní Nová Ves**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 3, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení stavby **II/501 Lázně Bělohrad – Dolní Nová Ves**“, včetně změny č. 1 - č. 3 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **40 719 891,92 Kč vč. DPH** (slovy čtyřicetmilionůsedmsetdevatenácticísosmsetdevadesátjedna Korun českých devadesátdva haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod c) článku II. Smlouvy).

Číslo stavby: 33124, 33120, 33107

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky a posléze aktualizovaná předchozím dodatkem ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	33 652 803,24 korun českých
DPH (21%)	7 067 088,68 korun českých
Cena celkem	40 719 891,92 korun českých

3) Oceněný soupis prací SO 101 Silnice II/501 km 9,624 – 9,935 a SO 102 Silnice II/501 km 9,935 – 10,764, SO 201 Most přes Heřmanku ev. č. 501-007 (vše pro 2. část), ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (j) Související dokumenty se nahrazuje novým soupisem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný soupis prací SO 101 Silnice II/501 km 9,624 – 9,935 a SO 102 Silnice II/501 km 9,935 – 10,764, SO 201 Most přes Heřmanku ev. č. 501-007 (vše pro 2. část) je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

4) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (c) Nabídka Zhotovitele, se mění následující termíny takto:

Název článku obchodních podmínek	Číslo článku obchodních podmínek	Příslušné údaje
Datum zahájení prací 2. část stavby	1.1.3.3	3. 7. 2017 (termín kácení vzrostlé zeleně: 27. 3. 2017 – 2. 4. 2017)
Přerušení stavebních prací 2. část stavby		2. 10. 2017 – 29. 10. 2017
Termín dokončení prací 2. část stavby		5. 11. 2017
Lhůta pro dokončení stavby (6 týdnů po termínu dokončení prací) 2. část stavby		17. 12. 2017
Doba realizace stavby (bez zimní přestávky) 2. část stavby		15 týdnů + 6 týdnů

5) Postup prací (harmonogram) ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (j) Související dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem postupu výstavby dle sjednaných změn. Aktualizovaný postup prací (harmonogram) je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Číslo stavby: 33124, 33120, 33107

Dodatek je vyhotoven v 7 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 5 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.


Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne

27. 10. 2017

- 1. 11. 2017


.....
Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15


.....
Zhotovitel
Milan Jiroušek
ředitel oblasti Hradec Králové


.....
Zhotovitel
Lukáš Novák, DiS.
vedoucí obchodního oddělení



odštěnný závod Dopravní stavby VÝCHOD, oblast H. Králové
ČR - 517 21 Týniště nad Orlicí, Nádražní 486
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Obchodní firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD
se sídlem: K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Registrovaná: obchodním rejstříkem Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Zastoupená: Zdeňkem Havlem, vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby VÝCHOD
nar. 19.7.1959 bytem Starý Pelhřimov 64, 393 01 Pelhřimov,

uděluje tímto

panu **Milanu Jirouškovi**, bytem Vraclav 50, 565 42 Vraclav
a
panu **Lukášovi Novákovi, DiS.**, bytem Kunčice 7, 561 51 Letohrad

plnou moc

ke společnému zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na stavební práce a s tím souvisejících smluv o dílo a kupních smluv včetně souvisejících dokumentů a činností (např. objednávek, zápisů, k podávání žádostí o uzavírky apod.) na veřejnou zakázku:

II/501 Lázně Bělohrad – Dolní Nová Ves

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí dva zmocněnci své podpisy.

Jednomu ze shora uvedených zmocněnců uděluje zmocnitel plnou moc k předání nabídky, účasti při otevírání obálek, případně k úkonům spojeným s nahlédnutím do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek a pořízení jejího opisu.

Tato plná moc je platná do 31. 03. 2018

V Pelhřimově dne 22. září 2017

Zmocnitel:


Tuto plnou moc přijímáme:

Zmocněnci:


SWIETELSKY stavební s.r.o.



.....
Zdeněk Havel
vedoucí odštěpného závodu



.....
Milan Jiroušek



.....
Lukáš Novák

Název stavby:

„II/501 Lázně Bělohrad - Dolní Nová Ves“

Rekapitulace ceny - 1. část II/501 Hamerský mlýn - Dolní Nová Ves vč. mostů 501-002, 501-003 a 501-004

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		ZMĚNA Č. 2		ZMĚNA Č. 3		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	
SO 000	Všeobecné a předběžné položky	257 760,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 760,44
SO 101	Komunikace	6 069 683,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 069 683,33
SO 103	Příčný propustek km 81,100 75	268 366,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 366,84
SO 180	Dopravní inženýrské opatření	1 844 324,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844 324,11
SO 201	Most ev. č. 501-002	2 304 678,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304 678,50
SO 202	Most ev. č. 501-004	3 632 479,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 632 479,24
CENA CELKEM bez DPH		14 377 292,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 377 292,46
DPH 21 %		3 019 231,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 019 231,42
CENA CELKEM včetně DPH		17 396 523,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 396 523,88

Rekapitulace ceny - 2. část II/501 Lázně Bělohrad - Kotykova alej

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		ZMĚNA Č. 2		ZMĚNA Č. 3		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	
SO 000	Všeobecné položky	343 569,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 569,72
SO 101	Silnice II/501 km 9,624 - 9,935	2 106 700,16	0,00	0,00	615 875,94	0,00	704 409,25	0,00	3 426 985,34
SO 102	Silnice II/501 km 9,935 - 10,764	5 571 804,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5 195 787,52	0,00	10 767 591,52
SO 151	Dopravní opatření	242 194,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 194,11
SO 201	Most přes Heřmanku ev.č. 501-007	1 008 500,84	0,00	0,00	0,00	0,00	364 677,65	-73 230,58	1 299 947,91
CENA CELKEM bez DPH		9 272 768,86	0,00	0,00	615 875,94	0,00	6 264 874,42	-73 230,58	16 080 288,60
DPH 21 %		1 947 281,46	0,00	0,00	129 333,95	0,00	1 315 623,63	-15 378,42	3 376 860,60
CENA CELKEM včetně DPH		11 220 050,32	0,00	0,00	745 209,89	0,00	7 580 498,05	-88 609,00	19 457 149,20

Rekapitulace ceny - 3. část Most ev. č. 501-006 Lázně Bělohrad

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		ZMĚNA Č. 2		ZMĚNA Č. 3		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	
SO 000	Všeobecné položky	242 793,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 793,70
SO 101	Dočasné dopravní opatření	364 551,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 551,52
SO 102	Chodník	70 403,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 403,80
SO 201	Most ev. č. 501-006	2 517 473,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 517 473,16
CENA CELKEM bez DPH		3 195 222,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 195 222,18
DPH 21 %		670 996,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 996,66
CENA CELKEM včetně DPH		3 866 218,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 866 218,84

Rekapitulace ceny celé stavby

II /501 LÁZNĚ BĚLOHRAD - DOLNÍ NOVÁ VES	REKAPITULACE CENY DLE SoD (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		ZMĚNA Č. 2		ZMĚNA Č. 3		CENA CELKEM BEZ DPH
		vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	
CENA CELKEM bez DPH	26 845 283,50	0,00	0,00	615 875,94	0,00	6 264 874,42	-73 230,58	33 652 803,24
DPH 21 %	5 637 509,54	0,00	0,00	129 333,95	0,00	1 315 623,63	-15 378,42	7 067 088,68
CENA CELKEM včetně DPH	32 482 793,04	0,00	0,00	745 209,89	0,00	7 580 498,05	-88 609,00	40 719 891,92
PODÍL CEN K CENĚ Z SOD (ABS. HODNOTA)	100,00%	0,00%	0,00%	2,29%	0,00%	23,34%	0,27%	125,36%
SOUČET ABS. ZMĚN PROTI CENĚ DLE SOD		0,00%		2,29%		23,61%		25,90%

Za dodavatele: SWIETELSKÝ stavební s.r.o.
Pavel Sokol

Za projektanta: TRANSCONSULT s.r.o.
Ing. Vladimír Pravda

Za TDS: SÚS KHK a.s.
Ing. Václav Podlipný



Soupis objektů

Stavba: 33134 - II/501 Lázně Bělohrad - Kotykova alej, 22 01 2016, IROP +3cm

Varianta: I -

Nabídková cena [Kč]

9 272 768,86


Odbytová cena [Kč]

16 080 288,60

Objekt	Popis	Nabídková cena	OC
SO 000	Všeobecné položky	343 569,72	343 569,72
SO 101.1	Silnice II/501 km 9.624 - 9.935	2 010 653,30	3 330 938,48
<i>Z toho dodatek</i>			
ZBV 2	Změny dle skutečnosti		615 875,94
ZBV 3	Změny dle skutečnosti - sanace		704 409,25
SO 101.2	Propust DN 400	96 046,86	96 046,86
SO 102	Silnice II/501 km 9.935 - 10.764	5 571 804,03	10 767 591,52
<i>Z toho dodatek</i>			
ZBV 3	Změny dle skutečnosti - sanace		5 195 787,52
151.1	1. fáze	102 172,46	102 172,46
151.2	2. fáze	70 797,92	70 797,92
151.3	3. fáze	69 223,73	69 223,73
SO 201	Most přes Heřmanku ev.č. 501-007	1 008 500,84	1 299 947,91
<i>Z toho dodatek</i>			
ZBV3	Změny dle RDS		291 447,07

Název akce: II/501 II/501 Lázně Bělohrad - Kolykova alej - 2. část stavby

POSTUP PRACÍ (HARMONOGRAM) - PLÁN BOZP NA STAVENÍŠTI

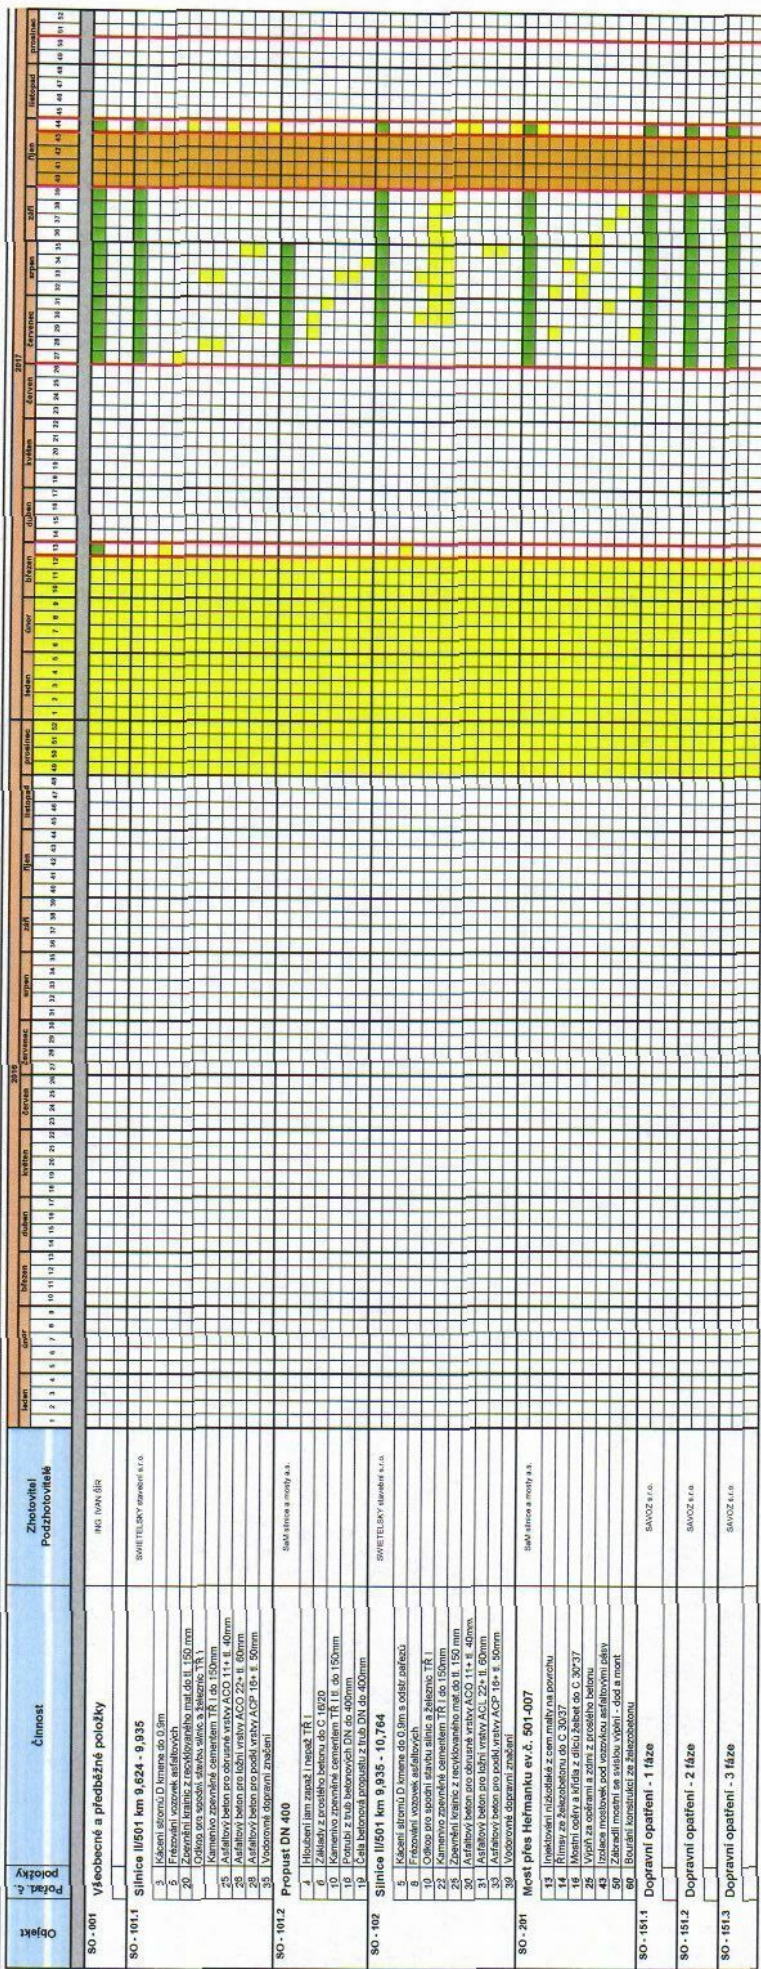

Termín ukončení zimní přestávky:

26.3.2017

27.3.2017 - 2.4.2017

3.7.2017

2.10.2017

29.10.2017

5.11.2017

17.12.2017

15. úněná + 6. úněná

Termín ukončení zimní přestávky:

27.3.2017 - 2.4.2017

3.7.2017

2.10.2017

29.10.2017

5.11.2017

17.12.2017

15. úněná + 6. úněná

Termín zahájení 2. části stavby:

Přerušení stavebních prací 2. části stavby od:

Přerušení stavebních prací 2. části stavby do:

Termín dokončení stavebních prací 2. části stavby:

Termín dokončení 2. části stavby:

Doba realizace 2. části stavby:

!! Požadujeme za objekt (ve vyšším řádku) a uvedenou položku označit konkrétní týdně, ve kterých budou uvedené práce prováděny !!

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Název akce:

II/201 Lázně Bělohrad - Dolní Nová Ves

Tabulka k odst. 4, bodu b)

Původní smluvní cena (vstupní)	26 845 283,50 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	26 845 283,50 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy - kontrolní (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZsS / Smluvní cena) < 15 %	0,00 % < 15,00 %	

Tabulka k odst. 5, bodu c)

Původní smluvní cena (vstupní)	26 845 283,50 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 5	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 5	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)	26 845 283,50 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
(Změna ZsS / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 6, bodu c)

Původní smluvní cena (vstupní)	26 845 283,50 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 6	+ 6 264 874,42 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 6	- 73 230,58 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)	33 036 927,34 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	6 338 105,00 Kč bez DPH	
(Změna ZsS / Smluvní cena) < 50 %	23,61 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 7, bodu b)

Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	odečítají se (zahrnou se do "navýšení")
Méněpráce zařazené k odst. 7 nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7

Původní smluvní cena (vstupní)	26 845 283,50 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 (vícepráce po odečtení méněprací)	6 191 643,84 Kč bez DPH	
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	23,06 % < 30,00 %	

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 6 264 874,42 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 73 230,58 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU	6 191 643,84 Kč bez DPH

Předchozí dodatek č. 1

Vícepráce (k odst. 4) z předchozího	+ 0,00 Kč bez DPH
-------------------------------------	-------------------

dodatku	+ 0,00 Kč bez DPH	dle zákona č. 134/2016 Sb. (nový zákon)
Méněpráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	- 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce (k odst. 5, 6, 7) z předchozího dodatku	+ 615 875,94 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Předchozí dodatek č. 2		
dodatku		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE
dodatku		

Předchozí dodatek č. 3		
dodatku		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE
dodatku		

Předchozí dodatek č. 4		
dodatku		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE
dodatku		

Předchozí dodatek č. 5		
dodatku		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE
dodatku		

Předchozí dodatek č. 6		
dodatku		

		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 7		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

ZÁVĚREČNÁ POSOUZENÍ		
Změna závazku ze smlouvy - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	26 845 283,50 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	26 845 283,50 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZsS / Smluvní cena) < 15 %	0,00 % < 15,00 %	

Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	26 845 283,50 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení se zahrnutím víceprací a méněprací (k odst. 5, 6, 7) z předchozích dodatků	6 807 519,78 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	25,36 % < 30,00 %	

SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)	
PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)	26 845 283,50 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 6 880 750,36 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 73 230,58 Kč bez DPH
SOUČASNÁ CENA	33 652 803,28 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Kateřina Morávková

Pozn.: Rozdíl mezi celkovou cenou a cenou uvedenou v rekapitulační tabulce je dán zaokrouhlováním.

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

Číslo stavby :	33124
Registrační číslo projektu :	CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0000267
Smlouva o dílo uzavřena dne :	20.5.2016

3

Název stavby :

II/501 Lázně Bělohrad - Dolní Nová Ves

Název objektu :

2. část stavby - II/501 Lázně Bělohrad - Kotykova alej

Objednatel :

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

TRANSCONSULT s.r.o., Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové

Zhotovitel :

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD, K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov, IČ 48035599

Popis a zdůvodnění změny :

V rámci změnového listu č. 3 jsou zahrnuty konečné vícepráce po zjištěných skutečnostech v průběhu realizace, které navazují na změnový list č.2 (nalezený silně porušený CB kryt). ZBV3 řeší zejména vícepráce na potřebných sanacích na zbytku SO 101, rozsáhlé krajové a celoplošné sanace na objektu SO 102 a práce na nové rozšiřující nosné konstrukci mostu SO 201. Součástí změny 3 je pozastavení realizace stavby 2. částí od 2.10.2017 do 29.10.2017, které bylo nutné pro stanovení konečného rozsahu sanací. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky.


Přílohy evidenčního listu :

1.	Tabulka rekapitulace změny č. 1,2,3
2.	Soupis objektů s DPH se započtením víceprací změny 2 a 3 (změna č. 1 je pouze na termín)
3.	Aktualizovaný HMG 2. částí stavby
4.	Výpis položek změny č. 3

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku č.2 (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 3:		Nová cena stavby po změně č. 3:	Celková změna +/- oproti cen. nabídky:
		méněpráce	vícepráce		
32 482 793,04 Kč	33 228 002,90 Kč	-88 609,00 Kč	7 580 498,05 Kč	40 719 891,92 Kč	8 237 098,89 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.3:		-88 609,00 Kč	8 325 707,94 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zhotovitel :	SWIETELSKY stavební s.r.o.	Pavel Sokol	23 -10- 2017	
Projektant :	TRANSCONSULT s.r.o.	Ing. Vladimír Pravda	23 -10- 2017	
Správce stavby :				
Hlavní inženýr :	SÚS Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Luděk Horáček	23 -10- 2017	
Technický dozor :	SÚS Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Václav Podlípny	23 -10- 2017	
Supervize :				

Název stavby:

„II/501 Lázně Bělohrad - Dolní Nová Ves“

Rekapitulace ceny - 1. část II/501 Hamerský mlýn - Dolní Nová Ves vč. mostů 501-002, 501-003 a 501-004

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		ZMĚNA Č. 2		ZMĚNA Č. 3		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	
SO 000	Všeobecné a předběžné položky	257 760,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 760,44
SO 101	Komunikace	6 069 683,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 069 683,33
SO 103	Příčný propustek km 81,100 75	268 366,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 366,84
SO 180	Dopravně inženýrské opatření	1 844 324,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844 324,11
SO 201	Most ev. č. 501-002	2 304 678,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304 678,50
SO 202	Most ev. č. 501-004	3 632 479,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 632 479,24
CENA CELKEM bez DPH		14 377 292,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 377 292,46
DPH 21 %		3 019 231,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 019 231,42
CENA CELKEM včetně DPH		17 396 523,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 396 523,88

Rekapitulace ceny - 2. část II/501 Lázně Bělohrad - Kotýkova alej

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		ZMĚNA Č. 2		ZMĚNA Č. 3		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	
SO 000	Všeobecné položky	343 569,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 569,72
SO 101	Silnice II/501 km 9,624 - 9,935	2 106 700,16	0,00	0,00	615 875,94	0,00	704 409,25	0,00	3 426 985,34
SO 102	Silnice II/501 km 9,935 - 10,764	5 571 804,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5 195 787,52	0,00	10 767 591,52
SO 151	Dopravní opatření	242 194,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 194,11
SO 201	Most přes Heřmanku ev.č. 501-007	1 008 500,84	0,00	0,00	0,00	0,00	364 677,65	-73 230,58	1 299 947,91
CENA CELKEM bez DPH		9 272 768,86	0,00	0,00	615 875,94	0,00	6 264 874,42	-73 230,58	16 080 288,60
DPH 21 %		1 947 281,46	0,00	0,00	129 333,95	0,00	1 315 623,63	-15 378,42	3 376 860,60
CENA CELKEM včetně DPH		11 220 050,32	0,00	0,00	745 209,89	0,00	7 580 498,05	-88 609,00	19 457 149,20

Rekapitulace ceny - 3. část Most ev. č. 501-006 Lázně Bělohrad

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		ZMĚNA Č. 2		ZMĚNA Č. 3		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	
SO 000	Všeobecné položky	242 793,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 793,70
SO 101	Dočasné dopravní opatření	364 551,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 551,52
SO 102	Chodník	70 403,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 403,80
SO 201	Most ev. č. 501-006	2 517 473,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 517 473,16
CENA CELKEM bez DPH		3 195 222,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 195 222,18
DPH 21 %		670 996,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 996,66
CENA CELKEM včetně DPH		3 866 218,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 866 218,84

Rekapitulace ceny celé stavby

II /501 LÁZNĚ BĚLOHRAD - DOLNÍ NOVÁ VES	REKAPITULACE CENY DLE SoD (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		ZMĚNA Č. 2		ZMĚNA Č. 3		CENA CELKEM BEZ DPH
		vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	
CENA CELKEM bez DPH	26 845 283,50	0,00	0,00	615 875,94	0,00	6 264 874,42	-73 230,58	33 652 803,24
DPH 21 %	5 637 509,54	0,00	0,00	129 333,95	0,00	1 315 623,63	-15 378,42	7 067 088,68
CENA CELKEM včetně DPH	32 482 793,04	0,00	0,00	745 209,89	0,00	7 580 498,05	-88 609,00	40 719 891,92
PODÍL CEN K CENĚ Z SOD (ABS. HODNOTA)	100,00%	0,00%	0,00%	2,29%	0,00%	23,34%	0,27%	125,36%
SOUČET ABS. ZMĚN PROTI CENĚ DLE SOD		0,00%		2,29%		23,61%		25,90%

Za dodavatele: SWIETELSKÝ stavební s.r.o.
Pavel Sokol

Za projektanta: TRANSCONSULT s.r.o.
Ing. Vladimír Pravda

Za TDS: SÚS KHK a.s.
Ing. Václav Podlipný

 **SWIETELSKÝ**[®]
stavební s.r.o.
oštrý závod Dopravní stavby VÝCHOD, oblast H. Králové
ČR - 517 21 Týniště nad Orlicí, Nádražní 486
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

 **TRANSCONSULT s.r.o.**
Nerudova 37
500 02 Hradec Králové
IČO: 47453292 DIČ: CZ47453292

 **ÚS**
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
IČO: 27502988, DIČ: CZ27502988 [74]

Soupis objektů s DPH

Stavba: 33134 - II/501 Lázně Bělohrad - Kotyková alej (SWIETELSKY)

Varianta: I -

Objekt	Popis	Odbytová cena [Kč]		16 080 288,60
		OC + DPH [Kč]		19 457 149,20
		OC	DPH	OC + DPH
SO 000	Všeobecné položky	343 569,72	72 149,64	415 719,36
SO 101	Silnice II/501 km 9,624 – 9,935	3 426 985,34	719 666,92	4 146 652,26
Z toho ZBV				
ZBV 2	Změny dle skutečnosti	615 875,94	129 333,95	745 209,89
ZBV 3	Změny dle skutečnosti - sanace	704 409,25	147 925,94	852 335,19
SO 102	Silnice II/501 km 9,935 - 10,764	10 767 591,52	2 261 194,22	13 028 785,74
Z toho ZBV				
ZBV 3	Změny dle skutečnosti - sanace	5 195 787,52	1 091 115,38	6 286 902,90
SO 151	Dopravní opatření	242 194,11	50 860,76	293 054,87
SO 201	Most přes Heřmanku ev.č. 501-007	1 299 947,91	272 989,06	1 572 936,97
Z toho ZBV				
ZBV3	Změny dle RDS	291 447,07	61 203,88	352 650,95

ZA STAVBU:

ZA AD:

ZA TDS:

SWIETELSKY
 stavební s.r.o.
 odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD, oblast H. Králové
 ČR - 517 21 Týniště nad Orlicí, Nádražní 486
 IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

TRANSCONSULT s.r.o.
 Nerádova 37
 500 02 Hradec Králové
 IČO: 47453292 DIČ: CZ47453292

ÚS
 ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
 Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
 IČO: 27502988, DIČ: CZ27502988 [74]
