

Smlouva o dílo

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel	Královéhradecký kraj
se sídlem:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
zástupce	Petr Koleta, hejtman
bankovní spojení:	
č. účtu:	

dále též jako „objednatel“ a

Zhotovitel	IRBOS s.r.o.
	společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou C 15647
se sídlem	Čestice 115, 517 41 Čestice
IČO	259 33 094
DIČ	CZ25933094
zastoupený	Ing. Radel Myšák – jednatel společnosti
bankovní spojení	
číslo účtu	

dále též jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

Článek 1 Úvodní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku veřejné zakázky s názvem **„SM/24/310 Stavební úpravy kuchyně - Gymnázium, Dobruška - projektové dokumentace a výkon dozoru projektanta“** zadané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále též jen „veřejná zakázka“).

Článek 2 Zmocněné osoby

1. Objednatel zmocňuje následující osoby k jednání:
 - a) zástupce objednatele ve věcech technických a plnění:

Ing. Václav Nýč,

František Mrázek DiS, [REDACTED]

- b) zástupce objednatele ve věcech provozních: Ing. Lenka Hubáčková, ředitelka Gymnázia Dobruška, [REDACTED]

2. Zhotovitel zmocňuje následující osoby k jednání:

- a) zástupce zhotovitele ve věcech smluvních: Ing. Radek Myšák [REDACTED]

- b) zástupce zhotovitele - hlavní (vedoucí) projektant: Ing. Radek Myšák, [REDACTED]

- a) zástupce zhotovitele ve věcech technických: Ing. Radek Myšák, [REDACTED]

3. Zmocněné osoby smluvních stran mohou být **změněny písemným oznámením** doručeným druhé smluvní straně. Smluvní strana bude informovat druhou smluvní stranu o takové změně bezodkladně.

4. **Na realizaci díla se bude podílet následující specialista zhotovitele** (osoba odpovědná za plnění veřejné zakázky dle nabídky dodavatele):

Vedoucí projektant: jméno, příjmení, číslo autorizace: **Ing. Radek Myšák, číslo autorizace 0602505**

autorizovaný architekt v oboru **architektura** nebo autorizace v oboru **pozemní stavby** ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě;

- o praxe v oboru projekčních prací **alespoň pět (5) let;**

5. Zhotovitel je oprávněn **změnit osobu vedoucího projektanta pouze ve zcela výjimečných případech**. Důvody pro změnu výše uvedené osoby je zhotovitel povinen doložit spolu s oznámením této změny. Objednatel, na základě oznámení zhotovitele a za předpokladu, že jsou splněny všechny podmínky a doloženy všechny doklady v rozsahu dle odst. 8. tohoto článku, vydá souhlas se změnou této osoby.

6. Za výjimečný případ ve smyslu odst. 5 se považuje:

- a) významná změna zdravotního stavu, smrt;
- b) ukončení pracovního poměru, nebo obdobného vztahu;
- c) ukončení poddodavatelského vztahu.

7. Za výjimečný případ ve smyslu odst. 5 se nepovažují kapacitní důvody, které mohl zhotovitel předvídat již v době podání nabídky.

8. V případě změny je zhotovitel povinen prokázat, že nahrazující osoby splňují kvalifikaci minimálně v rozsahu, ve kterém ji splňovala osoba nahrazovaná. K nahrazující osobě zhotovitel vždy doloží následující doklady:

- a) doklady k prokázání kvalifikace v rozsahu, v jakém byla kvalifikace prokázána prostřednictvím nahrazované osoby;
- b) čestné prohlášení o pracovním poměru, nebo obdobném vztahu ke zhotoviteli v případě, že je nahrazující osoba zaměstnancem zhotovitele;
- c) doklady k prokázání splnění základní kvalifikace dle čl. 10 zadávací dokumentace (obdobně

dle § 83 č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů) v případě, že nahrazující osoba není zaměstnancem zhotovitele;

- d) doklady, ze kterých bude vyplývat, že by nabídka zhotovitele podaná v zadávacím řízení veřejné zakázky měla stejné pořadí po provedeném hodnocení jako původní nabídka zhotovitele i v případě, že by předmětem hodnocení byla kvalifikace nahrazující osoby.
9. Objednatel může vydat souhlas ve smyslu odst. 5 i v jiných než výjimečných případech dle odst. 6, a to pouze za předpokladu, že budou doloženy všechny doklady dle odst. 8.

Článek 3

Podklady pro uzavření smlouvy

1. Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele podaná dne 8.10.2024 v rámci zadávacího řízení uvedené veřejné zakázky.
2. Předmět plnění je mimo jiné vymezen následující dokumentací, která tvoří přílohy této smlouvy:
 - a) Souhrnné prohlášení (také jako čestné prohlášení) (Příloha č. 1 zadávací dokumentace)
 - b) Bližší specifikace investičního záměru včetně projektového podkladu (Příloha č. 3 zadávací dokumentace)
 - c) Metodický návod pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi (uložena mimo smlouvu)
 - d) Zásady cirkulární ekonomiky při projektování budov (uložena mimo smlouvu)
 - e) Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2021-2027 včetně Výzvy č. 63 (uložena mimo smlouvu)
 - f) Vybraná vysvětlení zadávací dokumentace
3. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické a smluvní podmínky byly před podpisem smlouvy na základě jeho žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky, na základě jejíhož výsledku je uzavřena tato smlouva, zahrnutý do jeho nabídky.
4. Zhotovitel dále prohlašuje, že realizaci předmětu smlouvy provede v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky včetně všech jejích vysvětlení či změn a doplnění provedených objednatel.
5. Zhotovitel upozorní objednatel bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky smluvních dokumentů, resp. jejich obsahu. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků smluvní dokumentace, resp. jejího obsahu, včetně návrhů na jejich odstranění zhotovitel předá objednateli bez zbytečného odkladu po provedení kontroly.
6. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení díla dle této smlouvy, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému zhotovení díla. Pokud některé práce na sjednaném díle zajistí prostřednictvím třetích osob, odpovídá za kvalitu prací a dodávky, jako by dílo prováděl sám.

7. Zhotovitel prohlašuje, že není předlužen a není mu známo, že by bylo vůči němu zahájeno insolvenční řízení. Dále prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, či rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem soudní exekuce na majetek zhotovitele a že takové řízení nebylo vůči němu zahájeno.

Článek 4

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele svým jménem na svůj náklad a odpovědnost ve sjednaných termínech zhotovit a dokončit dílo dále specifikované je předat objednateli sjednaným způsobem. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu ve výši a za podmínek dále stanovených. Není-li uvedeno jinak, jsou veškeré činnosti potřebné k realizaci účelu této smlouvy označeny souhrnně jako „dílo“.
2. Obecným místem plnění je Královéhradecký kraj. Místem plnění, bude-li to vzhledem k charakteru činnosti zhotovitele možné, je místo předmětné stavby.
3. Předmět smlouvy bude realizován v souladu s požadavky objednatele, dle této smlouvy a jejích příloh, v souladu se zadávacími podmínkami příslušné veřejné zakázky, s platnými právními předpisy a příslušným územním plánem a případně dalšími podklady poskytnutými zhotoviteli objednatelem. Objednatel si vyhrazuje právo upravit závěry vyplývající z předaných podkladů v závislosti na svých požadavcích.
4. Zhotovitel navrhne řešení, které bude energeticky úsporné a environmentálně šetrné, zejména bude při zpracování dokumentace řešit možnost zpětného využití dešťových vod pro provoz objektu nad rámec požadavku § 5 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel preferuje technická řešení, která napomáhají udržitelnému hospodaření s vodou (např. zachytávání srážkové vody na zalévání zahrady, akumulace srážkové vody pro zálivku, zakládání tzv. zelených střech, výstavba retenčních nádrží, jezírek apod.). Zhotovitel posoudí vhodnost takových řešení s ohledem na typ stavby a její využití. Objednatel dále požaduje, aby řešení zohlednilo a preferovalo využití recyklovaných materiálů a materiálů z recyklovaných a obnovitelných zdrojů (např. recyklovaný beton, konopné izolace aj.), taková řešení bude zhotovitel objednateli aktivně navrhovat.

Článek 5

Předmět díla a podmínky pro zpracování díla

Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace pro stavbu s názvem: **Stavební úpravy školní kuchyně Gymnázium, Dobruška** s níže uvedeným upřesněním stavebního záměru ve stupních studie - návrhu dispozičního řešení kuchyně (dále též „studie“), projektová dokumentace pro povolení stavby, projektové dokumentace pro provádění stavby, dokumentace interiérového a gastro vybavení (dále jen také jako „PD interiéru a vybavení“), (vše dále jen také jako „PD“ nebo „projektové dokumentace“), dále zpracování energetického posudku, kompletní inženýrská činnost s tím spojená, včetně úhrady všech správních poplatků, pravomocného stavebního povolení případně jiných opatření vydaných dle zákona č. 283/2021, stavební zákon (dále jen „stavební

zákon“) nezbytných k realizaci stavby dle zpracované projektové dokumentace, vše v souladu s požadavky uvedenými v zadávacích podmínkách. Předmětem plnění bude i součinnost při zadávacím řízení veřejné zakázky na realizaci předmětných stavebních prací a dodávek vybavení a výkonu činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rámci stavby, součinnost objednateli při získávání dotací, a v případě realizace vlastní stavby i výkon dozoru projektanta.

Projektová dokumentace bude vypracována jako soubor dokumentací, kde výslednou dokumentací bude PD pro provádění stavby.

Rozsah a obsah PD stavby je stanoven vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, (dále i jen „vyhláška“). Součástí zpracování projektové dokumentace bude část – zpracování plánu BOZP, plánu organizace výstavby a stanovení možných rizik výstavby.

Předmětem plnění (dále také „předmět díla“) dle této smlouvy je vypracování studie obsahující zaměření a zakreslení stávajícího stavu, zjištění a identifikaci aktuálních a dlouhodobých energetických parametrů, hodnot a spotřeb energií, které zhotovitele zpracuje v nezbytných podrobnostech za účelem stanovení vhodnosti projektu a plnění podmínek pro získání podpory z Operačním programem Životní prostředí pro období 2021-2027 – dle výzvy č.63 - Energetické úspory ve veřejné infrastruktuře, dále posouzení dispozice, gastro vybavení a zařízení v rozsahu nezbytném pro objektivní zpracování dokumentace a odhad nákladů na realizaci. Z tohoto posouzení budou vycházet minimálně 2 návrhy (varianty) dispozičního řešení včetně stavebních úpravy a udržovacích prací v souladu s požadavky platné legislativy zejména KHS, HZS včetně nového rozmístění vybavení. Z těchto variant bude vybráno finální řešení pro zpracování PD.

Posouzení dispozice, gastro vybavení a zařízení budou obsahovat i zhotovitelem zpracovanou zprávu ohledně kompletního stávajícího vybavení, posouzení využitelnosti stávajícího zařízení kuchyně a začlenění použitelného vybavení do návrhu vybavení kuchyně, včetně odborného popisu zdůvodňujícího, proč nelze dané vybavení dále používat, jako podklad pro vyřazení daného majetku.

Mimo jiné bude předmět díla obsahovat:

- zaměření a zakreslení stávajícího stavu v rozsahu nezbytném pro objektivní zpracování projektové dokumentace, odhad nákladů na realizaci, provedení minimálně 2x návrh/varianta provedení dispozičního řešení a vybavení a posouzení vhodnosti projektu pro čerpání pro získání podpory z Operačním programem Životní prostředí pro období 2021-2027.
- návrh dispozičního řešení a stavebních úprav v souladu s požadavky plané legislativy a KHS,
- návrh vybavení kuchyně (spotřebiče, vybavení – stoly, pulty, police, regály, ...), posouzení využitelnosti stávajícího zařízení kuchyně a začlenění použitelného vybavení kuchyně do návrhu vybavení kuchyně,
- návrh materiálového a barevného řešení obkladů, dlažeb, podlahových krytin;
- kompletní úpravy technického zařízení budovy zejména úpravy vody, kanalizace, elektro a slaboproudu, odvětrání, topení atd.
- součástí elektroinstalace bude výpočet denního a umělého osvětlení,

- požárně bezpečnostní řešení,
- inženýrská činnost - projednání projektové dokumentace včetně zajištění kladných vyjádření s dotčenými orgány (KHS, HZS,...), se správcí inženýrských sítí, s vlastníky dotčených pozemků, apod. včetně zapracování připomínek objednatele a uživatele školy.
- rozpočet a výkaz výměr,
- projednání a písemné odsouhlasení navržených úprav a vybavení kuchyně se zástupcem objednatele a uživatele.

Součástí zpracování PD bude i zajištění veškerých nutných průzkumů nad rámec poskytnutých podkladů (i geodetické zaměření, digitalizace a doměření podkladů, stavebně technický průzkum, statický průzkum atd.).

1. Předmět díla je rozdělen na následující části:

- a) Zpracování **studie** (bude zpracován min 2 návrhy dispozice, které bude pravidelně konzultován a upravován dle případných připomínek objednatele, či uživatele, až do finální podoby), včetně inženýrské činnosti včetně projednání navrženého řešení s dotčenými orgány státní správy, samosprávy, uživatelem a s vlastníky či správcí inženýrských sítí technického vybavení, včetně zpracování 2 vizualizací interiéru, odhad nákladů na realizaci a posouzení vhodnosti projektu pro čerpání pro získání podpory z Operačním programu Životní prostředí pro období 2021-2027 na podkladu vypracovaného Odborného technického, celkového posouzení bilance spotřeby energie včetně výpočtu prokazující splnění či nesplnění podmínek pro získání podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2021-2027.
- b) **Zpracování energetického posudku (EP)** dle vyhlášky č. 141/2021 Sb., o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie, zpracovaný energetickým specialistou s příslušným oprávněním podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění.
- c) Vzhledem k záměru objednatele žádat o spolufinancování díla z operačního programu Životního prostředí 2021-2027, Opatření 1.1.2 - Snížení energetické náročnosti/zvýšení účinnosti technologických procesů, je zhotovitel povinen poskytnout potřebnou **součinnost objednateli při získávání těchto dotací a dále je povinen zpracovat potřebnou technickou část dokumentace v podobě a podrobnostech potřebných ke zpracování a podání žádosti o dotaci.** Pokud budou v průběhu prací vydány poskytovatelem dotací aktualizovaná pravidla, je zhotovitel se při zpracování díla řídit těmito aktualizovanými dokumenty.
- d) Zpracování projektové **dokumentace pro povolení stavby** podle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, vydané Ministerstvem pro místní rozvoj podle § 333 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 152/2023 Sb. k provedení § 158 odst. 5 a § 166 odst. 4 zákona včetně položkového rozpočtu, včetně realizace související inženýrské činnosti a získání pravomocného stavebního povolení případně jiných opatření vydaných dle zákona č. 283/2021, stavební zákon (dále jen „stavební zákon“) nezbytných k realizaci stavby v rozsahu projektu.
- e) Zpracování projektové **dokumentace pro provádění stavby** podle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb vydané Ministerstvem pro místní rozvoj (dále i jen „vyhláška“) podle § 333 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 152/2023 Sb. k provedení § 158 odst. 5 a § 166 odst. 4 zákona, včetně jednotlivých profesí a spolupráce při výběru dodavatele, zpracování projektové dokumentace interiérů a vybavení (**PD interiérů a**

vybavení), včetně podrobného položkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – členění do jednotlivých položek s výkazem výměr. Součástí zpracované dokumentace pro provádění stavby bude část – zpracování plánu zdolávání požáru, plánu POV a BOZP a stanovení možných rizik z provádění stavebních prací včetně situačních výkresů atd. a součástí této dokumentace budou koordinační výkresy jednotlivých profesí.

- f) Předmětem veřejné zakázky je dále také poskytnutí součinnosti zadavateli při přípravě a realizaci zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce, dodávky a výkonu činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rámci příslušné stavby. Jedná se vždy o minimálně tři samostatná zadávací či výběrová řízení. Předmětem činnosti dodavatele v rámci plnění této části veřejné zakázky je příprava odpovědí na žádosti o vysvětlení projektové dokumentace a kontrola předmětných částí nabídek a zajištění dozoru projektanta na stavbě.

g) **Dozor projektanta.**

2. Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby, PD interiérů a vybavení a bude k nim vypracován soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to v souladu s požadavky vyhlášky č. 169/2016., Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. Soupis bude vypracován v podobě oceněného a neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr jednotlivých položek pro jednotlivé PD. Ocenění položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb bude provedeno za použití aktuální platné cenové soustavy (např. ÚRS Praha) v době předání PD. S ohledem na skutečnost, že předmětem díla je zpracování projektové dokumentace ke stavebním pracím včetně projektu interiérů a vybavení (viz výše) bude projektová dokumentace včetně soupisu prací vyhotovena tak, aby bylo možné oddělit pro samostatná zadávací (výběrová řízení) na zhotovitele stavby a dodávky či služby, přičemž soupisy prací pro stavební práce a dodávky či služby budou zpracovány jako samostatné soubory.
3. Předmětem plnění je i kompletní zajištění inženýrské činnosti včetně získání vyjádření dotčených orgánů a jejich zapracování do dokumentace pro provádění stavby a případné získání stavebního povolení. Rozsah a obsah projektové dokumentace bude zpracován v souladu s aktuálně platnou vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb a aktuálně platnou legislativou v době zpracování PD.
4. Předmětem díla je rovněž zajištění veškerých nutných průzkumů, měření nad rámec poskytnutých podkladů (doměření stávajícího stavu, digitalizace a doměření podkladů, stavebně technický průzkum, statický průzkum, projednání se správci sítí atd.), jsou-li k řádné realizaci nezbytná a účelná.
5. Projektové dokumentace budou vždy vypracovány v takové podobě a podrobnostech, aby na jejich základě byla získána všechna potřebná povolení příslušných správních orgánů k vlastní realizaci a trvalého užívání stavby (předmětu PD). Potřebný rozsah a podobu PD bude dodavatel konzultovat s příslušnými správními orgány.

6. Objednatel požaduje v průběhu zpracování návrhu osobní konzultace zpracovatele s objednatelem a uživatelem v potřebné míře směřující k úspěšnému plnění díla – minimálně jedenkrát za 14 dní, případně častěji na vyzvání objednatele. Místo a termín konání těchto konzultací určí zadavatel nejméně tři pracovní dny před konáním konzultace.
7. Objednatel dále požaduje, aby projektová dokumentace byla zpracována s maximálním využitím recyklace a smysluplného využití stavebních a demoličních odpadů, v souladu s Metodickým návodem na řízení vzniku stavebních odpadů a pro nakládání s nimi, který zpracovalo Ministerstvo životního prostředí.
8. Projektová dokumentace bude dále zpracována v souladu se Zásadami cirkulární ekonomiky při projektování budov, které vydala v roce 2020 Evropská komise. Zpracovatel dokumentace bude navrhovat řešení také z hlediska zvažování nákladů a přínosů budovy, zvažování různých variant řešení projektu s ohledem na dopady a přínosy zejména pro životní prostředí a sociální oblast, nebo návrhu k použití materiálů, jež jsou snadno recyklovatelné.
9. Součástí zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby bude vypracování plánů POV, ZOV (textová i výkresová část) a plánu BOZP, plánu požárně bezpečnostního řešení a stanovení možných rizik výstavby. Dále bude součástí inženýrská činnost související se zajištěním kladných vyjádření DOSS a zajištěním pravomocného stavebního povolení, pokud bude požadováno ze strany stavebního úřadu.
10. Výsledná podoba PD musí odpovídat jejímu účelu, ustanovením této smlouvy včetně jejích příloh, pokynům objednatele a být v souladu s platnými právními předpisy a s platnými ČSN v částech závazných i doporučujících.
11. V poslední fázi je součástí předmětu i výkon dozoru projektanta do doby konečného předání všech stavebních prací, dodávek a služeb předpokládaných projektovou dokumentací a do kolaudace vlastní stavby realizované na základě zpracované projektové dokumentace. Součástí plnění bude dále zajištění i všech výslovně neuvedených posudků, měření a vyjádření, bude-li to vzhledem k postupu zpracování projektové dokumentace účelné nebo nutné.
12. Vzhledem ke skutečnosti, že dílo bude sloužit jako podklad pro navazující zadávací řízení na zhotovitele stavby, zavazuje se zhotovitel spolupracovat s objednatelem při zpracování zadávací dokumentace průběžně a pravidelně, zejména pak v rámci zpracování dodatečných informací (vysvětlení zadávací dokumentace) a posouzení nabídek v rámci hodnocení veřejné zakázky.
13. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v rozsahu a za podmínek v této smlouvě stanovených a v souladu s veškerými právními předpisy, které se k předmětu díla vztahují.
14. Zhotovitel se zavazuje realizovat i ty činnosti, které nejsou výslovně v této smlouvě

specifikovány, avšak zhotovitel jako osoba s příslušnou odborností o těchto činnostech věděl či vědět měl.

15. **Objednatel upozorňuje, že v žádné části dodavatelem zpracované projektové dokumentace nesmí být uveden žádný přímý nebo nepřímý odkaz na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu. Porušením této povinnosti by mohlo dojít ke zvýhodnění nebo znevýhodnění určitých dodavatelů nebo výrobků.** Takový odkaz lze použít pouze v případě, pokud stanovení technických podmínek prostřednictvím parametrů vyjadřujících požadavky na výkon nebo funkci, popisu účelu nebo potřeb, které mají být naplněny, nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné. U každého takového odkazu dodavatel uvede možnost nabídnout rovnocenné řešení.
16. **Součástí dílčího předmětu díla dle tohoto článku jsou i dále uvedené činnosti a podmínky:**
- a) Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení ve smyslu ustanovení § 89 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „ZZVZ“).
 - b) Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „stavební zákon“).
 - c) Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s aktuální platnou vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb a v souladu s aktuálně platnou legislativou v době zpracování PD. Součástí díla je zpracování konečné verze oceněného soupisu prací s výkazem výměr, technických podmínek.
 - d) Projektová dokumentace bude zpracována s ohledem na požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb v souladu s aktuálně platnou vyhláškou a s aktuálně platnou legislativou v době zpracování PD.
 - e) Projektová dokumentace bude obsahovat kompletní dokladovou část, odpovídající danému stupni projektové dokumentace, a bude obsahovat veškerá potřebná a platná vyjádření a rozhodnutí příslušných orgánů a organizací pověřených výkonem státní správy a ostatních účastníků správních řízení včetně správců inženýrských sítí (tras technické infrastruktury).
 - f) Dále bude projektová dokumentace zpracována dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. Technické podmínky stavby budou v souladu s aktuálně platnou vyhláškou č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu a aktuálně platnou legislativou v době zpracování PD, s předpisy a normami České republiky a Evropských společenství v oblasti výstavby a stavebnictví. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s platnými zákony, vyhláškami a normami.

- g) Zajištění veškerých nutných průzkumů nad rámec poskytnutých podkladů a nad rámec předmětu plnění (i doměření stávajícího stavu, hydrogeologický průzkum atd.), jsou-li k řádné realizaci díla nezbytné.
- h) Kompletní zajištění relevantní inženýrské činnosti a získání všech potřebných vyjádření, stanovisek včetně úhrady všech poplatků, bude-li to během realizace díla nezbytné.

Činnosti a podmínky spojené s navazujícím zadávacím řízením na dodavatele stavby

Zhotovitelem zpracovaná projektová dokumentace DPS bude použita jako podklad k zadávacímu řízení veřejné zakázky na zhotovitele vlastní stavby. Zhotovitel poskytne objednateli součinnost při přípravě zadávacího řízení na dodavatele vlastního předmětu projektové dokumentace, včetně případných odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace a spolupráce při posuzování a hodnocení nabídek při výběru zhotovitele vlastní stavby.

Součinnost zhotovitele v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky spočívá zejména v:

- součinnosti při zpracování zadávacích podmínek zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky na realizaci předmětného plnění;
- vypracování návrhu technických částí odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu § 98 zákona o zadávání veřejných zakázek, v rozsahu předmětu plnění; zhotovitel odešle návrh odpovědi objednateli, případně osobě objednatelem určené, **ve lhůtě 2 pracovních dnů** od výzvy k vypracování návrhu odpovědí; výzvu dle tohoto ustanovení je oprávněn učinit objednatel, případně osoba objednatelem určená; k řádnému učinění výzvy postačí e-mailová forma;
- kontrola nabídek uchazečů podaných objednateli v zadávacím řízení příslušné veřejné zakázky na realizaci předmětu díla; v rámci kontroly dle tohoto ustanovení provede zhotovitel posouzení nabídek v podrobnostech výkazu výměr; posouzení, zda nabídka uchazeče obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve smyslu § 113 zákona o zadávání veřejných zakázek; posouzení splnění technických podmínek stanovených zadávacími podmínkami příslušného zadávacího řízení;
- zpracování aktualizace dokumentace (včetně aktualizace neoceněného a oceněného výkazu výměr) v rámci dotazů a zapracování případných oprav v PD – dodavatel u každé změny vždy vypracuje aktuální seznam s vyznačením změn a upraví a předloží opravené výkresy; při přidávání položek dodavatel vždy zachová číslování původních položek.

Další podmínky

- Projektová dokumentace (DPS a PD interiérů a vybavení) bude obsahovat oceněný a neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr jednotlivých položek ve formátu *.xls, nebo *.xlsx (MS Excel). V soupisu stavebních prací, dodávek a

služeb včetně výkazu výměr jednotlivých položek nesmí být uvedeny soubory a komplety vyjma situace dále uvedené.

- Soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr jednotlivých položek, podepsaný autorizovaným projektantem, členěný podle jednotného ceníku stavebních prací v cenové úrovni platné v době odevzdání příslušné části PD, ve formě oceněného soupisu prací (musí vždy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ použité cenové soustavy ve tvaru "rok typ cenové soustavy", tj. např. "CS ÚRS 2024" Dále dokládá jeho elektronickou podobu ve formátu XML – jedná se o otevřený elektronický formát, který umožňuje transfery dat a jejich zpracování různými softwarovými programy a splňuje tak veškeré požadavky vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů a je volně dostupný.
- V odůvodněných případech a po výslovném schválení objednatelem pro každou jednotlivou položku může zhotovitel v položkovém rozpočtu uvést položky charakteru soubor nebo komplet, v takovém případě musí projektant k použitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Pro položky v rozpočtech projektu interiéru a vybavení bude ke každé položce doložen průzkum trhu (minimálně 3 nabídky). Součástí položkového rozpočtu stavby budou jednotkové ceny stavebních prací, uvedené v cenové soustavě. Pokud je jednotková cena, uvedená projektantem, vyšší než jednotková cena, uvedená v cenové soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit. Výstupem specifikace souborů/kompletů či vysvětlení vyšší jednotkové ceny položek je naskenovaný dokument opatřený podpisem autorizovaného projektanta. K položkovému rozpočtu bude doloženo prohlášení projektanta o cenové úrovni jednotlivých položek rozpočtu.
- **Výkaz výměr** projektové dokumentace bude obsahovat vymezení druhu, jakosti a množství požadovaných prací, dodávek, činností a služeb potřebných k plnění a bude podkladem pro zpracování nabídky na zhotovení stavby a pod popisem položky bude obsahovat podrobný postup výpočtu množství měrných jednotek. Výkaz výměr bude u jednotlivých položek obsahovat vzorce výpočtu, přičemž u neoceněného výkazu výměr budou vzorce zneviditelněny pomocí uzamčení, tak aby bylo možné upravit pouze jednotkové ceny jednotlivých položek výkazu výměr. Zároveň budou jednotlivé listy výkazu výměr vzájemně provázány součtovými vzorci, tak aby celkový souhrnný list odpovídal součtu položek všech jednotlivých listů výkazu výměr. Výkaz výměr projektové dokumentace bude součástí všech vyhotovení projektové dokumentace. Projektová dokumentace bude obsahovat oceněný a neoceněný položkový rozpočet nákladů stavby ve formátu XLS nebo XLSX (MS Excel) nebo Kros, a dále ve formátu PDF včetně razítka.
- Každá z použitých položek musí obsahovat jednoznačný slovní popis včetně podrobné specifikace s odkazem do výkresové dokumentace, z něhož budou patrné parametry položky a charakter a druh požadovaných prací a dodávek, aby umožnily výběr z nabídky na trhu; dále budou položky obsahovat měrnou jednotku a požadované množství.
- Pokud dojde v rámci pozdější úpravy položkového rozpočtu (například v rámci

dodatečných informací) k doplnění soupisu prací o novou položku, je nutné zachovávat původní číslování položek, a tedy, pokud vzejde nová položka, musí jí být přiděleno takové číslo položky (tj. číslo na konci číselné řady), aby nedošlo k přečíslování ostatních.

- Ve výkazu výměr a projektové dokumentaci nesmí být uveden přímý či nepřímý odkaz na určité dodavatele či výrobky, nebo patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu (dále jen specifické označení), mající vztah k jednomu dodavateli. Pokud jsou ve VV nebo PD stanoveny technické podmínky prostřednictvím odkazu na normy nebo technické dokumenty, bude u každého takového odkazu uvedena možnost nabídnout rovnocenné řešení. Pokud zhotovitel uvedené povinnosti poruší, bez ohledu na to, kdy toto porušení objednatel zjistí, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý případ použití specifického označení, nebo odkazu bez možnosti rovnocenného řešení, a zároveň nahradit objednateli škodu, která mu tímto porušením povinnosti zhotovitele vznikne. Zhotovitel může u specifického označení prokázat, že konkrétní materiál, výrobek či službu nelze upřesnit jinak, než použitím specifického označení, je povinen na tuto skutečnost objednatele vždy písemně upozornit a vždy uvést u příslušného specifického označení hlavní a rozhodující technické parametry – rozměry, hmotnost, hluk, výkon, apod. a zároveň uvést jasně a viditelně ve všech předmětných částech projektové dokumentace upozornění, že pokud jsou v projektové dokumentaci, nebo jejích přílohách, odkazy na obchodní firmy, názvy, specifická označení zboží nebo služeb, mající vztah k jednomu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládaného standardu a autor dokumentace výslovně prohlašuje, že je pro realizaci vlastního předmětu možné použití i jiných, kvalitativně a technicky srovnatelných řešení a výrobků.
- Pro potřeby objednatele bude v jednom provedení oceněného výkazu výměr uvedena i přesná specifikace příkladů odpovídajících výrobků či materiálů, s uvedením výrobce pro kontrolu navržených standardů.
- Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr DPS a PD interiérů a vybavení s celkovou cenou s DPH a bez DPH bude doložen v prvním vyhotovení PD (paré č. 1). Ocenění položkového rozpočtu objednatel požaduje dle aktuálního ceníku URS s maximální zatříděním stavebních a montážních položek dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací (TSKP).

Forma vyhotovení

- Studie stavby bude předána ve 3 (třech) vyhotoveních v tištěné formě. Projektová dokumentace ve stupni DPS a PD interiérů a vybavení bude předána v 6 (šesti) vyhotoveních v tištěné formě, , ostatní stupně PD budou předány ve 4 (čtyřech) tištěných vyhotoveních a dále v každém stupni bude PD ve 3 (třech) vyhotoveních v digitální formě na přenositelném médiu, např. na CD/DVD, FlashDisk s výstupem USB A, či obdobném datovém nosiči ve formátu *.pdf, *.xls popř. v dalších nutných formátech. Digitální forma projektové dokumentace bude seříděna ve stejném členění jako tištěná forma projektové dokumentace s dodržením názvů a číslováním výkresů. Elektronická verze bude dále poskytnuta v digitálním formátu umožňující editaci jednotlivých výkresů, např.: *.dwg formát. Projektová dokumentace bude vždy označena pořadovým číslem daného výtisku,

stejným pořadovým číslem budou rovněž označeny výtisky jednotlivých výkresů, technické zprávy, výpočty, výkazy výměr a všechny ostatní doklady tvořící projektovou dokumentaci.

Kompletní cesta v adresním řádku k veškerým souborům (názvy složek a souborů) u předané projektové dokumentace v elektronické podobě **nesmí přesáhnout maximální počet 180 znaků**.

Všechny stupně a všechna paré předávané projektové dokumentace dle čl. 5 odst. 1 včetně jednotlivých výkresových a textových částí budou opatřeny příslušným autorizačním razítkem a vlastnoručním podpisem oprávněného zpracovatele projektové dokumentace v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž soupis stavebních prací, dodávek a služeb a výkaz výměr budou opatřeny autorizačním razítkem a vlastnoručním podpisem oprávněného zpracovatele.

Inženýrská činnost

- V případě potřeby jednání s dotčenými orgány a účastníky řízení, jehož výsledkem musí být bezrozporná kladná stanoviska k navrženému projektovému řešení.
- V případě potřeby podání návrhu na vydání stavebního povolení a inženýrská činnost spojená s vydáním stavebního rozhodnutí příslušné úrovně, tj. jednání s úřady a dotčenými orgány ohledně výstavby, vyřízení všech stanovisek ke stavebnímu povolení a následně i získání pravomocného rozhodnutí.
- V případě potřeby je zhotovitel povinen podat žádost o vydání stavebního rozhodnutí příslušné úrovně a předat v termínu objednateli kompletní složku s žádostí o stavební povolení potvrzené stavebním úřadem včetně všech příloh této žádosti dle aktuálně platných vyhlášek a aktuálně platné legislativy v době zpracování PD a kladných závazných stanovisek dotčených orgánů.
- Veškerá rozhodnutí musí být vystavena na objednatele (investora), případně na jiný subjekt dle pokynů objednatele. Všechna rozhodnutí musí být opatřena doložkou o nabytí právní moci.
- K činností dle této smlouvy, bude-li to potřebné, bude zhotoviteli na jeho žádost objednatelem udělena plná moc v potřebném rozsahu.
- Obstarání všech potřebných vyjádření včetně úhrady všech poplatků, bude-li to během realizace díla nezbytné.
- Součástí činnosti dle tohoto odstavce je i zajištění prodloužení stavebního povolení v případě nezačínání stavby v termínu platnosti stavebního povolení, a to v dostatečném předstihu.

Celkový rozsah inženýrské činnosti je určen platnou a účinnou právní úpravou ČR a obsahem inženýrské činnosti dle tohoto odstavce je zajištění všech dokladů a pravomocných rozhodnutí nutných k završení činnosti včetně nabytí právní moci. Inženýrská činnost zahrnuje projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy, samosprávy, formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč.

doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání předmětných rozhodnutí, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony.

Součástí dílčího předmětu díla dle čl. 5, odst. 1 písm. a) jsou dále uvedené činnosti a podmínky:

- a) Investiční záměr – studie musí splňovat minimální požadavky uvedené v Příloze písmene b) této smlouvy, pokud objednatel neurčí jinak.
- b) V prvotní fázi studie zhotovitel předloží min. 2 návrhy dispozice, které bude pravidelně konzultovat a upravovat dle případných připomínek objednatele, či uživatele. Návrh odsouhlasený objednatelem, bude podkladem pro vypracování konečné studie.
- c) Zhotovitel zajistí zpracování studie architektem/autorizovaným inženýrem (technikem), popřípadě jinými specialisty, zahrnující textovou část, výkresovou část (situace, koordinační situace, půdorysy, řezy a interiérové vizualizace, , návrh etapizace a časového harmonogramu, propočet investičních nákladů (vlastní stavba + vybavení), specifikace potřebných podkladů a průzkumů.
- d) Zhotovitel si v rámci plnění zajistí zaměření stávajícího stavu, vypracování dokumentace stávajícího stavu včetně ověření stávajících provozů, , dále obsahem studie bude i statické posouzení objektu za účelem proveditelnosti stavby, provozního, dopravního a funkčního řešení, představa o použitých materiálech, vliv na okolní zástavbu, zhodnocení širších vztahů, ověření kapacit přípojek médií (vodovod, kanalizace, topení, elektro atd.), koncepce technologického (výtahy), gastro a interiérového vybavení včetně barevného řešení.
- e) Součástí bude i zajištění potřebné konzultace s dotčenými orgány a organizací státní správy a samosprávy, vlastníků či správců sítí technického vybavení.
- f) Zpracovaná studie bude podkladem pro zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a dokumentace pro provedení stavby.
- g) Studie bude zpracována v souladu s platnými právními předpisy a s platnými ČSN v částech závazných i doporučujících.
- h) Studie bude obsahovat odhad nákladů na realizaci a posouzení vhodnosti projektu pro čerpání pro získání podpory z Operačním programu Životní prostředí pro období 2021-2027 na podkladu vypracovaného Odborného technického, celkového posouzení bilance spotřeby energie včetně výpočtu prokazující splnění či nesplnění podmínek pro získání podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2021-2027.
- i) Studie dále bude obsahovat zjištění předpokládané ceny stavby a souvisejících nákladů, na jejímž základě dojde k následnému zpracování podrobného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb v rámci dalších stupňů projektové dokumentace. Propočet investičních nákladů vyplývající ze studie bude závazný i pro navazující stupně projektové dokumentace. Zhotovitel bude povinen doložit v rámci každého navazujícího stupně projektové dokumentace, že byly deklarované investiční náklady stavby dodrženy. Pro vyloučení pochybností strany uvádějí, že zhotovitel neporuší smlouvu, pokud dojde k překročení propočtu investičních nákladů ze studie v důsledku nových pokynů objednatele nebo vlivem inflace.
- j) Součástí díla v průběhu zpracování studie jsou osobní konzultace zhotovitele s objednatelem a

s uživatelem objektu směřující k úspěšnému plnění díla. Zhotovitel bude informovat objednatele o průběhu prací na studii a technickém řešení průběžně, **minimálně 1x7 dní** formou svolání tzv. výrobních výborů. Zhotovitel vždy aspoň 2 pracovní dny před termínem konání odešle objednateli písemnou pozvánku, která bude obsahovat informaci o předmětu jednání. Zhotovitel vždy vyhotoví záznam z jednání, který bude součástí studie. V případě rozdílných názorů o technickém řešení rozhodne objednatel v souladu s obecně závaznými právními předpisy a technickými normami.

- k) Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřipustnost podkladových materiálů, pokynů, věcí, které mu byly předány objednatelem, a/nebo objednatelem požadovaných změn. V případě, že objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele, trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu.

Součástí dílčího předmětu díla dle čl. 5, odst. 1, písm. g) jsou dále uvedené činnosti a podmínky:

- a) Dozor projektanta během realizace.
- b) Poskytování vysvětlení potřebných k vypracované dokumentaci.
- c) Účast na odevzdání staveniště zhotovitelem
- d) Účast na kontrolních dnech stavby 1x za týden během realizace stavby nebo po dohodě podle potřeb objednatele.
- e) Účast na kontrolních prohlídkách stavby, požadovaných příslušným stavebním úřadem.
- f) Dohled nad dodržáním projektové dokumentace s přihlédnutím k podmínkám určeným územním rozhodnutím, stavebním povolením a s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby. Zjistí-li zhotovitel při výkonu AD nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti objednatele. Zhotovitel uvědomí dodavatele stavby v případě nebezpečí z prodlení. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení projektové dokumentace a tomu odpovídající důsledek.
- g) Posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky od objednatelem schválené projektové dokumentace, spolupráce na přípravě podkladů ke kolaudačnímu řízení včetně posuzování návrhů účastníků výstavby na změny a odchylky projektové dokumentace z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, lhůt a postupu výstavby včetně poskytování vyjádření k případným požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové dokumentaci.
- h) Po odsouhlasení změny zhotovitel PD do 14 dnů zpracuje výkaz výměr včetně jeho ocenění a podpisem změnového listu dodavatele stavby vyjádří svůj souhlas.
- i) Odsouhlasení vzorků předložených zhotovitelem.
- j) Sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby.
- k) Spolupráce s koordinátorem BOZP a TDS.
- l) Účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení.

- m) Účast na kontrolní prohlídce stavby (dále také „KPS“) a závěrečné prohlídce stavby (dále také „ZKPS“), součinnost při vydání kolaudačního rozhodnutí včetně účasti na jednání v kolaudačním řízení.
- n) Spolupráce při zajišťování požadavků poskytovatele dotace v průběhu výstavby a pro potřeby závěrečného vyhodnocení akce.
- o) Zpracování detailů a změn projektové dokumentace k odstranění odchylek mezi prováděním plnění a projektovou dokumentací, na základě požadavků objednatele i dodavatele stavby dopracování detailů konstrukcí neobsažených v projektové dokumentaci, dále zpracování změn projektové dokumentace na základě skutečností zjištěných při realizaci předmětu projektové dokumentace a na základě požadavků objednatele včetně kladného písemného projednání s dotčenými orgány veřejné správy a stavebním úřadem tj. zajištění případného povolení změny stavby před jejím dokončením. Schvalování podkladů pro zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.
- p) Příprava podkladů pro případná změnová řízení, pokud se týkají projektové dokumentace.
- q) V případě účasti na kontrolních prohlídkách stavby požadovaných stavebním úřadem, účasti na předání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení a účasti na jednání v kolaudačním řízení, bude zhotovitel informovat objednatele o postupu prací. Na těchto kontrolních dnech musí být přítomen vedoucí projektového týmu nebo jím pověřená osoba, která bude oprávněna činit závazné závěry.
- r) Objednatel zajistí pro zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného dozoru projektanta, v tomto smyslu zejména oznámí zhotovitele jako osobu vykonávající dozor projektanta dodavateli stavby a zajistí, aby zhotovitel dostával potřebné podklady týkající se realizace stavby a kontrolních dnů na stavbě.

Výkon dozoru projektanta je vyžadován a stručně upravován právním řádem České republiky, zejména § 161 odst. 2, 164 odst. 2, 169 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

- 17. Součástí předmětu díla jsou dále všechny činnosti výše neuvedené, které vyplývají z charakteru díla a z účelu této smlouvy.
- 18. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy se řádně seznámil s poklady blíže specifikovanými v této smlouvě, jakož i se všemi skutečnostmi mající vliv na řádné a včasné provedení díla, prověřil si místní podmínky místa budoucího provedení stavby a prohlašuje, že tyto podmínky jsou pro provedení díla dostačující a vyjasnil si veškeré otázky ohledně realizace díla a nejsou mu známy žádné skutečnosti, které by byly důvodem navýšení ceny díla.
- 19. Zhotovitel provede průběžnou konzultaci přípravy projektové dokumentace (vyjma studie) s objednatelem a zástupcem uživatele objektu, a to minimálně jedenkrát za každých čtrnáct dní, případně častěji na vyzvání objednatele. Zhotovitel se zavazuje zpracovat všechny požadavky objednatele, vyplývající z provedených konzultací, pokud nebudou v rozporu s platnými právními předpisy. O konečném řešení v případě rozdílných názorů rozhodne objednatel v souladu s obecně závaznými předpisy a technickými normami. Konzultace proběhnou v sídle objednatele nebo v objektu Gymnázia Dobruška, požadavek na místo konání navrhne objednatel. Objednatel oznámí

konání konzultace vždy alespoň jeden týden předem. Objednatel zajistí patřičné prostory. Zhotovitel není povinen provést konzultaci dle tohoto ustanovení v případě, že objednatel písemně označí její konání za nadbytečné. Na těchto kontrolních dnech musí být přítomen vedoucí projektového týmu nebo jím pověřená osoba, která bude oprávněna činit závazné závěry.

Článek 6 Termíny plnění

1. Zhotovitel zahájí plnění díla dle této smlouvy na základě výzvy objednatele, přičemž na základě této výzvy zpracuje zhotovitel dílo dle článku 5 odst. 1 písm. a) až f) a předá ho v požadovaném počtu vyhotovení objednateli. Výzva ve smyslu tohoto ustanovení může být učiněna osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických a věcech plnění a musí být učiněna písemnou formou. Za písemnou formu se považuje i e-mail.
2. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:
 - a) **Předání studie -návrhu dispozičního řešení kuchyně** - do 8 týdnů od výzvy k zahájení plnění (výzva č.1)
 - b) **Zpracování EP** - do 8 týdnů - na výzvu objednatele (výzva č.2)
 - c) **Poskytování součinnosti objednateli při získávání dotací** - na výzvu objednatele (výzva č.3)
 - d) **Předání dokumentace pro povolení stavby** vč. zpracování a podání žádosti o vydání stavebního povolení vč. zajištění kladných stanovisek dotčených orgánů státní správy a vlastníků dotčených pozemků, zpracování rozpočtu investičních nákladů stavby - do 10 týdnů od předání Studie.
 - e) **Předání dokumentace pro provádění stavby ke kontrole** včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a rozpočtu v aktuální cenové úrovni do 6 týdnů od podání žádosti o vydání stavebního povolení.
 - f) **Poskytování součinnosti v navazujících zadávacích řízeních** - na výzvu objednatele (výzva č.4)
 - g) **Dozor projektanta** - na výzvu objednatele (výzva č.5), od zahájení stavebních prací do ukončení a předání všech dodávek, služeb a stavebních prací, předpokládaných příslušnou projektovou dokumentací a do dne vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí v případě, že bude pro danou stavbu relevantní nebo do dne převzetí předmětné stavby objednatelem bez vad a nedodělků

Dokončení plnění:

po dokončení a předání všech dodávek, služeb a stavebních prací, předpokládaných příslušnou projektovou dokumentací a po kolaudaci vlastní stavby, realizované na základě zpracované PD.

3. Realizaci díla dle článku 5 odst. 1 písm. b) a c) smlouvy zahájí zhotovitel vždy pouze na základě písemné výzvy objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace předmětné části díla závisí na výsledku energetického posouzení vhodnosti projektu pro čerpání pro získání podpory z Operačním programem Životní prostředí pro období 2021-2027. Objednatel si vyhrazuje právo zaslat výzvu k realizaci části díla dle věty první tohoto odstavce i v případě, že objekt nebude naplňovat podmínky dle věty třetí tohoto odstavce, a to v případě, že objednatel shledá realizaci dotčené části díla jako účelnou pro další využití v rámci jiného dotačního programu či pro jiné účely. Nevyzve-li

objednatel zhotovitele k plnění ve smyslu tohoto odstavce do tří (3) let od uzavření této smlouvy, zanikají smluvním stranám všechna práva a povinnosti ve vztahu k předmětné části předmětu plnění. Realizaci díla dle článku 5 odst. písm. f a g) smlouvy zahájí zhotovitel vždy pouze na základě písemné výzvy objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace předmětných částí díla závisí na výsledku navazujících zadávacích řízení veřejných zakázek a zajištění finančních prostředků na jejich realizaci. Nevyzve-li objednatel zhotovitele k plnění ve smyslu tohoto odstavce do tří (3) let od uzavření této smlouvy, zanikají smluvním stranám všechna práva a povinnosti ve vztahu k předmětné části předmětu plnění.

4. Objednatel má právo písemně oznámit zhotoviteli **pozastavení prací na projektové dokumentaci**. Zhotovitel je povinen na změnu termínu zpracování projektové dokumentace přistoupit. Termíny plnění dle odst. 2 se v takovém případě stavějí a počínají běžet dnem doručení žádosti objednatele o opětovné zahájení prací.
5. Zhotovitel může **požádat o přerušování prací** v případě, že nebude vydáno kladné stanovisko dotčeného orgánu státní správy (dále také "DOSS"), ovšem ne z důvodu pochybení na straně zhotovitele projektové dokumentace.
6. V případě, že stavební povolení bude vydáno později, než je termín dokončení DPS dle článku 6 odst. 2 této smlouvy, tak se termín dokončení prodlužuje o dobu stanovenou objednatelem tak, aby všechny připomínky ze stavebního povolení mohly být do této projektové dokumentace dodatečně zhotovitelem zpracovány.

Článek 7

Cena díla

1. Cena za realizaci předmětu díla dle této smlouvy je sjednána pro celý rozsah plnění jako cena pevná a nejvýše přípustná a její změny jsou možné pouze způsobem, uvedeným v této smlouvě. Cena díla obsahuje úhradu za realizaci veškerých činností uvedených v čl. 5 smlouvy.
2. Celková cena za realizaci předmětu díla je vzhledem k dále uvedenému rozsahu dílčích částí následující:

- a) cena za realizaci předmětu díla dle článku 5 odst. 1 písm. a) (**zpracování studie**) činí:

cena bez DPH	50.000,- Kč
DPH samostatně	10.500,- Kč
cena s DPH	60.500,- Kč

- b) cena za realizaci předmětu díla dle článku 5 odst. 1 písm. b) (**zpracování energetického posudku (EP) dle vyhlášky č. 141/2021 Sb.)** činí:

cena bez DPH	70.000,- Kč
DPH samostatně	14.700,- Kč
cena s DPH	84.700,- Kč

- c) cena za realizaci předmětu díla dle článku 5 odst. 1 písm. c) (**součinnost při získávání dotace a**

zpracování technické části dokumentace potřebné ke zpracování a podání žádosti o dotaci)
činí:

cena bez DPH	20.000,- Kč
DPH samostatně	4.200,- Kč
cena s DPH	24.200,- Kč

- d) **cena za realizaci předmětu díla dle článku 5 odst. 1 písm. d) (zpracování dokumentace pro povolení stavby včetně položkového rozpočtu a inženýrská činnost**

činí:

cena bez DPH	205.000,- Kč
DPH samostatně	43.050,- Kč
cena s DPH	248.050,- Kč

- e) **cena za realizaci předmětu díla dle článku 5 odst. 1 písm. e) (zpracování dokumentace pro provádění stavby, včetně profesí, a projektové dokumentace interiérů a vybavení, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb)** činí:

cena bez DPH	280.000,- Kč
DPH samostatně	58.800,- Kč
cena s DPH	338.800,- Kč

- f) **cena za realizaci předmětu díla dle článku 5 odst. 1 písm. f) (součinnost při přípravě a realizaci zadávacích řízení veřejných zakázek, tj. na stavební práce, dodávky, výkon TDS a koordinátora BOZP)** činí:

cena bez DPH	5.000,- Kč
DPH samostatně	1.050,- Kč
cena s DPH	6.050,- Kč

- g) **cena za realizaci předmětu díla dle článku 5 odst. 1 písm. g) (dozor projektanta)** činí:

cena bez DPH	50.000,- Kč
DPH samostatně	10.500,- Kč
cena s DPH	60.500,- Kč

-
- h) **součet dílčích cen výše dle písm. a), b), c), d), e), f) a g):**

cena celkem bez DPH	680.000,- Kč (slovy šestset osmdesát tisíc korun českých)
DPH samostatně	142.800,- Kč
cena s DPH	822.800,- Kč

3. Dohodnutá cena zahrnuje v celém rozsahu veškeré práce a náklady zhotovitele spojené s řádným provedením (přípravou a provedením) díla dle této smlouvy, včetně pojištění veškerých rizik a

vlivů během jeho provádění, poplatků a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s prováděním díla (zejména hotových výdajů, nákladů za komunikaci a jízdného, licence, správních poplatků u úřadů). Cena za provedení díla nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla.

4. Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změnám zákonných sazeb DPH nebo ke změně věcného rozsahu díla vymezeného touto smlouvou z objektivních důvodů ležících na straně objednatele. Úprava se mimo případů změn DPH provede písemným dodatkem k této smlouvě. V případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek uzavřen před zahájením prací zhotovitelem. V případě omezení rozsahu prací požadovaných objednatelem, se sníží cena díla za předpokladu, že zúžení předmětu díla bylo objednatelem uplatněno včas, tj. před zahájením prací na omezeném rozsahu části díla. Jinak má zhotovitel právo i na úhradu účelně vynaložených nákladů na již provedené práce nebo činnosti.
5. Cena za realizaci předmětné části předmětu díla dle článku 5 odst. 1 písm. g) – dozor projektanta je pevná a nebude předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Samotný rozsah realizace části předmětu díla dle článku 5 odst. 1 písm. g) – dozor projektanta závisí na průběhu realizace výsledků navazujících zadávacích řízení veřejných zakázek a zhotovitel na sebe výslovně přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Článek 8

Platební podmínky

1. Objednatel nebude poskytovat na dílo zhotoviteli zálohy.
2. Cenu díla uhradí objednatel na základě faktur zhotovitele vystavených po řádném dokončení, předání a převzetí jednotlivých částí předmětu díla v následujícím členění a následujícím způsobem:
 - a) dílo - Zpracování studie
 - b) dílo - Zpracování energetického posudku (EP)
 - c) dílo - Součinnost při získávání dotace a zpracování technické části dokumentace potřebné ke zpracování a podání žádosti o dotaci
 - d) dílo - Zpracování dokumentace pro povolení stavby, včetně položkového rozpočtu,
 - e) dílo - Zpracování dokumentace pro provádění stavby, včetně profesí a projektové dokumentace interiérů a vybavení, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb,
 - f) dílo - Součinnost při přípravě a realizaci zadávacích řízení veřejných zakázek na stavební práce a výkon TDS a koordinátora BOZP
 - g) dílo – Dozor projektanta

Za řádné dokončení díla se rozumí podpis akceptačního protokolu, kde bude výslovně uvedeno, zda objednatel dílo přijímá.

Zhotovitel má právo vystavit účetní doklad (fakturu) pouze za bezvadně uskutečněné plnění předmětu

smlouvy dle příslušného oddílu, přičemž platí, že:

- a) 100 % ceny díla **dle článku 7 odst. 2 písm. a) zpracování studie** bude zhotoviteli zaplacen po předání studie v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou;
- b) 100 % ceny díla **dle článku 7 odst. 2 písm. b) zpracování EP** bude zhotoviteli zaplacen po předání EP v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou;
- c) 100 % ceny díla **dle článku 7 odst. 2 písm. c) součinnost při získávání dotace a zpracování technické části dokumentace potřebné ke zpracování a podání žádosti o dotaci** bude zhotoviteli zaplacen po předání podkladů a podání žádosti o dotaci, v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou.
- d) 80 % ceny díla **dle článku 7 odst. 2 písm. d) dokumentace pro povolení stavby**, bude zhotoviteli zaplacen po předání příslušného počtu dokumentace pro povolení stavby a po řádném podání žádosti o stavební povolení, a 20 % ceny za tuto část díla bude zhotoviteli zaplacen po nabytí právní moci stavebního povolení či jiného opatření opravňujícího k realizaci stavby dle stavebního zákona a po předání a převzetí příslušného počtu dokumentací bez vad.
- e) 90 % ceny díla **dle článku 7 odst. 2 písm. e) (dokumentace pro provádění stavby a PD interiérů a vybavení)** bude zhotoviteli zaplacen po předání příslušného počtu dokumentace pro provádění stavby a PD interiérů a vybavení v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou, bez vad a nedodělků a po nabytí právní moci stavebního povolení a 10 % ceny této části díla bude zhotoviteli zaplacen po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí. Pokud by objednatel nezapočal s prováděním vlastní stavby, která bude předmětem PD do 12 měsíců od předání dokumentace pro provádění stavby, doplatí zbylých 10 % ceny této části díla bez splnění podmínky podle předchozí věty. Objednatel je oprávněn vyplatit zbylých 10 % ceny této části díla i dříve, rozhodne-li, že nezhájí realizaci předmětu projektové dokumentace ve lhůtě 12 měsíců od předání dokumentace pro provádění stavby.
- f) 100 % ceny díla **dle článku 7 odst. 2 písm. f) součinnost při přípravě a realizaci zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce a výkon TDS a koordinátora BOZP** bude zhotoviteli zaplacen následně po výběru dodavatele a podpisu smlouvy na stavební práce a výkon TDS a koordinátora BOZP, v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou;
- g) **Dozor projektanta** bude hrazen na základě dílčích měsíčních faktur a na základě konečné faktury. Dílčí faktury budou zhotovitelem vystavovány po ukončení každého měsíce, a to na částku rozdělenou poměrově za každý měsíc, nejvýše však do dosažení částky 90 % ceny uvedené v čl. 7 odst. 2 písm. g) a zaslány objednateli vždy nejpozději do 14. dne následujícího měsíce. Jako den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění bude uveden poslední den kalendářního měsíce, v němž vznikl nárok na fakturovanou odměnu. Vystavené faktury musí být odsouhlaseny objednatel. Konečnou fakturu na úhradu zbylé části ceny dle čl. 7 odst. 2 písm. g) je zhotovitel oprávněn vystavit nejprve dne, kdy je možné užívat dokončenou stavbu v souladu se stavebním zákonem, jsou odstraněny všechny vady či nedodělky z předávacího řízení a stavba je předána objednateli.

Veškeré cenové údaje budou uvedeny v Kč a platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK).

3. Zhotovitel je dle odst. 2 oprávněn fakturovat pouze dílčí části díla objednatelům řádně přijaté dle předávacího protokolu, v němž objednatel výslovně uvede, že akceptuje předanou podobu plnění. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na činnosti, které nelze vzhledem k jejich charakteru protokolárně předat. Činnost dozoru projektanta je zhotovitel oprávněn fakturovat vždy jednou měsíčně, přičemž podkladem fakturace bude vždy objednatelům odsouhlasený výkaz činnosti zhotovitele.
4. Při předání části díla bude sepsán akceptační protokol o předání a převzetí díla, který bude podepsán zástupci obou smluvních stran, umožňující-li to charakter plnění zhotovitele.
5. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a jejich splatnost bude stanovena na **30 dnů** od doručení objednateli. Faktury dále musí obsahovat název (a příp. číslo) projektu. V případě, že faktury nebudou obsahovat náležitosti daňového dokladu nebo další stanovené náležitosti, objednatel je oprávněn vrátit je zhotoviteli na doplnění. V takovém případě lhůta splatnosti začne běžet nejdříve až po doručení řádně opravené faktury objednateli. Faktury budou obsahovat v příloze oboustranně podepsané dílčí předávací protokoly.
6. Dílčí faktury budou vystavovány samostatně na předmět plnění vyplývající z původní smlouvy o dílo a samostatně na případné vícepráce vyplývající z dodatků ke smlouvě o dílo. Případné méněpráce budou fakturovány vždy v rámci dílčí faktury z původní smlouvy o dílo.
7. Plátce je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po něm lze rozumně požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění.

Článek 9

Splnění a převzetí díla

1. Závazek řádně provést dílo dle této smlouvy je splněn řádným předáním a převzetím všech dílčích PD a pokud bude dle PD realizována i vlastní stavba, tak i provedením všech činností v rámci dozoru projektanta. Objednatel bude během plnění přebírat dílčí plnění ve formě příslušné PD, což bude potvrzeno akceptačním protokolem. Toto ustanovení dopadá pouze na části díla, které to svým charakterem umožňují.
2. K převzetí díla ke kontrole v termínech dle této smlouvy vyzve zhotovitel objednatelů alespoň 3 pracovní dny předem. O předání díla ke kontrole bude podepsán písemný předávací protokol. Objednatel si vyhrazuje právo na kontrolu předaného díla (v každém stupni projektové dokumentace vyjma díla uvedeného v článku 5 odst. 1 písm. e), a to s maximální lhůtou 10 kalendářních dnů od předání příslušné dokumentace ke kontrole. U díla uvedeného v článku 5 odst. 1 písm. e) si objednatel vyhrazuje právo na kontrolu, a to s maximální lhůtou 30 kalendářních dnů od předání této dokumentace ke kontrole. Objednatel není povinen po provedené kontrole projektovou dokumentaci převzít akceptačním protokolem, pokud projektová dokumentace nebo její část vykazuje vady a nedodělky. V případě že projektová dokumentace nebo její část vykazuje vady a nedodělky, objednatel je písemně zhotoviteli doručí. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě do dvou (2) pracovních dnů od doručení těchto vad a nedodělků, projedná s objednatelům tyto vady a nedodělky a jejich způsob odstranění. Zhotovitel je povinen do deseti (10) kalendářních dnů vady a nedodělky odstranit od písemného doručení vad a nedodělků, pokud si smluvní strany nedohodnou lhůtu delší z důvodu faktické nemožnosti odstranění vad a

nedodělků ve výše uvedené lhůtě, nejdéle však do dvaceti (20) kalendářních dnů.

3. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřipustnost podkladových materiálů, pokynů, věcí, které mu byly předány objednatelem, a/nebo objednatelem požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla, či rozpočtu, s podklady pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN či jinými normami. V případě, že objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele, trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu.
4. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.
5. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu či jeho části jeho protokolárním převzetím.

Článek 10

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost při plnění předmětu díla.
2. Objednatel poskytne veškeré údaje týkající se požadavků na dílo, především sledovaného záměru, údajů o tom, co objednatel od návrhu očekává, jaké požadavky má zhotovitel sledovat, případně jaké jsou zhotovitelovy možnosti tento záměr rozšířit nebo jakými dalšími omezeními je vázán.
3. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly realizované při kontrole projektu a tuto součinnost v případě, že k tomu bude objednatel vyzván, poskytnout.
4. Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu plnění a projektu včetně účetních dokladů minimálně deset let od skončení realizace plnění. Dodavatel se zavazuje minimálně po tuto dobu poskytovat informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům objednatele či zmocněncům pověřených orgánů a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci předmětu plnění a projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
5. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat při plnění této smlouvy povinnosti stanovené **Čestným prohlášením ke společensky a environmentálně odpovědnému plnění veřejné zakázky** (dále též jen „Čestné prohlášení“, které předal objednateli při podání nabídky na tuto veřejnou zakázku. Zhotovitel se tímto prohlášením zavázal, že:

bude-li s ním uzavřena smlouva na veřejnou zakázku, zajistí po celou dobu plnění veřejné zakázky:

- a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí,
- b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních

pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku,

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým *poddodavatelům*, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany zadavatele za konkrétní plnění.

Zhotovitel tímto čestným prohlášením dále prohlašuje, že vyvine maximální úsilí, aby v rámci řešení zpracovaného v PD byly minimalizovány dopady na *životní prostředí*, byla respektována udržitelnost či možnosti *cirkulární ekonomiky* (viz výše - Zásady cirkulární ekonomiky při projektování budov) a pokud je to možné a vhodné bude implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy související s předmětem veřejné zakázky a bude dodržovat další požadavky na *společenskou a environmentální odpovědnost a inovace* uvedené v obchodních a jiných smluvních podmínkách; splnění uvedených požadavků zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů.

Objednatel je oprávněn plnění povinností vyplývajících z Čestného prohlášení kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. Výzva dle předchozí věty může být učiněna i e-mailem na kontaktní osobu zhotovitele.

6. Zhotovitel při plnění předmětu veřejné zakázky zajistí legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet.
7. Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.

Článek 11

Záruka

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude vyhotoven podle podmínek smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a normami platnými pro tento předmět díla s požadavky veřejnoprávních orgánů a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
2. Zhotovitel nezodpovídá za vady v předmětu díla, které byly způsobeny použitím podkladů poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost nebo na nevhodnost objednatele upozornil a ten na jejich použití trval.
3. Pokud bude potřeba zpracovat dokumentaci pro povolení stavby, zhotovitel poskytuje objednateli záruku na zhotovené dílo – dílčího projektového celku Dokumentace pro povolení stavby s tím, že záruka skončí uplynutím 24 (slovy dvaceti čtyř) kalendářních měsíců od předložení platného rozhodnutí či jiného opatření vydaného opravňujícího k realizaci stavby dle stavebního zákona.

4. Zhotovitel PD poskytuje objednateli záruku na zhotovené dílo v podobě Dokumentace pro provádění stavby na celou dobu, po kterou bude stavba zhotovitelem stavby realizována s tím, že záruka skončí uplynutím 24 (slovy dvaceti čtyř) kalendářních měsíců po podpisu předávacího protokolu stavby nebo po právní moci kolaudačního rozhodnutí stavby jako celku.
5. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté kdy je zjistí. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno písemně (e-mailem nebo doporučeným psaním). V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace.
6. Smluvní strany se dohodly, že za vady v projektové dokumentaci zhotovitel odpovídá dle ustanovení občanského zákoníku.
7. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, na které se protokolárně dohodne objednatel se zhotovitelem s přihlédnutím ke všem objektivním okolnostem.
8. Zhotovitel je plně odpovědný za případy, kdy dojde vlivem opomenutí důležitých skutečností nebo vlivem nesouladu mezi výkresovou částí projektové dokumentace a výkazem výměr ke zvýšení nákladů vlastního plnění, ledaže prokáže, že zvýšené náklady nezpůsobila chyba v jím prováděném díle.
9. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani ukončením smlouvy, ani odstoupením kterékoliv ze smluvních stran od smlouvy.

Článek 12

Sankční ustanovení a odpovědnost za škodu

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla či jeho části, či plněním povinnosti dle termínů uvedených v této smlouvě vzniká objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z příslušné ceny díla bez DPH či jeho části za každý i započatý den prodlení zhotovitele.
2. V případě porušení některé z povinností uvedených v článku 13 (mimo povinnost setrvat v pojištění po celou dobu, po kterou může být vůči zhotoviteli vznesen nárok na náhradu škody) uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3 % z celkové ceny bez DPH za každý případ porušení této povinnosti (v případě jednorázového porušení povinnosti), a to i opakovaně, a v případě trvání prodlení 0,3 % z celkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti.
3. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla v dohodnutém termínu dle této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín plnění objednatelem výslovně označený v zápise z kontrolního dne stavby, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
5. V případě, že se zhotovitel bez řádné a včasné omluvy nedostaví na kontrolní den stavby, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ neomluvené absence zhotovitele na kontrolním dni stavby. Za řádnou se omluva považuje, pokud důvod neúčasti není zaviněn zhotovitelem a pokud je učiněna písemně (např. e-mailem) a doručena objednateli alespoň 2 (dva) pracovní dny před konáním kontrolního dne.
6. V případě, že na základě vady projektu dojde k navýšení vlastní ceny plnění, vzniká objednateli právo na náhradu škody ve výši zvýšených nákladů spojených s realizací tohoto plnění oproti nákladům, které by vynaložil, kdyby příslušnou vadu projektová dokumentace neobsahovala. Jedná se především o náklady spojené s pořádáním nového zadávacího řízení, případné náklady spojené s prodloužením realizace díla, případné marně vynaložené náklady (např. v důsledku potřeby část díla odstranit aj.) a vícenáklady, náklady, které nesplňují podmínky způsobilosti výhradně v důsledku porušení povinnosti zhotovitele zhotovit projektovou dokumentaci bez vad apod. Ustanovení tohoto odstavce se užije, pokud na danou situaci nebude možno aplikovat ustanovení odstavce 7 tohoto článku smlouvy.
7. V případě neúplného nebo vadného zpracování výkresové či textové části dokumentace či výkazu výměr, které vyvolají práce nad rámec původního předmětu realizované předmětné stavby (vícepráce) o více než 2 % oproti původní smluvní ceně bez DPH stanovené na základě zadávacího řízení na zhotovitele předmětné stavby, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny díla dle článku 7 včetně DPH a zhotovitel je povinen tuto pokutu zaplatit. Za každé další jedno procento navýšení ceny stavby nad 2 % oproti původní smluvní ceně bez DPH stanovené na základě zadávacího řízení na zhotovitele předmětné stavby, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 2 % z celkové ceny díla dle článku 7 včetně DPH a zhotovitel je povinen tuto pokutu zaplatit.
8. V případě, že dílo bude mít vady, které brání samy o sobě nebo ve spojení s jinými jeho řádnému použití k zamýšlenému účelu – tj. zadání a realizaci následujících stavebních prací, má objednatel nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 % z ceny díla dle článku 7 této smlouvy včetně DPH. Pro vyloučení pochybností strany sjednávají, že na tuto smluvní pokutu má objednatel nárok především, pokud bude muset vzhledem k takovým vadám změnit zadávací dokumentaci jakéhokoli zadávacího řízení, které bude věcně vycházet z výsledků této smlouvy o dílo nebo takové zadávací řízení zrušit.
9. Pro případ prodlení úhrady zhotovitelem řádné vystavené faktury ve lhůtě splatnosti vzniká zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení objednatele.

10. Při porušení povinnosti dle článku 5 odst. 16 bez ohledu na to, kdy toto porušení objednatel zjistí, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý případ použití specifického označení, nebo odkazu bez možnosti rovnocenného řešení a zároveň nahradit objednateli škodu, která mu tímto porušením povinnosti zhotovitele vznikne.
11. Při porušení povinnosti ve vypracování návrhu technických částí odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu § 98 ZZVZ v rozsahu předmětu plnění a odeslání návrhu odpovědi objednateli ve lhůtě 2 pracovních dnů od výzvy objednatele k vypracování návrhu odpovědi dle článku 5 odst. 16 této smlouvy, je stanovena smluvní pokuta ve výši 2 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
12. Pro případ porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každé jednotlivé porušení smluvní povinnosti.
13. V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost dle článku 10 odst. 3 nebo 4 této smlouvy a objednateli bude v té souvislosti uložena sankce, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli v plné výši uloženou sankci i další výdaje, spojené s řízením, ve kterém byla sankce uložena.
14. Zjistí-li objednatel porušení kterékoliv povinnosti vyplývajících z Čestného prohlášení (čl. 10 odst. 5 této smlouvy), je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý zjištěný případ.
15. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty ukládané podle této smlouvy zhotoviteli nepřekročí v součtu částku rovnající se 30% celkové ceny díla s DPH dle článku 7 této smlouvy.

Článek 13 Pojištění

1. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu pro případ vzniku pojistné události související s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu:
 - a. pojištění odpovědnosti za škody způsobenou poskytováním odborných služeb (tzv. pojištění profesní odpovědnosti), a to na limit pojistného plnění minimálně **1.000.000 Kč** (slovy jeden milion korun českých) za jednu pojistnou událost. Pojištění se současně musí vztahovat na případy vyplývající z chyby nebo opomenutí v projektové dokumentaci, která z tohoto důvodu nebude odpovídat požadavkům smlouvy, a to na limit pojistného plnění **minimálně 3.000.000 Kč** (slovy tři milionů korun českých).
 - b. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností (tzv. pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám), a to na limit pojistného plnění **minimálně 1.000 000 Kč** (slovy jede milion korun českých) **za jednu pojistnou událost.**
2. Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv dle tohoto článku této smlouvy nejpozději do 7 pracovních dnů po doručení výzvy k zahájení plnění dle této smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí po celou dobu trvání této smlouvy. Zhotovitel předloží doklad o trvání požadovaného pojištění objednateli kdykoliv za trvání této smlouvy do 7 pracovních dnů od výzvy

objednatel. Zhotovitel se zavazuje pokračovat v pojištění (nebo sjednat tzv. udržovací pojištění) dle výše uvedeného rozsahu také minimálně 3 roky po ukončení realizace plnění této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu za podmínek blíže specifikovaných v tomto článku smlouvy i pro případ, že zhotovitel přestane vykonávat činnost projektanta nebo architekta nebo pozbude autorizaci před uplynutím sjednané záruční doby stavby (tzv. „udržovací pojištění“). Sjednání podmínek, za kterých pojistitel uzavře se zhotovitelem „udržovací pojištění“ může být též součástí pojistné smlouvy pojištění profesní odpovědnosti, není to však podmínkou. Zhotovitel „udržovací pojištění“ objednateli kdykoliv na vyžádání v jím stanovené lhůtě doloží předložením pojistné smlouvy, příp. pojistného certifikátu.

Článek 14

Užití díla

1. Objednatel se zavazuje užít vytvořené dílo pouze k účelu uvedenému v této smlouvě, nebo z této smlouvy vyplývajícimu.
2. Zhotovitel touto smlouvou uděluje objednateli výhradní časově a územně neomezenou licenci k užití díla a všech jeho částí. Objednatel je oprávněn užít dílo či jeho část ve smyslu tohoto ustanovení v plném rozsahu veškerých majetkových práv k dílu náležejících. Objednatel je především oprávněn užít dílo či jeho část jako podklad pro zadávání veřejných zakázek ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek, a to včetně uveřejnění způsobem umožňujícím přímý a neomezený dálkový přístup. Užití dle předcházející věty se vztahuje i na veřejné zakázky zadávané mimo režim zákona o veřejných zakázkách.
3. Licence na objednatel přechází okamžikem uzavření této smlouvy.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že licenční odměna za licenci dle této smlouvy je zahrnuta do ceny díla.
5. Objednatel neužije dílo způsobem, který by snížil jeho hodnotu.
6. Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí osobě zcela nebo zčásti. Poskytnutím oprávnění dle věty předchozí nevzniká zhotoviteli právo na další odměnu.
7. Objednatel je oprávněn upravit dílo popř. stavbu zhotovenou na základě díla v souladu se svými potřebami. Úpravy je oprávněn provést sám, popř. zadat jejich provedení třetí osobě. Zhotovitel s tímto podpisem smlouvy výslovně souhlasí.
8. Zhotovitel není oprávněn dílo dle této smlouvy poskytnout třetí osobě či využít jinak, než ve prospěch objednatel v souladu s touto smlouvou.

Článek 15

Vyšší moc, pozastavení prací a omezení rozsahu prací

1. Brání-li smluvní straně ve splnění povinnosti vyšší moc, jak je definována v článku 15 odst. 3. této smlouvy (dále jen „Vyšší moc“), prodlužuje se lhůta ke splnění této povinnosti o dobu trvání překážky Vyšší moci za předpokladu, že daná smluvní strana postupovala podle článku 15 odst. 4 této smlouvy.

2. Nedojde-li ke splnění povinnosti, jejímuž včasnému splnění zabránila Vyšší moc, ani do 60 dní od toho, co měla být povinnost splněna původně před prodloužením lhůty dle článku 15 odst. 1 této smlouvy, má kterákoliv smluvní strana právo od smlouvy odstoupit.
3. Pro účely této smlouvy se Vyšší mocí rozumí událost, která splňuje kumulativně následující znaky:
 - a) objektivně znemožňuje některé ze smluvních stran v plnění některé z jejích povinností podle této smlouvy (objektivní nemožnost je v příčinné souvislosti s touto událostí);
 - b) tuto událost nemohla příslušná smluvní strana s vynaložením odborné péče zjistit ani předvídat před uzavřením smlouvy;
 - c) tato událost je mimo vliv smluvních stran a žádná ze smluvních stran nemohla této události zamezit.

Mezi případy Vyšší moci náleží zejména:

- přírodní katastrofy (zejm. požáry, výbuchy, zemětřesení, přílivové vlny, povodně, epidemie);
 - válka, ozbrojené konflikty (ať byla vyhlášena válka či nikoli), invaze, akt nepřátelského státu, mobilizace, zabavení majetku nebo embarga;
 - povstání, revoluce nebo vojenské, ozbrojené či násilné převzetí moci, nebo občanská válka;
 - nepokoje, sročení, nebo akty či hrozby terorismu.
4. V případě, že některá ze smluvních stran nemůže plnit své povinnosti v důsledku případu Vyšší moci, je povinna informovat druhou smluvní stranu o tomto případě Vyšší moci neprodleně poté, co se o vzniku takového případu Vyšší moci dozvěděla nebo co se mohla při vynaložení odborné péče o vzniku takového případu Vyšší moci dozvědět. V oznámení o případě Vyšší moci povinná smluvní strana uvede povahu Vyšší moci, počátek Vyšší moci, předpokládanou dobu trvání Vyšší moci a možné způsoby odvrácení újmy, která by v důsledku případu Vyšší moci hrozila.
 5. Smluvní strana, které ve splnění povinnosti zabránila Vyšší moc, je povinna učinit vše, co je v jejích silách, aby odvrátila či minimalizovala újmu vzniklou druhé Smluvní straně z důvodu, že není schopna svou povinnost splnit.

Článek 16

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy dle předchozí věty zajistí objednatel. Obě strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy v jejím plném znění.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, kromě výše uvedeného a kromě případů uvedených v ustanovení § 2001 a násl. občanského zákoníku též v případě:
 - a) kdy bude zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele; zhotovitel je povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně objednateli.

- b) bude-li plnění zhotovitele opakovaně vykazovat vady, na něž objednatel zhotovitele opakovaně (nejméně 2x) upozorní, pokud zhotovitel nesjedná ve stanovené lhůtě nápravu.
3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení.
 4. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva, včetně případných dodatků, může být uveřejněna na profilu zadavatele objednatele ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se plnění dle této smlouvy, které jsou případně předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné, předem objednateli písemně a jasně označil a nejsou obsaženy v této smlouvě.
 5. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, její přílohy či případné dodatky neobsahují informace, jejichž uveřejněním by došlo k porušení obchodního tajemství, ochrany osobních údajů apod. ve smyslu obecně závazných právních předpisů.
 6. Tuto smlouvu lze měnit doplnit nebo zrušit pouze písemnou formou řádně číslovanými dodatky.
 7. Tato smlouva byla uzavřena podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v účinném znění a v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“). Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí příslušnými ustanoveními těchto právních předpisů.
 8. Je-li tato smlouva uzavírána v listinné podobě, bude vyhotovena v pěti výtiscích, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel. Je-li tato smlouva uzavírána v elektronické podobě, pak obě strany obdrží její elektronický originál.
 9. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena vážně a svobodně, a že je jim znám význam jednotlivých ustanovení této smlouvy. Na důkaz svého souhlasu s obsahem jak je výše uvedeno připojují své (zaručené elektronické) podpisy.
 10. Tato smlouva je uzavírána na základě ustanovení Směrnice č. 3 Rady Královéhradeckého kraje, kterou se stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání veřejných zakázek.

Za objednatele

Za zhotovitele



Petr Koleta
hejtman



Ing. Radek Myšák
jednatel společnosti

Souhrnné prohlášení dodavatele

Krycí list nabídky

Informace o veřejné zakázce	
Název veřejné zakázky	SM/24/310 Stavební úpravy kuchyně - Gymnázium, Dobruška - projektové dokumentace a výkon dozoru projektanta
Zadavatel	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546
Druh řízení	Veřejná zakázka malého rozsahu 2. kategorie
Předpokládaná hodnota VZ	Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky (včetně vyhrazené změny závazku) činí celkem: 975 000 Kč bez DPH Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky (bez vyhrazené změny závazku) činí celkem: <u>750 000 Kč bez DPH</u> Hodnota vyhrazené změny závazku podle § 100 odst. 3 zákona (na další služby) činí: 225 000 Kč bez DPH

Identifikační údaje dodavatele	
Obchodní firma	IRBOS s.r.o.
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném U Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C15647	
IČO	25933094
DIČ	CZ25933094
Sídlo	Čestice 115, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Zástupce	Ing. Radek Myšák
Bankovní spojení/ číslo účtu	

Kontaktní údaje dodavatele	
Kontaktní osoba ve věci veřejné zakázky	Ing. Radek Myšák
e-mail	

Telefon	
Kontaktní osoba ve věcech smluvních	Ing. Radek Myšák
e-mail	
Telefon	
Kontaktní osoba ve věcech technických	Ing. Radek Myšák
e-mail	
Telefon	
Autorizovaná osoba	Ing. Radek Myšák
Číslo autorizace	0602505

<u>Nabídková cena:</u>			
a) Zpracování studie (Smlouva o dílo, čl. 5, odst. 1, písm. a))	Kč bez DPH	Samostatně DPH	Kč včetně DPH
	50.000,-	10.500,-	60.500,-
b) Zpracování energetického posudku (EP) dle vyhlášky č. 141/2021 Sb. (Smlouva o dílo, čl. 5, odst. 1, písm. b))	Kč bez DPH	Samostatně DPH	Kč včetně DPH
	70.000,-	14.700,-	84.700,-
c) Součinnost při získávání dotace a zpracování technické části dokumentace potřebné ke zpracování a podání žádosti o dotaci (Smlouva o dílo, čl. 5, odst. 1, písm. c))	Kč bez DPH	Samostatně DPH	Kč včetně DPH
	20.000,-	4.200,-	24.200,-
d) Zpracování	Kč bez DPH	Samostatně DPH	Kč včetně DPH

dokumentace pro povolení stavby včetně položkového rozpočtu a inženýrská činnost (Smlouva o dílo, čl. 5, odst. 1, písm. d))	205.000,-	43.050,-	248.050,-
e) Zpracování dokumentace pro provádění stavby, včetně profesí a projektové dokumentace interiérů a vybavení, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (Smlouva o dílo, čl. 5, odst. 1, písm. e))	Kč bez DPH	Samostatně DPH	Kč včetně DPH
	280.000,-	58.800,-	338.800,-
f) Součinnost při přípravě a realizaci zadávacích řízení veřejných zakázek, tj. na stavební práce, dodávky a výkon TDS a koordinátora BOZP (Smlouva o dílo, čl. 5, odst. 1, písm. f))	Kč bez DPH	Samostatně DPH	Kč včetně DPH
	5.000,-	1.050,-	6.050,-
g) Dozor projektanta. (Smlouva o dílo, čl. 5, odst. 1, písm. g))	Kč bez DPH	Samostatně DPH	Kč včetně DPH
	50.000,-	10.500,-	60.500,-
Nabídková cena celkem (součet dílčích cen a+b+c+d+e+f+g), údaj pro hodnocení nabídek)	Kč bez DPH	Samostatně DPH	Kč včetně DPH
	680.000,-	142.800,-	822.800,-

Prohlášení o kvalifikaci

1. Dodavatel k prokázání základní způsobilosti prohlašuje, že:

- a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahrazeným odsouzením se nepřihlíží;

- b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek;
- c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění;
- d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
- e) není v likvidaci ve smyslu § 187 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku ve smyslu § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v účinném znění, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

2. Dodavatel k prokázání profesní způsobilosti prohlašuje, že:

- a) je zapsán v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci a disponuje výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
- b) disponuje osvědčením o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, anebo

disponuje osvědčením o registraci dle ust. §30r zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a to v oboru: pozemní stavby, případně v rozsahu autorizace autorizovaného architekta ve smyslu §4 téhož zákona.

Jméno a příjmení autorizované osoby	Ing. Radek Myšák
Vztah osoby k dodavateli	pracovněprávní vztah
Obor autorizace	Pozemní stavby
Číslo autorizace	0602505

3. Dodavatel k prokázání technické kvalifikace předkládá:

- a) Seznam významných služeb poskytnutých za posledních tři (3) roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.

Ze seznamu významných stavebních prací musí vyplývat realizace:

- **Jedné (1) zakázky na služby**, jejímž předmětem byly **projekční práce alespoň ve dvou stupních (a to samostatné dokumentace) v rámci stavební akce stavby nebo rekonstrukce budovy občanské výstavby nebo budov pro bydlení**, vyjma výrobních hal a logistických center a vyjma staveb, kde hlavním předmětem projektové dokumentace, resp. projekčních prací byl ETICS, výměna okenních a dveřních výplní, zateplení střešního pláště, změna způsobu vytápění, instalace vzduchotechniky včetně rekuperace, úprava měření a regulace apod.), přičemž hodnota každé z uvedených služeb musela činit **alespoň 350.000 Kč bez DPH**.
- **Jedné (1) zakázky na služby**, jejímž předmětem byly **projekční práce v rámci stavební akce stavby nebo rekonstrukce občanské výstavby s gastro provozem**, vyjma výrobních hal a logistických center a vyjma staveb, kde hlavním předmětem projektové dokumentace, resp. projekčních prací byl ETICS, výměna okenních a dveřních výplní, zateplení střešního pláště, změna způsobu vytápění, instalace vzduchotechniky včetně rekuperace, úprava měření a regulace apod.), přičemž hodnota každé z uvedených služeb musela činit **alespoň 250.000 Kč bez DPH**.

Za budovu občanské výstavby a budovy pro bydlení budou zadavatelem považovány stavební objekty zařazené v číselníku jednotné klasifikace stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy (JKSO) ve skupině 801 a 803 s výše uvedenou výjimkou.

Významná služba č. 1

Název a předmět	Centrum sociálních služeb Bělehradská 389, Pardubice
Objednatel (alespoň název a IČO)	Statutární město Pardubice, IČ 00274046
Termín realizace	9/2022 – 2/2024
Celková cena v Kč bez DPH	2,6 mil Kč

Významná služba č. 2

Název a předmět	MŠ Teplého – rozšíření kapacit (gastro provoz)
Objednatel (alespoň název a IČO)	Statutární město Pardubice, IČ 00274046
Termín realizace	9/2022 – 2/2024
Celková cena v Kč bez DPH	1,83 mil Kč

b) Dodavatel uvede osobu, odpovědnou za zpracování projektových dokumentací tj. osoba vedoucího projektanta, který musí splňovat minimálně kvalifikaci v následujícím rozsahu

- **autorizace v oboru v oboru pozemní stavby** podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném a účinném znění;
- praxe v projektování min. 5 let;

Zadavatel stanovuje, že dodavatel splní tento kvalifikační předpoklad, pokud doloží k osobě odpovědné za zpracování projektových dokumentací doklad o odborné způsobilosti ve formě osvědčení o autorizaci nebo registraci v oboru „pozemní stavby“ /viz výše/ v rozsahu dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném a účinném znění, doklad o vzdělání a prohlášení, ze kterého bude patrné, že tato osoba má příslušné zkušenosti (praxi) – např. profesní životopis.

VEDOUcí PROJEKTANT	
Jméno a příjmení	Ing. Radek Myšák
Vztah k dodavateli (zaměstnanec/ poddodavatel aj.)	zaměstnanec
Autorizace (uved'te č. autorizace a obor)	Pozemní stavby č. 0602505
Délka praxe v oboru projekčních prací (roky)	9 let

Seznam poddodavatelů

Dodavatel prohlašuje, že	
	k plnění veřejné zakázky nehodlá využít poddodavatele, tzn. že veškeré plnění tvořící předmět smlouvy se zavazuje realizovat vlastními silami
X	k plnění veřejné zakázky hodlá využít poddodavatele
Identifikační údaje poddodavatele	
Obchodní firma	Ing. Vojtěch Lipovský
IČO	63385511
Sídlo	Podešvova 13, Brno
Plnění, které bude poddodavatel realizovat	
Silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace	

Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů?	
NE	
Jedná se o poddodavatele, který bude plnit více než 10 % hodnoty zakázky <u>a současně</u> jsou u něj naplněny podmínky, pro něž není zadavatel oprávněn zadat vybranému dodavateli zakázku dle nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8.dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnosti Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině?	
NE	
Identifikační údaje poddodavatele	
Obchodní firma	INTERKLIMA, spol. s.r.o.
IČO	13586556
Sídlo	Semtín 92, Pardubice VII
Plnění, které bude poddodavatel realizovat	
Vzduchotechnické zařízení, ústřední topení	
Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů?	
NE	
Jedná se o poddodavatele, který bude plnit více než 10 % hodnoty zakázky <u>a současně</u> jsou u něj naplněny podmínky, pro něž není zadavatel oprávněn zadat vybranému dodavateli zakázku dle nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8.dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnosti Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině?	
NE	
Identifikační údaje poddodavatele	
Obchodní firma	Pipetech Project s.r.o.
IČO	06230958
Sídlo	Dostihová 1155, Pardubice
Plnění, které bude poddodavatel realizovat	
Zdravotně-technické instalace	
Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů?	
NE	
Jedná se o poddodavatele, který bude plnit více než 10 % hodnoty zakázky <u>a současně</u> jsou u něj naplněny podmínky, pro něž není zadavatel oprávněn zadat vybranému dodavateli zakázku dle	

nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8.dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnosti Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině?	
NE	
Identifikační údaje poddodavatele	
Obchodní firma	Požárně-bezpečnostní servis – Bc. Ingrid Čermáková
IČO	69841691
Sídlo	Dobrovského 1653, Rychnov nad Kněžnou
Plnění, které bude poddodavatel realizovat	
PBŘ	
Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů?	
NE	
Jedná se o poddodavatele, který bude plnit více než 10 % hodnoty zakázky <u>a současně</u> jsou u něj naplněny podmínky, pro něž není zadavatel oprávněn zadat vybranému dodavateli zakázku dle nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8.dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnosti Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině?	
NE	

¹ Ve vazbě na [Nařízení Rady \(EU\) 2022/576](#) ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině – viz. čl. 18 odst. 2 výzvy k podání nabídek.

Prohlášení o neexistenci střetu zájmů

Dodavatel předkládá čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů v souladu s § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů¹ a prohlašuje, že

- není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;
- poddodavatel, prostřednictvím kterého prokazuje kvalifikaci (existuje-li takový), není

¹ Pokud dodavatel nemůže toto čestné prohlášení pravdivě vyplnit, tj. pokud je obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti nebo má takového poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazuje kvalifikaci, uvede tyto skutečnosti v nabídce.

obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti

Prohlášení o neexistenci důvodu aplikace zákazu zadání či plnění veřejné zakázky v souladu s Nařízením Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 22

Dodavatel prohlašuje, že neexistují důvody, pro které by mu nebylo možné zadat veřejnou zakázku ve smyslu článku 5k Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině.

Prohlášení k akceptaci obchodních podmínek

Dodavatel prohlašuje, že se seznámil s návrhem smlouvy, který je přílohou č. 2 Výzvy a že s takto navrženými obchodními podmínkami bez výhrad souhlasí a bere na vědomí, že smlouva na plnění této veřejné zakázky bude uzavírána ve znění přílohy č. 2 Výzvy, a zavazuje se, že v případě, že bude vybraným dodavatelem, smlouvu ve znění přílohy č. 2 uzavře na výzvu zadavatele bez zbytečného odkladu.

Čestné prohlášení k odpovědnému plnění veřejné zakázky

Dodavatel čestně prohlašuje, že, bude-li s ním uzavřena smlouva na veřejnou zakázku, zajistí po celou dobu plnění veřejné zakázky:

a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí,

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut shodná se smlouvou na veřejnou zakázku,

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany zadavatele za konkrétní plnění.

d) Dodavatel zajistí používání inovativních materiálů a produktů dnešní doby.

e) Dodavatel zajistí řešení, které **bude energeticky úsporné** a environmentálně šetrné, zejména bude při vypracovávání projektové dokumentace řešit možnost zpětného využití dešťových vod pro provoz objektu nad rámec požadavku § 5 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů,

ve znění pozdějších předpisů. Řešení bude napomáhat udržitelnému hospodaření s vodou (např. zachytávání srážkové vody na zalévání zahrady, akumulace srážkové vody pro zálivku, zakládání tzv. zelených střech, výstavba retenčních nádrží, jezírek apod.). Dodavatel posoudí vhodnost takových řešení s ohledem na typ stavby a její využití.

f) Dodavatel se zavazuje vypracovat projektové dokumentace v souladu se Zásadami cirkulární ekonomiky při projektování budov, které vydala v roce 2020 Evropská komise (Příloha č. 5). Dodavatel bude navrhopvat řešení také z hlediska zvažování nákladů a přínosů budovy, zvažování různých variant řešení projektu s ohledem na dopady a přínosy zejména pro životní prostředí a sociální oblast, nebo návrhu k použití materiálů, jež jsou snadno recyklovatelné.

Za dodavatele dne 8.10.2024


A large rectangular area of the document is redacted with a solid grey box. Above the box, a small portion of a blue ink signature is visible.

Ing. Radek Myšák, jednatel²


² Prohlášení podepíše osoba, oprávněná jednat jménem/za dodavatele. Pokud oprávnění takové osoby nevyplývá z veřejného rejstříku (např. obchodní rejstřík), je nutné přiložit plnou moc, podepsanou osobou oprávněnou jednat.

Bližší specifikace investičního záměru

Předmětem záměru je rekonstrukce školní kuchyně v 1. podzemním a 1. nadzemním podlaží se zaměřením na modernizaci kuchyňské technologie a vybavení včetně vyvolaných dispozičních změn, dále odstranění provozních vad a poruch stávajících konstrukcí zejména sanace vlhkého zdiva v prvním podzemním podlaží. Současná kapacita školní jídelny je cca 620-640 jídel.

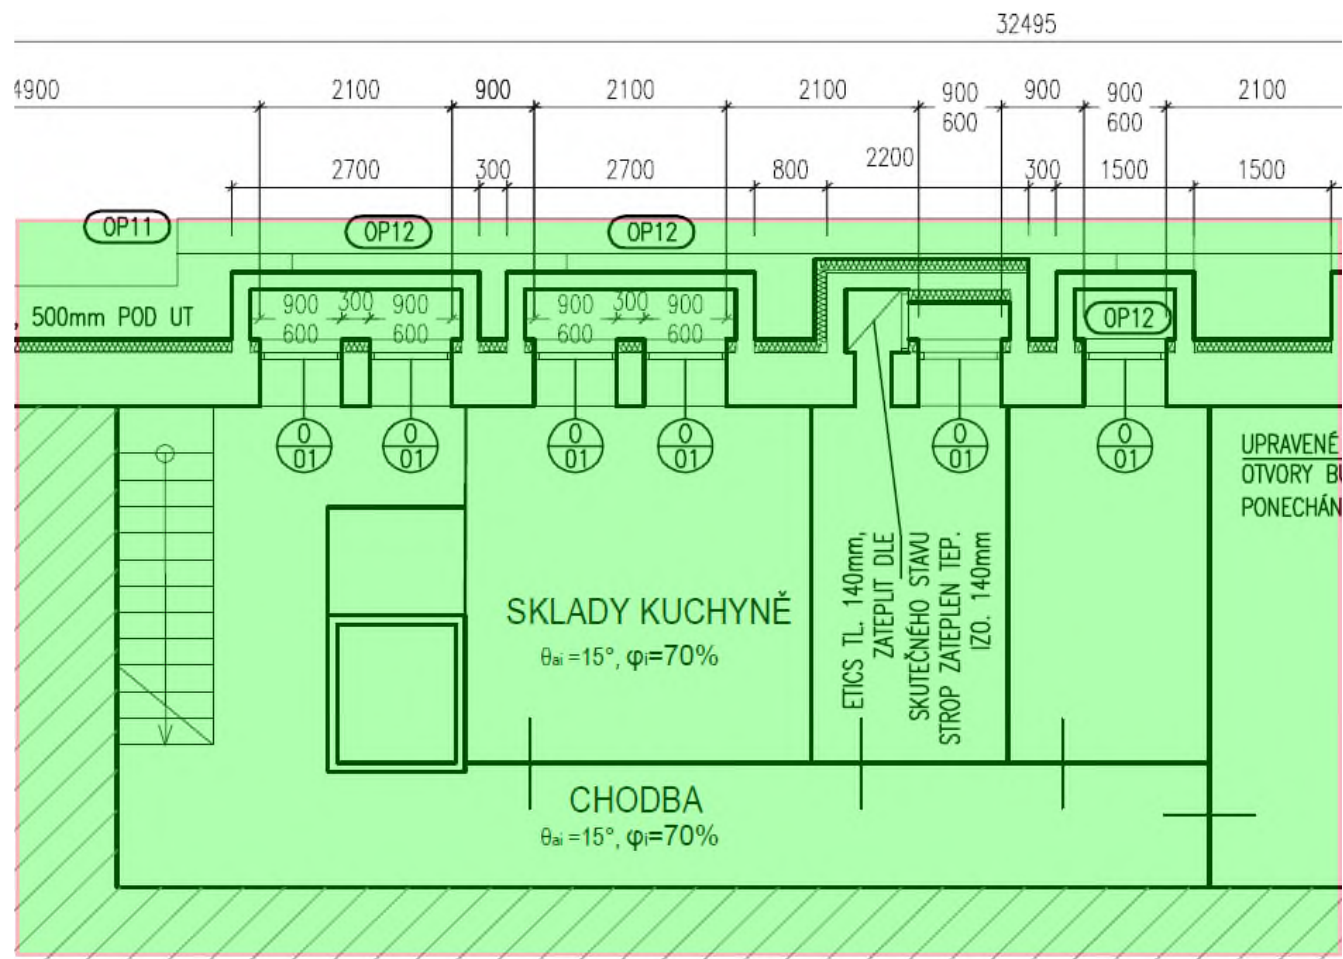

1 podzemní podlaží gastro provozu

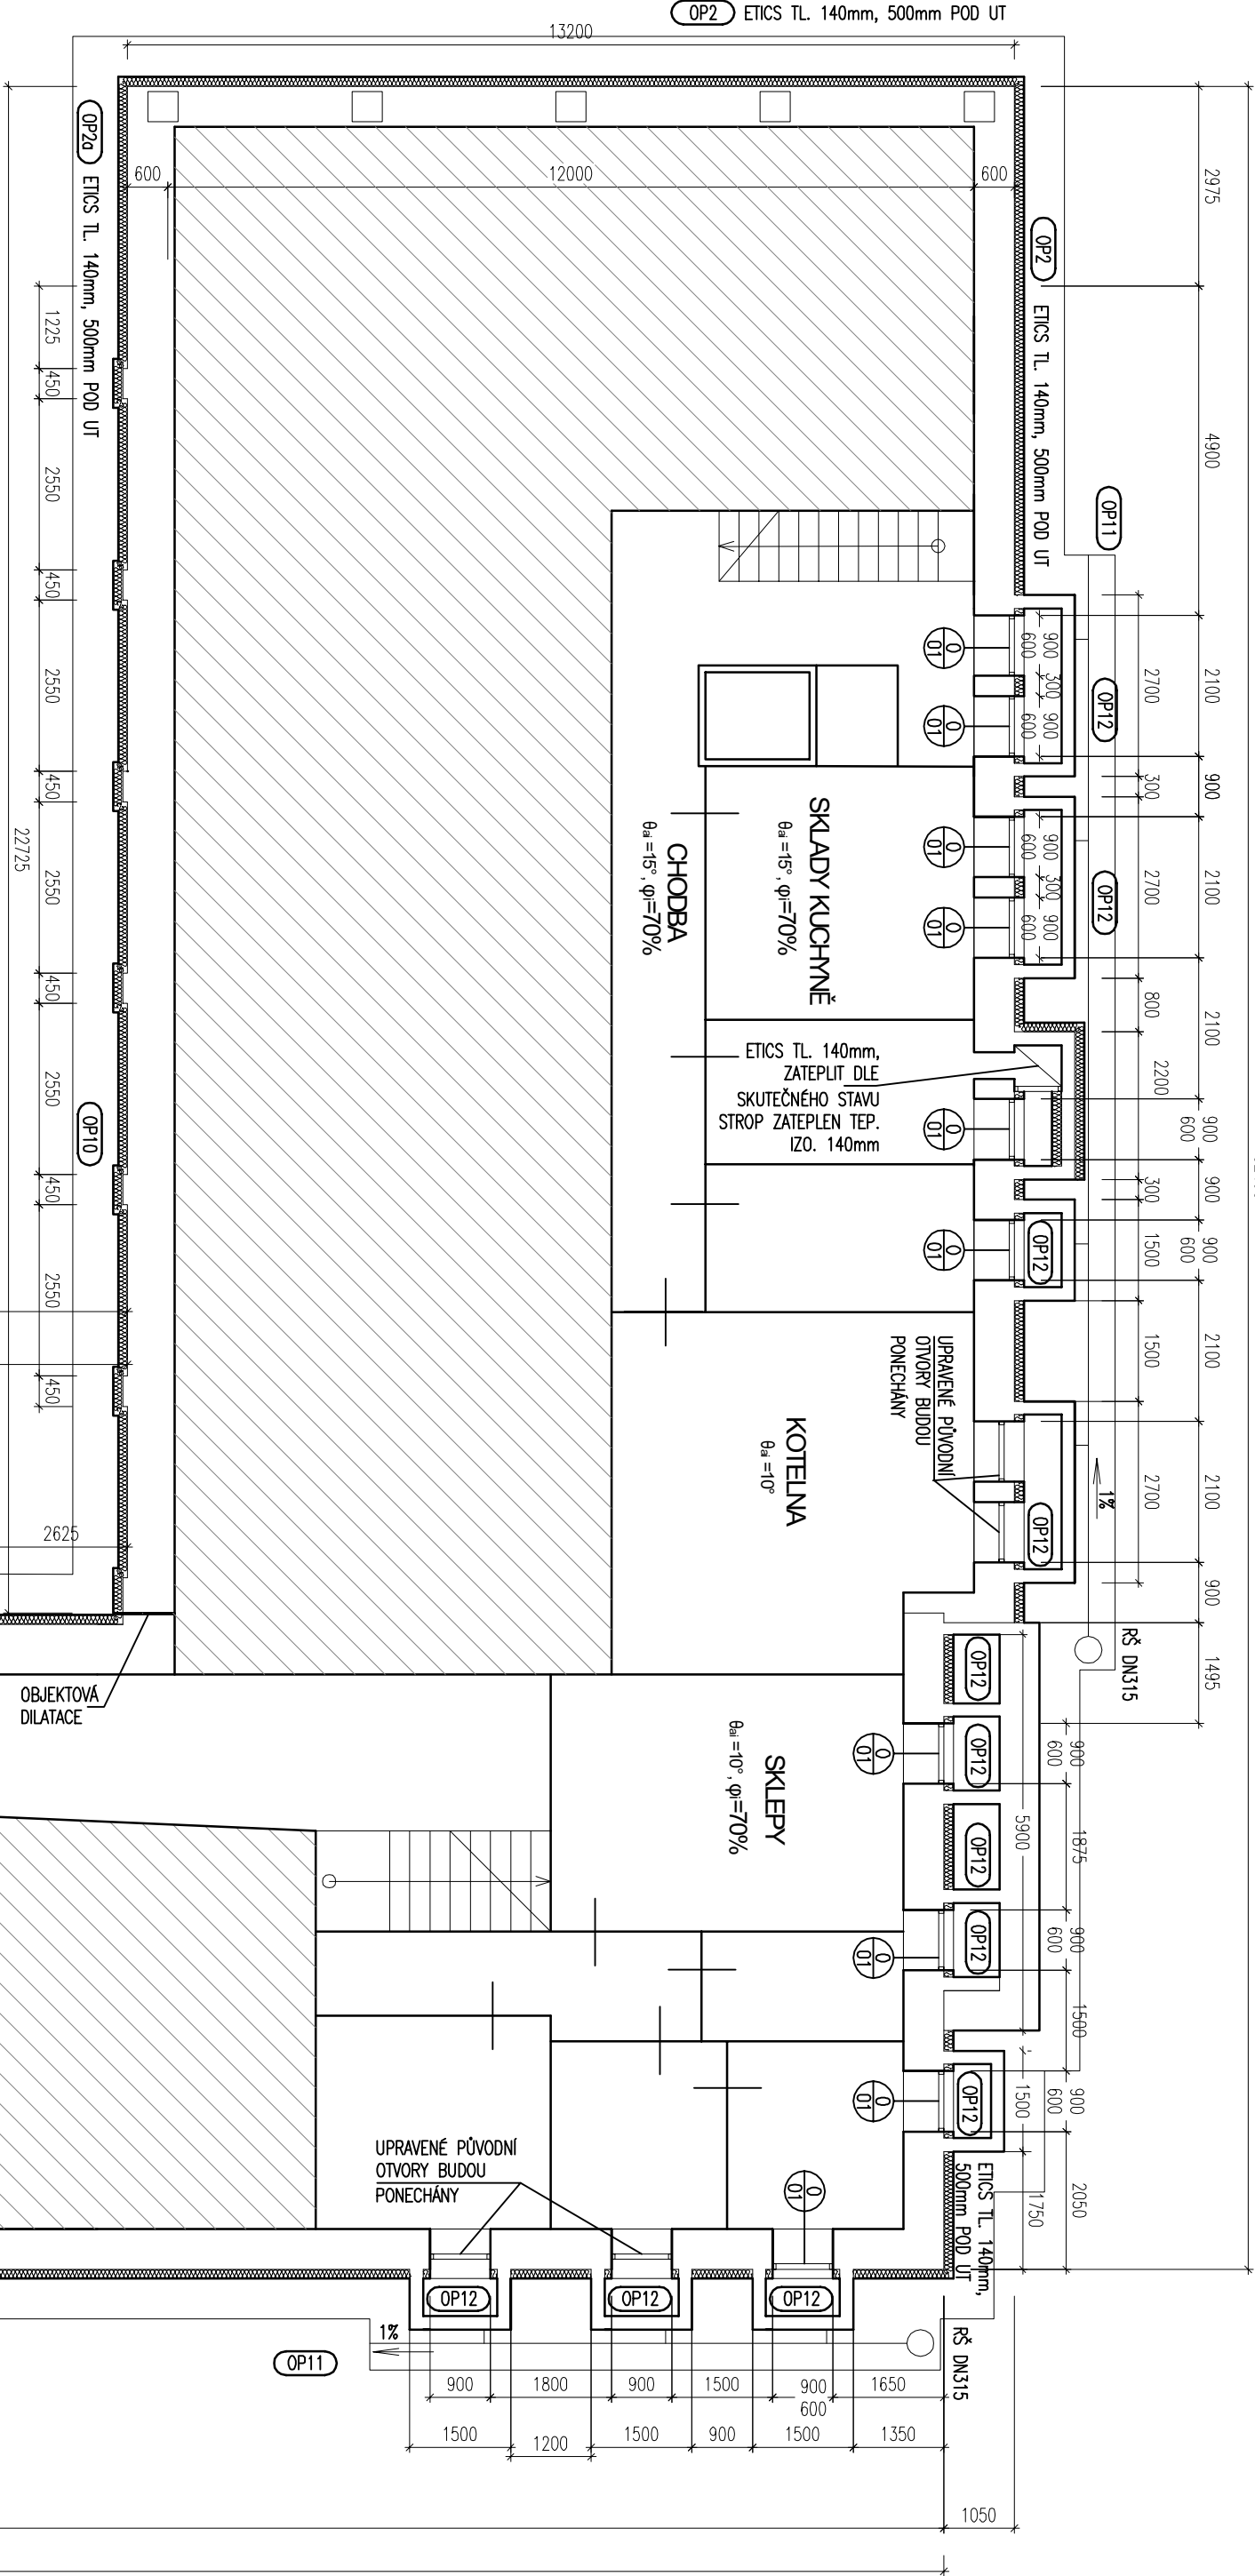

LEGENDA HNŮT

STÁVAJÍCÍ ZDNO

NOVÉ NÁSTROJE TEPELNÁ IZOLACE

PŘEHLED:

TAHÁKA NĚŠTICH VÝPLNÍ

TAHÁKA KEMPEKSKÝCH VÝPLNÍ

TAHÁKA OSAINICH VÝPLNÍ

TAHÁKA SKLADOB

DETLAV VZ VÝPLNÍ

01.010.ARS.002.1w

01.010.ARS.003.1w

01.010.ARS.004.1w

01.010.ARS.005.1s


01.010.ARS.1010.dal

POZNÁMKY:

- VŠECHNÉ ROZMĚRY ZKONTROLOVAT NA STU.

- PŘED VÝROBOU PRÁVO (OVEN, DŘEVÍ PRŮD) ZAJISTIT OTVORY SAMOSTATNĚ.

- V PŘÍPADĚ ŘEŠENÍ DETAILU ANGLICKÝCH DVOŘKŮ BŮDE PROVÁZEN DŘEVĚNÝ SYSTÉM NÁPOJENÍ NA ANGLICKÉ DVOŘKY NA ZAČÁTKU ÚSEKU BŮDE UMÍSTĚN RŮZNÝ SAGHA DN15. DŘEVĚNÝ BŮDE PROVÁZEN VĚ SPÁOU 1X.

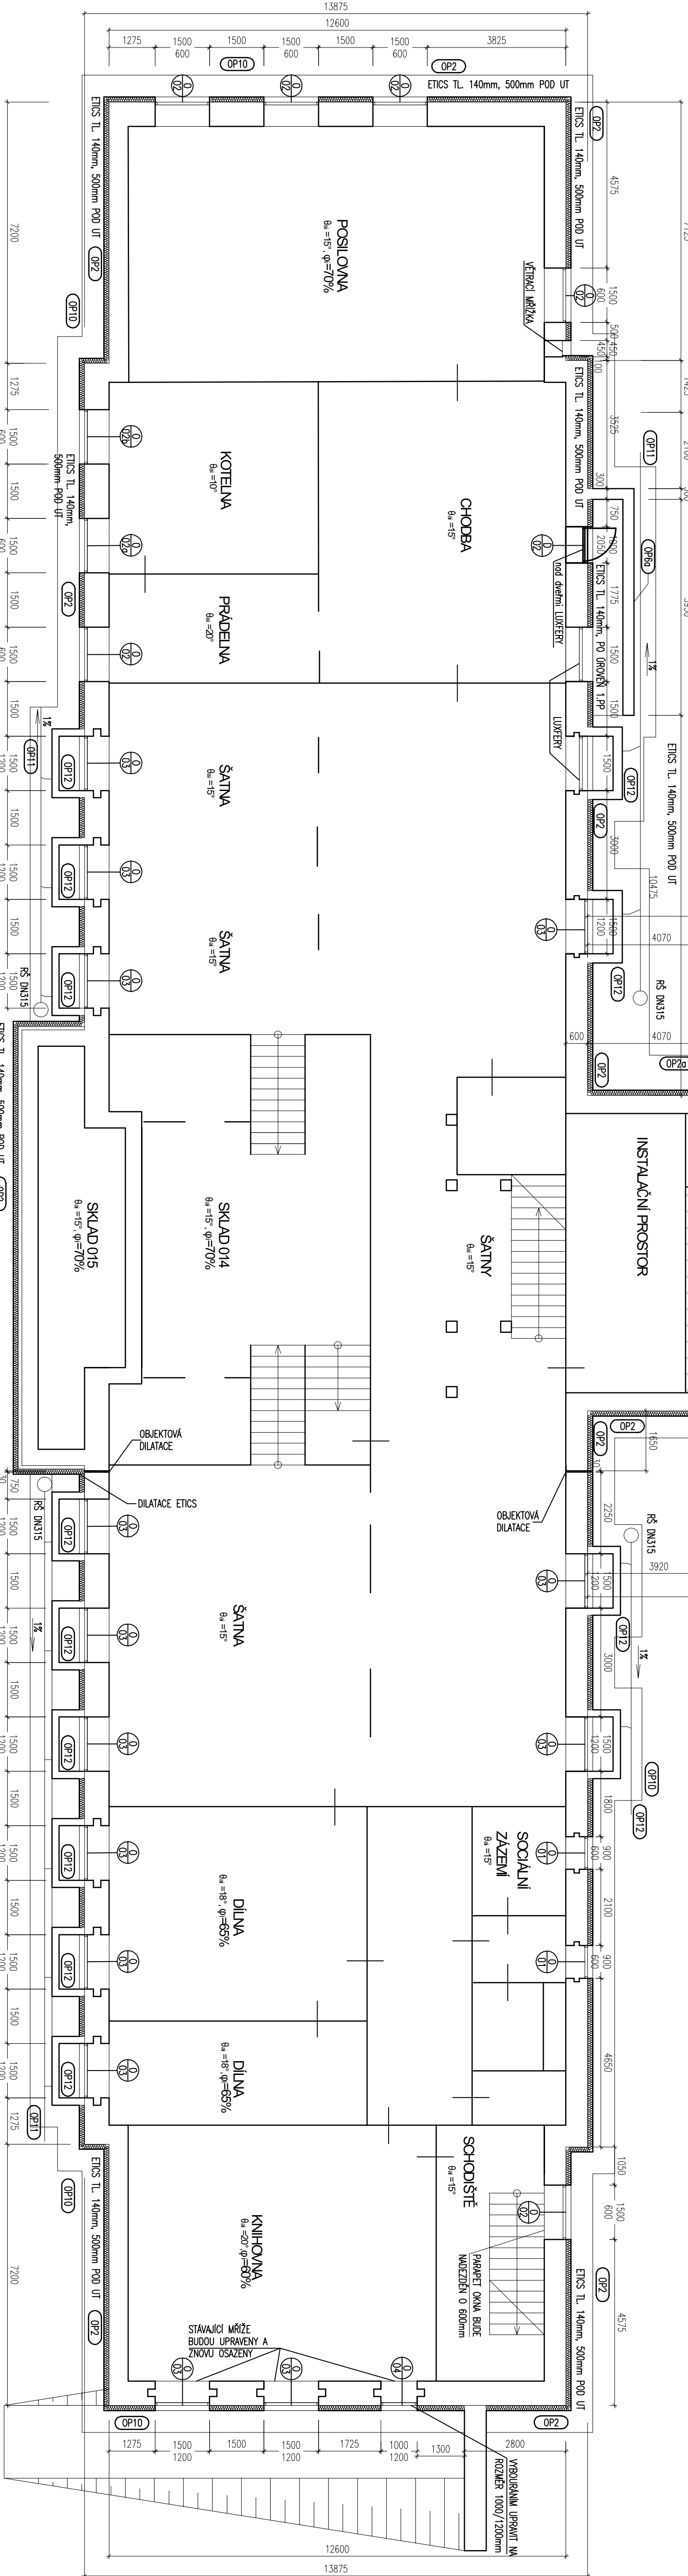

Zateplení objektu a výměnaoken
na Gymnáziu Dobruška

Pukla 776, 518 01 Dobruška

Gymnázium Dobruška

Pukla 779

518 01 Dobruška

KARLÍNSKÝ s.r.o.

KARLÍNSKÝ s.r.o.

KARLÍNSKÝ s.r.o.

KARLÍNSKÝ s.r.o.

KARLÍNSKÝ s.r.o.

KARLÍNSKÝ s.r.o.

KARLÍNSKÝ s.r.o.

KARLÍNSKÝ s.r.o.

KARLÍNSKÝ s.r.o.

KARLÍNSKÝ s.r.o.

KARLÍNSKÝ s.r.o.

KARLÍNSKÝ s.r.o.

KARLÍNSKÝ s.r.o.

KARLÍNSKÝ s.r.o.

KARLÍNSKÝ s.r.o.

KARLÍNSKÝ s.r.o.

KARLÍNSKÝ s.r.o.

KARLÍNSKÝ s.r.o.

KARLÍNSKÝ s.r.o.

KARLÍNSKÝ s.r.o.

KARLÍNSKÝ s.r.o.

KARLÍNSKÝ s.r.o.

KARLÍNSKÝ s.r.o.

KARLÍNSKÝ s.r.o.

KARLÍNSKÝ s.r.o.

KARLÍNSKÝ s.r.o.

KARLÍNSKÝ s.r.o.

KARLÍNSKÝ s.r.o.

KARLÍNSKÝ s.r.o.

KARLÍNSKÝ s.r.o.

KARLÍNSKÝ s.r.o.

KARLÍNSKÝ s.r.o.

KARLÍNSKÝ s.r.o.

KARLÍNSKÝ s.r.o.

KARLÍNSKÝ s.r.o.

KARLÍNSKÝ s.r.o.

KARLÍNSKÝ s.r.o.


KARLÍNSKÝ s.r.o.

KARLÍNSKÝ s.r.o.

KARLÍNSKÝ s.r.o.

KARLÍNSKÝ s.r.o.


KARLÍNSKÝ s.r.o.

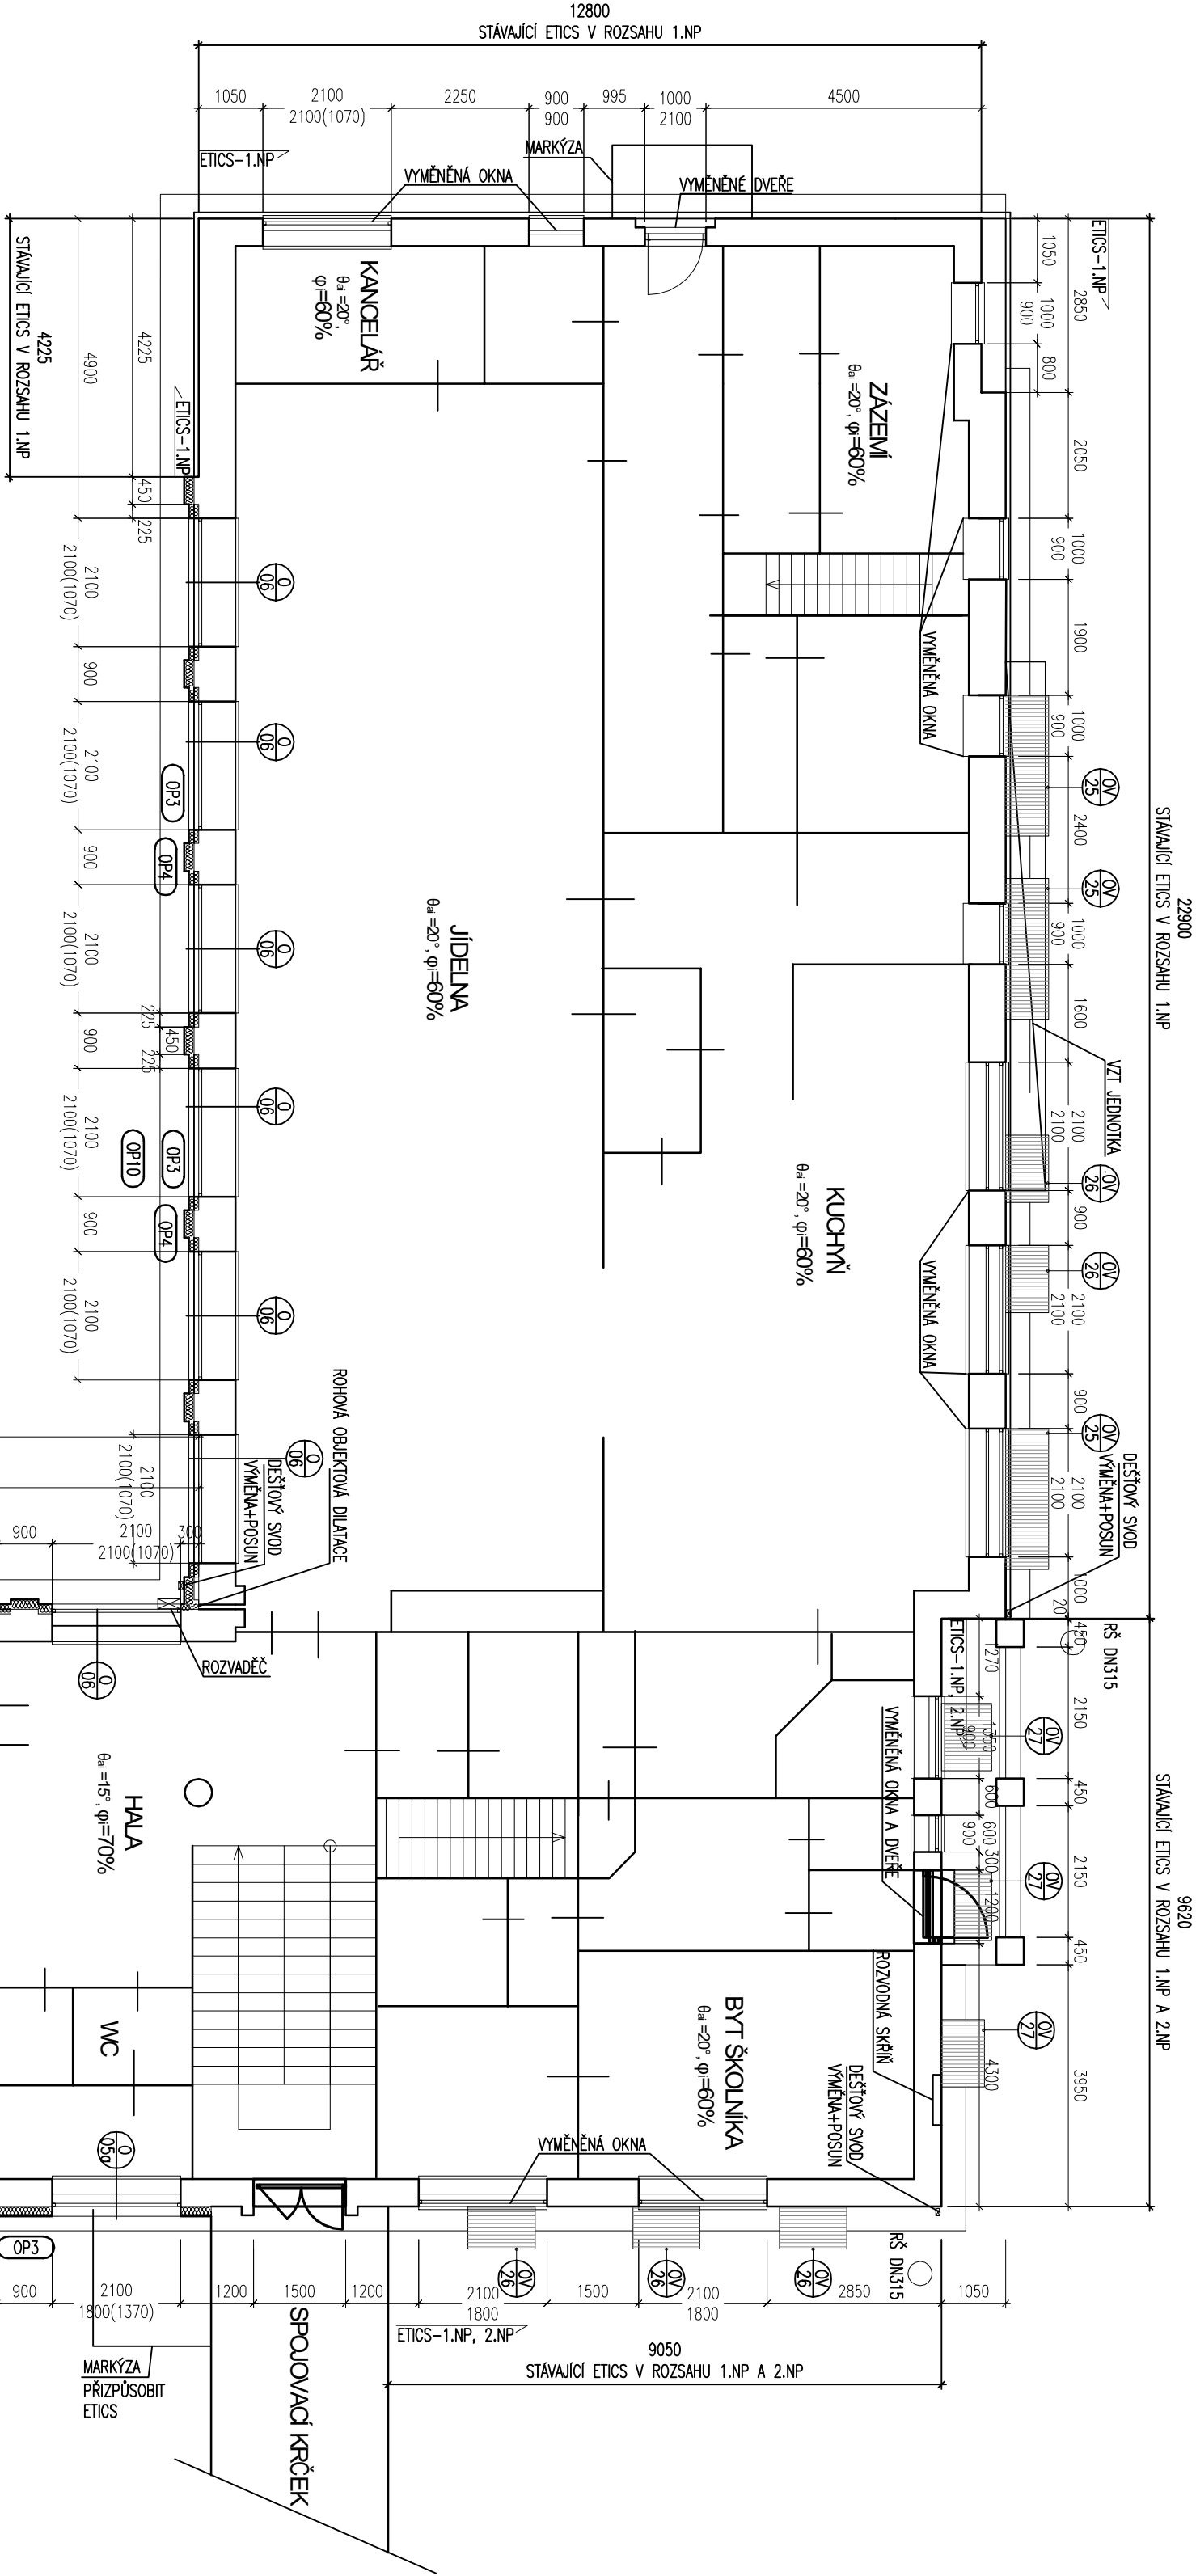

LEGENDA: HMOT
STAVBAČÍ ZNAČ
NOVÉ NÁMĚTOVÁ TĚRUM IZOLACE

PRÍLOHA:
TABULKA VĚŠÍCH VÝPLNÍ
TABULKA KLENBÝSKÝCH VÝROBKŮ
TABULKA OSTATNÍCH PRVŮ
TABULKA SKLADBY
DETAILY VZ. VÝKRES
DL.010.ARS.002.LW
DL.010.ARS.003.LW
DL.010.ARS.004.LW
DL.010.ARS.005.LS
DL.010.ARS.1010.441

POZNÁMKY:
- VĚŠKÉ ROZMĚRY ZKONTROLOVAT IN SITU.
- PŘED VÝROBOU PRVŮ (OKEN, DVEŘÍ APOD.) ZAMĚŘIT OTVORY SAMOSTATNĚ.

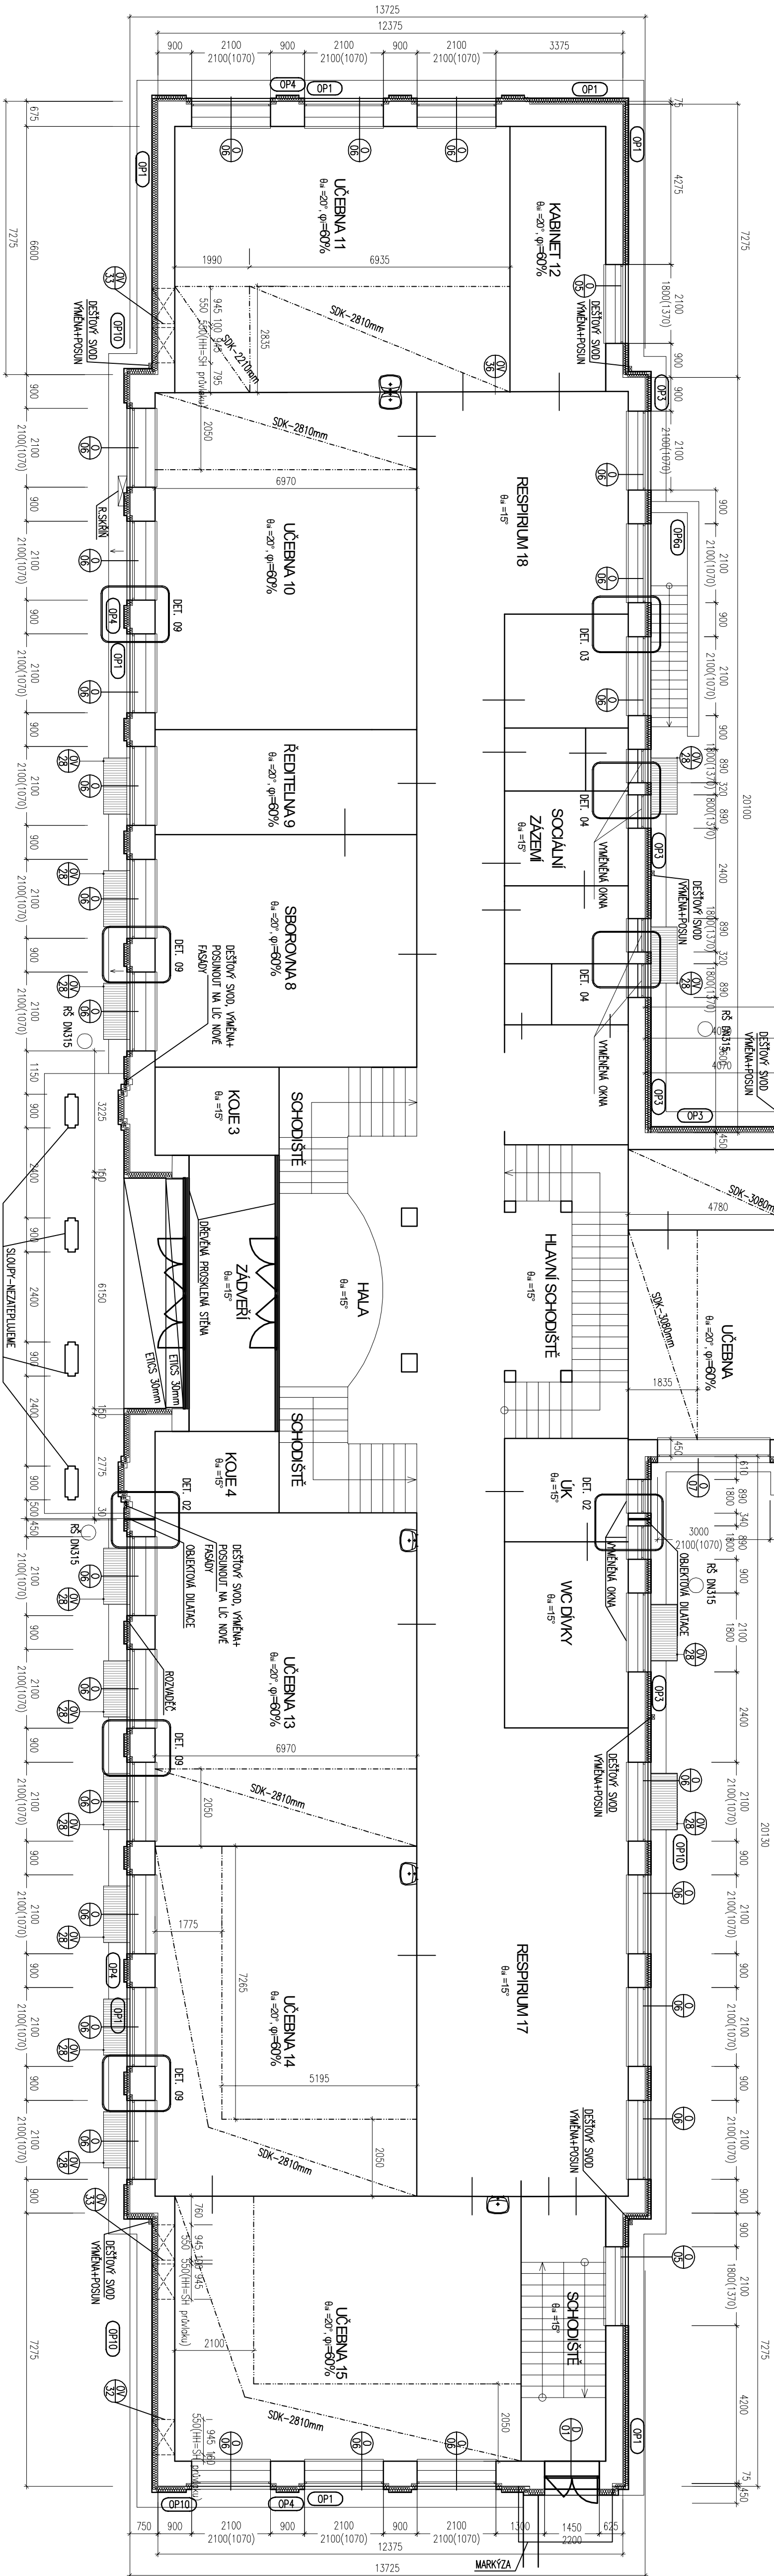

Základní údaje o výstavbě
a o stavbě
a o stavbě

Plán 1:100

Stavba
Stavba
Stavba

KARL NBLK
KARL NBLK s.r.o.
KARL NBLK s.r.o.

KARL NBLK
KARL NBLK s.r.o.
KARL NBLK s.r.o.

KARL NBLK
KARL NBLK s.r.o.
KARL NBLK s.r.o.

KARL NBLK
KARL NBLK s.r.o.
KARL NBLK s.r.o.

KARL NBLK
KARL NBLK s.r.o.
KARL NBLK s.r.o.

KARL NBLK
KARL NBLK s.r.o.
KARL NBLK s.r.o.

KARL NBLK
KARL NBLK s.r.o.
KARL NBLK s.r.o.

KARL NBLK
KARL NBLK s.r.o.
KARL NBLK s.r.o.

KARL NBLK
KARL NBLK s.r.o.
KARL NBLK s.r.o.

KARL NBLK
KARL NBLK s.r.o.
KARL NBLK s.r.o.

KARL NBLK
KARL NBLK s.r.o.
KARL NBLK s.r.o.
