

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů

Článek I.

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245

500 03 Hradec Králové

Zapsaný v Obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl B, vložka 891

Jednající : PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman Královéhradeckého kraje

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a ekonomických:

Jitka Brádllová, tel. spojení: [REDACTED],

e-mail: [REDACTED]

Zástupce Objednatele pro věci technické (dále také jen „TDS“):

Ing. Josef Kubíček, tel. spojení: [REDACTED],

e-mail: [REDACTED]

IČO : 708 89 546
DIČ : CZ 708 89 546
Bankovní spojení : Komerční banka a.s.
Číslo účtu : 27-2031100257/0100

(dále též jako „Objednatel“)

a

ATECH Bohemia a.s.

Rohoznice č.p.102,

533 41 Rohoznice

Zapsaná v Obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2124

Jednající : Mgr. Michal Pokorný
předseda představenstva
Zástupce pro věci technické : Robert Hegedůš
IČ : 259 43 219
DIČ : CZ 25943219
Bankovní spojení : ČSOB a.s.
Číslo účtu : 179242084/0300
Telefon : [REDACTED]

(dále též jako „Zhotovitel“)

Zhotovitel prohlašuje, že je osobou oprávněnou k provádění staveb, prací a provedení předmětu díla popsánoho touto smlouvou.

Uvedené osoby oprávněné jednat jménem obou smluvních stran prohlašují, že jsou plně způsobilé k právnímu jednání, dále že jsou oprávněny tuto smlouvu (s dále sjednaným obsahem uzavřít) a podepsat a k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiné osoby. Tím není dotčena povinnost splnit podmínky platnosti smlouvy vyplývající pro objednatele především ze zákona 129/2000 Sb., o krajích a 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, oba ve znění pozdějších předpisů.

Zástupce Objednatele pro věci technické (TDS) je oprávněn projednat se zhotovitelem potřebu:

- projekčních změn díla, včetně rozšíření nebo redukce smluvních prací do max. objemu 20 % z celkové ceny díla vč. DPH za dodržení příslušných ustanovení § 222 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), o změně smlouvy není TDS oprávněn samostatně rozhodnout;
- provedení dodatečných zkoušek nebo ověření a dát k nim zhotoviteli pokyn;
- pozastavení prováděných stavebních prací nebo jejich zastavení v souladu s podmínkami smlouvy a dát k němu zhotoviteli pokyn;
- uplatnění požadavku na vyloučení pracovníků Zhotovitele, kteří hrubým způsobem poruší předpisy a nařízení platné pro realizaci díla a takový požadavek uplatnit.

Zástupcem Zhotovitele pověřeným řízením stavebních prací, koordinací poddodavatelů, řešením všech problémů souvisejících s realizací díla a jednat za Zhotovitele v rozsahu pravomoci stavbyvedoucího (dále jen stavbyvedoucí) je: [REDAKCE]
tel. [REDAKCE]

Článek II.

Podklady pro uzavření smlouvy

1. Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 28.11.2018 předložená v rámci výběrového řízení na akci s názvem „**Výměna vstupních požárních dveří v POO - A Jičín**“. Dalším podkladem pro uzavření této smlouvy je následující projektová a smluvní dokumentace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy:

- a) *Výkaz výměr*
- b) *Specifikace prací pro instalaci vstupních požárních dveří*

2. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem smlouvy:

- a) překontroloval předanou projektovou a smluvní dokumentaci dle bodu 1 tohoto článku;
- b) prověřil předloženou dokumentaci a nemá připomínky / námitky;
- c) prověřil místní podmínky na staveništi;
- d) nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele;
- e) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do podrobného rozpočtu v rozsahu, který specifikoval objednatel do doby podpisu této smlouvy;
- f) veškeré své požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě.

3. Zhotovitel si prověřil převzatou projektovou a smluvní dokumentaci, uvedenou v bodě 1 tohoto článku a prohlašuje, že nebude uplatňovat žádné náklady, vyplývající z titulu případných rozdílů mezi oceněným rozpočtem uvedeným ve své nabídce, zpracovaným dle projektové a smluvní dokumentace, uvedené v bodě 1 tohoto článku a skutečným provedením stavby, které bude výsledkem jeho plnění podle této smlouvy, s výjimkou změn a rozsahu prací, které budou objednatelům dodatečně písemně požadovány.

Článek III.

Předmět díla

1. Předmětem díla je kompletní provedení:

Zhotovení díla „**Výměna vstupních požárních dveří v POO - A Jičín**“ specifikovaného projektovou dokumentací (*specifikace prací pro instalaci vstupních požárních dveří*), kterou vypracoval Ladislav Voves a soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení díla. Objednatel se zavazuje k provedení úhrady za dílo dle podmínek této smlouvy, po jeho převzetí v termínech stanovených dle smlouvy.

2. Dojde-li při realizaci díla k potřebě provést změnu závazku ze smlouvy dle § 222 ZZZV, tj. dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky, které svým množstvím a rozsahem smlouvené práce překračují, avšak k původnímu předmětu díla přísluší, a které nejsou obsaženy v původní veřejné zakázce a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu díla a tyto práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, je Zhotovitel povinen provést položkový soupis těchto stavebních prací a předložit tento soupis Objednateli nebo jeho zástupci pro věci technické (TDS). Objednatel bude v tomto případě postupovat ve smyslu ustanovení § 222 ZZZV.

Pro ocenění případných dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení těchto cen využívány ceny z příslušných katalogů ÚRS, a.s. Praha, event. RTS a.s. Brno, a to v cenové úrovni platné v době podání nabídky.

O realizaci dodatečných stavebních prací uzavřou smluvní strany dodatek ke smlouvě o dílo. Teprve po jeho uzavření má Zhotovitel právo na realizaci dodatečných stavebních prací a na jejich úhradu. Pokud Zhotovitel neučiní veškeré úkony dle tohoto odstavce a nebude uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo na realizaci dodatečných stavebních prací a na jejich úhradu, má se za to, že práce a dodávky dodatečně Zhotovitelem realizované byly zahrnuty v předmětu a ceně díla.

3. Bez písemného souhlasu Objednatele a zpracovatele projektu nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo výrobky, než které uvádí zadávací dokumentace a související doklady. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál nebo prostředek, o kterém je v době použití známo, že je škodlivý pro zdraví lidí. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitou nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

4. Místem plnění je ON Jičín a.s. – nemocnice Jičín, Bolzanova 512, 506 01 Jičín, objekt POO – A, st.p.č. 3693.

Článek IV.

Čas plnění

1. Zhotovitel převezme staveniště na základě výzvy Objednatele nejpozději do 7 dnů po obdržení výzvy.

Předpokládaný termín zahájení prací: **leden 2019**

Zhotovitel provede dílo v termínu nejdéle **do 11 týdnů od podpisu smlouvy o dílo** a předá dílo Objednateli nejdéle **do 12 týdnů od podpisu smlouvy o dílo**.

V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně objednatel nebude možné dodržet termín zahájení doby plnění, je objednatel oprávněn zahájení doby plnění posunout na pozdější dobu, posouvá se tak i termín ukončení doby plnění.

2. Podmínkou pro zahájení prací ve smyslu této smlouvy je protokolární předání staveniště v rozsahu dle zadávací dokumentace a ustanovení této smlouvy. V případě, že Objednatel nepředá Zhotoviteli staveniště včetně příslušných dokladů, prodlouží se termín dokončení díla dle článku IV., odst. 1 této smlouvy (a ostatní termíny) úměrně tomuto prodlení, a to o dobu odpovídající počtu dní prodlení Objednatele s protokolárním předáním staveniště dle ustanovení věty předcházející.

3. Smluvní strany si výslovně sjednaly, že pokud Zhotovitel nezahájí práce na realizaci díla dle ustanovení této smlouvy do 5 dnů po sjednaném termínu zahájení, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

4. Jestliže Zhotovitel předmět díla dokončí před dohodnutým termínem, zavazuje se Objednatel toto dílo převzít v dřívějším sjednaném termínu, pokud dílo nevykazuje vady či nedodělky.

Článek V.

Cena díla

1. Cena díla byla dohodnuta v souladu s ustanovením zákona č. 526/90 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů jako "CENA NEJVÝŠE PŘÍPUSTNÁ (MAXIMÁLNÍ)" pro rozsah dle článku III. - předmět díla, specifikovaný zadávací dokumentací, kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených ve smlouvě.

Celková cena předmětu díla činí:

Cena bez DPH	605.636,- Kč
DPH 21%	127.183,56 Kč
Cena celkem vč. DPH	732.819,56 Kč

(slovy: sedmsetřicetdvatisícosemsetdevatenáct korunčeských a padesátšest haléřů)

2. Cena díla je stanovena na základě rozpočtu (cenové nabídky) Zhotovitele, který tvoří nedílnou součást této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni platné k datu předání kompletního díla.

3. Zhotovitel zaručuje, že jeho rozpočet (cenová nabídka) obsahuje veškeré práce dle ustanovení této smlouvy o dílo a podmínek výběrového řízení pro předmětnou stavbu (včetně kompletní zadávací dokumentace). Cena díla zahrnuje zejména veškeré náklady včetně materiálu, dopravy, poplatků za skládku, ukládání hmot na skládky, veškerých energií, vybudování příjezdů na staveniště, dočasného dopravního značení, nákladů

spojených s dočasným omezením práv jiných osob v souvislosti s prováděním stavby, poplatků za dočasné užívání veřejných a jiných ploch (mezideponie, překopy apod.), nákladů na vytyčení inženýrských sítí, zajištění potřebných revizí, zkoušek, rozborů a zaměření potřebných ke zhotovení a dokončení díla. V ceně díla jsou rovněž zahrnuty náklady na vybudování, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště a bezpečnostní zajištění staveniště (osvětlení, ohrazení, přechody apod.). Cena díla obsahuje případné předpokládané zvýšení ceny v závislosti na inflaci.

4. Poplatky za „skládkovné“ jsou v ceně zahrnuty celkovou limitní (maximální) částkou. Zhotovitel doloží při soupisu prací doklady o uložení a úhradě poplatků.

5. Daňové sazby budou účtovány dle daňových zákonů a předpisů, platných v době realizace.

Článek VI.

Platební a finanční podmínky, smluvní sankce

1. Objednatel uhradí Zhotoviteli smluvní cenu díla na základě předložených faktur, které budou splňovat podmínky daňového dokladu. Podkladem pro vystavení a nedílnou součástí každého daňového dokladu musí být zástupcem Objednatele odsouhlasený a potvrzený soupis provedených prací a dodávek, který vypracuje Zhotovitel vždy k poslednímu kalendářnímu dni příslušného měsíce. Plnění Zhotovitele v rozsahu Objednatelem potvrzeného soupisu prací a dodávek bude považováno za samostatné zdanitelné plnění v režimu přenesené daňové povinnosti ve smyslu ustanovení §92a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Daňový doklad (faktura) bude obsahovat všechny náležitosti dle platných předpisů.

Daňový doklad dále musí obsahovat:

- číslo a datum podpisu smlouvy o dílo
- název a sídlo smluvních stran a jejich IČO a DIČ
- předmět stavebních prací a název stavby
- název peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platba provést
- razítko a podpis Zhotovitele
- zástupcem Objednatele odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek jako přílohu.

Smluvní strany se dohodly, že Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.

V případě, že daňový doklad nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je Objednatel oprávněn vrátit jej neprodleně Zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přerušuje plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opraveného účetního dokladu Objednateli.

2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Tento odstavec se nevztahuje na dodatečné stavební práce, pro které platí režim dle článku III. odstavec 2.

3. Pokud Zhotovitel předá Objednateli a Objednatel převezme celé komplexní dílo zhotovené dle projektové dokumentace, které však bude mít drobné vady a nedodělky, které nebudou bránit řádnému užívání díla, uhradí Objednatel Zhotoviteli 90% z celkové ceny díla. Zbývajících 10 % z celkové ceny díla uhradí Objednatel Zhotoviteli po odstranění poslední z vad či nedodělků, evidovaných v zápise o předání a převzetí díla.

Splatnost faktur (daňových dokladů) je stanovena do 30 kalendářních dnů po jejím obdržení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena tři dny po jejím doporučeném odeslání. Závazek Objednatele k úhradě ceny za dílo je splněn tehdy, kdy je příslušná částka odepsána z účtu Objednatele.

4. Pracovníkem, zmocněným Objednatelem pro kontrolu a odsouhlasení soupisu provedených prací je [REDAKCE] tel. [REDAKCE]

5. V případě, že Zhotovitel odmítne převzít staveniště předávané Objednatelem v souladu s touto smlouvou, je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den do převzetí staveniště.

6. V případě prodlení Zhotovitele s časem plnění dle článku IV. bod 1. této smlouvy (tzn., pokud Zhotovitel nesplní termíny dle tohoto článku), zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla včetně DPH za každý den prodlení (až do dne, kdy tento závazek ze smlouvy splní. Tento den bude zaznamenán ve stavebním deníku osobami k tomu jménem smluvních stran oprávněnými). Pokud prodlení přesáhne 20 kalendářních dnů, jedná se o podstatné porušení smlouvy.

7. V případě, že Objednateli vznikne ve smyslu ujednání této smlouvy o dílo nárok na smluvní pokutu nebo náhradu škody, která není kryta smluvní pokutou vůči Zhotoviteli, je Objednatel oprávněn odečíst tuto částku z fakturované částky.

8. Bude-li v záruční lhůtě na díle zjištěna vada, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Prodlením se v tomto případě rozumí doba, která uplyne ode dne doručení oprávněné reklamace do dne předání bezvadných prací. Tuto pokutu však Zhotovitel neplatí, předá-li bezvadné práce (odstraní-li vady) do 10-ti dnů od doručení reklamace nebo v termínu, který smluvní strany dohodnou při reklamačním řízení. Neprokáže-li se jinak, považuje se za termín doručení oprávněné reklamace pátý kalendářní den od jejího odeslání.

9. Odstraněním vady do 10 dnů od doručení reklamace (nebo v termínu, který smluvní strany dohodnou při reklamačním řízení) není dotčen nárok poškozené strany na úhradu vzniklé škody způsobené vadami díla.

10. Pokud Zhotovitel nevyklidí při odevzdání a převzetí díla zcela a úplně staveniště a neupraví jej tak, jak určuje zadávací dokumentace a ustanovení této smlouvy o dílo, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení s plněním tohoto závazku.

11. Jestliže Zhotovitel oznámí Objednateli, že je dílo připravené k odevzdání a při převjímacím řízení bude zjištěno, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady s tím vzniklé.

12. Jestliže Zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v termínu, který byl dohodnut v převjímacím řízení při předání dokončeného díla (pokud se na díle vyskytují), zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý nedodělek nebo vadu a den prodlení.

13. Strana, která zapříčinila důvodné odstoupení od smlouvy, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy a navíc jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny díla (včetně DPH).

14. Zhotovitel prokáže účtování (fakturování) poplatků za „skládkovné“ doložením dokladu o zaplacení poplatku (potvrzeno správcem skládky) a příslušnou částku bez DPH zahrne do fakturované částky.

Článek VII.

Závazky Objednatele a Zhotovitele, podmiňující provedení díla

Objednatel předá Zhotoviteli staveniště v rozsahu a takovém stavu, aby Zhotovitel mohl započít práce.

Článek VIII.

Staveniště

1. Staveništěm se rozumí prostor, určený zadávací dokumentací veřejné zakázky pro stavbu a zařízení staveniště.

2. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště nejpozději v den zahájení prací, pokud se strany nedohodnou jinak.

3. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi a zabezpečit je tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

4. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky nebo světelné řízení dopravy podle předpisů o pozemních komunikacích a podmínek silničního správního úřadu, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá za umístování, přemístování a udržování tohoto zařízení v souvislosti s průběhem provádění prací.

5. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci svých prací staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany životního prostředí oplocení, osvětlení, přechody, vstupy oddělení současného provozu na místních komunikacích od staveniště apod. v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací, stavebním povolením, stavebním zákonem včetně souvisejících předpisů, dále ve smyslu zákona č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákona č.309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č.591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a souvisejících předpisů. Případné škody vzniklé nedodržením tohoto ustanovení nese Zhotovitel. Detailní podmínky budou dohodnuty při přijímce staveniště.

6. Nejpozději při odevzdání a převzetí díla je Zhotovitel povinen vyklidit zcela staveniště a upravit jej tak, jak určuje zadávací dokumentace, pokud nebude dohodnuto jinak.

7. Zhotovitel zodpovídá za zajištění čistoty všech komunikací, které používá k realizaci stavby. Veškeré případné sankce a pokuty, které budou na Objednateli uplatněny z důvodu nesplnění této povinnosti, a které způsobí Zhotovitel, je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli.

Článek IX.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku jsou stanoveny zákonem č.183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č.499/2006 Sb., ve znění pozdějších. Povinnost vést stavební deník končí až po odstranění drobných vad a nedodělků.

Stavební deník bude uložen na staveništi u stavbyvedoucího Zhotovitele a kdykoli bude na žádost poskytnut Objednateli, popř. osobě jím k tomu oprávněné.

2. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího mohou do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze osoby, stanovené stavebním zákonem a vyhláškou č.499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

3. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil zástupce Objednatele pro věci technické nebo Objednatelem pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 2 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem bez výhrad souhlasí.

4. Objednatel je povinen vyjadřovat se k mimořádným zápisům ve stavebním deníku učiněných Zhotovitelem nejpozději do 3 pracovních dnů od data zápisu na základě telefonické výzvy Zhotovitele.

5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy o dílo, ale slouží jako podklad pro vypracování případného návrhu dodatku smlouvy o dílo.

Článek X.

Provádění díla, kvalitativní podmínky

1. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými na svůj náklad. Prodlení, které bude tímto případně způsobeno, je považováno za prodlení zaviněné Zhotovitelem. Objednatel je povinen provést kontrolu prací nejpozději do pěti pracovních dnů od doručení písemné výzvy Zhotovitele.

2. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelé, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel odpovídá za kvalitu těchto prací tak, jako by je prováděl sám. Doklady o kvalifikaci pracovníků Zhotovitele nebo jeho poddodavatele je Zhotovitel povinen na požádání Objednatele předložit do tří pracovních dnů. V případě nesplnění této povinnosti je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.

3. Zhotovitel je povinen při provádění prací dodržovat veškeré platné ČSN a EN, bezpečnostní a hygienické předpisy, zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti (např. při svářečských pracích a s otevřeným ohněm včetně zajištění osmi

hodinového dohledu po ukončení uvedených prací). Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese vzniklé náklady spojené s odstraněním škody Zhotovitel.

4. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění stavby podmínky orgánů státní správy a podmínky správců sítí. Případné škody, vzniklé nedodržením těchto podmínek, nese Zhotovitel.

5. Obě smluvní strany se dohodly, že kvalita díla je definována zadávací dokumentací s technickými specifikacemi použitých materiálů a výrobků, normami ČSN a EN (i když nejsou ve smyslu stavebního zákona závazné) a úvodními ustanoveními bývalých ceníků URS Praha, kde je specifikována předeepsaná kvalita a způsoby její kontroly, uvedeny způsoby měření, názvosloví a definice.

6. Náklady spotřebovaných energií a vody potřebných pro stavbu nese Zhotovitel. Jejich měření, přihlášení a projednání odběrů si zajistí Zhotovitel na svoje náklady u dodavatelů energií. Detailní podmínky budou dohodnuty při přejímce staveniště.

7. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele, a to až do výše ceny díla vč. DPH. Stejně podmínky je Zhotovitel povinen zajistit u svých poddodavatelů. Doklady o pojištění díla je povinen Zhotovitel na požádání předložit Objednateli do tří pracovních dnů. V případě nesplnění této povinnosti je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.

8. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek, vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných právních předpisů či z ustanovení této smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

9. Na stavbě budou konány pravidelné kontrolní dny. Termín konání kontrolního dne oznámí zástupce Objednatele.

10. Zhotovitel umožní provedení rekonstrukčních prací na stávajících inženýrských sítích, zhotovení nových inženýrských sítí, případně jejich přeložek nebo přípojek inženýrských sítí, které se v prostoru staveniště nacházejí a které zajišťují správci, nebo vlastníci těchto sítí.

11. Zhotovitel je povinen stanovit a dodržet technologii svých prací tak, aby zabezpečil při bouracích a demoličních pracích šetrné demontáže výrobků, rozebrání povrchů chodníků včetně obrubníků a dalších materiálů a výrobků a nedošlo tak ke zbytečnému poškození materiálů a výrobků, o které má Objednatel zájem pro další využití.

12. Před zahájením prací (nebo v průběhu prací) provedou společně zástupci Zhotovitele a Objednatele soupis – inventarizaci stávajícího materiálu a výrobků. Po rozebrání na vyzvání Zhotovitele posoudí zástupce Objednatele pro věci technické (TDS) vhodnost dalšího použití těchto výrobků a materiálů. Vytříděný a očištěný materiál bude uložen Zhotovitelem do skladů Objednatele dle určení stavebního dozoru Objednatele. Ostatní (tj. neupotřebitelný) materiál a výrobky budou uloženy dle podmínek zadávací dokumentace k výběrovému řízení a ustanovení této smlouvy o dílo. Veškeré náklady, spojené s realizací tohoto bodu, jsou zahrnuty v ceně díla.

13. Zhotovitel před provedením zásypu inženýrských sítí vyzve příslušného správce a vlastníka inženýrské sítě k souhlasu s provedením zásypu – souhlas příslušného správce a vlastníka bude zaznamenán ve stavebním deníku.

Článek XI.

Předání díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Termín zahájení přejímacího řízení oznámí Objednatel písemně Zhotoviteli.

2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit k přejímacímu řízení:

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách, použitých materiálech (atesty, paspory, certifikáty, osvědčení, stanoviska, zkoušky, protokoly, apod.)
- prohlášení o shodě pro všechny předepsané výrobky
- *návody k obsluze, montáži a údržbě všech instalovaných zařízení a výrobků (v českém jazyce) včetně pohonů*
- *zpráva o revizi elektro, protokol o funkčnosti požárního tlačítka*
- *dokumentace skutečného provedení díla – do dokumentace pro výběr zhotovitele budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla*
- stavební deník (deníky)

3. O průběhu přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis, ve kterém uvede i soupis případných vad a nedodělků, pokud se na díle vyskytnou, dále termín jejich odstranění. Pokud Objednatel odmítne dílo převzít, uvede do zápisu své důvody.

4. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou práce uvedené v této smlouvě (článek III. Předmět díla) ukončeny řádně a včas a Zhotovitel předal Objednateli veškeré doklady uvedené v tomto článku smlouvy a Objednatel dílo převzal. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny "ukončení díla", „ukončení zkušebního provozu“ nebo "den předání", rozumí se tím den, ve kterém dojde k podpisu předávacího protokolu respektive k podpisu protokolu o ukončení zkušebního provozu.

5. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla. V tomto případě je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí.

6. Objednatel není povinen převzít dílo, vykazující vady nebo nedodělky, které podstatným způsobem omezují užívání stavby.

7. Zhotovitel se na základě výzvy Objednatele zavazuje k účasti na kolaudačním řízení v místě provedení díla, za účelem zodpovězení případných dotazů stavebního úřadu nebo dotčených orgánů a organizací státní správy.

Článek XII.

Záruka

1. Zhotovitel poskytuje na předmět díla dle ustanovení této smlouvy záruku 24 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které Objednatel zjistil, a které bez zbytečného odkladu reklamoval. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí celého kompletního díla Objednatelem.
2. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále může Objednatel v reklamaci uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit, a zda požaduje finanční náhradu.
3. Reklamaci lze uplatnit nejpozději v poslední den záruční lhůty.
4. Zhotovitel je povinen nastoupit na opravu do 48 hodin po nahlášení reklamace (závady). Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 24 hodin po nástupu na opravu oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává.
6. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 30 dnů po obdržení reklamace Objednatele, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
7. Ve sporných případech o oprávněnosti reklamace rozhoduje příslušný soud. O dobu, po kterou bude Zhotovitel v prodlení s odstraněním vady, se prodlužuje jím poskytnutá záruční doba. O takto prodloužené záruční době bude pořízen účastníky záznam.

Článek XIII.

Změna závazku

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným "Dodatek ke smlouvě".
2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání osob oprávněných jménem smluvních stran jednat.

Článek XIV.

Pojištění

1. Zhotovitel je povinen mít před zahájením prací na díle na své náklady uzavřené pojištění odpovědnosti vůči třetím stranám a je povinen je udržovat v platnosti, nebo zařídit, aby bylo udržováno v platnosti, a to po celou dobu platnosti smlouvy, až do splnění všech svých závazků vyplývajících ze smlouvy, včetně závazků poddodavatelů. Limit pojištění odpovědnosti Zhotovitele vůči třetím stranám musí být alespoň do výše ceny včetně DPH dle čl.V. odst.1 za každou pojistnou událost.

2. Pokud Zhotovitel nemá uzavřenou pojistnou smlouvu v požadované výši je povinen uzavřít před započítáním stavby pojistnou smlouvu na „Stavebně montážní rizika“ na požadovanou částku.

3. Zhotovitel je povinen dodat Objednateli na jeho žádost příslušné doklady o pojištění jako důkaz, že požadované pojištění je plně platné a účinné, a to do tří pracovních dnů. V případě nesplnění této povinnosti je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.

Článek XV.

Ostatní ujednání

1. Objednatel může nařídít dočasné zastavení stavebních prací. Lhůty a termíny se v takovém případě prodlužují o čas, po který byly stavební práce zastaveny, pokud nebude dohodnuto jinak.

2. Při opakovaném nebo závažném nedodržení kvality provádění prací nebo porušení technologických postupů a technologické kázně Zhotovitelem nebo při nedodržení termínů a podmínek stanovených v této smlouvě, má právo po Zhotovitelově neuposlechnutí předchozího upozornění Objednatel od smlouvy jednostranně odstoupit. V tomto upozornění musí být ze strany Objednatele uvedeno, v čem spatřuje porušení povinností Zhotovitele, musí mu být poskytnuta dodatečná lhůta pro odstranění závadného stavu.

3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit, je povinna své odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením data, ke kterému od smlouvy odstupuje. Odstoupení od smlouvy je možné pouze v případě, že dojde k porušení smluvních povinností druhou stranou. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Minimální lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 10 pracovních dní od podepsání smlouvy.

4. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, jsou pak povinnosti smluvních stran následující:

- Zhotovitel provede soupis všech provedených prací
- Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací (tj. soupis provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla) a zpracuje celkovou sestavu těchto provedených prací
- Zhotovitel odklidí veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak
- Zhotovitel vyzve Objednatele k "dílčímu předání díla" a Objednatel je povinen do pěti pracovních dnů od doručení této výzvy zahájit "dílčí přejímací řízení"
- po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemně práva a povinnosti, plynoucí pro ně ze zániku smlouvy.

5. Smluvní vztahy neupravené v této smlouvě se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy. Závazky vyplývající z této smlouvy jsou v plném rozsahu závazné i pro případné právní nástupce obou smluvních stran.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních (stejnopisech), z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. Každý stejnopis této smlouvy má platnost originálu.

7. Dlužné částky z titulu náhrady škody nebo smluvních pokut jsou splatné ve lhůtě patnácti dnů od doručení písemné výzvy strany oprávněné straně povinné z těchto plnění s tím, že v takové výzvě bude uveden důvod a výše tohoto plnění. V případě sporu se má za to, že tato výzva byla doručena uplynutím pěti pracovních dní od jejího odeslání.

8. Smluvní strany prohlašují, že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu, že smlouva je projevem pravé a svobodné vůle obou smluvních stran a že nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

9. Tato smlouva je platná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

10. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy, jejích změn a dodatků v souladu s povinností stanovenou objednateli zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně dle dalších právních předpisů upravujících povinnost uveřejnění dokumentů vztahujících se k plnění díla dle této smlouvy.

11. O uzavření této smlouvy rozhodl na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK.1.2.128.12014 hejtman Královéhradeckého kraje.

Tato smlouva je schválena dnem podpisu obou stran.

V Hradci Králové dne 13. 02. 2019



V Rohoznici dne 4.2.2019

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



.....
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman Královéhradeckého kraje



.....
Mgr. Michal Pokorný
předseda představenstva

Výměna vstupních dveří oddělení pavilonu POO
Výkazy výměr

1) Výměna vstupních dveří na Porodnickém oddělení a ORL

P.č.	Specifikace	Množství	M.J.	Cena /M.J.	Cena bez DPH
Demontáž					
1	Demontáž stávající konstrukce prosklené stěny s dvoukřídlými dveřmi (2100 x 2700mm)	2	ks	3 600,00	7 200,00
2	ekologické likvidace	2	ks	500,00	1 000,00
Stavební přípomoc					
3	Úprava ostění pro kotvení konstrukce prosklené stěny	14	bm	300	4 200,00
4	Jádrové vrtání pro posunutí stávající elektroinstalace	6	ks	220,00	1 320,00
5	Průrazy pro novou elektroinstalaci	4	ks	185,00	740,00
6	Začištění štukem po montáži prosklené konstrukce, začištění stávajících otvorů po demontáži vypínačů a zásuvky, interkomu	2	ks	3 400,00	6 800,00
7	Opravné malby	6	m ²	220,00	1 320,00
Elektroinstalace					
8	Kabel pro přívod elektrického proudu 220V/10A 3Cx1,5 mm ² CYKY	22	m	11,00	242,00
9	Jednopolový jistič C 10A	2	ks	245,00	490,00
10	Klíčový spínač	4	ks	0,00	0,00
11	Ovládací jednotka dveří pro přepnutí režimů.	2	ks	0,00	0,00
12	Požární tlačítko	2	ks	550,00	1 100,00
13	Radar s bezpečnostním infračidlem.	4	ks	0,00	0,00
14	Úprava stávající elektroinstalace - demontáž světla a ukončení přívodu v krabičce	2	ks	550,00	1 100,00
15	Úprava stávající elektroinstalace - přemístění 2ks vypínačů, 1ks zásuvka, interkom dle specifikace	2	ks	850,00	1 700,00
16	Tlačítko ovládání otevření dveří	2	ks	150,00	300,00
17	Kabel 5x2x0,5mm2 SYKFY pro propojení dveří s ovládací jednotkou	4	m	9,00	36,00
18	Kabel 2x2x0,5 mm2 SYKFY pro propojení: tlačítka otevírání dveří ze sestery, 2x klíčového spínače, propojení dveří a požárního tlačítka	60	m	7,00	420,00
19	Montážní práce elektro (přívod 220V/10A), slaboproudá propojení dveří (ovládací jednotka, klíčové spínače, požární tlačítko, ovládací tlačítko ze sestery)	2	soub.	4 850,00	9 700,00
D + M nové prosklené stěny s aut. dvoukřídlými dveřmi					
20	D + M hliníkové prosklené stěny s aut. dvoukřídlými dveřmi	2	ks	178 815,00	357 630,00
Ostatní					
21	Revize elektro, protokol o funkčnosti EPS	2	ks	1 500,00	3 000,00
22	Úklid po montáži	2	soub.	1 000,00	2 000,00
23	Zaškolení obsluhy	1	soub.	500	500,00
Celkem bez DPH					400 798,00 Kč
DPH 21%					84 167,58 Kč
Celkem s DPH					484 965,58 Kč

D + M = dodávka + montáž

2) Výměna vstupních dveří na Porodních sálech

P.č.	Specifikace	Množství	M.J.	Cena /M.J.	Cena bez DPH
Demontáž					
1	Demontáž stávající konstrukce prosklené stěny s dvoukřídlými dveřmi (1720 x 2000mm)	1	ks	3 200,00	3 200,00
2	Ekologická likvidace	1	ks	500,00	500,00
Stavební přípomocce					
3	Úprava ostění pro kotvení konstrukce prosklené stěny	5,5	bm	300,00	1 650,00
4	Doplnění špalet st. otvoru - UA pozink. profil 75/2 mm .	0,6	m	320,00	192,00
5	posunutí překladu dle stávající konstrukce 2250 mm	1	ks	3 100,00	3 100,00
6	Ocelové konstrukce (ocelový jelek 60x60x3) od podlahy do stropní konstrukce nad podhledem pro vytvoření šikmého ostění pro kotvení pohonu	6,6	m	240,00	1 584,00
7	Opláštění SDK ocelové konstrukce šikmého ostění	3,5	m ²	6 120,00	21 420,00
8	Průrazy pro novou elektroinstalaci	1	ks	185,00	185,00
9	Zatmelení po montáži prosklené konstrukce	1	ks	2 800,00	2 800,00
10	Opravné malby	6	m ²	220,00	1 320,00
Elektroinstalace					
11	Kabel pro přívod elektrického proudu 220V/10A 3Cx1,5 mm ² CYKY	8	m	11,00	88,00
12	Jednopolový jistič C 10A	1	ks	245,00	245,00
13	Klíčový spínač	2	ks	0,00	0,00
14	Ovládací jednotka dveří pro přepnutí režimů.	2	ks	0,00	0,00
15	Požární tlačítko			550,00	0,00
16	Radar s bezpečnostním infračidlem.	2	ks	0,00	0,00
17	Posunutí stávajícího hlásiče požáru dle specifikace	1	ks	750,00	750,00
18	Tlačítko ovládání otevření dveří	3	ks	150,00	450,00
19	Kabel 5x2x0,5mm ² SYKIFY pro propojení: dveří s ovládací jednotkou, instalace nového interkomu, tlačítek otevírání dveří	50	m	9,00	450,00
20	Kabel 2x2x0,5 mm ² SYKIFY pro propojení: 2x klíčového spínače, propojení dveří a požárního tlačítka	12	m	7,00	84,00
21	Interkom (jednotlačítkový modul el. vrátného, 3x domácí telefon)	1	ks	2 150,00	2 150,00
22	Rozvodné krabice pro propojení tlačítek pro otevření dveří	3	ks	85,00	255,00
23	Montážní práce elektro - přívod 220V/10A, slaboproudá propojení dveří (ovládací jednotka, klíčové spínače, požární tlačítko, radary s bezpečnostním infačidlem, ovládací tlačítka), interkom	1	soub.	7 800,00	7 800,00
D + M nové prosklené stěny s aut. jednokřídlými dveřmi					
24	D + M hliníkové prosklené stěny s aut. jednokřídlými dveřmi	1	ks	153 615,00	153 615,00
Ostatní					
25	Revize elektro, protokol o funkčnosti EPS	1	ks	1 500,00	1 500,00
25	Úklid po montáži	1	soub.	1 000,00	1 000,00
25	Zaškolení obsluhy	1	soub.	500	500,00
Celkem bez DPH				204 838,00 Kč	
DPH 21%				43 015,98 Kč	
Celkem s DPH				247 853,98 Kč	

D + M = Dodávka + montáž

Výměna vstupních dveří oddělení pavilonu POO	
Celkem bez DPH	605 636,00 Kč
DPH 21%	127 183,56 Kč
Celkem s DPH	732 819,56 Kč

Specifikace prací pro instalaci výměny vstupních požár. dveří v POO - A Jičín

1) Výměna vstupních požárních dveří na porodnickém oddělení a ORL

Specifikace:

Stávající stav:

Dřevěná prosklená stěna s vnitřními dvoukřídlými otočnými dveřmi s polodrážkou.

Požární odolnost PB 30 C2-S. Rozměr stěny 2100 x 2700 mm.

Rám stěny je ukotven v konstrukci železového betonu o síle 215 mm.

Požadovaný standard:

Prosklená požární stěna (EI30DP1+C) hliníkové konstrukce s dvoukřídlými automatickými dveřmi.

Rozměr konstrukce 2100 x 2700 mm. Povrchová úprava RAL 1028 žlutá.

Zasklení stabilním požárním sklem EI 30.

Motor pohonu Record STA20 shodný s již používanými systémy na ostatních odděleních nemocnice.

Ovládání pohonu digitální jednotkou s možností přepnutí režimů.

2 x přístupový klíčový spínač (interier-exterie) včetně vložky a 6ks klíčů.

Bezpečnostní prvky:

2x radar s bezpečnostním infračidlem,

záložní zdroj pro zabezpečení chodu dveří při výpadku sítě,

připojení dveří na systém EPS (instalace požárního tlačítka),

elektromechanický zámek,


nouzové odblokování.

Umožnění otvírání dveří ze sesterny - napojení na spínací tlačítko.

Přemístění vypínačů osvětlení a el. zásuvky ve vstupní hale mimo dráhu křídla dveří.

Zajištění údržby a servisního zásahu (Hot-line).

Součástí dodávky budou revize elektro a protokol o funkčnosti EPS.

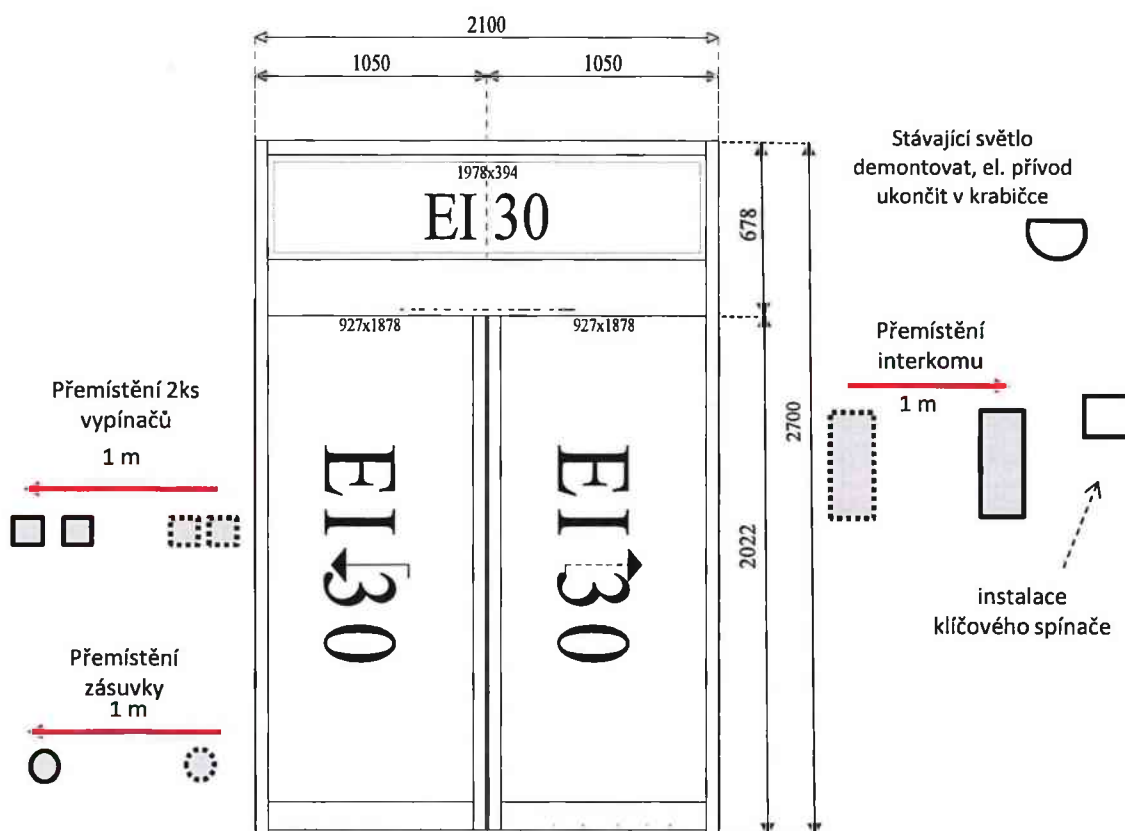

2) Výměna vstupních požárních dveří na porodních sálech

Specifikace:

Stávající stav:

Dřevěná prosklená stěna s vnitřními dvoukřídlými otočnými dveřmi s polodrážkou.

Požární odolnost PB 30 C2-S. Rozměr stěny 1720 x 2000 mm.

Rám stěny je ukotven v SDK konstrukci.

Požadovaný standard:

Prosklená požární stěna (EI30DP1+C) hliníkové konstrukce s jednokřídlými automatickými dveřmi s bočním fixním zasklením.

Rozměr konstrukce 1900 x 2240 mm. Povrchová úprava RAL 1028 žlutá.

Zasklení stabilním požárním sklem EI 30.

Motor pohonu Record STA20 shodný s již používanými systémy na ostatních odděleních nemocnice.

Ovládání pohonu digitální jednotkou s možností přepnutí režimů.

2 x přístupový klíčový spínač (interier-exterie) včetně vložky a 3ks klíčů.

Bezpečnostní prvky:

2x radar s bezpečnostním infračidlem,

záložní zdroj pro zabezpečení chodu dveří při výpadku sítě,

připojení dveří na systém EPS (instalace požárního tlačítka),

elektromechanický zámek,

nouzové odblokování.


Interkom (vstup oddělení- sesterna) , 3x DT.

Umožnění otvírání dveří ze sesterny, ambulance, DMZ - napojení na spínací tlačítko.

Přemístění požárního hlásiče z dráhy dveří.

Zajištění údržby a servisního zásahu (Hot-line).

Součástí dodávky budou revize elektro a protokol o funkčnosti EPS.

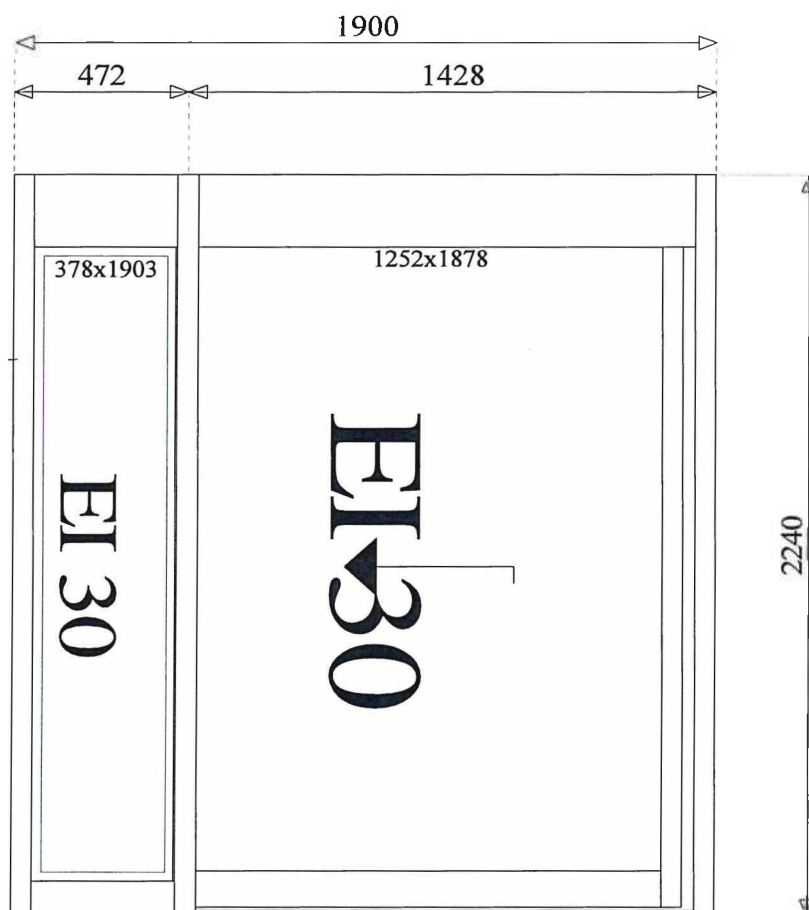

Výměna vstupních požárních dveří na porodních sálech

Stavební úprava

- POKUD NEBUDOU INSTALOVÁNY
DOPLNIT NOVĚ VA PROFILY,
- PŘEKLAD ZVÝŠIT NA 12250,
- ŠPALETY DOKONČIT PO MOLNÁŽI
STĚNY

