

SMLOUVA O DÍLO

(dále jen „Smlouva“)

SOUHRN SMLUVNÍCH DOHOD

dle ustanovení § 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění

Smluvní strany:

- (1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem Bc. Lubomírem Francem
bankovní spojení, č. účtu: 3009-813511
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

- (2) M-SILNICE a.s.
Sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice
Kontaktní adresa: oblastní závod SEVER, Hradecká 415, 506 01 Jičín
IČ: 421 96 868
DIČ: CZ42196868
zastoupený Ing. Petrem Křenkem, ředitelem oblastního závodu SEVER, na základě plné moci
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 430
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Hradec Králové, č. účtu 1080015329/0800
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

I.

Základní ustanovení

- Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení stavby „**III/2815 Samšina – kř. Příchvoj**“ v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 3 387 566,82 Kč vč. DPH (slovy: třímilionytřistaosmdesátšestsetšedesátšest 82/100 Korun českých) v souladu se zněním nabídky (bod c) článku II. Smlouvy).
- Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit řádně a včas Dílo bez vad za výše uvedenou cenu specifikovanou v odstavci 1 tohoto článku, a to v souladu s podmínkami obsaženými v dokumentech uvedených v článku II. této Smlouvy.

II.

Obsah Smlouvy o dílo

1. Níže uvedený souhrn dokumentů tvoří nedílnou součást obsahu Smlouvy. Pojmy a definice uvedené v této Smlouvě a především v tomto článku II. mají stejný význam, jaký jim je přiřazen v Obchodních podmínkách na zhotovení Díla.

Jedná se o následující dokumenty, které jsou nedílnou součástí Smlouvy, jejich důležitost je dána pořadím:

- (a) Souhrn smluvních dohod;
- (b) Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na stavební práce: „III/2815 Samšina – kř. Příchvoj“ ze dne 8.11.2013;
- (c) Nabídka Zhotovitele (Dopis nabídky, Příloha k nabídce) ze dne 31.10.2013;
- (d) Zadávací dokumentace, včetně dodatečných informací, týkající se provedení Díla; Obchodní podmínky, které zahrnují:
- (e) Zvláštní obchodní podmínky na zhotovení Díla;
- (f) Všeobecné obchodní podmínky Obchodních podmínek staveb pozemních komunikací menšího rozsahu (schválené MD-OI, č.j. 321/08-910-IPK/1 ze dne 9.4.2008 s účinností od 1.5.2008); (jsou přístupné na internetu na adrese www.pjpk.cz a ke smlouvě se nepřikládají)
Technické podmínky, které obsahují:
- (g) Situační plán, technická zpráva
- (h) Související dokumenty. Tyto dokumenty zahrnují rekapitulaci nabídkové ceny, oceněný soupis prací týkající se provedení Díla včetně technické specifikace, harmonogram, rezortní systém jakosti v oboru pozemních komunikací (RSJ – PK) (je přístupný na internetu na adrese www.pjpk.cz a ke smlouvě se nepřikládá) a plán jakosti stavby Díla, ze dne²⁾; 13.11.2013.

2. Strany si ujednaly, že dokumenty, uvedené v čl. II. pod písmenem f) a rezortní systém jakosti v oboru pozemních komunikací (RSJ – PK), jsou stranám známé a považované jimi za nedílnou součást této Smlouvy, budou v listinné podobě uloženy u Objednatele a tamtéž stranám k dispozici.
3. Nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou.

III.

Ostatní a závěrečná ujednání

1. Tato Smlouva, jejíž součástí jsou dokumenty uvedené v odst. 1 – (a) až (h) článku II., nabude platnosti dnem podpisu smluvních stran.
2. Finanční krytí ceny díla objednatel je závislé na přidělení finančních prostředků ze SFDI. Smluvní strany se proto dohodly na odkládací podmínce, podle které nabývá tato Smlouva účinnosti dnem, kdy je Objednatel doručena Zhotoviteli výzva k provedení díla podle této Smlouvy, když tato bude učiněna, pokud bude závazně schváleno poskytnutí finančních prostředků na krytí celkové ceny díla, která není kryta z rozpočtu Objednatele dle této Smlouvy. Toto doručení Zhotoviteli bude provedeno ve lhůtě maximálně jednoho roku od nabytí platnosti této Smlouvy.
3. Pokud bude rozhodnuto o neposkytnutí finančních prostředků na krytí ceny díla, je Objednatel povinen Zhotovitele o této skutečnosti bezodkladně informovat, nejpozději

však do 15 dnů ode dne, kdy se o neposkytnutí finančních prostředků dozvěděl. Tímto oznámením tato Smlouva dle ust. § 349 obchodního zákoníku zaniká.


4. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“) povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
5. Obsah této Smlouvy je možné změnit pouze písemným číslovaným dodatkem, odsouhlaseným a podepsaným oběma smluvními stranami.
6. V otázkách, které nejsou touto Smlouvou výslovně upraveny, se řídí právní vztahy smluvních stran ustanoveními obchodního zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky v platném znění.
7. Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.
8. Je-li některé ustanovení této Smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či stane-li se takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti ustanovení ostatních, pokud z povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové ustanovení přijato, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně zahájit jednání za účelem nové úpravy vzájemných vztahů tak, aby byl zachován původní záměr Smlouvy.
9. Strany prohlašují, že ke dni podpisu Smlouvy mají všechny dokumenty (případně jejich kopie), které jsou označeny jako součást Smlouvy, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení, v návaznosti na ujednání čl. II odst. 2 této Smlouvy.
10. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace vzájemně poskytnuté a vztahující se ke Smlouvě se považují za důvěrné a za obchodní tajemství. Kterákoli smluvní strana nesmí bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany poskytnout nebo zpřístupnit třetím osobám jakékoli informace nebo dokumenty, které se vztahují ke Smlouvě, které jí již byly nebo budou druhou smluvní stranou předány nebo jinak zpřístupněny. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na případy, kdy:
 - a) mají smluvní strany opačnou povinnost stanovenou zákonem,
 - b) takové informace sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost mlčenlivosti
 - c) se takové informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než porušením povinností vyplývajících z tohoto odstavce,
 - d) je poskytnutí takových informací v souladu se Smlouvou a jejím účelem.
11. Smlouva je vyhotovena v sedmi stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel obdrží pět vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
12. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, plně porozuměly jejímu obsahu a s jejím zněním souhlasí. Dále prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto prohlášení připojují své vlastnoruční podpisy.
13. Smlouva byla schválena Radou Královéhradeckého kraje dne 8.11.2013, číslo usnesení RK/36/1432/2013.


15. 11. 2013

V Hradci Králové dne

V Jičíně dne ..15.11.2013

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové


Objednatel
Bc. Lubomír Franc
Hejtman


Zhotovitel
Ing. Petr Křenek
ředitel oblastního závodu SEVER
společnosti M – SILNICE a.s.

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČO 421 96 868 ⑦
oblastní závod SEVER
Hradecká 415, 506 01 Jičín

Poznámka: Údaje označené ¹⁾ musí být doplněny uchazečem před předložením nabídky a údaje označené ²⁾ budou doplněny před podpisem Smlouvy o dílo (Souhrnu smluvních dohod) s uchazečem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější

PLNÁ MOC

Představenstvo společnosti M - SILNICE a. s.,
se sídlem v Pardubice, Husova 1697, PSČ 530 03, IČ 421 96 868,
zastoupené panem **Ing. Václavem KUČEROU**, místopředsdou představenstva
a panem **Ing. Milošem MATĚJŮ**, členem představenstva, tímto

zplnomocňuje

pana **Ing. Petra KŘENKA**, narozeného dne 5. prosince 1964, bytem Tesařova 845,
286 01 Čáslav, ředitele oblastního závodu SEVER společnosti M – SILNICE a.s., k provádění
níže uvedených úkonů jménem společnosti

v záležitostech obchodních vztahů:

- uzavírat obchodní smlouvy do výše 3 000 000 Kč (slovy: třímiliónykorunčeských)
bez DPH jednotlivého kontraktu

V Hradci Králové dne 12. srpna 2013

Ing. Václav KUČERA
místopředseda představenstva

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČO 421 96 868 ⑦
oblastní závod SEVER
Hradecká 415, 506 01 Jičín

Ing. Miloš MATĚJŮ
člen představenstva

Zmocnění přijímá:

V Hradci Králové dne 12. srpna 2013

Ing. Petr KŘENEK
ředitel oblastního závodu

Tuto plnou moc obdrží:

- 1 x představenstvo společnosti M - SILNICE a. s.
- 1 x Ing. Petr Křenek, ředitel oblastního závodu

Ověřovací doložka pro vidimaci
Podle ověřovací knihy pošty: Jičín 1

Poř.č.: 50601-043-0607

Tato úplná kopie, obsahující 1 stran souhlasí doslovně
s předloženou listinou, z níž byla pořízena a tato listina je
prvopis, obsahující 1 stran.

Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, neobsahuje
viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního
významu této listiny.

Jičín 1 dne 03.09.2013
Vítíková Blanka

Podpis, Úřední razítko





Královéhradecký kraj
Bc. Lubomír Franc
hejtman

M-SILNICE a.s.
Škroupova 719
500 02 Hradec Králové

Váš dopis ze dne | Vaše značka (č. j.)

Naše značka (č. j.)

Hradec Králové
8.11.2013

Vyřizuje | linka | e-mail
Mgr. Libuše Němcová
lnemcova@kr-kralovchradecky.cz

Název Zakázky: „III/2815 Samšina – kř. Příchvoj“

Forma zadání: **zakázka malého rozsahu na stavební práce**

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Královéhradecký kraj zastoupený Bc. Lubomírem Francem, hejtmanem, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 50003 Hradec Králové jako zadavatel předmětné veřejné zakázky rozhodl v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje ze dne 8.11.2013 a ve smyslu ust. § 81 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“) o přidělení veřejné zakázky uchazeči


Uchazeč:

1. **M-SILNICE a.s., Škroupova 719, 500 02 Hradec Králové, IČ 42196868**

Pořadí ostatních hodnocených uchazečů :

2. **EUROVIA CS, a.s., odštěpní závod oblast Čechy východ, Piletická 498, 503 41 Hradec Králové, IČ 45274924**

3. **Porr, a.s., Václavské náměstí 837/11, 110 00 Praha 1, IČ 43005560**


Bc. Lubomír Franc
hejtman

DOPIS NABÍDKY

NÁZEV STAVBY: „III/2815 Samšina – kř. Příklad“

PRO: Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Prozkoumali jsme Obchodní podmínky, situační plán a technickou zprávu, Soupis prací – výkaz výměr včetně preambule, další související dokumenty a připojenou Přílohu k nabídce pro realizaci výše uvedené stavby. Tímto nabízíme provedení a dokončení stavby a odstranění veškerých vad v souladu s touto nabídkou, jejíž součástí jsou všechny uvedené dokumenty, za částku ve výši (v měně platby)

cena bez DPH	2 799 642,00 korun českých
DPH (21%)	587 924,82 korun českých
cena vč. DPH	3 387 566,82 korun českých

nebo za částku, která bude stanovena v souladu s Obchodními podmínkami Smlouvy o dílo.

Souhlasíme s tím, že tato nabídka bude platit do **31. 12. 2013**, a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli do této doby. Uznáváme, že Příloha k nabídce tvoří součást této nabídky.

Bude-li naše nabídka přijata, poskytneme požadovanou záruku za provedení díla, pokud je požadována, začneme s realizací díla co nejdříve to bude možné po datu zahájení prací, a dokončíme stavbu v souladu s výše uvedenými dokumenty ve lhůtě pro její dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva o dílo, nebude tato nabídka, spolu s jejím písemným přijetím z Vaší strany, představovat závaznou Smlouvu o dílo mezi námi.

Uznáváme, že nejste povinni přijmout nejnižší nebo jakoukoli nabídku, kterou obdržíte.



M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČO 421 96 868 ⑦
oblastní závod SEVER
Hradecká 415, 506 01 Jičín

Podpis oprávněné osoby Titul, jméno, příjmení: Ing. Petr Křenek
Funkce: ředitel oblastního závodu SEVER společnosti M – SILNICE a.s.

Uchazeč:

název: M – SILNICE a.s.
sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice
kontaktní adresa: oblastní závod SEVER, Hradecká 415, 506 01 Jičín
IČ: 421 96 868, zápis v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 430
Kontaktní osoba: Ing. Přemysl Hrnčíř, obchodní náměstek oblastního závodu SEVER
Te., fax., e-mail: 495 847 106, 724 826 244, fax 495 847 140, premysl.hrncir@msilnice.cz

V Jičíně dne 31. 10. 2013

PŘÍLOHA K NABÍDCE

NÁZEV STAVBY: „III/2815 Samšina – kř. Příchvoj“

Položka	Článek	Údaje
Datum zahájení prací		19. 11. 2013
Termín dokončení prací		09. 12. 2013
Termín dokončení _____ 1.1.9 (nejpozději do 4 týdnů po termínu dokončení prací)		05. 01. 2014
Doba realizace stavby		21 dnů + 4 týdny
Právo Smlouvy o dílo _____ 1.4		Právo České republiky
Jazyk _____ 1.5		čeština
Poskytnutí staveniště _____ 2.1		v den zahájení prací
Oprávněná osoba objednatele _____ 3.1		Bc. Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové
Jméno a adresa zástupce objednatele _____ 3.2 Jméno a adresa správce stavby:		SÚS Královéhradeckého kraje a.s. Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
Hlavní inženýr stavby:		ing.Karek Charousek,tel:493 586 952 SÚS Královéhradeckého kraje a.s. Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
Technický dozor stavebníka:		Čeněk Hrdlička, tel.: 493 586 965, e-mail: cenek.hrdlicka@suskhk.cz Petr Bulíček, tel.: 493 586 966, e-mail: petr.bulicek@suskhk.cz SÚS Královéhradeckého kraje a.s., středisko přípravy a realizace staveb Jičín, Koněvova 467, 506 01 Jičín
Lhůta pro předání programu prací _____ 7.2		Do 14 dnů po datu zahájení prací
Smluvní pokuta za nesplnění termínu dokončení _____ 7.4		0,3 % za den až do maxima 30 % ceny uvedené ve Smlouvě o dílo
Záruční doba _____ 9.1		36 měsíců počítaných od data uvedeného v protokolu podle článku 8.1
Měna platby _____ 11.7		koruna česká
Výše úroků z prodlení _____ 11.8		0,2 % za den z ceny uvedené ve Smlouvě o dílo

Pojištění: _____ 14.1 a 14.2

Typ pojištění	Pojistná částka	Jméno (a) pojištěného (pojištěných)
Práce, materiály, techn. zařízení a poplatky	Cena uvedená ve Smlouvě o dílo plus 15 %	M – SILNICE a.s.
Vybavení zhotovitele	Cena plné náhrady	M – SILNICE a.s.
Odpovědnost - zranění osob a škody na majetku	Min. 10 mil. Kč	M – SILNICE a.s.
Pracovníci		M – SILNICE a.s.
Jiná pojistná smlouva		

Poznámka: s výjimkou položek vyplněných zadavatelem doplní uchazeč informace před tím, než podá nabídku

V Jičíně dne 31. 10. 2013



M - SILNICE a.s.
Pardubice, Huscva 1697
IČO 421 96 868 ⑦
oblastní závod SEVER
Hradecká 415, 506 01 Jičín

.....
Ing. Petr Křenek,
ředitel oblastního závodu SEVER
společnosti M – SILNICE a.s.



Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, 500 03

Telefon: 495817453
Fax: 495817336
E-mail: lnemcova@kr-kralovehradecky.cz
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

ROZDĚLOVNÍK

Váš dopis zn. ze dne:

Naše značka

Vyřizuje/linka

Hradec Králové dne 24.10.2013

Mgr. Němcová / 453

Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Ve smyslu ust. § 18 odst. 5 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“) a v souladu se Směrnicí č. 3 Rady Královéhradeckého kraje Vás vyzýváme k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ust. § 12 odst. 3 ZVZ na stavební práce:

„III/2815 Samšina – kř. Příchvoj“

1. Identifikace zadavatele

Královéhradecký kraj
se sídlem Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Zastoupený Bc. Lubomírem Francem, hejtmanem

Kontaktní osoba zadavatele pro tuto veřejnou zakázku:
pro organizaci zadávacího řízení: Mgr. Libuše Němcová, tel. 495 817 453
e-mail: lnemcova@kr-kralovehradecky.cz

pro technické záležitosti: Čeněk Hrdlička, tel: 493 586 965 mail: cenek.hrdlicka@suskhk.cz

Profil zadavatele – https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

2. Vymezení druhu a předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je výběr nejvhodnější nabídky uchazeče na stavební práce „III/2815 Samšina – kř. Příchvoj“

Jedná se o opravu krytové vrstvy silnice č. III/2815 Předpokládá se výsrava výtluků, vyrovnávka. Následovat bude pokládka nového asfaltobetonového krytu.

Stavba bude provedena podle situačního plánu na základě mapového podkladu, technické zprávy a výkazu výměr.

[Zadejte text.]

[Zadejte text.] [Zadejte text.]

6. Dodatečné informace

V případě potřeby je zadavatel v souladu se zákonem připraven poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost o dodatečné informace se podává písemně nebo elektronicky s elektronickým podpisem (kontaktní osoba Mgr. Libuše Němcová, e-mail adresa: lnemcova@kr-kralovehradecky.cz). Žádost musí být doručena zadavateli nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodatečné informace včetně přesného znění požadavku budou uveřejňovány na profilu zadavatele, na URL odkazu: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html. v detailu výše uvedené zakázky

7. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne 4.11.2013 v 9: 00 hod. Všechny nabídky musí být zadavateli doručeny do skončení lhůty pro podání nabídek. Nabídky doručené zadavateli po uplynutí takto stanovené lhůty nebudou zadavatelem hodnoceny.

Nabídku lze doručit osobně, nebo doporučeně poštou v uzavřené obálce na přelepu opatřené razítkem uchazeče. Na obálce bude uvedeno „III/2815 Samšina – kř. Příklad — NEOTEVÍRAT“, a bude zde uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek dle § 71 odst. 6 ZVZ

Nabídky se podávají na doručovací adrese zadavatele:

**Královéhradecký kraj
Podatelna
Pivovarské náměstí 1245/2
500 03 Hradec Králové**

Zájemci doručí nabídky na podatelnu zadavatele (Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové) v úředních dnech pondělí a středa 8.00 – 16.00 hod., v ostatních pracovních dnech úterý, čtvrtek, pátek 8.00 – 13.00 hod.

Při podání nabídky poštou nebo jiným veřejným přepravcem se za okamžik podání považuje její fyzické převzetí zadavatelem na výše uvedené adrese.

Za rozhodující termín doručení nabídky je okamžik převzetí nabídky na výše uvedené adrese.

8. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace podle § 50 a násl. zákona ve lhůtě pro podání nabídek. Kvalifikaci dodavatel splní, pokud:

1. prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona,
2. prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona,
3. předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku a
4. prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 ZVZ.

Dodavatel prokazuje splnění kvalifikačních předpokladů ve smyslu ust. § 62 odst. 3 ZVZ předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel splňuje kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem. Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva je povinen před jejím

Nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Nabídka bude číslována vzestupnou číselnou řadou v pevně spojené podobě tak, aby nebylo možné jednotlivé listy vyjmout či jinak s nabídkou manipulovat. Nacenený soupis prací musí být přiložen i v elektronické formě na CD, a to ve formátu Aspe nebo Excel. Veškeré části nabídky budou tvořit jeden celek. Takto spojená nabídka bude opatřena přelepku s razítkem.

Nabídka bude zpracována v následujícím členění:

Obsah nabídky s uvedením čísel stran

9.1. Dopis nabídky včetně přílohy a návrh smlouvy

Uchazeč k nabídce připojí v jednom vyhotovení dopis nabídky vč. přílohy a návrh smlouvy, přičemž oba tyto dokumenty musí být vypracované dle vzorů, které jsou součástí zadávací dokumentace. Uchazeč doplní chybějící údaje a oba dokumenty podepíše osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče. V případě, že podepisuje nabídku, resp. dokumenty nabídky, osoba k tomu zmocněná, doklad o oprávnění této osoby za uchazeče jednat a to originál nebo úředně ověřená kopie

9.2. Čestné prohlášení o splnění kvalifikace

Zadavatel výslovně upozorňuje, že se musí jednat o čestné prohlášení uchazeče, nikoliv o čestné prohlášení jeho statutárního orgánu. Vzor „Čestného prohlášení o splnění kvalifikace“ je součástí zadávací dokumentace. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že uchazeč splňuje veškeré kvalifikační předpoklady stanovené zadavatelem a že je ekonomicky a finančně způsobilý splnit veřejnou zakázku.

9.3. Nabídková cena – nacenený soupis prací včetně preambule, tabulka Rekapitulace nabídkové ceny

Nabídková cena za předmět veřejné zakázky bude uvedena v českých korunách a stanovena jako nejvýše přípustná na základě jednotkových cen a sazeb. Cena bude uvedena v členění cena bez DPH, DPH a cena s DPH. Cena obsahuje veškeré náklady uchazeče nutné k realizaci veřejné zakázky.

Cena bude zpracována po jednotlivých položkách dle výkazu výměr a předložena v nabídce jednak v písemné formě a jednak v elektronické formě (formát ASPE, příp. Excel, datová základna OTSKP) na disketě/CD.

Za účelem zpracování nabídkové ceny je dodavatel povinen použít **Soupis prací** a tabulku **Rekapitulace nabídkové ceny**, kteréžto dokumenty jsou součástí zadávací dokumentace. Zadavatel upozorňuje dodavatele, že **jakékoliv přidávání či odebrání položek je nepřípustné a bude mít za následek vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče.**

9.4. Další doklady požadované zadavatelem

Součástí nabídky musí být rovněž harmonogram postupu výstavby, platební kalendář dle vzoru, který jsou součástí zadávací dokumentace.

10. Požadavky na varianty

Variantní řešení proti předaným projektovým podkladům zadavatel nepřipouští.

13. Zadávací lhůta

Doba, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, končí **31.12.2013**.

14. Další informace

Prohlídka místa plnění veřejné zakázky je individuální bez přítomnosti zadavatele.

Zadavatel požaduje množství asfaltobetonu z ACO 8 použité jako vyrovnávací vrstva doložit formou předání vážních lístků a kopií záznamu o provozu vozidla. Množství asfaltobetonu pro tuto vyrovnávku uvedené ve výkazu výměr je stanoveno jako maximální a nepřekročitelné.

Pro přejímací řízení dokončené stavby budou předloženy doklady o kvalitě materiálu dle zákona č. 22/97 Sb. ve znění pozdějších předpisů (certifikáty, prohlášení o shodě, atesty, zkoušky asfaltových směsí vč. závěrečné zprávy o hodnocení kvality prací).

Stavba musí splnit požadavky příslušných TKP, TP a ČSN souvisejících s prováděnými pracemi a činnostmi včetně BOZP.


V případě, že zadávací dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, specifická označení zboží, označení původu apod., jedná se pouze o způsob určení minimálních požadavků na kvalitu a provedení výrobku a zadavatel umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

Zhotovitel zodpovídá za veškeré škody na okolním majetku či pozemcích způsobených realizací této zakázky.

Účastníkům veřejné zakázky se nepřiznává právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení. Předložené nabídky zůstávají uloženy u zadavatele a nevracejí se uchazečům.

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit.

Další informace a podmínky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, která je pro zpracování nabídky nutná.



Bc. Lubomír Franc
hejtman Královéhradeckého kraje

Dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Zakázka: „III/2815 Samšina – kř. Příchvoj“

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Způsob zadání: veřejná zakázka malého rozsahu

Zadavatel poskytuje ve smyslu ust. § 49 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů tuto dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám:

Zadavatel zveřejňuje výkaz výměr ve formátu ASPE.

V Hradci Králové 29.10.2013

Mgr. Jitka Bučková
vedoucí oddělení zakázek
na základě pověření

ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY

na zhotovení stavby

„III/2815 Samšina – kř. Příchvoj“

1.1.5 zní:

„**Zhotovitel**“ je totožný termín, jako „**Dodavatel**“ ve smyslu zákona o veřejných zakázkách ve všech mluvnických formách a podobách a znamená osobu (osoby) označenou (é) jako zhotovitel v Dopise nabídky přijaté objednatelem a v Souhrnu smluvních dohod podepsaném stranami, a právní nástupce této osoby nebo osob.

Zhotovitel musí mít jako stavební podnikatel příslušná oprávnění k provádění konkrétních (vztahujících se k předmětné stavbě) stavebních a montážních prací jako předmětu své činnosti a vybrané činnosti ve výstavbě musí zabezpečit fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností, podle zvláštních předpisů. Zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím (který zajistí plnění všech povinností uložených mu stavebním zákonem) a výkon prací, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, osobami, které jsou držiteli takovýchto oprávnění.

1.1.9 se doplňuje:

„Někdy může být vhodnější místo slova lhůta použít slovo „termín“, což znamená poslední den příslušné lhůty.“

1.1.14 se doplňuje:

„Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se na ně, následující události nebo okolnosti, pokud jsou splněny výše uvedené podmínky:

- a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,
- b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,
- c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávková nebo výlučná vyvolaná jinými osobami než je personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitelů,
- d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto municí, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel,
- e) přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita.“

1.1.19 se doplňuje:

„...a odstranění vad.“

Za 1.1.19 se vkládají nové články:

„**1.1.20 „Soupis prací“** je totožný termín jako „Soupis prací včetně výkazu výměr“ ve všech mluvnických formách a podobách - znamená kompletní seznam prací nutných ke zhotovení díla, sestavený podle Oborového třídíku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP) schváleného Ministerstvem dopravy, s uvedením jejich množství objednatelem a oceněný zhotovitelem; je zahrnut v Souvisejících dokumentech.“

„**1.1.21 „Dopis o přijetí nabídky“** znamená oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, přičemž Smlouva o dílo vznikne až podepsáním Souhrnu smluvních dohod oběma stranami.“

„**1.1.22 „Dopis nabídky“** znamená dokument nadepsaný Dopis nabídky, který byl sestaven zhotovitelem a obsahuje podepsanou nabídku objednateli na zhotovení stavby včetně příslušných dokumentů podle zákona o veřejných zakázkách.

„**1.1.23 „Související dokumenty“** znamenají dokument(y) nadepsaný(é) Související dokumenty, sestavené zhotovitelem a předané spolu s Dopisem nabídky, tak jak jsou obsaženy ve Smlouvě o dílo.“

- organizování kontrolních dnů stavby
- hlášení archeologických nálezů příslušným orgánům
- spolupráce s projektantem stavby zabezpečujícím autorský dozor při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem
- dohlížet na řádné dokumentování průběhu stavby, kontrolovat vedení stavebního deníku zhotovitelem, pravidelně odsouhlasovat veškeré záznamy provedené zhotovitelem nebo orgány oprávněnými provádět zápisy do stavebního deníku
- kontrolovat dodržení smluvních podmínek daných smlouvou na zhotovení díla, v případě nutných změn zajistit jejich zapracování do smluvního vztahu
- sledovat průběh výstavby s hlediska časového plánu každé jednotlivé akce
- dodržování podmínek zákona č. 309/2006 Sb. kterým se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, v platném znění, a prováděcích předpisů
- odsouhlasovat provedené práce, které nejsou obsaženy v projektové dokumentaci, jako jsou např. vícepráce nebo změny projektových řešení, které byly navrženy v průběhu výstavby.
- kontrolovat u zhotovitele předepsané doklady (prohlášení o shodě, atesty) o použitých materiálech a zabudovaných výrobcích, které je nutné předložit při řízení o užívání stavby.
- kontrolovat věcnou a finanční správnost fakturovaných položek oproti rozpočtu stavby
- zajistit konečné vyúčtování stavby
- zúčastnit se na základě výzvy zhotovitele přejímky provedených stavebních prací kde bude provedena kontrola provedených prací a sestavení seznamu zjištěných vad a nedodělků
- bude provedena kontrola předepsaných dokumentů pro přejímku:
 - stavební deník
 - prohlášení o shodě zabudovaných materiálů a výrobků
 - dokladů o provedených zkouškách a revizích
 - vyjádření zainteresovaných orgánů státní a veřejné správy
 - souhrnnou závěrečnou zprávu zhotovitele o kvalitě provedených prací
 - sepsání protokolu o odevzdání a převzetí stavby
 - po uplynutí lhůty pro odstranění vad a nedodělků provedení kontroly jejich odstranění a sepsání o tom zápis z jednání.

2) Inženýrská činnost po dokončení stavby.

Jedná se zejména o tyto činnosti:

- zajištění užívání stavby dle stavebního zákona
- sledovat stavbu v záruční době, v případě výskytu vad, zajistit jejich odstranění. Před uplynutím záruční doby svolat jednání, za účelem projednání kvality stavby před uplynutím záruční doby, zajistit, aby případné závady byly odstraněny.“

4. ZHOTOVITEL

Ve 4.1 třetí věta zní:

„Materiály a technologická zařízení se stávají vlastnictvím objednatele, jakmile nastane dřívější z následujících možností:

- a) když jsou zabudovány do stavby nebo zaplacený objednatelem,

vady oznámené v záruční době. Objednatel vrátí záruku za odstranění vad zhotoviteli do 42 dnů po uplynutí záruční doby a po odstranění veškerých vad oznámených v záruční době.

Kontrolní prohlídky stavby

4.7 Zhotovitel je povinen nejpozději 14 dnů předem nahlásit objednateli provedení prací odpovídajících fázím výstavby uvedeným ve stavebním povolení pro uskutečnění kontrolních prohlídek stavby podle stavebního zákona, podle dohody s objednatelům k nim vytvořit podmínky, zajistit potřebné podklady a spolupráci a těchto kontrolních prohlídek se zúčastnit.“

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

4.8 Zhotovitel zajistí dodržování těchto podmínek z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění, zákona č. 309/2006 Sb. a souvisejících předpisů, včetně:

- plnění zákonných požadavků, týkajících se provozu vyhrazených technických zařízení,
- plnění požadavků na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,
- zavedení systému požární ochrany podle příslušných právních předpisů,
- zavedení systému nakládání s odpady podle zákona o odpadech,
- plnění požadavků v dopravě, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky (mj. zpracování místního provozního bezpečnostního předpisu a plnění požadavků norem ADR při přepravě nebezpečných věcí),
- plnění požadavků zákona o chemických látkách a chemických přípravcích v platném znění.

Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni se vzájemně písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením.

Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající pro něj ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména ve vztahu ke koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (byl-li objednatelům určen).

Dále je zhotovitel povinen zavázat jiné fyzické osoby působící s jeho vědomím na stavbě:

- a) k dodržování předpisů v bezpečnosti a ochraně zdraví a k povinnosti používat osobní ochranné prostředky, technická zařízení, přístroje a nářadí splňující požadavky zvláštních předpisů,
- b) k povinnosti 5 dnů před převzetím pracoviště informovat zhotovitele o všech okolnostech, které by mohly vést ke zvýšení rizika ohrožení života a poškození zdraví jiných pracovníků.

Neplnění výše uvedených povinností se považuje za neplnění povinností zhotovitele podle Smlouvy o dílo.“

Vytyčení stavby

„**4.9** Zhotovitel zajistí vytyčení stavby a obvodu staveniště (včetně vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou) oprávněnými osobami podle hlavních bodů, os a referenčních výšek uvedených ve Smlouvě o dílo nebo oznámených objednatelům.“

Archeologické nálezy

„**4.10** Na základě § 176 zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon) v platném znění zhotovitel zajistí za stavebníka archeologický dohled u organizace ze soupisu oprávněných organizací vydaného Archeologickým ústavem AV ČR. Této organizaci je povinen 10 dní před zahájením výkopových prací oznámit termín zahájení. Pokud dojde k nálezům a bude nařízen „Záchraný archeologický

8.2. se ruší

9. ODSTRANĚNÍ VAD

V 9.1 se v prvním odstavci druhá věta doplňuje takto:

„a předá veškeré výše uvedené práce protokolárně objednateli (nebo jeho zástupci).“

10. ZMĚNY A ÚPRAVY

V 10.2 se vypouští bod a)

V 10.2 se mění bod d) takto:

d) vhodnými novými sazbami podle dohody, nebo takovými, jaké objednatel pokládá za vhodné například uvedené v OBOROVÉM TRÍDNÍKU STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A PRACÍ STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ schváleného MD – OI čj.1125/07-910-IPK/1 ze dne 17.12.2007 s účinností od 1. ledna 2008, nebo

11. CENA DÍLA A PLATBY

11.1 zní:

„Práce budou oceňovány po přeměření na základě oceněného soupisu prací a podle kapitoly 10. Měřit se bude netto skutečné množství každé položky zhotovovacích prací v souladu se soupisem prací nebo jinými použitelnými dokumenty Smlouvy o dílo. Při oceňování se vychází z toho, že jednotkové sazby a ceny uvedené v Soupisu prací zahrnují úhradu nejen prací, které jsou uvedeny jako položky Soupisu prací, ale i dalších prací a věcí vyplývajících ze Smlouvy o dílo, které jsou nutné pro zdárné provedení a dokončení stavby a odstranění všech vad, i když nejsou v soupisech prací případně konkrétně uvedeny (vybavení zhotovitele, realizační dokumentace stavby apod.).“

V 11.2 v prvním odstavci se vypouští bod b) a ve druhém odstavci se doplňuje: „Po odsouhlasení prohlášení (Soupis provedených prací) objednatelem (zástupcem objednatele) vystaví zhotovitel fakturu s datem zdanitelného plnění shodným s datem odsouhlasení prohlášení (Soupis provedených prací). Přílohou faktury je odsouhlasené prohlášení (Soupis provedených prací). Objednatel odsouhlasí prohlášení (Soupis provedených prací) do 15 dnů od jeho předání objednateli (zástupci objednatele) zhotovitelem.“

Článek 11.3 zní:

Do 30 dnů po doručení každé faktury objednatel zhotoviteli zaplatí částku, uvedenou v prohlášení zhotovitele mínus jakoukoliv částku, pro niž objednatel uvedl důvody svého nesouhlasu. Objednatel nebude vázán žádnou částkou, kterou dříve pokládal za splatnou zhotoviteli.

Objednatel může pozdržet dílčí platbu, dokud neobdrží záruku za provedení díla podle článku 4.4 (je- li).

11.4 se ruší.

11.5 se ruší.



V 11.6 se v prvním odstavci slova „v článku 11.5“ nahrazují slovy „v článku 8.1“ a ve druhém odstavci se slova „Do 28 dnů“ nahrazují slovy „Do 30 dnů“.

Za 11.8 se vkládají dva nové články:

11.9 Zhotovitel bude fakturovat cenu díla tak, aby faktury obsahovaly účel fakturovaných částek a přesně specifikovaly jednotlivé uznatelné náklady. Na každé faktuře bude uveden název stavby „III/2815 Samšina – kř. Příchvoj“, aby byla jednoznačně patrná souvislost jednotlivých faktur se stavbou. Jednotlivé faktury budou zpracovány bez zaokrouhlování (bez korunového vyrovnání fakturované částky).

11.10 Faktury budou vystavovány na objednatele a předkládány osobně prostřednictvím zástupce objednatele (správce stavby) nebo poštou na adresu: SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové.

III/2815 Samšina – kř. Příchvoj

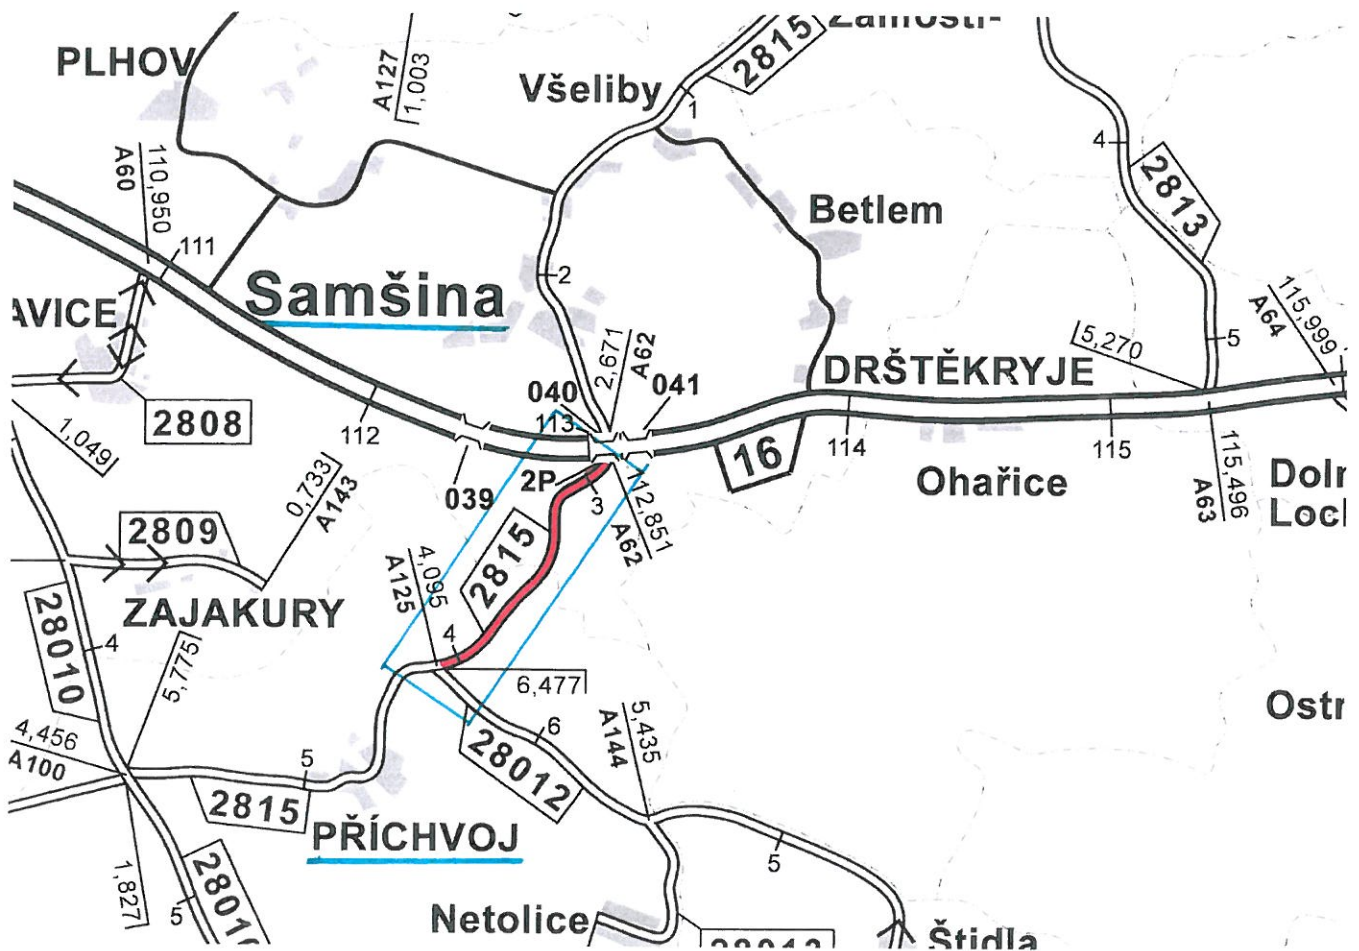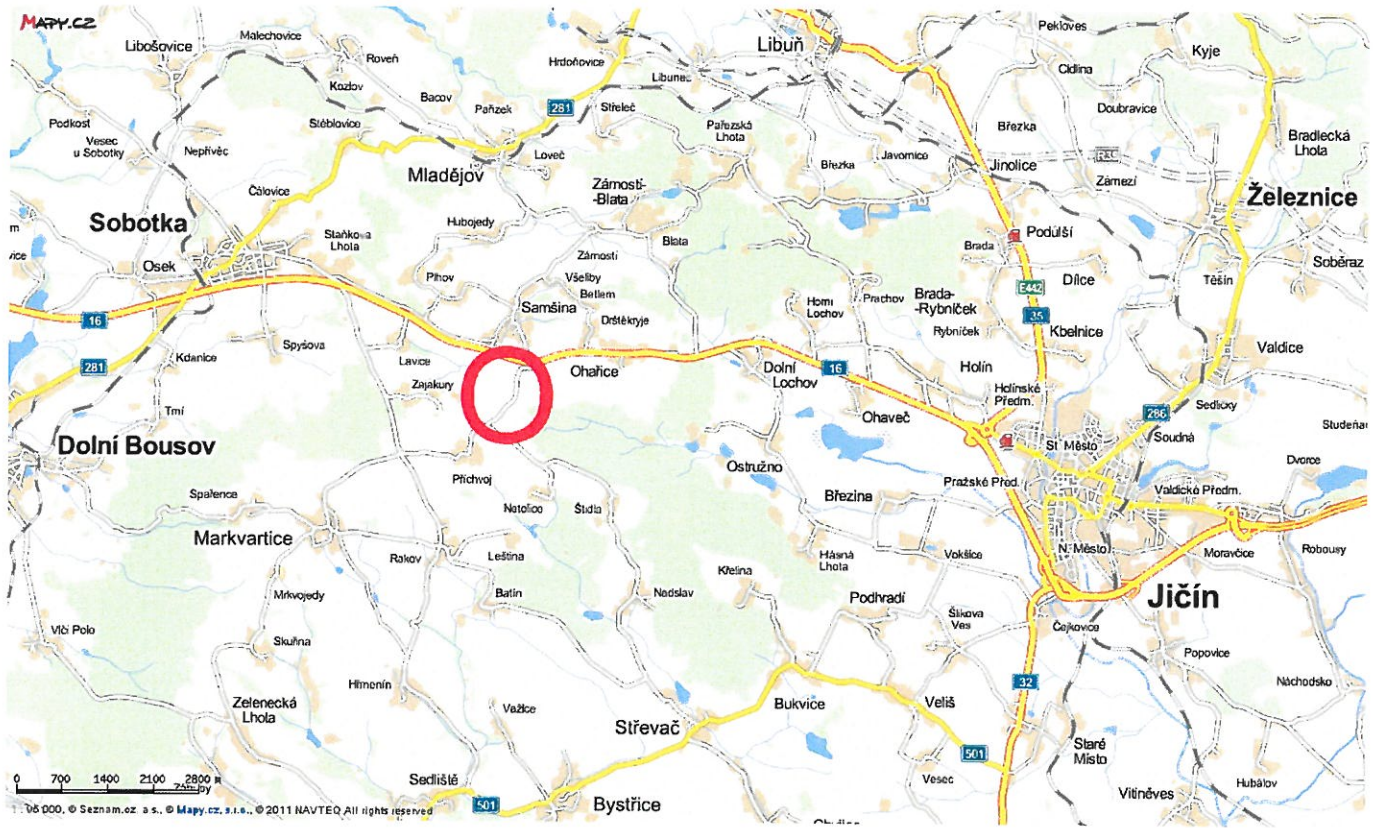

III/2815 Samšina – kř. Příchvoj

Technická zpráva

a) Zhodnocení staveniště

Staveniště se nachází převážně v extravilánu mezi MÚK Samšina a křižovatkou se silnicí III/28012 před obcí Příchvoj v rozsahu stávajícího silničního tělesa silnice III/2815. Úpravy jsou navrženy a musí být provedeny v rozsahu stávajícího silničního pozemku, k záboru okolních pozemků nedojde.

b) Technické řešení stavby

Technické řešení stavby – resp. úprava vozovky vychází z požadavku investora stavby na opravu krytu silnice III/2815 ve staničení 2,941 – 4,095 km

Stavbou dojde ke zlepšení životního prostředí z hlediska prašnosti, hlučnosti a vibrací

Stavba má jeden stavební objekt

Hlavní zásady řešení jsou tyto:

Kryt je porušen hloubkovou korozí a výtluky opravovanými nátěrovou technologií. Dále se vyskytují poruchy na krajích vozovky, vyžadující příčné vyrovnání.

Návrh opravy je tento:

- očistit vozovku
- provést výspravu výtluků směsí typu asfaltový beton
- provést spojovací postřík povrchu kationaktivní emulzí v množství 0,30 kg/m² asfaltu po vyštěpení
- provést pokládku vyrovnávací vrstvy krytu v průměrné tloušťce cca 40 mm z asfaltové směsi typu asfaltový beton ACO 8 dle ČSN EN 13 108-1
- provést spojovací postřík povrchu kationaktivní emulzí v množství 0,30 kg/m² asfaltu po vyštěpení
- provést pokládku obrusné vrstvy krytu v tloušťce 50 mm z asfaltové směsi typu asfaltový beton ACO 11 dle ČSN EN 13 108-1
- provést dosypání krajnic a úpravu napojení vjezdů k sousedním nemovitostem a pozemkům

Tloušťka nově pokládaných asfaltových vrstev vozovky byla navržena z technologických důvodů, aby byla posílena únosnost krajů vozovky a zvýšena odolnost vozovky proti vzniku trhlin.

Předpokládaný postup výstavby

- přípravné práce (vytyčení inženýrských sítí, provizorní dopravní značení atd.)
- za provozu (za jeho částečného omezení)

- bezpečné ukládání sypkých materiálů na dopravní prostředky zabraňující znečištění veřejných komunikací
- zabránění znečištění vod ropnými látkami

e) Zásady řešení bezbariérového užívání

Většina trasy je extravilánu obcí bez chodníků.

f) Podklady pro vytyčení stavby

Při stavbě musí být zachován stávající trvalý zábor stavby. Směrové a výškové řešení zůstane stejné, jen dojde k úpravě místních nerovností podélného a příčných řezů.

g) Technické specifikace a standardy

Při provádění stavebních prací a montáže konstrukcí je nutné postupovat v souladu s předpisy a normami, platnými v České Republice. Dále bude postupováno dle Technických podmínek vydaných a schválených Ministerstvem dopravy ČR a dle Technicko kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací (TKP), vydaných a schválených Ministerstvem dopravy a spojů ČR v platném znění.

Při stavbě bude aplikováno nejnovější vydání ČSN, TP a TKP. Pokud některé normy, technické podmínky, zákony a vyhlášky vydané následně za platnými TKP zpřísňují podmínky nebo pravidla uváděná v TKP, platí ustanovení těchto norem, předpisů, zákonů a vyhlášek.

Stavba bude provedena v souladu s ustanovením vyhl.č. 137/1998 Sb. o obecně technických požadavcích na výstavbu v platném znění.

Veškeré zboží a materiály, které budou zabudovány do projektového díla budou nové a nepoužité. Všechny použité materiály musí být schválené pro použití ve stavebnictví. Zhotovitel musí pro všechny výrobky a materiály předložit potvrzené osvědčení od autorizované zkušební laboratoře nebo certifikát stejné váhy platnosti.

Pracovní procesy podléhají ustanovení závazných norem, právních předpisů a nařízení ČR týkajících se provádění stavebních prací, platných v aktuálním období, čili v době stavby.

Všechny odkazy na normy a ostatní uvedené předpisy (ČSN, TP, TKP) uvedené v Zadávací dokumentaci týkající se materiálu, prací a jejich zkoušek musí Zhotovitel respektovat podle jejich posledních verzí, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak. Pokud jsou jakékoliv předpisy vztaheny jen k určité zemi nebo jen regionu, může je pro stavební práce Zhotovitel použít jen v případě, že zaručují stejný nebo vyšší standard provedení stavebního díla a pokud je uzná a písemně schválí Správce stavby. Rozdíly mezi platnými českými normami a normami, navrhovanými Zhotovitelem musí být písemně popsány a předány Správci ke schválení. V případě, kdy Správce stavby určí, že tyto rozdíly nezaručují shodu v provádění se schválenou projektovou dokumentací, Zhotovitel musí respektovat specifikované normy.

Ve výkazech výměr je mimo uvedený popis další obsah položek specifikován v Oborovém třídíku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací – část I. Popisovník prací staveb pozemních komunikací (schváleno MD ČR).

SOUPIS PRACÍ

PREAMBULE

„III/2815 Samšina – kř. Příklad“

1. Všeobecně

- a) Tuto preambuli je nutno číst ve spojitosti s ostatními částmi zadávací dokumentace, a to zejména s:
 - podmínkami smlouvy
 - technickými kvalifikacemi
 - výkresy
- b) Pro fakturaci budou výměry všech položek, tj. délky, plochy a kubatury měřeny na staveništi v souladu se Zvláštními obchodními podmínkami článku 11.1.
- c) Sazby a ceny v oceněném výkazu výměr musí, pokud a noli není stanoveno podle smlouvy, zahrnovat veškeré zhotovitelovo vybavení, pracovní síly, dozor, materiály, výstavbu vč. vyhotovení realizační dokumentace, fotodokumentace postupu výstavby, dokumentace stavu okolní zástavby, údržbu, pojištění, zisk, daně (kromě DPH) a poplatky spolu se všemi obecnými riziky, závazky a povinnostmi stanovenými nebo implikovanými ve smlouvě, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak. Částka DPH musí být přičtena jako oddělená položka v sumáři výkazu výměr.
- d) Veškeré sazby a ceny jsou míněny v korunách českých.
- e) Stručné popisy položek uvedené ve výkazech výměr jsou určeny pouze k účelům identifikace a nijak nepozměňují ani nenahrazují podrobný popis prací obsažených jinde v zadávací dokumentaci. S výjimkou případů, kde je ve specifikaci nebo soupisu prací konkrétně a výslovně stanoveno jinak, se kvalifikují pouze trvalé práce. Dílo se měří v čistých rozměrech podle dimenzí vyznačených v projektové dokumentaci (dokumentaci stavby) nebo písemně stanovených správcem stavby, pokud není ve smlouvě konkrétně popsáno nebo předepsáno jinak.
- f) Jestliže není ve smluvní (zadávací) dokumentaci stanoveno jinak, musí být metoda měření hotového díla k úhradě v souladu s „Oborovým třídníkem stavebních konstrukcí pozemních komunikací OTSKP“ MD ČR vč. elektronické formy.
- g) Nebude poskytována žádná srážka na ztráty materiálu či zmenšení jejich objemu během dopravy nebo zhutňování.
- h) Sazby a ceny zahrnuté do výkazu výměr se pokládají za vše zahrnující hodnoty prací popsaných dotýcnými položkami včetně všech nákladů a výdajů, které mohou být nutné při provádění a pro účely popsaných prací, spolu s veškerými dočasnými pracemi a instalacemi, jichž může být zapotřebí, a všemi obecnými riziky, povinnostmi a závazky stanovenými nebo implikovanými v dokumentech, na nichž je nabídka založena. Vzhledem k zabránění určitých nejasností se upozorňuje konkrétně: v ceně za výkopy musí být zahrnuty veškeré práce a ceny, tedy vodorovné i svislé přemístění a odvoz na skládku, vč. uložení a případných poplatků. Zásadně se neurčuje místo a vzdálenost skládek (pokud k tomu nejsou přesné požadavky v PD, např. skládka SÚS), s veškerým vytěženým materiálem hospodář zhotovitel a určuje si své vlastní skládky, pokud jsou ekonomicky výhodnější, než je uvedeno v PD. Obdobně pro uložení do násypů se předpokládá i získání vhodného materiálu, pro každý násyp či zásyp vč. odkopání, naložení, odvozu a kalkulace případného rozdílu objemové hmotnosti a zatlačení násypů do podloží, pokud není v projektu uvedeno jinak. V cenách a sazbách odkopávek, násypů, zásypů a dalších podobných zemních pracích musí být zahrnuty veškeré náklady na úpravu zemníků, skládek vč. příjezdných komunikací a případného uvedení do původního stavu či rekultivace, pokud není v projektu uvedeno jinak. Bude se předpokládat, že poplatky, režie, zisk a přírážky na všechny závazky jsou rozděleny rovnoměrně na všechny jednotkové ceny či sazby.

2. Prozatímní částky

Kde se v soupisu prací vyskytuje položka označená „Provizorní cena (Prov.cena)“ v popisu položky, jedná se o částku, stanovenou zadavatelem (objednatelem), kterou nesmí uchazeč (zhotovitel) v soupisu prací změnit, tj. snížit nebo zvýšit. Položka bude fakturována dle skutečnosti na základě specifikace zhotovitele, resp. odsouhlaseného podzhotovitele, odsouhlasené objednatelem nebo jeho zástupcem.

Každá provizorní položka bude použita, zcela nebo zčásti, v souladu s pokyny objednatele nebo jeho zástupce (je-li nějaký) a podle toho bude upravena cena díla. Celková suma vyplacená zhotoviteli bude zahrnovat pouze částky za práci, dodávky nebo služby bez jakýchkoli ostatních nákladů nebo zisků, k nimž se provizorní položky vztahují, podle pokynů objednatele nebo jeho zástupce (je-li nějaký).

3. Pevná cena

Ceny uvedené v soupisu prací, pokud jsou označeny v popisu položek „Pevná cena (Úhrnná částka)“, jsou ceny neměnné, a není-li uvedeno jinak ve smlouvě, nesmí být částka uvedená v soupisu prací žádným způsobem zvýšena ani snížena z titulu vyšších nebo nižších skutečných nákladů, než byly odhadnuty při určování ceny. Úhrady se potvrzují po splátkách úměrně rozsahu, v jakém byly podle posouzení objednatele příslušné práce provedeny.

4. Všeobecné položky – obecný popis

Obecný popis aktuálních položek je uveden v soupisu prací stavebních objektů – SO Všeobecné a předběžné položky.

Název stavby:
„III/2815 Samšina - kř. Příchvoj“

Rekapitulace nabídkové ceny

OBJEKT	NÁZEV	CENA BEZ DPH
SO 100	„III/2815 Samšina - kř. Příchvoj“	2 799 642,00 Kč
NABÍDKOVÁ CENA bez DPH		2 799 642,00 Kč
DPH 21 %		587 924,82 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		3 387 566,82 Kč

V Jičíně dne 31. 10. 2013



M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČO 421 96 868 ⑦
oblastní závod SEVER
Hradecká 415, 506 01 Jičín

.....
Ing. Petr Křenek,
ředitel oblastního závodu SEVER
společnosti M - SILNICE a.s.

podpis oprávněné osoby a razítko

**Soupis objektů s DPH****Stavba: SFDI - JC - III/2815 Samšina - křižovatka Příchvoj****Varianta: ZŘ -**

Objekt	Popis	Odbytová cena [Kč]		2 799 642,00
		OC + DPH [Kč]		3 387 566,82
		OC	DPH	OC + DPH
SO 100	Komunikace	2 799 642,00	587 924,82	3 387 566,82

V Jičíně dne 31.10.2013

M - SILNICE a.s.
 Pardubice, Husova 1697
 IČO 421 96 868 ⑦
 oblastní závod SEVER
 Hradecká 415, 506 01 Jičín

.....
 Ing. Petr Křenek,
 ředitel oblastního závodu SEVER
 společnosti M - SILNICE a.s.

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SFDI - JC III/2815 Samšina - křižovatka Příchvoj

Objekt: SO 100 Komunikace

Rozpočet: RI SO 100

Objednavatel: SÚS KHK

Zhotovitel dokumentace: Projektservis Jičín s.r.o.

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Základní cena: 2 799 642,00 Kč

Cena celková: 2 799 642,00 Kč

DPH: 587 924,82 Kč

Cena s daní: 3 387 566,82 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 2 799 642,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku: M - SILNICE a.s.

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky: 31.10.2013

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: SFDJ - JC III/2815 Samšina - křižovatka Příchovoj
 Objekt: SO 100 Kominikace
 Rozpočet: R1 SO 100

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0						
1	02720	Všeobecné konstrukce a práce POMOC PRÁCE ŽRÍZ NEBO ZAJIŠT REGULAČI A OCHRANU DOPRAVY - provizorní dopravní značení při provádění prací za částečně omezeného provozu - označení a ohrazení staveniště, usměrnění provozu vozidel, apod. Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednateltem požadovanými zařízeními	KČ	1,000	10 000,00	10 000,00
2	02730	POMOC PRÁCE ŽRÍZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍŤÍ - vytyčení průběhu všech inženýrských sítí, včetně přípojek, popř. provedení sond pro upřesnění jejich polohy Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednateltem požadovanými zařízeními	KČ	1,000	5 000,00	5 000,00
3	03100	ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - INFORMAČNÍ TABULE - náklady na zřízení 1ks informační tabule s údaji o stavbě s textem a rozměry dle vzoru objednatele Technická specifikace: zahrnuje objednateltem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení	KUS	1,000	2 000,00	2 000,00
4	03710	POMOC PRÁCE ZAJIŠT NEBO ŽRÍZ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY - zpřístupnění objektů, provizorní dosypání vjezdů (včetně pozdějšího odstranění) Technická specifikace: zahrnuje objednateltem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele	KČ	1,000	5 000,00	5 000,00
0		Všeobecné konstrukce a práce				22 000,00
1						
5	11372	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH - frézovaný materiál se použije na stavbě Technická specifikace:	M3	7,000	2 836,00	19 852,00
6	129221	ODTĚŽENÍ KRAJNIC OD NĀNOSU TL. DO 100MM - včetně odvozu na skládku zhotovitele - včetně sejmutí drnu , odvozu na skládku zhotovitele a poplatků za skládkování - odstranění krajnic v š. 0,5m a tl. 0,1m = 1154 x 2 x 0,5 = 1154 m2 (x 0,1 = 115,4 m3)	M2	1 154,000	30,00	34 620,00

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: SFDI - JC III/2815 Samšina - křižovatka Přehvoj
Objekt: SO 100 Komunikace
Rozpočet: R1 SO 100

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					54 472,00
5		Komunikace					
7	56933		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM zřízení nepevných krajnic ze štěrku dle ŠDA 0/32 tl. 0,15m 0,5 x 2 x 1154 = 1154 m ² Technická specifikace: - dodání směsi, postříku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postříků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M2	1 154,000	135,00	155 790,00
8	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 - spojovací postřík kaionaktivní emulzí 0,3 kg/m ² (estiatu po vystěpení) plocha: vyrovnávací vrstva = 6105 m ² plocha obrusná vrstva = 6105 m ² plocha celkem = 12210 m ² Technická specifikace: - dodání směsi, postříku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postříků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M2	12 210,000	9,00	109 890,00
9	574102		ASFALTOVÝ BETON TŘ. II - vyrovnávací vrstva ACO 8 (ABJ II) - průměrná tl. 40 mm (vyrovnání místních nerovností a propadlých okrajů) Technická specifikace: - dodání směsi, postříku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě	M3	250,000	4 213,00	1 053 250,00

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: SFDI - JC III/2815 Samšina - křižovatka Příchvoj
 Objekt: SO 100 Komunikace
 Rozpočet: R1 SO 100

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10	57414		ASFALTOVÝ BETON TL. 50MM - vozovka se bude pokládat v celé šířce vozovky najednou - bez středové spáry! - obrusná vrstva ACO II ... tl. 50 mm - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M2	6 105,000	204,00	1 245 420,00
Technická specifikace:							
11	577401		VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - Z ASFALTOVÉHO BETONU - oprava výtuků a poruch stávajícího krytu před položením vyrovnávací vrstvy - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M3	35,000	3 656,00	127 960,00
Technická specifikace:							
12	58910		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM - zařetí spáry v napojení na stáv. asfaltové plochy (stálepružná zálitvka) - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě	M	10,000	47,00	470,00
Technická specifikace:							



POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: SFDI - JC III/2815 Samšina - křižovatka Příchovoj
Objekt: SO 100 Komunikace
Rozpočet: R1 SO 100

Por.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5			Komunikace				2 692 780,00
9	15 914124		Ostatní konstrukce a práce DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VELOCEL FÓLIE TR 1 - DOD, MONT, DEMONT značky B1, B24a, B24b E13 (mimo vozidel stavby) - 3x celkem 6ks pro ZÚ Totéž pro KÚ 6ks Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie - odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.	KUS	12.000	679,00	8 148,00
16	916124		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ - spolu se Z2 - 2ks Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie - odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.	KUS	2.000	3 751,00	7 502,00


POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: SFDI - JC III/2815 Samšina - křižovatka Příchvoj
Objekt: SO 100 Komunikace
Rozpočet: RI SO 100

Por.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
17	916314	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ - Z2 - 2ks Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonové patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie - odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.	KUS	2,000	585,00	1 170,00
18	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM - řezání stávajícího asfaltového krytu v napojení na konci a začátku trasy a na další asf. povrchy Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky	M	20,000	68,00	1 360,00
19	93811	OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU - odstranění mechanických nečistot před spojovacími postřiky - 2 x 6105 m2 Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, bez ohledu na způsob provedení, včetně odklizení vzniklého odpadu.	M2	12 210,000	1,00	12 210,00
9		Ostatní konstrukce a práce				30 390,00

Celkem:

2 799 642,00



Plán kvality č.j: 6/2013/Pi

PLÁN JAKOSTI STAVBY

STAVBA : III/2815 Samšina – křižovatka Příchvoj

OBJEKTY : SO 100 Komunikace

OBJEDNATEL : Královéhradecký kraj,
Pivovarské nám. 1245
500 03 Hradec Králové

ZHOTOVITEL : M - SILNICE a.s.
Husova 1697, 530 03 Pardubice
Oblastní závod SEVER
Hradecká 415, 506 33 Jičín

VYPRACOVAL ZHOTOVITEL STAVBY (RAZÍTKO) : 13. XI. 2013

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČO 42198888
(22) ŘEDITELSTVÍ
02 Hradec Králové, Škroupova 710

JMÉNO ZPRACOVATELE : JAROSLAV PILAŘ

PODPIS :

VEDOUcí OKRĚJ : ING. OTTO HANŠ

PODPIS :

POČET STRAN CELKEM : 4

DATUM PŘEDÁNÍ :

PODPIS :

DATUM :

2. Dokumentace systému kvality

Veškeré činnosti ovlivňující kvalitu jsou zakotveny v řídicích dokumentech společnosti počínaje Příručkou systémů managementu kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; přes Řády, Směrnice až po Technologické předpisy (TLP) a Příkazy ředitele. Přehled platných řídicích dokumentů je navíc každoročně uváděn v **Organizačním věstníku společnosti**.

3. Zabezpečení kontroly kvality pro zakázku

Finálním dokladem rekapitulujícím požadované kontroly kvality zakázky je u staveb vypracování výstupky zakázky odborem kontroly a řízení (OKŘJ) a.s. v podobě **Souhrnné závěrečné zprávy zhotovitele o hodnocení kvality díla**.

Pro stanovení konkrétních druhů a četnosti zkoušek a měření bude pro tuto zakázku OKŘJ na základě požadavků platných norem a druhu a rozsahu prací vypracován **Plán kontrolních zkoušek**.

Za kvalitní realizaci zakázky při dodržení technologických předpisů i naplnění Plánu kontrolních zkoušek je přímo zodpovědný jmenovaný stavbyvedoucí. Na kontrolní činnosti se ve stanoveném rozsahu podílí i další řídicí pracovníci společnosti.

Stavbyvedoucí zajišťuje provádění zkoušek, měření a geodetických měření u akreditovaných laboratoří a u laboratoří se zvláštní způsobilostí.

4. Jednotlivé technologické procesy

Jednotlivé technologické procesy budou realizovány při dodržení jednotlivých **Technologických předpisů (TLP)**, které jsou zpracovány na základě platných ČSN a Technických a kvalitativních podmínek staveb vydaných ministerstvem dopravy a spojů, obor pozemních komunikací. Z platných TLP uvedených v přehledu jmenovitě uvádím tyto aplikované technologie :

4.1 Postřiky

Technologický proces postřiků se řídí technologickým předpisem **TLP 7/2011 Postřiky a nátěry**.

4.2 Hutněné asfaltové vrstvy

Technologický proces hutněných asfaltových vrstev se řídí technologickým předpisem **TLP 9/2008 Hutněné asfaltové vrstvy, 10/2011 Opravy poruch asfaltových vozovek**.



Kontrolní a zkušební plán (KZP)

NAZEV STAVBY: **III/2815 Samšina – křižovatka Příklad**

OBJEKT: **SO 100 Komunikace**

OBJEDNATEL: **Královéhradecký kraj,
Pivovarské nám. 1245
500 03 Hradec Králové**

ZHOTOVITEL: **M - SILNICE a.s.
Husova 1697, 530 03 Pardubice
Oblastní závod SEVER
Hradecká 415, 506 33 Jičín**

VYPRACOVAL OKŘJ ZHOTOVITELE STAVBY (RAZÍTKO): **13. XI 2013**

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČO 42198888
(22) ŘEDITELSTVÍ
500 02 Hradec Králové, Škroupova 716

JMÉNO ZPRACOVATELE:

Jaroslav Pilař

PODPIS:

JMÉNO VEDOUCÍHO OKŘJ:

Ing. Otto Hanš

PODPIS:



STAVBA: III/2815 Samsína – křiž. Příchvoj

Kontrolní a zkušební plán

Zpracoval: Jaroslav Pilař
Schválil: Ing. Otto Hanš

Objekt: SO 100 Komunikace

Konstrukční část	Hutněné asfaltové vrstvy			Požadované				Provedené				
	Konstrukční vrstva	Vyrovnávací vrstva		četnosti zkoušek	počty zkoušek	hodnoty zkoušek	TKP-7 (2008)	vyhov.	nevyh.	vyh. po opr.	CELKEM	
Materiál		ACO 8										
		Množství		Druh zkoušky								
plocha [m ²]	hmotnost [t]	délka [bm]		tl. [m]								
					1 x	1 000 t	1	dle průkaz. zk.	Tab. 3			
				Zrnitost	1 x	1 000 t	1	dle průkaz. zk.	Tab. 3			
				Obsah pojiva	1 x	1 000 t	1	dle průkaz. zk.	Tab. 3			
				Mezerovitost	1 x	5 000 m ²	2	2,0 - 7,5%	Tab. 4			
				Mezerovitost vrstvy – na vývrtech	1 x	5 000 m ²	2	min. 96,0%	Tab. 4			
				Míra zhutnění vrstvy – na vývrtech	1 x	5 000 m ²	2	6,7 kN	Tab. 4			
				Spojení vrstev – na vývrtech								



STAVBA: III/2815 Samšina – křiž. Příchvoj

Kontrolní a zkušební plán

Zpracoval: Jaroslav Pilař

Schválil: Ing. Otto Hanš

Objekt: SO 100 Komunikace

Konstrukční část	Hutněné asfaltové vrstvy		Požadované				Provedené			
	Konstrukční vrstva	Obrusná vrstva	četnosti zkoušek	počty zkoušek	hodnoty zkoušek	TKP-7 (2008)	vyhov.	nevyh.	vyh. po opr.	CELKEM
Materiál		ACO 11								
		Množství								
plocha [m ²]	hmotnost [t]	délka [bm]								
		délka [bm]	tl. [m]							
				Druh zkoušky						
				Zrmitost	1x 1 000 t	1	dle průkaz. zk.	Tab. 3		
				Obsah pojiva	1x 1 000 t	1	dle průkaz. zk.	Tab. 3		
				Mezerovitost	1x 1 000 t	1	dle průkaz. zk.	Tab. 3		
				Mezerovitost vrstvy – na vývrtech	1x 5 000 m ²	2	2.0 - 7.5%	Tab. 4		
				Míra zhutnění vrstvy – na vývrtech	1x 5 000 m ²	2	min. 96.0%	Tab. 4		
				Tloušťka vrstvy – na vývrtech (min./průměr)	1x 5 000 m ²	2	40 mm 45 mm	Tab. 4		
				Nerovnost povrchu v podélném směru	1x jízdní pruh	min. 1	5 mm	Tab. 4		
				Nerovnost povrchu v příčném směru	1x 20 bm	30	5 mm	Tab. 4		
